

Nota #1 Con esta fecha se abre la presente bitacora para la obra. Barde Lindero Sur Oriente y Poniente en el centro de resguardo temporal e identificación Humana (CERTIDU) en el Municipio de Coahuila, Estado de Sinaloa.

- Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-3103-2023
 - Importe de Contrato: \$ 1'987,580.15 CIVA
 - Periodo de contrato Fecha Inicio 10 Abril 2023
Fecha de Termina: 24 Mayo 2023
 - Contratista: Ing. Miguel Angel Carreles Villaseñor
 - Supervisor S.O.P Ing. Alejandro Sainz Sanchez
- Con esta fecha se hace la visita de obra con el contratista, para analizar los trabajos a ejecutar, teniendo el terreno listo para empezar los trabajos, este supervisor hace entrega del terreno para dar inicio a los trabajos.




Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P



Ing. Miguel Angel Carreles Villaseñor
Contratista.

NOTA #2 En supervisión de obra se muestran el siguiente avance.

- Se hace el trazo, real de como quedaría la cerca de rejacero, recortando la parte de la fachada posterior ya que existe un dren muy pegado a existamos los señalamientos por la lluvia.

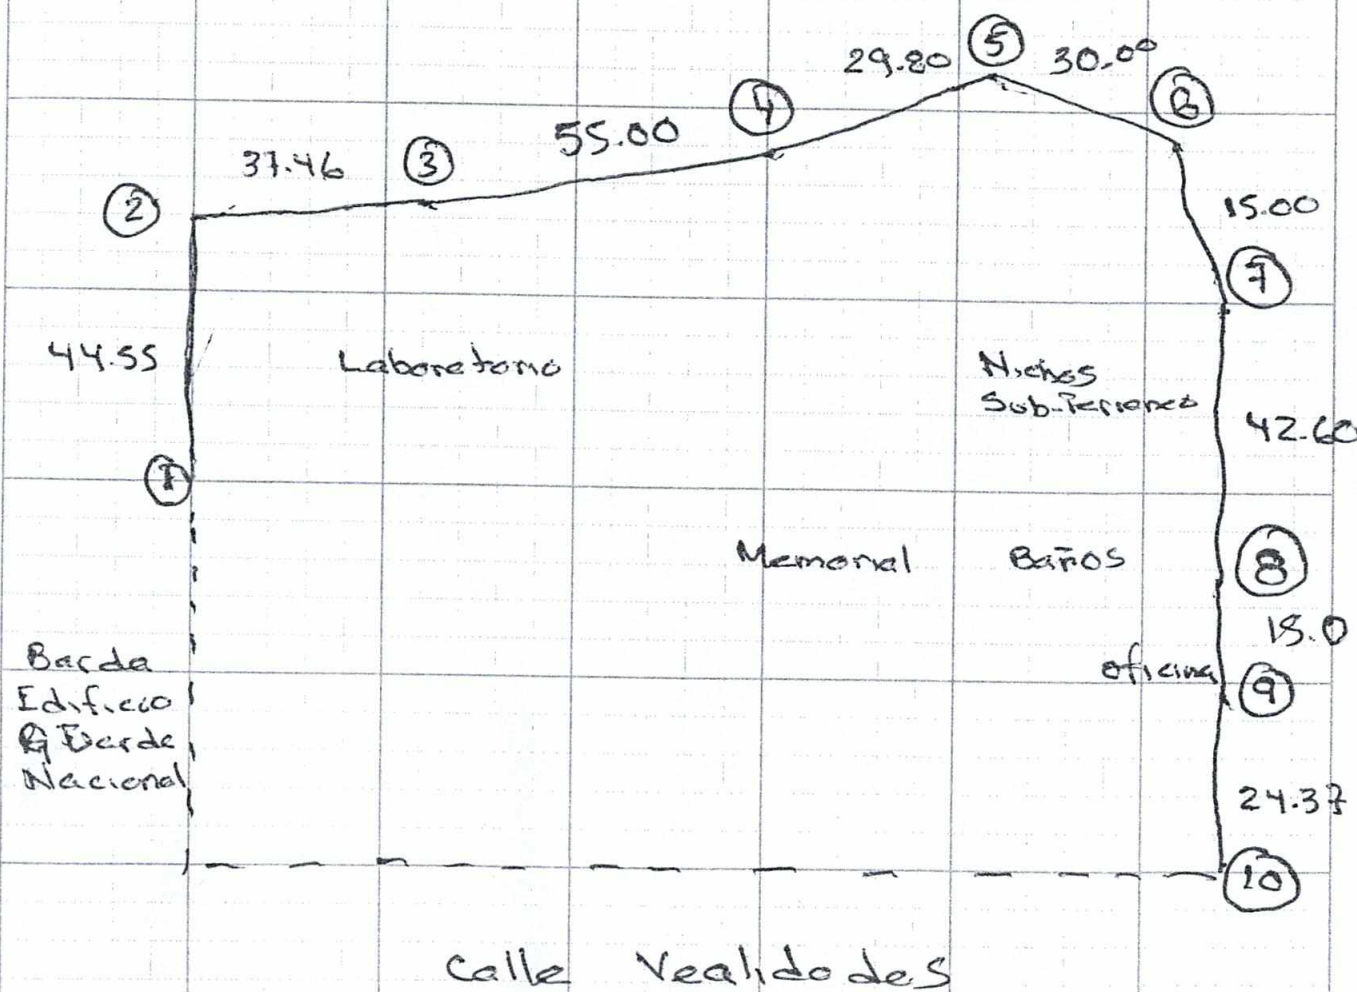


Ing. Alejandro Saenz Sanchez

Ing. Miguel Angel Corrales V.

NOTA #3 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se desmoran los trabajos de excavación y colocación de postes, se le desplanta por metro.

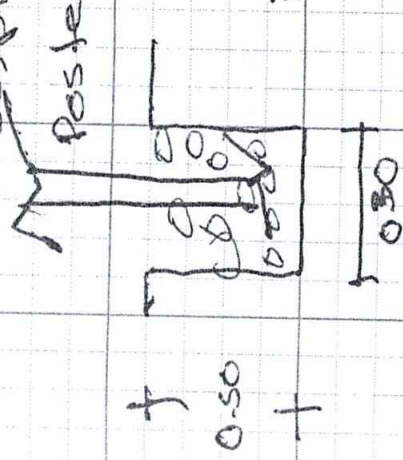

Excavación Promedio

- Se terminan los trabajos de excavación y colocación de cimentación para anclar postes para la rejilla de acero.
- Se continúan los trabajos de acero de acero de acero, producido de excavación y medidas existentes en terreno.

[Firma]

Ing. Alejandro Sandoz Sanchez

[Firma]

Ing. Miguel Angel Cordero Villalobos

NOTA # 4 En supervision de obra se muestra el siguiente avance

- Se continuan los trabajos de colocacion de poste.
- Se inician los trabajos de colocacion de rejecero.
- Se hace entrega de la estimacion uno para su pago, cobrandose los siguientes partidas.

- Rejecero Perimetral 2.65m de altura

- Preliminares	- - -	\$ 36,986.49	\$ 43,410.70
- Herreria	- - -	\$ 1,129,078.80	\$ 1,126,141.00
- Limpieza y fumigacion		\$ 10,167.73	\$ 7,229.93

S/IVA \$ 1,176,781.63
1,176,233.02

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP.

Ing. Miguel Angel Corrales V.
Contratista.

NOTA #5 Con este fecha se finalizan los trabajos de construcción de Borde Imburo sur, este y Poniente en el certidón, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se entrega la estimación número dos Adicional Piquito cobrando los siguientes Partidas

- Rejercero Perimetral

- Preliminares


- S/MA \$106,163.66
\$105,815.00

- Quedando en saldo de \$ 0.00 pesos.

- A



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Miguel Angel Cordero Y.

A la fecha de anterior se declara cerrado este bitácora

