



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE
OBRA: AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA,
ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

IMPORTE CONTRATO: \$8,300,683.94

CON I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$2,905,239.38

ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)

PERIODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

HOJA: 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	DEDUCCION DEL 3.0%				AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 16 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	\$ 1,862,310.74	\$ 48,163.21				\$ 651,808.76	\$ 699,971.97	\$ 1,162,338.77
ESTIMACION 2 (DOS)	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.	\$ 2,340,860.26	\$ 60,539.49				\$ 819,301.09	\$ 879,840.58	\$ 1,461,019.68
TOTALES		\$ 4,203,171.00	\$ 60,539.49				\$ 1,471,109.85	\$ 1,579,812.55	\$ 2,623,358.45
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 4,097,512.94	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO				\$ 1,434,129.53		

CONFORME:

ARQ. JESÚS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006 IMPORTE: \$7,155,762.01 MAS I.V.A. PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS) PERIODO EST: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025. FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

HOJA: 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TERRACERIAS

\$ 2,017,982.98

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 2,017,982.98

I.V.A. (16%): \$ 322,877.28

TOTAL DE ESTIMACION: \$ 2,340,860.26

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 819,301.09

DEDUCCION DEL 3.0% \$ 60,539.49

Suma de deducciones \$ 879,840.58

Neto a pagar de esta estimacion: \$ 1,461,019.68

(Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006	IMPORTE: \$7,155,762.01 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.
ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)	PERIODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL	FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

HOJA: 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. \$ 2,017,982.98

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 2,017,982.98
I.V.A. (16%): \$ 322,877.28
TOTAL DE ESTIMACION: \$ 2,340,860.26

DEDUCCIONES:
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 819,301.09
DEDUCCION DEL 3.0% \$ 60,539.49

Suma de deducciones \$ 879,840.58

Neto a pagar de esta estimacion: \$ 1,461,019.68

(Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006	IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)	PERIODO EST: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.	FECHA:	07 DE OCTUBRE DEL 2025.		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
1.-	TERRACERIAS								
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS DE TERRACERIA Y PAVIMENTACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS DIFERENTES CAPAS QUE COMPOENEN EL CUERPO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4,559.75	4,559.75			4,559.75	\$ 16.80	\$ 76,603.80
1.2	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL TIPO "B"	M3	2,600.74	2,600.74			2,600.74	\$ 66.36	\$ 172,585.11
1.4	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS EN EL 1er KM, DE MATERIAL AL QUE SE REFIERE EL CONCEPTO; 1.2, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,380.95	3,380.96			3,380.95	\$ 35.70	\$ 120,699.92
1.5	SOBRE ACARREO DE MATERIAL AL QUE SE REFIERE EL CONCEPTO 1.4 AL KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESCARGA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M³/KM	6,761.90	0.00			6,761.90	\$ 9.90	\$ 66,942.81
1.6	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90 % DE SU PVSM, INCLUYE; PRUEBAS DE COMPACTACION.	M2	3,460.40	3,460.40			3,460.40	\$ 23.91	\$ 82,738.16
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE 20 CMS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: ADQUISICION,CARGA Y ACARREO A 9 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	692.08	692.09			692.08	\$ 856.68	\$ 592,891.09
1.8	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: ADQUISICION,CARGA Y ACARREO A 9 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	692.08	692.09			692.08	\$ 856.68	\$ 592,891.09
1.9	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM1 A RAZON DE 1.5 LTS POR M2, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3,460.40	3,460.40			3,460.40	\$ 63.44	\$ 219,527.78
1.10	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA	M2	3,460.40	3,460.40			3,460.40	\$ 2.95	\$ 10,208.18
1.11	BARRIDO DE SUPERFICIE CON TRACTOR.	HAS.	0.35	0.35			0.35	\$ 2,524.46	\$ 883.56

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006	IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)	PERIODO EST: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.	FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2025.	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
1.12	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA.	M2	3,460.40	3,460.40			3,460.40	\$ HOJA: 2 DE 370	\$ 82,011.48
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES:								\$ 2,017,982.98
SUB TOTAL									\$ 2,017,982.98
IVA (16%)									\$ 322,877.28
Total:									\$ 2,340,860.26

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

CALCULÓ: C. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE

HOJA: 2 DE 3

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE 20 CMS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: ADQUISICION,CARGA Y ACARREO A 9 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M³	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			KM 0+000.00 AL 0+042.05		42.05	8.60	0.20			72.33		
			KM 0+042.05 AL 0+050.05		8.00	11.00	0.20			17.60		
			KM 0+050.05 AL 0+132.70		82.65	8.60	0.20			142.16		
			KM 0+132.70 AL 0+143.30		10.60	9.50	0.20			20.14		
			KM 0+143.30 AL 0+225.35		82.05	8.60	0.20			141.13		
			KM 0+225.35 AL 0+233.15		7.80	10.75	0.20			16.77		
			KM 0+233.15 AL 0+336.50		103.35	8.60	0.20			177.76		
			KM 0+336.50 AL 0+344.50		8.00	9.60	0.20			15.36		
			KM 0+344.50 AL 0+396.15		51.65	8.60	0.20			88.84		
										TOTAL	692.09	
1.8	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: ADQUISICION,CARGA Y ACARREO A 9 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M³	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			KM 0+000.00 AL 0+042.05		42.05	8.60	0.20			72.33		
			KM 0+042.05 AL 0+050.05		8.00	11.00	0.20			17.60		
			KM 0+050.05 AL 0+132.70		82.65	8.60	0.20			142.16		
			KM 0+132.70 AL 0+143.30		10.60	9.50	0.20			20.14		
			KM 0+143.30 AL 0+225.35		82.05	8.60	0.20			141.13		
			KM 0+225.35 AL 0+233.15		7.80	10.75	0.20			16.77		
			KM 0+233.15 AL 0+336.50		103.35	8.60	0.20			177.76		
			KM 0+336.50 AL 0+344.50		8.00	9.60	0.20			15.36		
			KM 0+344.50 AL 0+396.15		51.65	8.60	0.20			88.84		
										TOTAL	692.09	
1.9	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM1 A RAZON DE 1.5 LTS POR M2, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M²	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			KM 0+000.00 AL 0+042.05		42.05	8.60				361.63		
			KM 0+042.05 AL 0+050.05		8.00	11.00				88.00		
			KM 0+050.05 AL 0+132.70		82.65	8.60				710.79		
			KM 0+132.70 AL 0+143.30		10.60	9.50				100.70		
			KM 0+143.30 AL 0+225.35		82.05	8.60				705.63		
			KM 0+225.35 AL 0+233.15		7.80	10.75				83.85		
			KM 0+233.15 AL 0+336.50		103.35	8.60				888.81		
			KM 0+336.50 AL 0+344.50		8.00	9.60				76.80		
			KM 0+344.50 AL 0+396.15		51.65	8.60				444.19		
										TOTAL	3,460.40	

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

CALCULÓ: C. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE



HOJA: 3 DE 3

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
1.10	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA	M²	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			KM 0+000.00 AL 0+042.05		42.05	8.60				361.63		
			KM 0+042.05 AL 0+050.05		8.00	11.00				88.00		
			KM 0+050.05 AL 0+132.70		82.65	8.60				710.79		
			KM 0+132.70 AL 0+143.30		10.60	9.50				100.70		
			KM 0+143.30 AL 0+225.35		82.05	8.60				705.63		
			KM 0+225.35 AL 0+233.15		7.80	10.75				83.85		
			KM 0+233.15 AL 0+336.50		103.35	8.60				888.81		
			KM 0+336.50 AL 0+344.50		8.00	9.60				76.80		
			KM 0+344.50 AL 0+396.15		51.65	8.60				444.19		
										TOTAL	3,460.40	
1.11	BARRIDO DE SUPERFICIE CON TRACTOR.	HAS.	AV. ARROYO STA. MAGDAL							0.35		
										TOTAL	0.35	
1.12	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA.	M²	AV. ARROYO STA. MAGDAL						3,460.40	3,460.40		
										TOTAL	3,460.40	

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006


IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

REPORTE FOTOGRAFICO

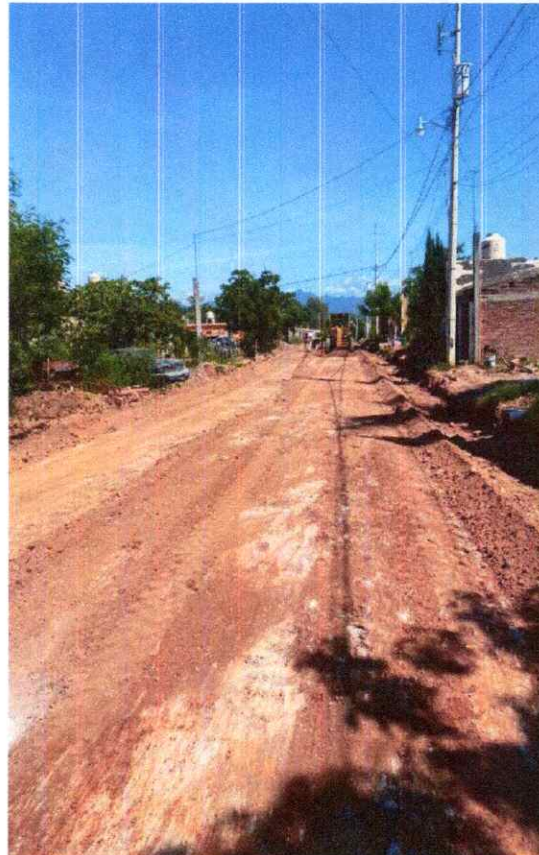

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA


ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO

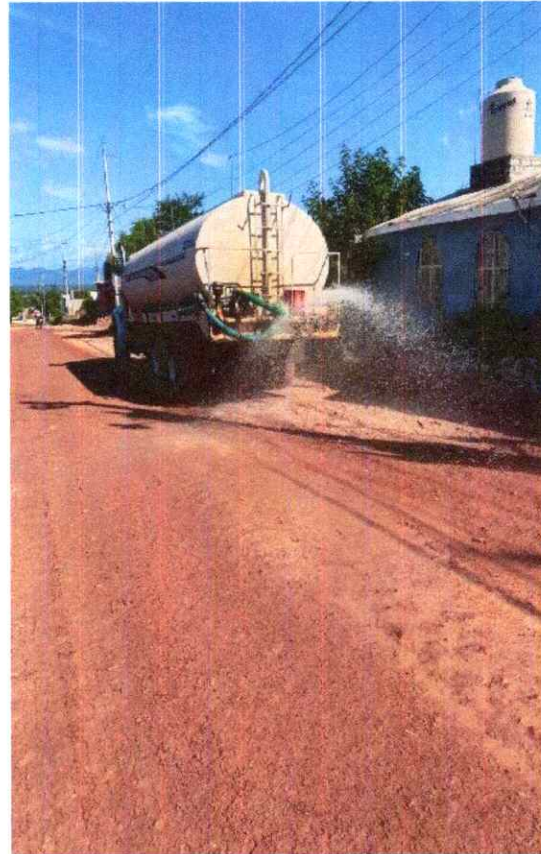

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA



ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO

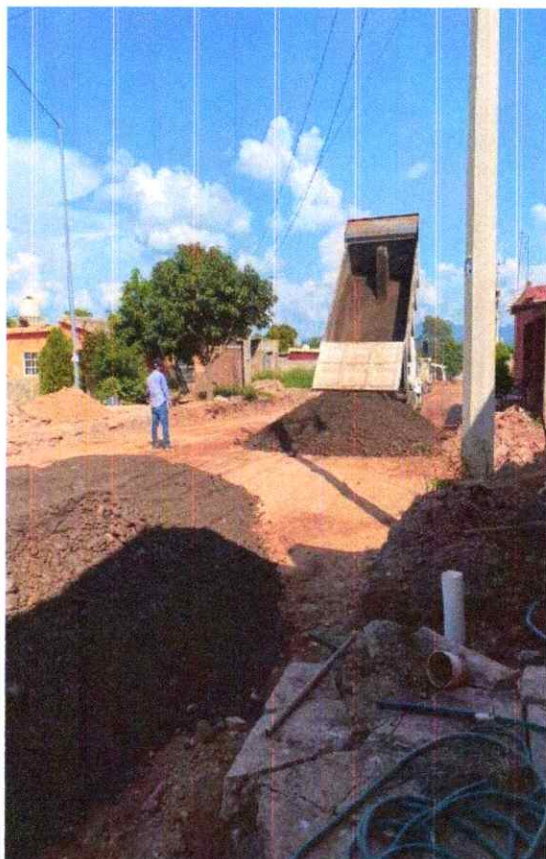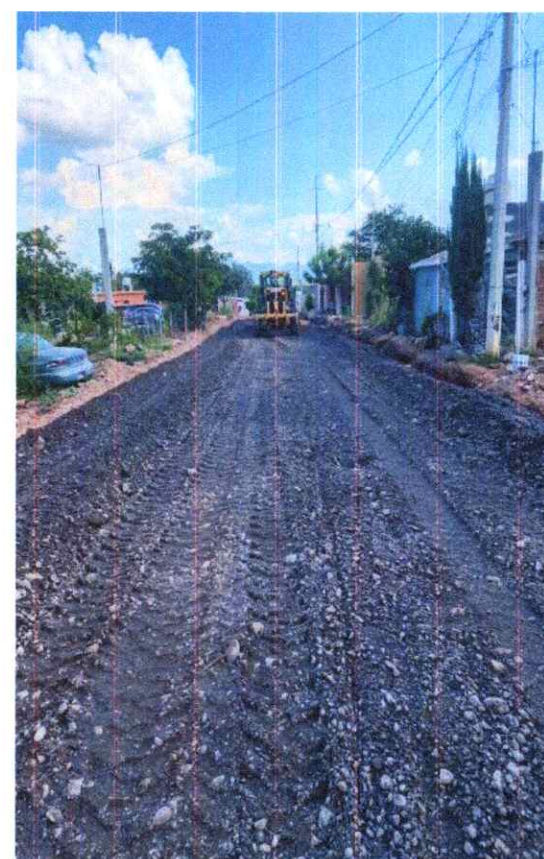

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA


ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO

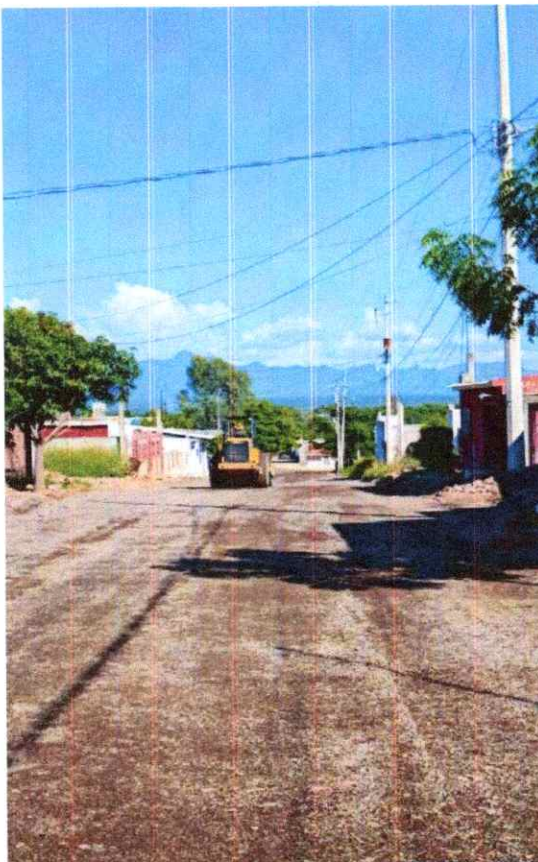

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)

FECHA: 07 DE OCTUBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

- LÍNEA DE PROYECTO
- CERCO
- CAJA DE CORTE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 2
TERRACERIAS

