



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE
OBRA: AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA,
ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

IMPORTE CONTRATO: \$8,300,683.94 CON I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$2,905,239.38

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)

PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

HOJA: 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	DEDUCCION DEL 3.0%				AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 16 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	\$ 1,862,310.74	\$ 48,163.21				\$ 651,808.76	\$ 699,971.97	\$ 1,162,338.77
ESTIMACION 2 (DOS)	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.	\$ 2,340,860.26	\$ 60,539.49				\$ 819,301.09	\$ 879,840.58	\$ 1,461,019.68
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$ 4,049,152.10	\$ 104,719.45				\$ 1,417,203.24	\$ 1,521,922.69	\$ 2,527,229.41
TOTALES		\$ 8,252,323.10	\$ 213,422.15				\$ 2,888,313.09	\$ 3,101,735.24	\$ 5,150,587.86
SALDO DEL CONTRATO:		\$48,360.84		SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO		\$	16,926.29		

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006	IMPORTE: \$7,155,762.01 MAS I.V.A.	
PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.		HOJA: 1 DE 1
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)	PERIODO EST: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL	
FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TERRACERIAS	\$ 2,652,115.56
GUARNICION, BANQUETAS Y PAVIMENTOS	\$ 68,144.04
SEÑALIZACION	\$ 119,862.82
VARIOS	\$ 650,525.94
ALUMBRADO PUBLICO	

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 3,490,648.36
I.V.A. (16%): \$ 558,503.74
TOTAL DE ESTIMACION: \$ 4,049,152.10

DEDUCCIONES:
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 1,417,203.24
DEDUCCION DEL 3.0% \$ 104,719.45
Suma de deducciones \$ 1,521,922.69

Neto a pagar de esta estimacion: \$ 2,527,229.41

(Son: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 41/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006	IMPORTE: \$7,155,762.01 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)	PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL	FECHA:	08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
				HOJA: 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. \$ 3,490,648.36

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 3,490,648.36
I.V.A. (16%): \$ 558,503.74
TOTAL DE ESTIMACION: \$ 4,049,152.10

DEDUCCIONES:
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 1,417,203.24
DEDUCCION DEL 3.0% \$ 104,719.45

Suma de deducciones \$ 1,521,922.69

Neto a pagar de esta estimacion: \$ 2,527,229.41

(Son: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 41/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006 IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A. PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO) PERIODO EST: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025. FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
2.-	GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS								
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CM, ANCHO DE 15 CMS, RODAMIENTO DE 42 CMS Y BORDILLO DE 15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN RESPALDO (POLIN DE 12" X 12 MTS CAL. 12), CONTRA RESPALDO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12) Y ALTURA DE GUARNICION (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD POR 62 CMS DE ANCHO POR MEDIOS MANUALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	792.30	798.71		6.41	792.30	\$ 676.07	\$ 535,650.26
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS, VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,201.06	1,138.18		-62.88	1,138.18	\$ 603.40	\$ 686,777.81
2.3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	66.08	66.46		0.38	66.08	\$ 1,052.94	\$ 69,578.28
2.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTOS A BASE DE ASFALTEX 505, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	50.40	192.96		142.56	50.40	\$ 48.94	\$ 2,466.58
2.6	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ADQUISICION Y PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO A 28 KMS, TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	174.54	176.17		1.63	174.54	\$ 7,756.56	\$ 1,353,829.98
2.7	DENTELLON DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 15 X 45 CMS.	ML	6.76	6.26		-0.50	6.26	\$ 609.75	\$ 3,812.65
	TOTAL DE GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS:								\$ 2,652,115.56

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ UBIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.									
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006			IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.		PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.				
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINQUITO)			PERIODO EST: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
3.-	SEÑALIZACION								
3.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	792.30	732.90		-59.40	732.90	\$ 58.17	\$ 42,632.79
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA METALICA DE 20X20 CMS PARA TOPE VEHICULAR DE 40 CMS DE SECCION; INCLUYE: BOYA METALICA DE 20x20 CMS, JUEGO DE CUATRO CLAVOS DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	102.00	102.00		0.00	102.00	\$ 201.16	\$ 20,518.32
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE HASTA 24" ø CON POSTE DE HASTA 3 MTS. Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 4,992.93	\$ 4,992.93
	TOTAL DE SEÑALIZACION:								\$ 68,144.04
4.-	VARIOS								
4.1	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	M3	88.00	88.00		0.00	87.99	\$ 49.69	\$ 4,372.22
4.2	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	4,559.75	4,559.75		0.00	4,559.73	\$ 16.42	\$ 74,870.77
4.3	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 5,340.43	\$ 5,340.43
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 3,977.06	\$ 3,977.06
4.5	RETIRO DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO AL 1ER KILOMETRO.	M2	215.67	215.67		0.00	215.67	\$ 145.14	\$ 31,302.34
	TOTAL DE VARIOS:								\$ 119,862.82
11.-	ALUMBRADO PUBLICO								
11.1	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	385.00	422.00		37.00	385.00	\$ 57.04	\$ 21,960.40
11.2	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	385.00	422.00		37.00	385.00	\$ 124.87	\$ 48,074.95
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	10.00	10.00		0.00	10.00	\$ 675.22	\$ 6,752.20

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.									
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006			IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.		PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.				
ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)			PERIODO EST: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.		FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
11.4	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	HOJA: 3 DE 3 \$ 1,406.94	\$ 1,406.94
11.5	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	19.00	19.00		0.00	19.00	\$ 2,078.23	\$ 39,486.37
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION CON CONTACTOR AUTOMATIZADO, RELEVADOR 5-0 HRS, INCLUYE: MURETE PREFABRICADO, MEDICION, TUBERIA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 21,676.53	\$ 21,676.53
11.8	PAGOS DE VERIFICACION, SUPERVISION, ENERGIZACION Y TODOS LOS CORRESPONDIENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	1.00		0.00	1.00	\$ 41,244.21	\$ 41,244.21
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN LUMINARIO CREE DE LED 80WATTS EN POSTE CFE CÓNICO OCTAGONAL 8 MTS, INCLUYE: LAMPARA, POSTE, BRAZO METALICO, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	19.00	19.00		0.00	19.00	\$ 24,732.86	\$ 469,924.34
TOTAL DE LUMINARIA:									\$ 650,525.94
SUB TOTAL									\$ 3,490,648.36
IVA (16%)									\$ 558,503.74
Total:									\$ 4,049,152.10

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE
OBRA: AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA,
ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CALCULÓ: C. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE



HOJA: 3 DE 8

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO,SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		ENTRE RIO PIAXTLA Y RIO FUERTE									
			LADO IZQ		9.70	1.35				13.10		
					37.72	1.52				57.33		
					0.88	1.35				1.19		
					29.46	1.05				30.93		
					2.73	1.06				2.89		
					0.94	1.34				1.26		
					0.60	0.65			3.00	-1.17		
				DIAM	0.13			3.14	2.00	0.11		
				DIAM	0.28			3.14	1.00	0.25		
			LADO DER		1.43	1.58				2.26		
					6.30	1.93				12.16		
					9.14	1.50				13.71		
					1.40	1.05				1.47		
					8.30	1.76				14.61		
					14.58	1.15				16.77		
					10.10	2.08				21.01		
					9.45	1.57				14.84		
					18.30	1.47				26.90		
					3.05	1.29				3.93		
					0.80	0.54				0.43		
					1.00	1.00				1.00		
			ENTRE RIO FUERTE Y RIO SINALOA									
			LADO IZQ		11.00	1.83				20.13		
					3.60	2.55				9.18		
					8.10	2.16				17.50		
					5.57	1.98				11.03		
					71.18	1.83				130.26		
					0.95	0.95				-0.90		
					0.80	0.90				-0.72		
			LADO DER		11.20	2.27				25.42		
					1.10	2.01				2.21		
					1.25	1.22				1.53		

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA: 8 DE 8

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES	
										PARCIAL	TOTAL		
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	AV. ARROYO STA. MAGDALENA										
					10.00						10.00		
											TOTAL	10.00	
11.4	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA.	AV. ARROYO STA. MAGDALENA										
							1.00				1.00		
											TOTAL	1.00	
11.5	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	AV. ARROYO STA. MAGDALENA										
								19.00			19.00		
											TOTAL	19.00	

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA


ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO

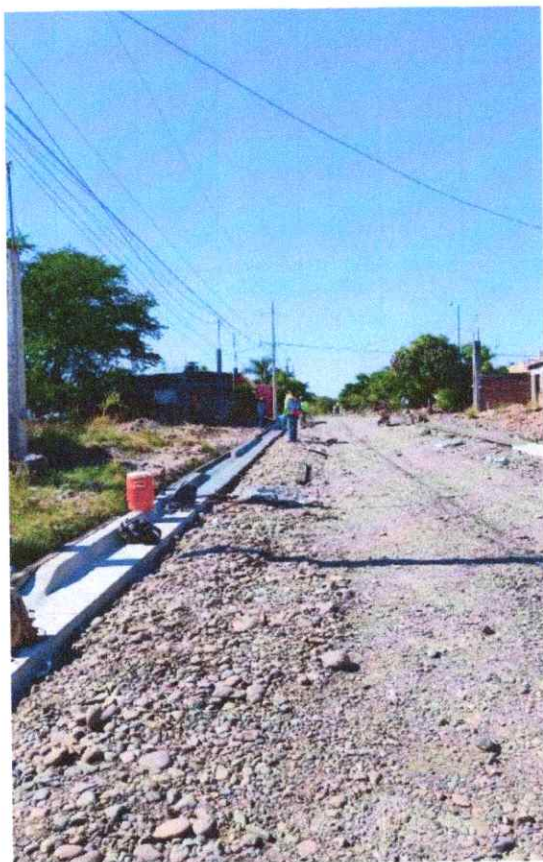

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA



ESTIMACIÓN No.: 3 (FINIQUITO)

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO

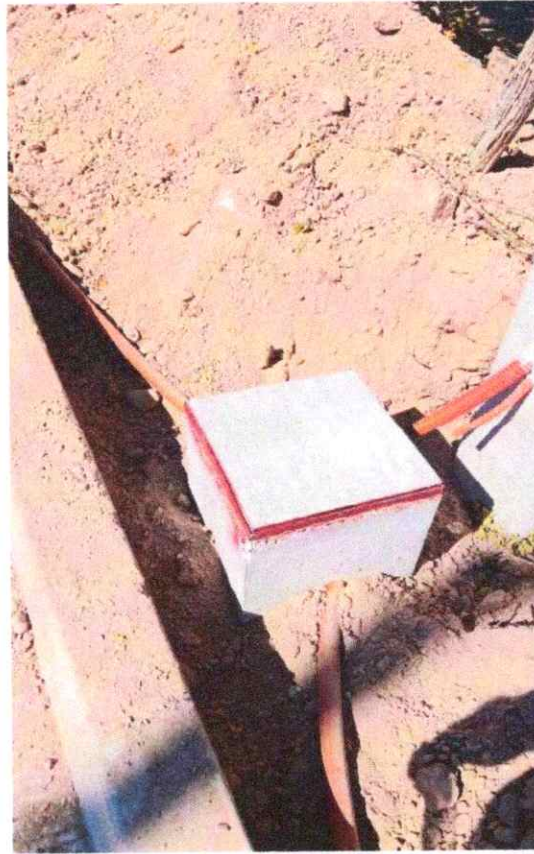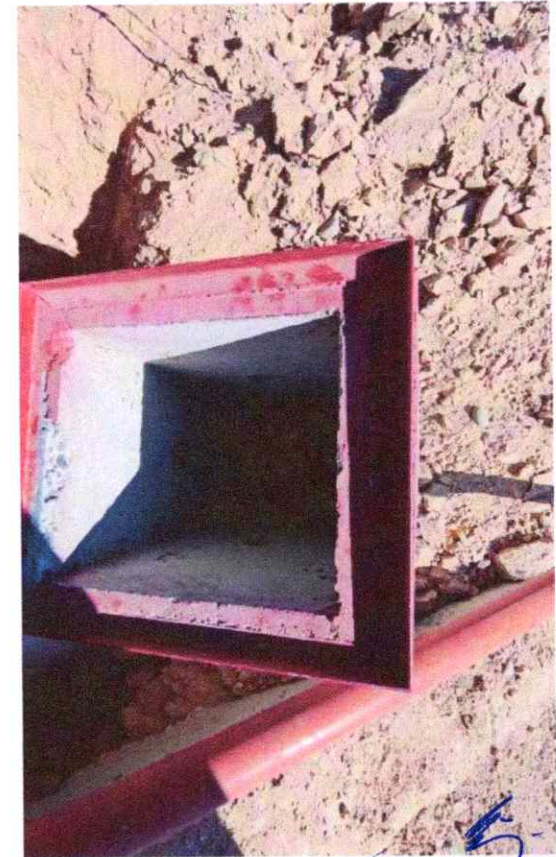

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3 PAVIMENTO

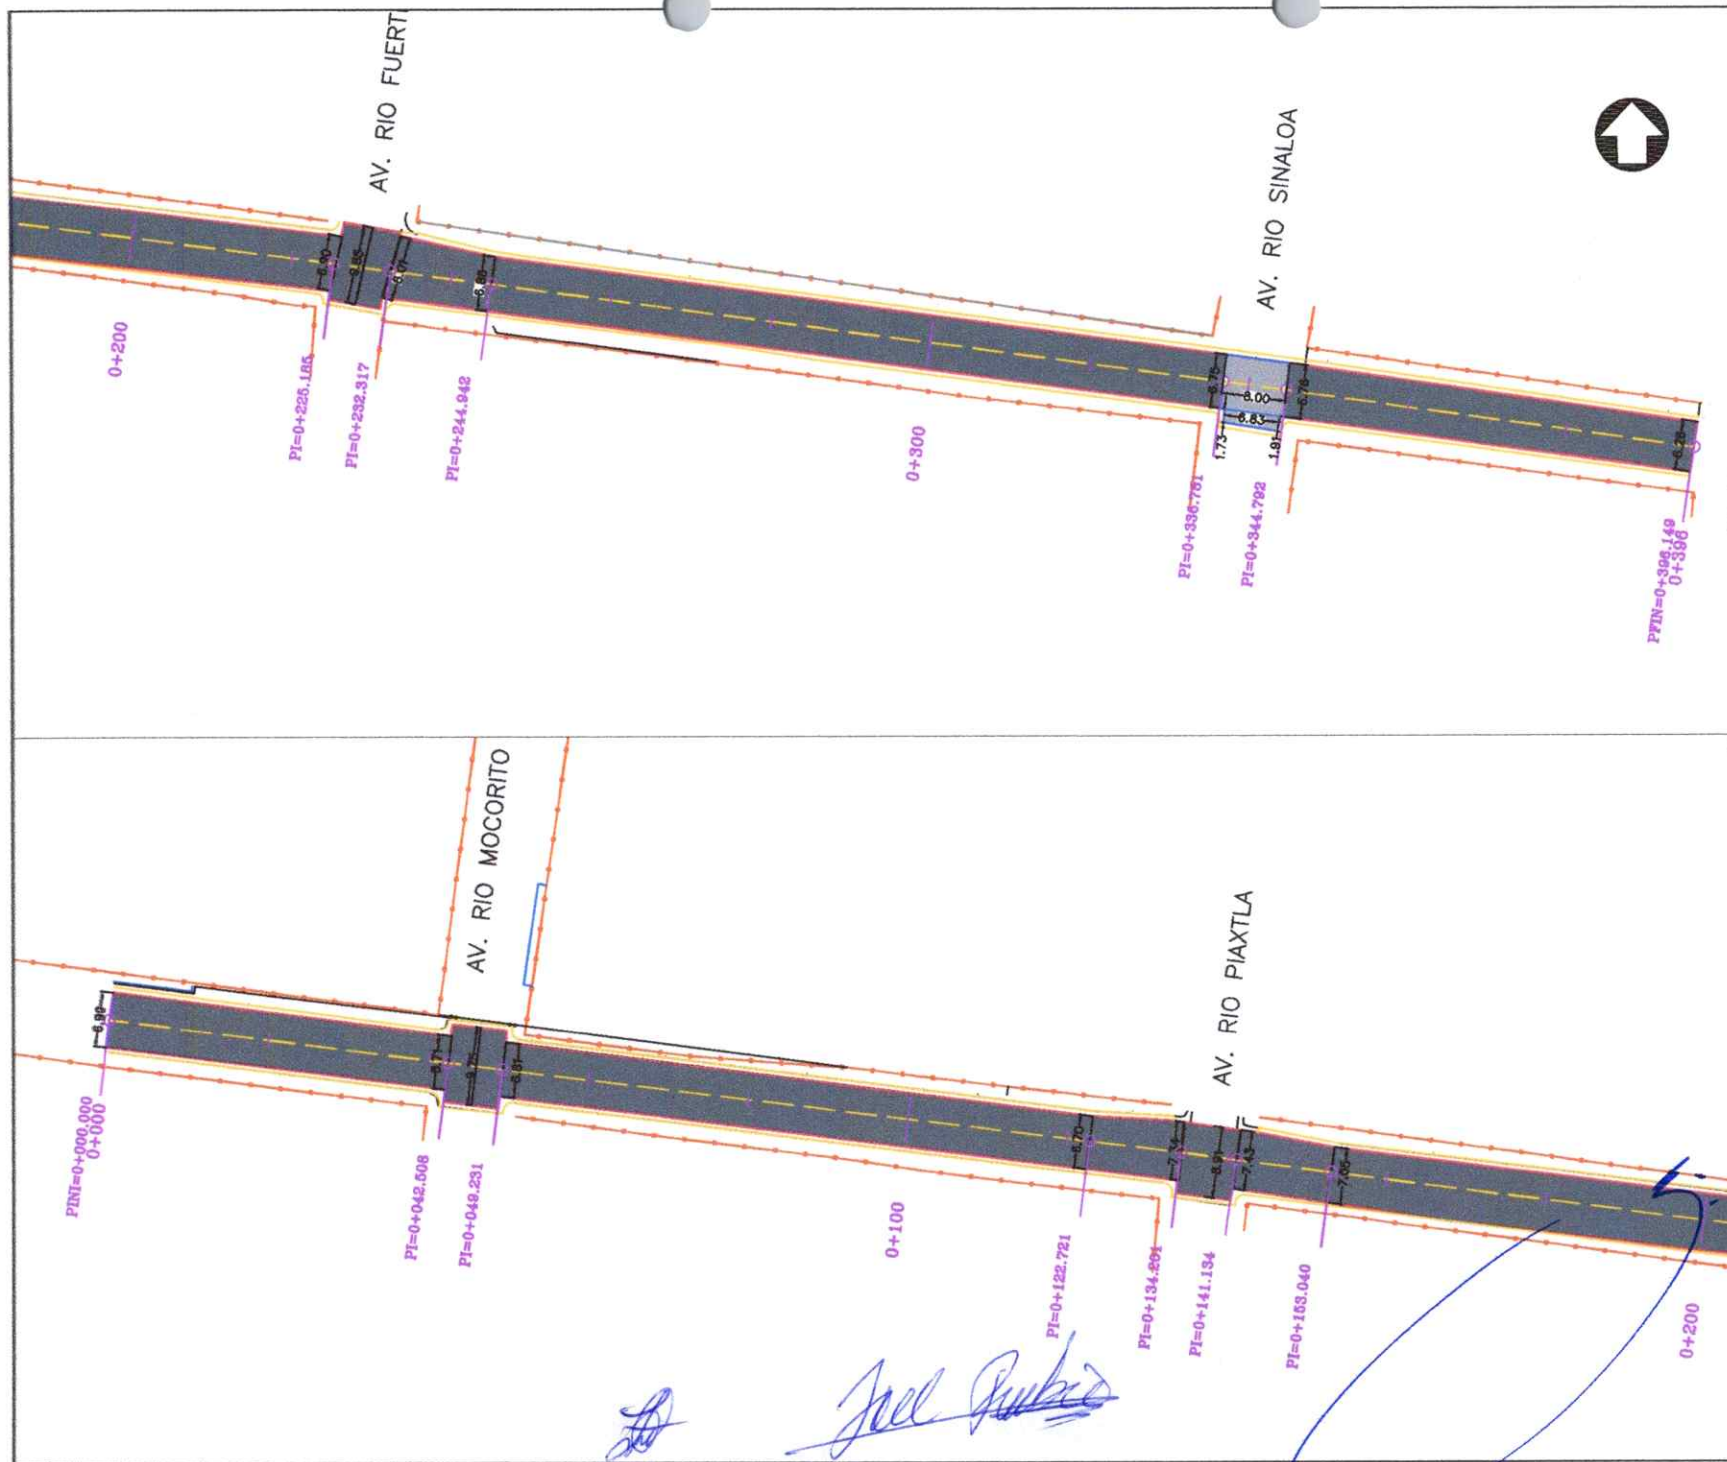



LOCALIZACION

SIMBOLOGIA


- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 200KG/CM2
- CABLE XLP 2+1
- LUMINARIA
- MURETE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO
ASFALTICO EN CALLE ARROYO
SANTA MAGDALENA ENTRE
AVENIDA RIO QUELITE Y
AVENIDA RIO CULIACAN EN LA
LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA,
MUNICIPIO DE SINALOA,
ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3
LUMINARIA



LUMINARIA

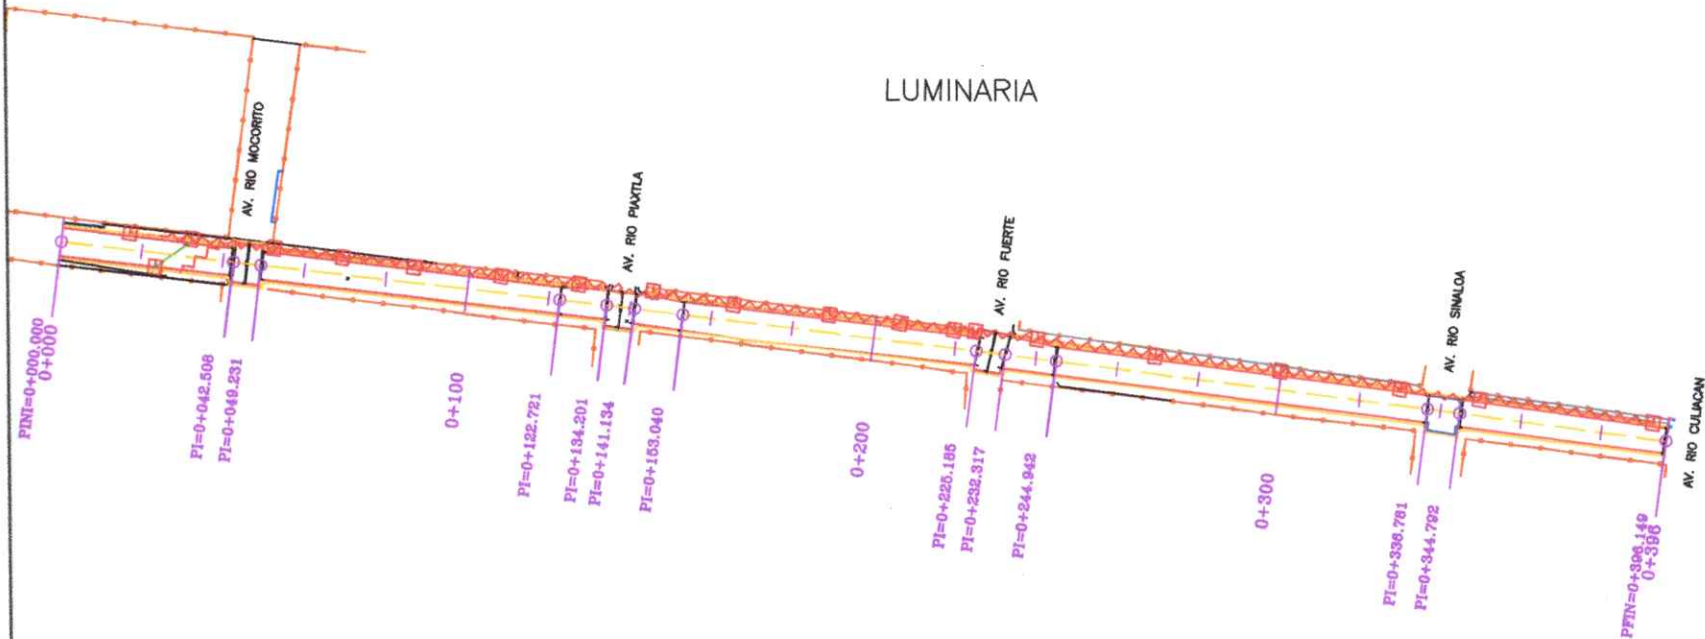

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3
BANQUETA





LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3
BANQUETA





LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION 3
GUARNICION

