



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE
OBRA: AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA,
ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

IMPORTE CONTRATO: \$8,300,683.94

CON I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO: \$2,905,239.38

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1

PERIODO: DEL 16 DE JULIO AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

HOJA: 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	DEDUCCION DEL 3.0%				AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 16 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	\$ 1,862,310.74	\$ 48,163.21				\$ 651,808.76	\$ 699,971.97	\$ 1,162,338.77
ESTIMACION 2 (DOS)	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025.	\$ 2,340,860.26	\$ 60,539.49				\$ 819,301.09	\$ 879,840.58	\$ 1,461,019.68
ESTIMACION 3 (FINIQUITO)	DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$ 4,049,152.10	\$ 104,719.45				\$ 1,417,203.24	\$ 1,521,922.69	\$ 2,527,229.41
ESTIMACIÓN ADICIONAL 1	DEL 16 DE JULIO AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	\$ 48,360.84	\$ 1,250.71				\$ 16,926.29	\$ 18,177.00	\$ 30,183.84
TOTALES		\$ 8,300,683.94	\$ 214,672.86				\$ 2,905,239.38	\$ 3,119,912.24	\$ 5,180,771.70
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00		SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO			\$0.00		

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE OBRA: AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006	IMPORTE: \$7,155,762.01 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1	PERIODO: DEL 16 DE JULIO AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	FECHA:	08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
				HOJA: 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

\$ 41,690.38

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 41,690.38

I.V.A. (16%): \$ 6,670.46

TOTAL DE ESTIMACION: \$ 48,360.84

DEDUCCIONES:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 16,926.29

DEDUCCION DEL 3.0% \$ 1,250.71

Suma de deducciones \$ 18,177.00

Neto a pagar de esta estimacion: \$ 30,183.84

(Son: TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006	IMPORTE: \$7,155,762.01 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1	PERIODO EST: DEL 16 DE JULIO AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	FECHA:	08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	HOJA: 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

GUARNICION, BANQUETAS Y PAVIMENTOS	\$ 22,607.40
TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 7,901.64
DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 11,181.34

SUB-TOTAL DE OBRA: \$ 41,690.38
I.V.A. (16%): \$ 6,670.46
TOTAL DE ESTIMACION: \$ 48,360.84

DEDUCCIONES:
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35% \$ 16,926.29
DEDUCCION DEL 3.0% \$ 1,250.71
Suma de deducciones \$ 18,177.00

Neto a pagar de esta estimacion: \$ 30,183.84
(Son: TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.		FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.					
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006		IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.		PERIODO EST: DEL 16 DE JULIO AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.					
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
2.-	GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS								
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CM, ANCHO DE 15 CMS, RODAMIENTO DE 42 CMS Y BORDILLO DE 15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN RESPALDO (POLIN DE 12" X 12 MTS CAL. 12), CONTRA RESPALDO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12) Y ALTURA DE GUARNICION (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD POR 62 CMS DE ANCHO POR MEDIOS MANUALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	792.30	798.71	0.00	6.41	6.410	\$ 676.07	\$ 4,333.61
2.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTOS A BASE DE ASFALTEX 505, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	ML	50.40	192.96	0.00	142.56	115.051	\$ 48.94	\$ 5,630.60
2.6	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ADQUISICION Y PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO A 28 KMS, TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	174.54	176.17	0.00	1.63	1.630	\$ 7,756.56	\$ 12,643.19
	TOTAL DE GUARNICION , BANQUETAS Y PAVIMENTOS:								\$ 22,607.40
	SISTEMA DE AGUA PÓTABLE								
7.-	TOMAS DOMICILIARIAS								
7.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	324.00	330.00	324.00	6.00	6.000	\$ 199.74	\$ 1,198.44
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	324.00	330.00	324.00	6.00	6.000	\$ 53.18	\$ 319.08
7.3	TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BANQUETA 1/2", BOTA DE FoFo, TUBO GAL DE 1/2", 3 CODOS DE 90° DE 1/2" GALV, VÁLVULA LIMITADORA DE BRONCE DE 1/2", MEDIDOR DE 1/2", TEE DE 1/2" GALV, MANGUERA DE 4 MTS, LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" EN BRONCE, ADAPTADOR YUCATAN DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE BANCO	PZA	54.00	55.00	54.00	1.00	1.000	\$ 6,384.12	\$ 6,384.12
	TOTAL DE TOMAS DOMICILIARIAS:								\$ 7,901.64

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006	IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.	
ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1	PERIODO EST: DEL 16 DE JULIO AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P. U.	IMPORTE
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO								
10.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS								
10.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	270.00	275.00	270.00	5.00	5.000	\$ 597.56	\$ 2,987.80
10.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	270.00	275.00	270.00	5.00	5.000	\$ 256.35	\$ 1,281.75
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8°X6".	LOTE	54.00	55.00	54.00	1.00	1.000	\$ 1,994.64	\$ 1,994.64
10.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	LOTE	54.00	55.00	54.00	1.00	1.000	\$ 4,917.15	\$ 4,917.15
	TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS:								\$ 11,181.34
								SUB TOTAL	\$ 41,690.38
								IVA (16%)	\$ 6,670.46
								Total:	\$ 48,360.84

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CALCULÓ: C. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE

HOJA: 1 DE 3

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
2.-	GUARNICION, BANQUETAS Y PAVIMENTOS											
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CM, ANCHO DE 15 CMS, RODAMIENTO DE 42 CMS Y BORDILLO DE 15 CMS, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN RESPALDO (POLIN DE 12" X 12 MTS CAL. 12), CONTRA RESPALDO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12) Y ALTURA DE GUARNICION (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD POR 62 CMS DE ANCHO POR MEDIOS MANUALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	AV. ARROYO STA. MAGDALENA ENTRE RIO QUELITE Y RIO MOCORITO									
			LADO IZQ		42.40					42.40		
			CRUCE LADO IZQ		9.65					9.65		
			LADO DER		42.60					42.60		
			CRUCE LADO DER		9.85					9.85		
			ENTRE RIO MOCORITO Y RIO PIAXTLA									
			LADO IZQ		83.65					83.65		
										0.00		
			LADO DER		85.00					85.00		
			CRUCE LADO DER		9.93					9.93		
			ENTRE RIO PIAXTLA Y RIO FUERTE									
			LADO IZQ		82.30					82.30		
			CRUCE LADO IZQ		9.00					9.00		
			LADO DER		84.09					84.09		
			CRUCE LADO DER		9.08					9.08		
			ENTRE RIO FUERTE Y RIO SINALOA									
			LADO IZQ		103.74					103.74		
			CRUCE LADO IZQ		8.00					8.00		
			LADO DER		105.67					105.67		
			CRUCE LADO DER		10.45					10.45		
			ENTRE RIO SINALOA Y RIO CULIACAN									
			LADO IZQ		51.50					51.50		
			LADO DER		51.80					51.80		
										TOTAL	798.71	
2.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTOS A BASE DE ASFALTEX 505, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	ML	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			GUARNICION LADO IZQUIERDO 390.24/3.00=									
			(0.42+0.15+0.15)=			0.72			131.00	94.32		
			GUARNICION LADO DERECHO 408.47/3.00=									
			(0.42+0.15+0.15)=			0.72			137.00	98.64		
										TOTAL	192.96	

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.



CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CALCULÓ: C. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE

HOJA: 2 DE 3

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
2.6	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ADQUISICION Y PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA, CARGA Y ACARREO A 28 KMS, TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			KM 0+000.00 AL 0+042.50		42.50	6.86	0.05	1.30		18.95		(7.00+6.71)/2
			KM 0+042.50 AL 0+049.23		6.73	9.75	0.05	1.30		4.27		9.75
			KM 0+049.23 AL 0+122.72		73.49	6.76	0.05	1.30		32.29		(6.81+6.70)/2
			KM 0+122.72 AL 0+134.20		11.48	7.02	0.05	1.30		5.24		(7.34+6.70)/2
			KM 0+134.20 AL 0+141.15		6.95	8.91	0.05	1.30		4.03		8.91
			KM 0+141.15 AL 0+153.05		11.90	7.24	0.05	1.30		5.60		(7.43+7.05)/2
			KM 0+153.05 AL 0+225.18		72.13	6.98	0.05	1.30		32.73		(7.05+6.90)/2
			KM 0+225.18 AL 0+232.32		7.14	9.85	0.05	1.30		4.57		9.85
			KM 0+232.32 AL 0+244.95		12.63	7.43	0.05	1.30		6.10		(8.00+6.86)/2
			KM 0+244.95 AL 0+336.78		91.83	6.81	0.05	1.30		40.65		(6.86+6.76)/2
			KM 0+336.78 AL 0+344.78									
			KM 0+344.78 AL 0+396.15		51.37	6.51	0.05	1.30		21.74		(6.76+6.26)/2
										TOTAL	176.17	
7.-	TOMAS DOMICILIARIAS											
7.1	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			ENTRE RIO MOCORITO Y RIO		6.00			1.00		6.00		
										TOTAL	6.00	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	ML	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			ENTRE RIO MOCORITO Y RIO		6.00			1.00		6.00		
										TOTAL	6.00	
7.3	TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE BANQUETA 1/2", BOTA DE FOF, TUBO GAL DE 1/2", 3 CODOS DE 90° DE 1/2" GALV, VÁLVULA LIMITADORA DE BRONCE DE 1/2", MEDIDOR DE 1/2", TEE DE 1/2" GALV, MANGUERA DE 4 MTS, LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" EN BRONCE, ADAPTADOR YUCATAN DE 1/2", PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE BANCO	PZA	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			ENTRE RIO MOCORITO Y RIO					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
10.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS											
10.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			ENTRE RIO MOCORITO Y RIO		5.00			1.00		5.00		
			PIAXTLA									
										TOTAL	5.00	

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE JULIO AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CALCULÓ: C. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE



HOJA: 3 DE 3

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	TRAMO	EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	AREA	RESULTADO		OBSERVACIONES
										PARCIAL	TOTAL	
10.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			ENTRE RIO MOCORITO Y RIO PIAXTLA		5.00			1.00		5.00		
										TOTAL	5.00	
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8°X6".	LOTE	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			ENTRE RIO MOCORITO Y RIO PIAXTLA					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
10.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	LOTE	AV. ARROYO STA. MAGDALENA									
			ENTRE RIO MOCORITO Y RIO PIAXTLA					1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	

CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 16 DE JULIO AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-006

IMPORTE: \$ 7,155,762.01 MAS IVA

ESTIMACIÓN No.: ADICIONAL 1

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.

PERIODO: DEL 16 DE JULIO AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO



CONFORME:

ARQ. JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORME:

ING. JOEL ERNESTO RUBIO ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

EJE DE PROYECTO

CERCO

TUBERIA PVC DE 8"

REGISTROS SANITARIOS


RENIVELACION DE POZO

CONSTRUCCION DE POZO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
A BASE DE CONCRETO
ASFALTICO EN CALLE ARROYO
SANTA MAGDALENA ENTRE
AVENIDA RIO QUELITE Y
AVENIDA RIO CULIACAN EN LA
LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA,
MUNICIPIO DE SINALOA,
ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION
ADICIONAL 1

DRENAJE SANITARIO

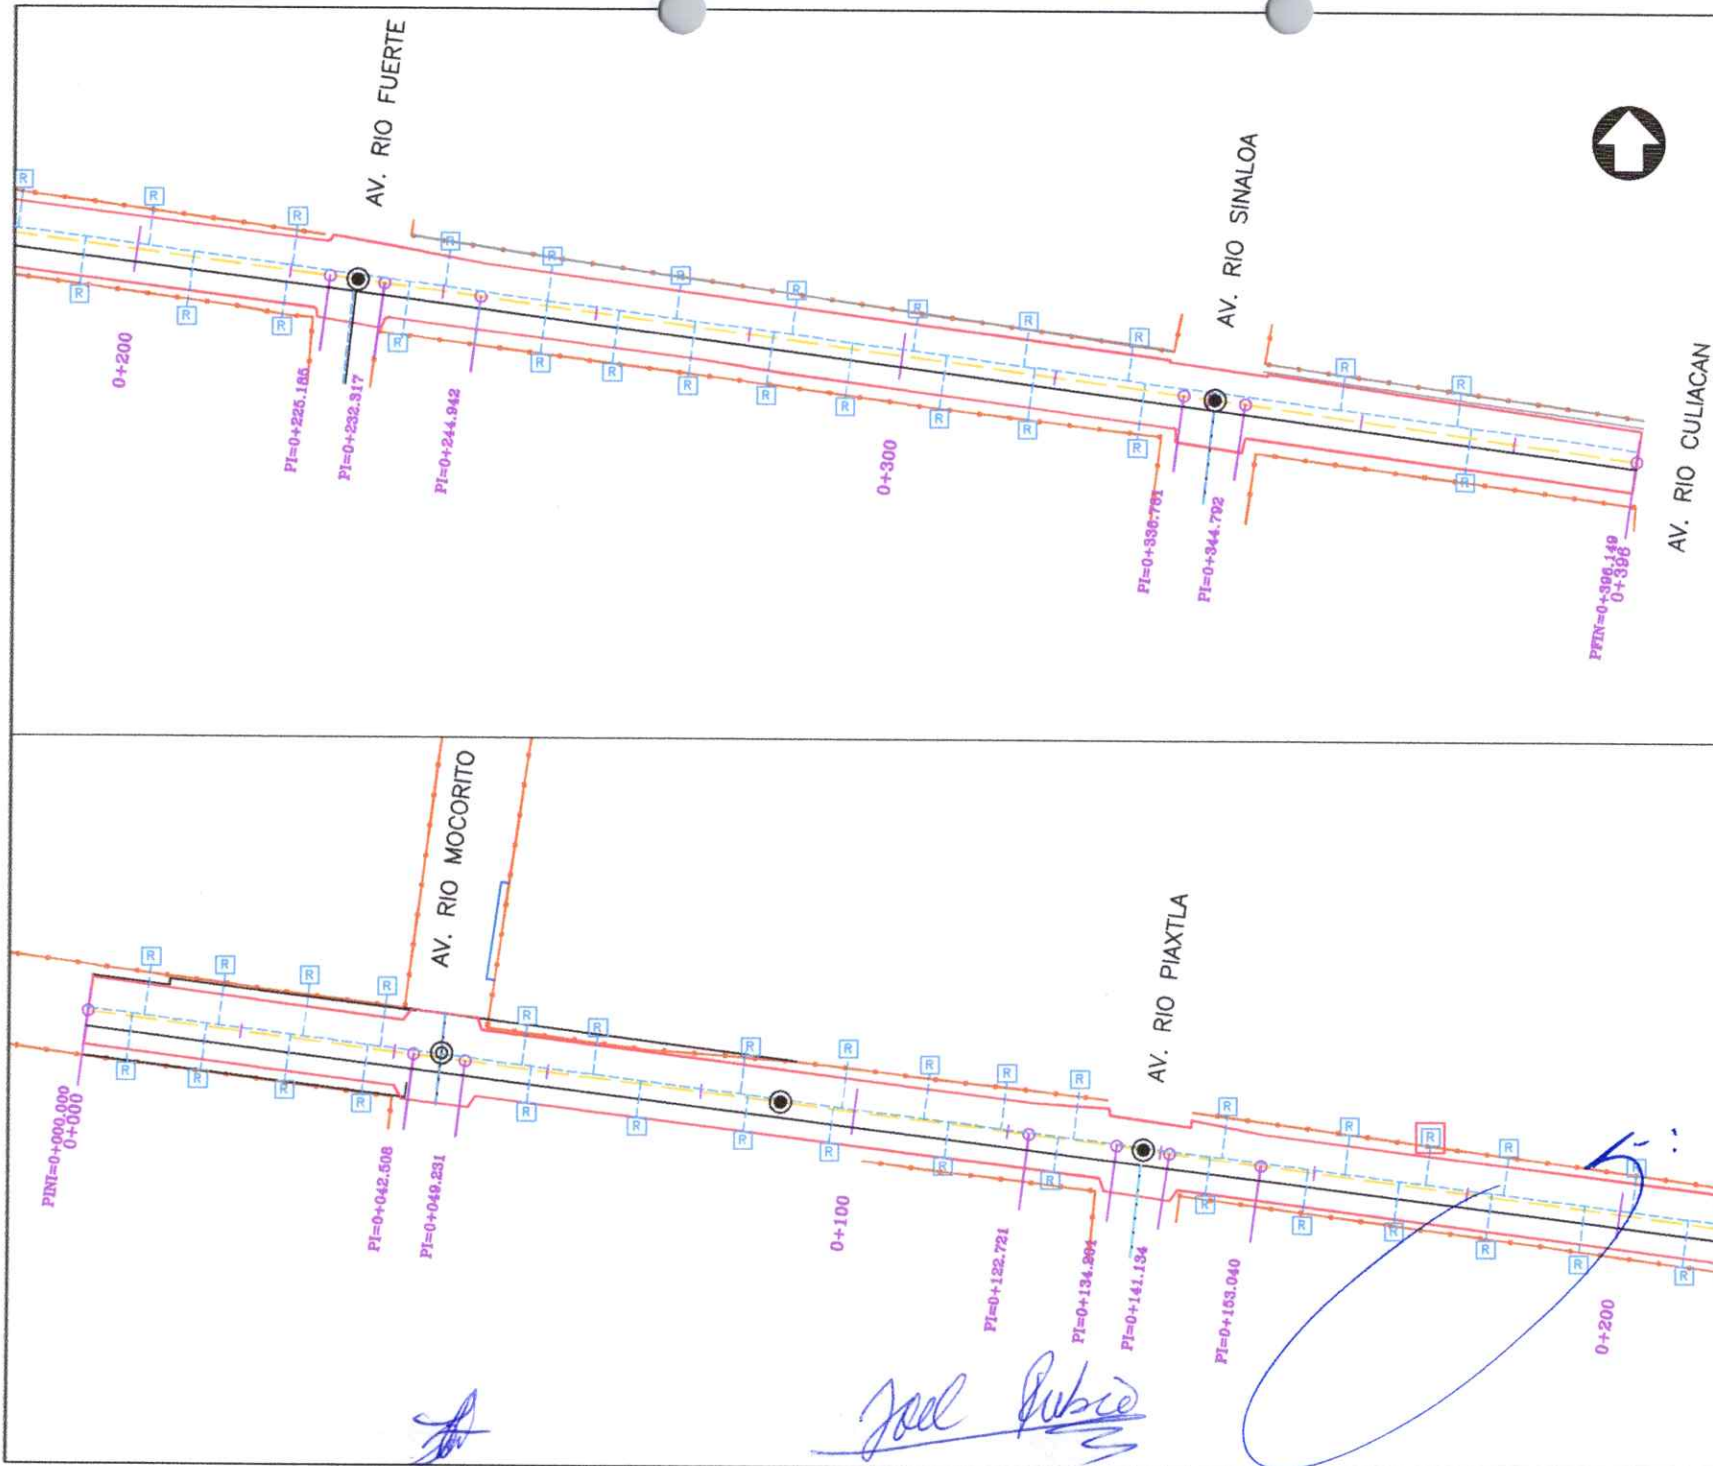



LOCALIZACION


SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- TUBERIA PVA DE 3"
- TOMAS DOMICILIARIAS
- REENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION ADICIONAL 1

AGUA POTABLE

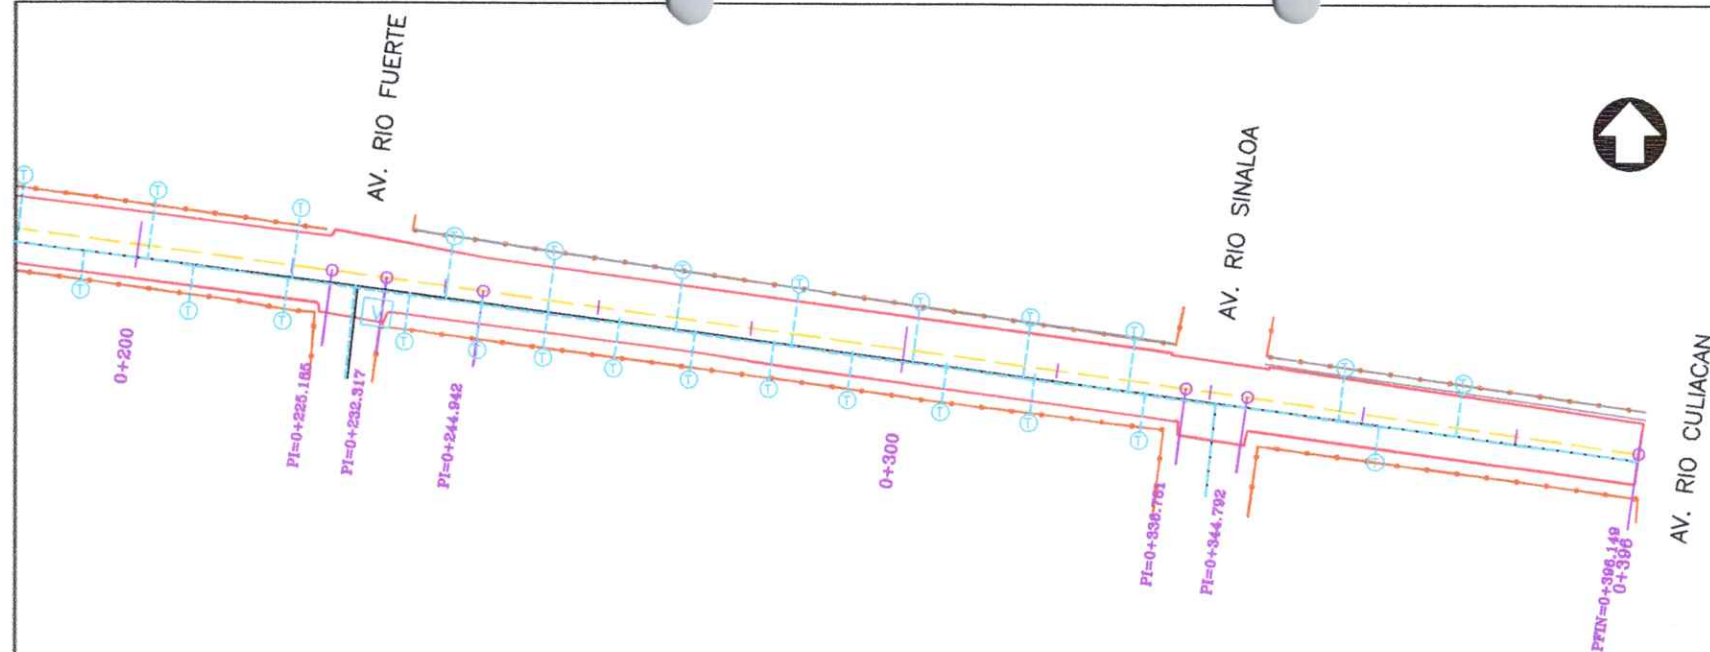



LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

- EJE DE PROYECTO
- CERCO
- AREA DE ASFALTO
- CONCRETO F'C 300KG/CM2
- CONCRETO F'C 200KG/CM2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA ENTRE AVENIDA RIO QUELITE Y AVENIDA RIO CULIACAN EN LA LOCALIDAD SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CROQUIS DE ESTIMACION ADICIONAL 1

GUARNICION

