

OPPU-EST-ADJ-FLSE-APDA-2810A-2022
FECHA: 07-NOV-2022

OBRA: AMPLIACION DE TUBERIA, DE DISTRIBUCION
PARA AGUA POTABLE EN ZONA NORTE DE
LA LOCALIDAD DE TAVOLTITA MUNICI-
PIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA

01°- SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD
PARA QUE CONTRATISTA EJECUTE LOS
TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

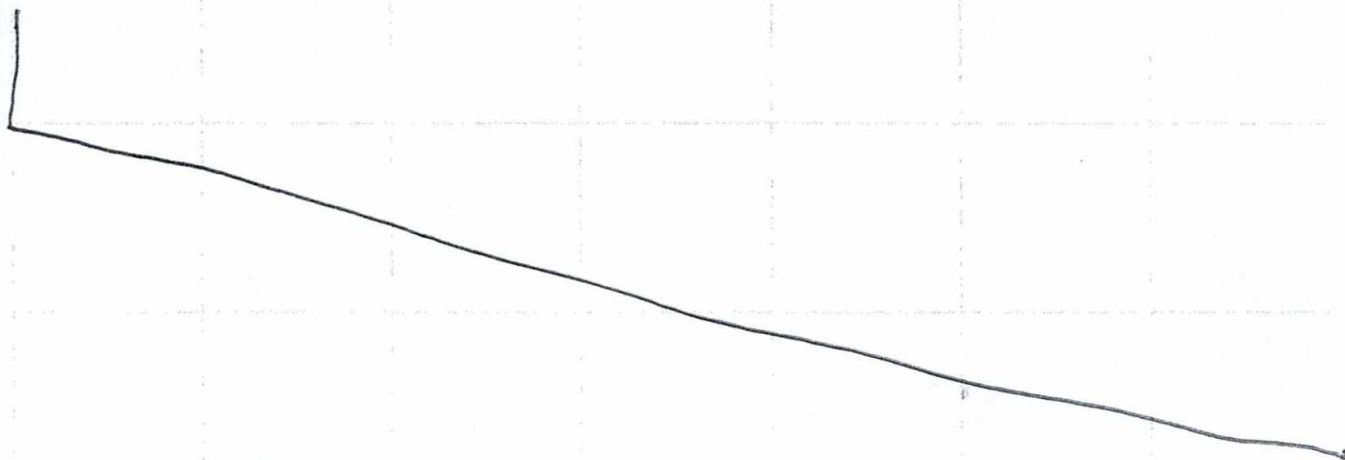
02°- INICIAN TRABAJOS CON TRAZO Y
NIVELACION CON EQUIPO.


03°- EXCAVACION EN ZANJAS PARA INTRO-
DUCIR LINEA PARA EL AGUA POTABLE.


FECHA: 15-NOV-2022

04°- SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC. HD
ANG. KD-32 DR 4".

05°- PLANTILLA COMPACTADA AL 90%




SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU-EST-APJ-ELSE-APDA-2810A-2022

FECHA: 18-NOV-2022

OBRA: AMPLIACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION
PARA AGUA POTABLE EN ZONA NORTE
DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA,
MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

06 - INSTALACION DE TUBERIA DE PVC.
PARA AGUA POTABLE DE 4".

07 - RELLENO ACOSTILLADO SOBRE LOMO DE
TUBO.

FECHA: 23-NOV-2022

08 - CONTINUAR CON INSTALACION DE
TUBO PVC. PARA AGUA POTABLE DE 3".


09 - RELLENO SOBRE LOMO DE TUBO
COMPACTADO.


FECHA: 29-NOV-2022

10 - REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS

FECHA: 07-12-2022

11 - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 01. NORMAL, PERIODO
DEL 07-11-2022 AL 07-12-2022.


SUPERVISOR SOPA


SUPERINTENDENTE

OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-2810A-2022
FECHA: 09-12-2022

OBRA: AMPLIACION DE TUBERIA, DE DISTRIBUCION
PARA AGUA POTABLE EN ZONA NORTE
DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA
MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.


12 - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL,
PERIODO DEL 07-11-2022 AL 07-12-2022.

FECHA: 14-12-2022

13 - RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 419,328.99
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO, PERIODO DEL
07-11-2022 AL 07-12-2022

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR. SOP.


SUPERINTENDENTE

OBRA: AMPLIACION DE TUBERIA, DE DISTRIBUCION
PARA AGUA POTABLE EN ZONA NORTE
DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO
DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

14 - INSTALACION DE TAPONES Y
REALIZACION DE PRUEVA DE LINEAS.

FECHA: 20-12-2022

15 - CONFORMADO DE CALLES CON
MOTOCONFORMADORA.


FECHA: 29-12-2022


16 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULO
DE OBRA DE 0.90 x 1.50 MTS. CON
BASTIDOR PTR DE 1 x 1 1/2" CAL. #1.

FECHA: 31-12-2022

17 - OBRA ESTA TERMINADA.

18 - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
02 FINIQUITO PERIODO DEL
08-12-2022 AL 31-12-2022


SUPERVISOR. Sop.


SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRA
OPPU-EST-ADJ-FLSE-APDA-2810A-2022
FECHA: 31-12-2022

OBRA: AMPLIACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION
PARA AGUA POTABLE EN ZONA NORTE
DE LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO
DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

19 - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION OZ FINIQUITO
PERIODO DEL 08-12-2022 AL 31-12-2022.

20 - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR
DE LA OBRA PARA EL PROXIMO, 06 DE
ENERO DEL 2023. PARA REALIZAR RECORRIDO
Y VERIFICAR TRABAJOS EJECUTADOS Y
SU BUENA CALIDAD Y SI ES EL CASO
ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 06-ENE-2023

21 - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y
SU CALIDAD, SE PROCEDE A LA ENTREGA
Y RECEPCION.


FECHA: 13-ENE-2023

22 - RECIBO ESTIMACION OZ FINIQUITO POR
UN IMPORTE DE: \$8,191.12 IVA INCLUIDO
MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL
CONTRATO PERIODO DEL 08-12-2022
AL 31-12-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

23 - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE
