



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/426/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION
01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 21 de Julio de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: DENISSE MACHADO OROZCO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-004/2025.
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$628,145.14 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL.
- **IMPORTE DE ESTIMACIÓN:** \$138,468.21 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)
- **IMPORTE A PAGAR REAL, (DISMINUCION POR EL IMPORTE RETENIDO DE RESICO):** \$136,914.27 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 27/100 M.N.)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** DENISSE MACHADO OROZCO.
- **R.F.C.:** MAOD870924MZ9
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE. CONST. HERIBERTO JARA N. 1961, COLONIA: LOC. LIBERTAD, C.P. 80180, CULIACÁN, SINALOA, CÓDIGO POSTAL: 80180.
- **No. DE FACTURA:** # B39C, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.C.P. ARCHIVO, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA**

21 JUL 2025
RECIBIDO

RFC emisor:MAOD870924MZ9

Nombre emisor: DENISSE MACHADO OROZCO

RFC receptor:MBA850101214

Nombre receptor: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Código postal del receptor: 80500

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B1507948-8F4B-4A87-B35B-82A255F84D80

No. de serie del CSD: 00001000000712949676

Código postal, fecha y hora de emisión: 80180 2025-07-18 21:27:32

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80111618		1	E48	Unidad de servicio	124,315.38	124,315.380000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	PAGO DE ESTIMACION: 01 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMUN-004/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 628145.14 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 191254.43 MAS I.V.A 16% \$30600.71 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 221855.14 AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$ 66933.05 MAS I.V.A.: \$10710.25 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: \$ 77.649.30 IMPORTE TOTAL A FACTURAR \$ 124315.38 MAS I.V.A \$ 19990.46 MONTO NETO A FACTURAR \$ 144205.84 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 5737.63 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 83386.93 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 138468.21				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	124,315.380000	Tasa	16.00%	19,890.460800
					ISR	Retención	124,315.380000	Tasa	1.25%	1,553.942250
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Impuestos retenidos ISR

Total

\$ 124,315.38

\$ 19,890.46

\$ 1,553.94

\$ 142,651.90

Sello digital del CFDI:

FNvQ0/iDQB0w7fjJVmqGUHcM1j8p+9rOpvTKgX5W80iw6+jD+HzqBXCD0YCGk6iOgsPN4Fzmuz1SU7G9lWFH8jAu5TepIj5Lnz/rmIcLPhkSAdSLszp8rjRAySqtBVnbA6qLdpdcsskXSASeysdrgURSN/rj1JMfwbx3v2AqSf+2GuVarnCLgggZYdQke1HMBinwfvrcMAxgCFF/u9UrFSQijp3JKOtXNfMrQ8BAMFNdP9BpfjgSvDmxxQGYyiHWD3jywwqIXJS6SaGrLTjCsRau6kpBPqt+ozZrB9CmoG7I8VCjFRGuENGPeX0xk3RBwG25zU+e7akoklyT9KFGA==

Sello digital del SAT:

YQU0081RtrGqjlkHp+o1862rM1AKPJ1x/Fhd0RF9+VKWdgOFcdBk784s5UQla6fTbmGKQp2AUrV4pHQ0ldeZ9bj8bc/8j5vLgoKMtGNy0YWyrt4adEbiUU1uH8N8MSWEP8cif31QaJMxOqgzRpkzuF7kdqifBtukWdPw38LYRFSxdgBIAcPGzaf88LZAhx2yBenfwwJWMMUJ4RIXH2+5E39WCqt3cQoIKGlsJU0PcnyCPjJVWlsWTO+HoJ4/VMeuUupmQZpPjBVHd8CF+NWVWHZ4/DE/qNS6epCEFFo8f6i6aKJ2uLKFINNTWJ3tGaBeDha5e555KVpS7VQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1507948-8F4B-4A87-B35B-82A255F84D80|2025-07-18T21:28:10|SAT970701NN3|FNvQ0/iDQB0w7fjJVmqGUHcM1j8p+9rOpvTKgX5W80iw6+jD+HzqBXCD0YCGk6iOgsPN4Fzmuz1SU7G9lWFH8jAu5TepIj5Lnz/rmIcLPhkSAdSLszp8rjRAySqtBVnbA6qLdpdcsskXSASeysdrgURSN/rj1JMfwbx3v2AqSf+2GuVarnCLgggZYdQke1HMBinwfvrcMAxgCFF/u9UrFSQijp3JKOtXNfMrQ8BAMFNdP9BpfjgSvDmxxQGYyiHWD3jywwqIXJS6SaGrLTjCsRau6kpBPqt+ozZrB9CmoG7I8VCjFRGuENGPeX0xk3RBwG25zU+e7akoklyT9KFGA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-07-18 21:28:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-07-18T21:27:32"
Sello="FNVq0/iDQ00w7fjJvMqGUHcM1j8p+9rOpvVTkgX5W80iW6+jD+lZqBXCDOYcgk6IOgsPN4FZmuz1SU7G9IWFH8jAuSTeplj5Lnz/rmIcLPhkSAdSLszjp8rjRAYSqtBvNbA6qLdpdcscKX5ASe
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000712949676"
Certificados="MIIGRjCCBC6GAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTI5NDk2NzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQ0Dx8QyBERUwgu0VSvK1DSU8gREUGjQUjR0gVFjJQjVU
SubTotal="124315.38" Moneda="MXN" Total="142651.90" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="80180">
<cfdi:Emisor Rfc="MAOD870924M29" Nombre="DENISSE MACHADO GROZCO" RegimenFiscal="626"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="80111618" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION: 01 NORMAL DE LA
OBRA REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
CONTRATO No.: MBGR-AD-FAISMUN-004/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 628145.14 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 191254.43 MAS I.V.A 16% $38600.77
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 221855.14 AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 66939.05 MAS I.V.A.: $10710.25 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 77.649.30
IMPORTE TOTAL A FACTURAR $ 124315.38 MAS I.V.A $ 19890.46 MONTO NETO A FACTURAR $ 144205.84 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y.C.): $ 5737.63 TOTAL DEDUCCIONES:
$ 83306.93 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 138468.21" ValorUnitario="124315.38" Importe="124315.380000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="124315.380000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="19890.460000"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="124315.380000" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="1553.942250"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19890.46" TotalImpuestosRetenidos="1553.94">
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="1553.94"/>
</cfdi:Retenciones>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="124315.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="19890.46"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="B1507948-8F4B-4A87-B35B-82A255F84D86"
FechaTimbrado="2025-07-18T21:28:10" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="FNVq0/iDQ00w7fjJvMqGUHcM1j8p+9rOpvVTkgX5W80iW6+jD+lZqBXCDOYcgk6IOgsPN4FZmuz1SU7G9IWFH8jAuSTeplj5Lnz/rmIcLPhkSAdSLszjp8rjRAYSqtBvNbA6qLdpdcsc
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="YQ00081RtrG0j1kHp+01862rM1AKPj1x/Fhd10R9F+YKWDgOfCdbk784s5UQIa6fTbmGKQp2AUrV4pHQ01deZ9bJ8bc/8j5vLgKMuGtNgy0WYrT4adEbiUu1uH8N8MSWEP8clf31Ja
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



CONSTRUCCIONES
MACHADO

Fecha: 17 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	DENISSE MACHADO OROZCO			ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL
DOMICILIO:	Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180			PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:			DEL	20-jun-25
6671-325077	6671633083			AL	14-jul-25
R.F.C.				FECHA DE CONTRATO:	
MAOD870924MZ9.				19-jun-25	
DEPENDENCIA:-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		
RINCON DE LOS MONTES		BADIRAGUATO	INICIO:	20-jun-25	
			TERMINACIÓN:	03-ago-24	
DESCRIPCIÓN:					
REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA					
CONTRATO No:					
MBGBR-AD-FAISMUN-004/2025					
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		
\$541,504.43	\$628,145.14	\$219,850.80	\$628,145.14		
			BUENO POR:	\$ 138,468.21	
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:					
\$ 138,468.21	(SON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)				
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		01 NORMAL			
DEDUCCIONES:					
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%		\$ 66,939.05	CALCULO DE ESTIMACIÓN		
MAS I.V.A.:		\$ 10,710.25	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA		\$ 191,254.43
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 77,649.30	MAS I.V.A 16 %		\$ 30,600.71
3 % SVIFYC:		\$ 5,737.63	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA		\$ 221,855.14
TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 83,386.93	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 83,386.93
			MONTO A FACTURAR CON IVA		\$ 144,205.84
			SALDO A PAGAR:		
			\$ 138,468.21		

ELABORO:

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.



**CONSTRUCCIONES
MACHADO**

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

DENISSE MACHADO OROZCO

REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, GUANAJUATO				Fecha:	Estimacion:
				17 de julio de 2025	01 NORMAL
Periodo de la estimación:	20/06/2025	14/07/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	20/06/2025	03/08/2024	RINCON DE LOS MONTES	MBGBR-AD-FAISMUN-004/2025	
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance	
\$ 628,145.14	\$ 541,504.43	\$ 219,850.80	\$ 189,526.55	35%	
				% Avance Total	
				35%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 191,254.43	ESTA ESTIMACION
\$ 77,649.30	16 % I.V.A (+) \$ 30,600.71	\$ 221,855.14
	Sub- Total A (=) \$ 221,855.14	
	Amortizacion Anticipo \$ 66,939.05	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 10,710.25	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ 77,649.30	\$ -
	Importe TOTAL \$ 124,315.38	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 19,890.46	TOTAL ACUMULADO.
\$ 77,649.30	Total (=) \$ 144,205.84	\$ 221,855.14
	3 % SVIFYC: \$ 5,737.63	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 83,386.93	CONTRATADO
\$ 219,850.80	Importe TOTAL \$ 138,468.21	\$ 628,145.14
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 138,468.21	SALDO
\$142,201.50	Son:	\$ 406,290.00
	(SON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.)	

ELABORO.-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ


ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIR. D. O. P. D. U. Y. E.

ELABORO.- 
C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.- 
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.- 
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y E



**CONSTRUCCIONES
MACHADO**

CONTRATISTA:		FECHA:	17 de julio de 2025
DENISSE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DOMICILIO:	Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán,		
R.F.C.	MAOD870924MZ9.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	RINCON DE LOS MONTES	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$	541,504.43		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$	219,850.80		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$	628,145.14		

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 3,004.04
2	CIMENTACIÓN	\$ 44,284.58
3	ESTRUCTURA	\$ 109,383.04
4	ALBAÑILERIA	\$ 34,582.77
5	ACABADOS	\$ -
6	INSTALACIONES BASICAS	\$ -
7	TRABAJOS FINALES	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 191,254.43

SUB TOTAL=	\$ 191,254.43
I.V.A AL 16 %	\$ 30,600.71
TOTAL =	\$ 221,855.14

ELABORO

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.

DESGLASE



CONTRATISTA:		DENISSE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		FECHA:		17/07/2025	
DOMICILIO:		Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa. Código Postal: 80180		R.F.C.		MAOD870924M29.		1 de 1			
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION											
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		RINCON DE LOS MONTES		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL			
IMPORTO DE OBRA SIN IVA:		\$541,504.43		IMPORTO DE ANTICIPO DE OBRA:		\$219,850.80		IMPORTO TOTAL DE CONTRATO:		\$638,145.14	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTO	
1 PRELIMINARES											
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO	M2	154.91	\$ 17.62	\$ 2,729.51	154.91	0.00	0.00	154.91	\$ 2,729.51	
GP1077	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE:	M3	0.32	\$ 642.13	\$ 205.48	0.32	0.00	0.00	0.32	\$ 205.48	
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3	0.32	\$ 215.79	\$ 69.05	0.32	0.00	0.00	0.32	\$ 69.05	
2 CIMENTACIÓN											
GP2403	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M. EN	M3	3.34	\$ 384.83	\$ 1,285.33	3.34	0.00	0.00	3.34	\$ 1,285.33	
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN	M3	2.40	\$ 293.70	\$ 704.88	2.40	0.00	0.00	2.40	\$ 704.88	
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES	M2	3.00	\$ 46.58	\$ 139.74	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 139.74	
GP18	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE	M2	3.00	\$ 214.09	\$ 642.27	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 642.27	
GP206	ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.20 MTS DE ESPESOR	PZA	3.00	\$ 1,431.32	\$ 4,293.96	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 4,293.96	
GP209	DADO DE 20X20 CM DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON	PZA	3.00	\$ 922.57	\$ 2,767.71	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 2,767.71	
GP503	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE	ML	15.04	\$ 630.48	\$ 9,482.42	15.04	0.00	0.00	15.04	\$ 9,482.42	
GP1039	LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON	M2	27.13	\$ 920.32	\$ 24,968.27	27.13	0.00	0.00	27.13	\$ 24,968.27	
3 ESTRUCTURA											
GP336	CASTILLO Y/O DALA DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX Y	ML	8.43	\$ 544.20	\$ 4,587.61	8.43	0.00	0.00	8.43	\$ 4,587.61	
GP505	MURO DE BLOQUE 15X20X40 CMS. INCLUYE: MATERIAL,	M2	36.71	\$ 699.72	\$ 27,086.16	36.71	0.00	0.00	36.71	\$ 27,086.16	
GBR93	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-1 DE 45X20 CM,	ML	4.30	\$ 2,041.78	\$ 8,779.65	4.30	0.00	0.00	4.30	\$ 8,779.65	
GBR94	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-2 DE 30X20 CM,	ML	8.60	\$ 1,443.58	\$ 12,414.79	8.60	0.00	0.00	8.60	\$ 12,414.79	
GP5033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE	ML	7.75	\$ 675.54	\$ 5,235.44	7.75	0.00	0.00	7.75	\$ 5,235.44	
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F' C= DE	M2	44.29	\$ 1,157.81	\$ 51,279.39	44.29	0.00	0.00	44.29	\$ 51,279.39	
4 ALBANILERIA											
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN	M3	9.80	\$ 293.70	\$ 2,878.26	9.80	0.00	0.00	9.80	\$ 2,878.26	
GP10	BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO	M2	49.00	\$ 579.15	\$ 28,378.35	49.00	0.00	0.00	49.00	\$ 28,378.35	
GP11	FABRICACIÓN DE RAMPA DE MINUSVALIDOS A BASE DE	PZA	1.00	\$ 3,326.16	\$ 3,326.16	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,326.16	
SUBTOTAL \$										191,254.43	
IVA \$										30,600.71	
TOTAL \$										221,855.14	

ELABORADO
C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.

AUTORIZO

VOLUMENES GENERADORES

<div>  CONTRATISTA: DENISSE MACHADO OROZCO R.F.C. MAOD870924MZ9. </div>										ESTIMACION 01 NORMAL
REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO		EN METROS					
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	A - D	1 - 5	M2	11.70	13.24			154.91	
								TOTAL	154.91	
GP1077	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	2	A - B	M3	0.90	0.15	2.40		0.32	
								TOTAL	0.32	
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.	2	A - B	M3	0.90	0.15	2.40		0.32	
								TOTAL	0.32	
2	CIMENTACIÓN									
GP2403	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1	A - D	M3	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	
		A	1 - 2	M3	3.50	0.15	0.15	1.00	0.08	
		1	A - D	M3	8.04	0.15	0.15	1.00	0.18	
		D	1 - 2	M3	3.50	0.15	0.15	1.00	0.08	
								TOTAL	3.34	
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	1	A - D	M3	1.00	1.00	0.80	3.00	2.40	
								TOTAL	2.40	
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1	A - D	M2	1.00	1.00		3.00	3.00	
								TOTAL	3.00	
GP18	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE ACERO DE 100 KG/CM2	1	A - D	M2	1.00	1.00		3.00	3.00	
								TOTAL	3.00	
GP205	ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1	A - D	PZA				3.00	3.00	
								TOTAL	3.00	
GP209	DADO DE 20X20 CM DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	1	A - D	PZA				3.00	3.00	
								TOTAL	3.00	
GP503	FABRICACION Y COLOCACION DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x15 cm, ARMADA CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	A	1 - 2	ML	3.50				3.50	
		1	A - D	ML	8.04				8.04	
		D	1 - 2	ML	3.50				3.50	
								TOTAL	15.04	
GP1009	LOSA DE CONCRETO PULIDA DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	A - D	1 - 2	M2	3.50	7.75			27.13	
								TOTAL	27.13	

ELABORO:
DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:
ARQ BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO:
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D.O.P.D.U.Y.E.

VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:									
DENISSE MACHADO OROZCO					REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
R.F.C. MAOD870924M29.					ESTIMACION 01 NORMAL				
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO		EN METROS				
3	ESTRUCTURA								
GP335	CASTILLO Y/O DALA DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	1	A - D	ML		2.60	2.00	5.20	
		1	A - D	ML		3.23	1.00	3.23	
							TOTAL	8.43	
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	A	1 - 2	M2	3.50	2.60		9.10	
		D	1 - 2	M2	3.50	2.60		9.10	
		D	1 - 2	M2	1.80	1.57		-2.83	VENTANA
		1	A - D	ML	7.75	2.85		22.09	
		1	A - D	ML	7.75	0.90		3.49	
		1	A - B	M2	0.80	1.40		-1.12	VENTANA
		1	B - C	M2	0.80	1.40		-1.12	VENTANA
							TOTAL	38.71	
GBR03	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-1 DE 45x20 CM, ARMADA CON 2 VARS #3, 4 VARS #4, 3 VARS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	C	1 - 2	ML	4.30			4.30	
							TOTAL	4.30	
GBR04	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-2 DE 30x20 CM, ARMADA CON 2 VARS #3, 4 VARS #4, 3 VARS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	A	1 - 2	ML	4.30			4.30	
		D	1 - 2	ML	4.30			4.30	
							TOTAL	8.60	
GP5033	FABRICACION Y COLOCACION DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 cm, ARMADA CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1	A - D	ML	7.75			7.75	
							TOTAL	7.75	
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	A - D	1 - 2	M2	10.30	4.30		44.29	
							TOTAL	44.29	
4	ALBANILERIA								
GP25	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	A	1 - 5	M3	9.70	4.00	0.20	7.76	
		D	1 - 5	M3	10.30	0.30	0.20	0.62	
		1	A - D	M3	12.04	0.30	0.20	0.72	
		5	A - D	M3	12.04	0.30	0.20	0.72	
							TOTAL EJECUTADO	9.82	
							TOTAL CONTRATADO	9.80	
GP10	BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	A	1 - 5	M2	9.70	4.00		38.80	
		D	1 - 5	M2	10.30	0.30		3.09	
		1	A - D	M2	12.04	0.30		3.61	
		5	A - D	M2	12.04	0.30		3.61	
							TOTAL EJECUTADO	49.11	
							TOTAL CONTRATADO	49.00	
GP11	FABRICACION DE RAMPA DE MINUSVALIDOS A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ACABADO RAYADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, (INCLUYE MATERIAL).	A	1 - 5	PZA			1.00	1.00	
							TOTAL	1.00	

ELABORADO:
DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR:
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZADO:
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D.O.P.D.U.Y.E.



DENISSE MACHADO OROZCO

OBRA:	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,
ESTIMACION:	SINALOA 01 NORMAL

1		REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION PRELIMINARES
GP01		TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP2403		DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.
GP26		CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO.



ELABORÓ:

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZÓ.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

DENISSE MACHADO OROZCO



OBRA:	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
ESTIMACION:	01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION	
CIMENTACIÓN	
2	
GP2403	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA, AGUA,
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP18	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE ACERO DE 100 KG/CM2
GP206	ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES , COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON
GP209	DADO DE 20X20 CM DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2,
GP503	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x15 cm, ARMADA CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL,
GP1099	LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORÓ:-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
COORDINADORA DE O.P.D.U. Y E.

REVISÓ:-

ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZÓ:-


ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DENISSE MACHADO OROZCO

OBRA:	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
ESTIMACION:	01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION	
3	ESTRUCTURA
GP336	CASTILLO Y/O DALA DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2,
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GBR93	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-1 DE 45x20 CM, ARMADA CON 2 VARS #3, 4 VARS #4, 3 VARS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE:
GBR94	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-2 DE 30x20 CM, ARMADA CON 2 VARS #3, 4 VARS #4, 3 VARS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE:
GP5033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 cm, ARMADA CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE:
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO

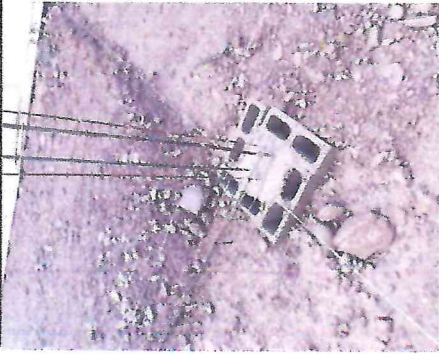

ELABORO

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Brst
ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DENISSE MACHADO OROZCO

OBRA:	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,
	SINALOA
ESTIMACION:	01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

4	ALBAÑILERIA
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA, AGUA,
GP10	BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP11	FABRICACION DE RAMPA DE MINUSVALIDOS A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ACABADO RAYADO, INCLUYE: PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,



ELABORÓ:

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL


REVISÓ.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

	
CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
DENISSE MACHADO OROZCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DOMICILIO:	Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961,
R.F.C.	Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180
OSRA:	MAOD670924MZ9.
REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	
CROQUIS ESTIMACION:	
CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP1077	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO.

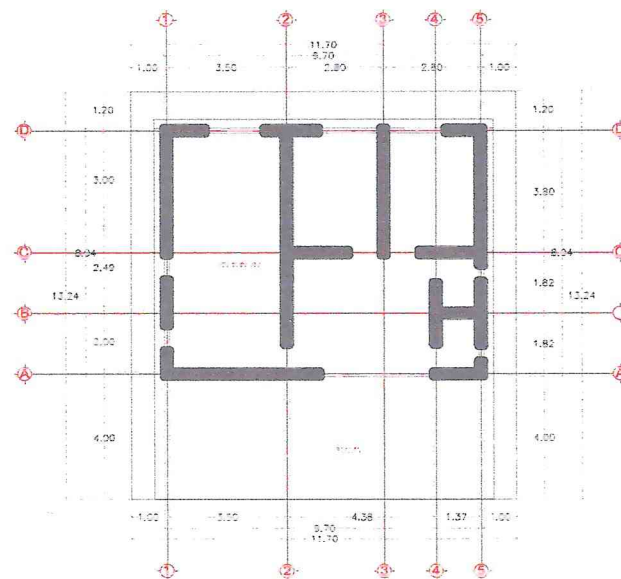

ELABORO.-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL


REVISO.-


 ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO.-


 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR O. P. D. U. Y E.

	
CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
DENISSE MACHADO OROZCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DOMICILIO:	Calle, Const. Heriberto Jara N. 1961,
R.F.C.	Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180
OBRA:	MAOD670924MZ9.
REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	
CROQUIS ESTIMACION:	
4	ALBAÑILERÍA
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP10	BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP11	FABRICACIÓN DE RAMPA DE MINUSVALIDOS A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ACABADO RAYADO, INCLUYE: PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, (INCLUYE MATERIAL).

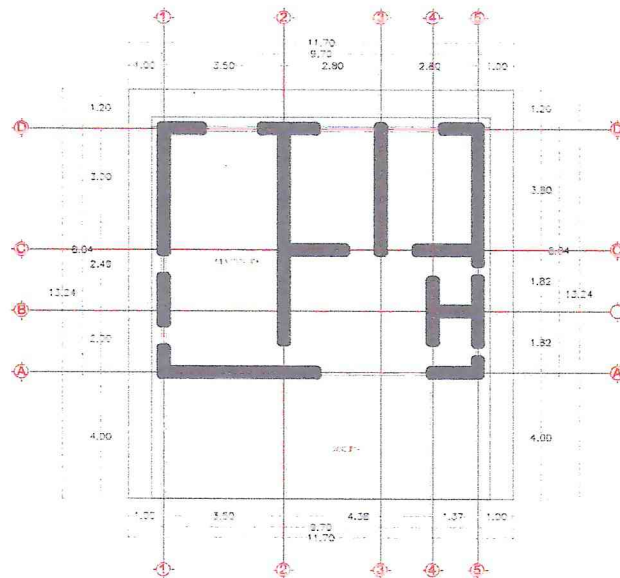

ELABORO:

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y E.



Fecha y hora de consulta

28/07/2025 9:18:49 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00798320

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco	
Descripción: EST 02 NORM AD 004	Importe de la operación: 136,914.27 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836	Cuenta de depósito: 0488130388
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO	Titular de la cuenta: DENISSE MACHADO OROZCO
Fecha de creación: 28/07/2025	Fecha de aplicación: 28/07/2025
Hora: 21:18:47	
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382	Motivo de pago: EST 02 NORM AD 004

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0048459024

Folio único: I323202507282118470048459031

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/07/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/07/2025
