

OFICIO No. OPDUE/455/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION
01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 12 de Agosto de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: DENISSE MACHADO OROZCO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-004/2025.
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$628,145.14 (SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO.
- IMPORTE DE ESTIMACIÓN: \$17,732.62 (DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 62/100 M.N)
- IMPORTE A PAGAR REAL, (DISMINUCION POR EL IMPORTE RETENIDO DE RESICO): \$17,533.62 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: DENISSE MACHADO OROZCO.
- R.F.C.: MAOD870924MZ9
- DOMICILIO FISCAL: CALLE. CONST. HERIBERTO JARA N. 1961, COLONIA: LOC. LIBERTAD, C.P. 80180, CULIACÁN, SINALOA, CÓDIGO POSTAL: 80180.
- No. DE FACTURA: # AD76, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2025.


SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.


AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
C.C.P. ARCHIVO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA

12 AGO 2025
RECIBIDO


RFC emisor:

MAOD870924MZ9

Nombre emisor:

DENISSE MACHADO OROZCO

RFC receptor:

MBA850101214

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Código postal del receptor:

80500

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

30DC7E2E-0BAD-41FD-A57C-D4656BA3AD76

No. de serie del CSD:

00001000000712949676

Código postal, fecha y hora de emisión:

80180 2025-08-07 14:09:18

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Régimen Simplificado de Confianza

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80111618		1.00	E48	Unidad de servicio	15,920.18	15,920.180000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACION: 01 ADICIONAL FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No-MBGBR-AD-FAISMUN-004/2 025 MONTO DEL CONTRATO: \$628145.14 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$24492.59 MAS IVA 16% \$3918.81 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$28411.40 AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$8572.41 MAS IVA \$1371.59 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO \$9944.00 IMPORTE TOTAL A FACTURAR \$15920.18 MAS IVA \$2547.23 MONTO NETO A FACTURAR \$18467.41 RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.) \$734.78 TOTAL DEDUCCIONES: \$10678.78 MONTO LIQUIDO A RECIBIR \$17732.62				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	15,920.180000	Tasa	16.00%	2,547.228800
					ISR	Retención	15,920.180000	Tasa	1.25%	199.002250
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 15,920.18

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 2,547.23

Impuestos retenidos

ISR

\$ 199.00

Total

\$ 18,268.41

Sello digital del CFDI:
TVUadJ5iTTifOmYXP9JeLmUEpZrGuKst2eJFuqcYTLvdUXSAeOc1HLAIsFxMKYRhbI7jxzFsezDiuzwHdRLlWMRVicYwY6Jm4S5lqhixHuyBCaSa5R0fumkpX/71EKNVUeAuPPQZgJNzwrPES5oN9AxTducaqv81xn+JWO/MwZ78gMHIUUb1L8BsK+TdJhrdRzfvPASpxD0NSqBTCNIUnocU31omQKqBOMnVycKAIID+6bn6powcnj25DHywxqYtZ9a9ul1E8xc5SDMKPSmP7D9nJclc2p5L+WDUTEzhpYGNsZYm9fqLSyM2PIRBJESQqRbhYYWVsJ0JEgw1UfCQ==

Sello digital del SAT:
VekCer9lag9CM+hqqt73BjHv9xbQvNumjKLAH/SHaXlxw6dKyKZVOrbEeOfVNbaGQP3Zub1gq5eKITkAD3Efe5UG2Zg/FTclss1TBf9byZgk0Q3u91gT7hy5SoKVYYKpxQXGgbtqB3qtq/qUMDDSZhNmwmbska5hJ1TnQgLfHAE94FYmicXvmuDeX4LoSeBvmaltalGvO8b4G1rzmFvQlyqnrLiBv05cW7i7YnjdMCoB1Xr+4PUB+HWuNzXJ3dTUJRJU4cZ2ttfDQ6ApulAI/1NHBfMsVDX0+vmnrpEFb7e1gJ4HxsXcokZkMCIHDKi6LKA6P+ELJh/WYZ+t+WtQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]30DC7E2E-0BAD-41FD-A57C-D4656BA3AD76|2025-08-07T14:10:31|SAT970701NN3|TVUadJ5iTTifOmYXP9JeLmUEpZrGuKst2eJFuqcYTLvdUXSAeOc1HLAIsFxMKYRhbI7jxzFsezDiuzwHdRLlWMRVicYwY6Jm4S5lqhixHuyBCaSa5R0fumkpX/71EKNVUeAuPPQZgJNzwrPES5oN9AxTducaqv81xn+JWO/MwZ78gMHIUUb1L8BsK+TdJhrdRzfvPASpxD0NSqBTCNIUnocU31omQKqBOMnVycKAIID+6bn6powcnj25DHywxqYtZ9a9ul1E8xc5SDMKPSmP7D9nJclc2p5L+WDUTEzhpYGNsZYm9fqLSyM2PIRBJESQqRbhYYWVsJ0JEgw1UfCQ==[00001000000705250068]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-08-07 14:10:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-08-07T14:09:18"
Sello="TVUadJ5iTTifOmYXp9JelMUEpzrGuKst2eJFuqcYTLvduXSAeOc1HLAIsFxmKYRhbI7jxzFsezDiuzwHdRLlWmRVicYwY6Vjrn4S5lqhiXhuyBCaSa5R0fumkpX/71EKNVUeAuPPQZgJNzwrPE
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000712949676"
Certificado="MIIGRjCCBC6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTISNDk2NzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUUMWwYDVQDDCxBQyBERUwglU0VSVk1DSURgREUgQURNSUSU1RSQUJTO4gVFJJQ1VU
SubTotal="15920.18" Moneda="MXN" Total="18268.41" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="80180">
  <cfdi:Emisor Rfc="MAOD870924MZ9" Nombre="DENISSE MACHADO OROZCO" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80111618" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION; 01 ADICIONAL
    FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO
    DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No.:MBG8R-AD-FAISMUN-004/2025 MONTO DEL CONTRATO: $628145.14 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $24492.59 MAS IVA
    16% $3918.81 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $28411.40 AMORTIZACION ANTICIPO 35% $8572.41 MAS IVA $1371.59 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $9944.00
    IMPORTE TOTAL A FACTURAR $15920.18 MAS IVA $2547.23 MONTO NETO A FACTURAR $18467.41 RETENCION 3% (S.V.I.F. Y C.) $734.78 TOTAL DEDUCCIONES: $10678.78
    MONTO LIQUIDADO A RECIBIR $17732.62" ValorUnitario="15920.18" Importe="15920.180000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="15920.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2547.228000"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Base="15920.180000" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="199.002250"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2547.23" TotalImpuestosRetenidos="199.00">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="199.00"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="15920.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2547.23"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="30DC7E2E-0BAD-41FD-A57C-D4656BA3AD76"
    FechaTimbrado="2025-08-07T14:10:31" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="TVUadJ5iTTifOmYXp9JelMUEpzrGuKst2eJFuqcYTLvduXSAeOc1HLAIsFxmKYRhbI7jxzFsezDiuzwHdRLlWmRVicYwY6Vjrn4S5lqhiXhuyBCaSa5R0fumkpX/71EKNVUeAuPPQZg
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="VekCer9lag9CM+hhqt73BjHv9xbQvNumjklAH/5HaXkxTw6dKyKzVOrbEeOfVnbaGQP3Zub1gq5eK1tkAD3EFESUG2Zg/FTciss1TBf9byZgk0Q3u91gT7hy5S0KVYYKpxQXGgbtqB3
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 4 de agosto de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: DENISSE MACHADO OROZCO		ESTIMACIÓN No: 01 ADICIONAL FINIQUITO	
DOMICILIO: Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 6671-325077	CEL: 6671633083	DEL: 14-jul-25	AL: 01-ago-25
R.F.C. MAOD870924MZ9.		FECHA DE CONTRATO: 19-jun-25	
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			
LOCALIDAD: RINCÓN DE LOS MONTES		MUNICIPIO: BADIRAGUATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
		INICIO: 20-jun-25	TERMINACIÓN: 03-ago-24
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No: MBGBR-AD-FAISMUN-004/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO
\$541,504.43	\$628,145.14	\$219,850.80	\$628,145.14
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:			BUENO POR: \$ 17,732.62
\$ 17,732.62 (SON DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL FINIQUITO			
DEDUCCIONES:			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 8,572.41	CALCULO DE ESTIMACIÓN	
MAS I.V.A.:	\$ 1,371.59	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 24,492.59
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 9,944.00	MAS I.V.A 16 %	\$ 3,918.81
3 % SVIFYC:	\$ 734.78	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 28,411.40
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 10,678.78	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 10,678.78
		MONTO A FACTURAR CON IVA	\$ 18,467.40
SALDO A PAGAR:			\$ 17,732.62

ELABORO-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.

		Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato Control de Estimaciones	
DENISSE MACHADO OROZCO			
REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		Fecha: 4 de agosto de 2025	Estimación: 01 ADICIONAL FINIQUITO
Período de la estimación: 14/07/2025 01/08/2025	Localidad: RINCON DE LOS MONTES	No. De contrato: MBGBR-AD-FAISMUN-004/2025	
Período de Ejecución: 20/06/2025 03/08/2024	RINCON DE LOS MONTES		
Importe del contrato con I.V.A: \$ 628,145.14	Imp. Contratado sin I.V.A \$ 541,504.43	Anticipo \$ 219,850.80	Importe Anticipo sin I.V.A \$ 189,526.55
		% de Avance 5% % Avance Total 100%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION \$ 9,943.99	Importe de la Estimacion (+) \$ 24,492.59 16 % I.V.A (+) \$ 3,918.81 Sub- Total A (=) \$ 28,411.40 Amortizacion Anticipo \$ 8,572.41 16 % I.V.A (+) \$ 1,371.59 Total (=) \$ 9,944.00	ESTA ESTIMACION \$ 28,411.40
AMORTIZACION ANTERIOR \$ 209,906.81	Importe TOTAL \$ 15,920.18 16 % I.V.A (+) \$ 2,547.23 Total (=) \$ 18,467.41	ACUMULADO ANTERIOR \$ 599,733.74
TOTAL AMORTIZADO \$ 219,850.80	3 % SVIFYC: \$ 734.78 Total Deducciones (=) \$ 10,678.78	TOTAL ACUMULADO. \$ 628,145.14
ANTICIPO OTORGADO \$ 219,850.80	Importe TOTAL \$ 17,732.62 NETO A PAGAR \$ 17,732.62	CONTRATADO \$ 628,145.14
SALDO DEL ANTICIPO \$0.00	Son: (SON DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)	SALDO \$ -

ELABORO:-

 C. DENISSE MACHADO OROZCO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

 ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIR. D. O. P. D. U. Y E.



DENISSE MACHADO OROZCO

DOMICILIO:
Calle: Consta. Humberto Sosa N. 1331,
Colonia: Loc. Libertad. C.P. 80180. Culiacán. Sinaloa. Código Postal: 80180

MAOD870924MZ9.

01 ADICIONAL FINIQUITO

RINCON DE LOS MONTES

ESTIMACIÓN:

DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA.
--------------	--

CONTRATO.

ANEXO ADICIONAL

NIO ADICION

ANEXO ADICIONAL

IMPOR

SIN IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\$	191,2
----	-------

\$ 325,7

3	4
---	---

74,2

[illegible]

--	--

[illegible]

--	--

[illegible][illegible][illegible]

€	24
---	----

\$	541,300
----	---------

SA

1

JOSE RODRIGUEZ

COSTOS Y

REVISO:-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



**CM CONSTRUCCIONES
MACHADO**

FECHA: 4 de agosto de 2025

CONTRATISTA:
DENISSE MACHADO OROZCO
DOMICILIO: Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961,
Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán,
R.F.C. MAOD870924MZ9.

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGÍA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD: RINCÓN DE LOS MONTES
ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$ 541,504.43
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 219,850.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 628,145.14

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	CIMENTACIÓN	\$ -
3	ESTRUCTURA	\$ -
4	ALBAÑILERÍA	\$ -
5	ACABADOS	\$ 54,220.91
6	INSTALACIONES BÁSICAS	\$ -
7	TRABAJOS FINALES	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 54,220.91
POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:		\$ 28,411.40

SUB TOTAL= \$ 24,492.59
I.V.A AL 16 % \$ 3,918.81
TOTAL = \$ 28,411.40

ELABORO.-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y. E.



DESGLASE

CONTRATISTA:		DENISSE MACHADO OROZCO			DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			FECHA:		04/08/2025	
DOMICILIO:		Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180					R.F.C.		MAOD870924MZ9.		1 de 2		
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION													
		LOCALIDAD:		RINCON DE LOS MONTES		ESTIMACIÓN:		01 ADICIONAL FINQUITO					
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.													
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$541,504.43		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$219,850.80		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$628,145.14			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
1 PRELIMINARES													
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO	M2	154.91	\$	17.62	\$	2,729.51	154.91	0.00	0.00	\$		
GP1077	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO.	M3	0.32	\$	642.13	\$	205.48	0.32	0.00	0.00	\$		
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3	0.32	\$	215.79	\$	69.05	0.32	0.00	0.00	\$		
2 CIMENTACIÓN													
GP2403	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M. EN	M3	3.34	\$	384.83	\$	1,285.33	3.34	0.00	0.00	\$		
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN	M3	2.40	\$	293.70	\$	704.88	2.40	0.00	0.00	\$		
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES	M2	3.00	\$	46.58	\$	139.74	3.00	0.00	0.00	\$		
GP18	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE	M2	3.00	\$	214.09	\$	642.27	3.00	0.00	0.00	\$		
GP206	ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.20 MTS DE ESPESOR	PZA	3.00	\$	1,431.32	\$	4,293.36	3.00	0.00	0.00	\$		
GP209	DADO DE 20X20 CM DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON	PZA	3.00	\$	922.57	\$	2,767.71	3.00	0.00	0.00	\$		
GP503	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE	ML	15.04	\$	630.48	\$	9,482.42	15.04	0.00	0.00	\$		
GP1099	LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON	M2	27.13	\$	920.32	\$	24,968.27	27.13	0.00	0.00	\$		
3 ESTRUCTURA													
GP336	CASTILLO Y/O DALA DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX	ML	8.43	\$	544.20	\$	4,587.61	8.43	0.00	0.00	\$		
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL,	M2	38.71	\$	699.72	\$	27,036.16	38.71	0.00	0.00	\$		
GBR93	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-1 DE 45X20	ML	4.30	\$	2,041.78	\$	8,779.65	4.30	0.00	0.00	\$		
GBR94	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-2 DE 30x20	ML	8.60	\$	1,443.58	\$	12,414.79	8.60	0.00	0.00	\$		
GP5033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE	ML	7.75	\$	675.54	\$	5,235.44	7.75	0.00	0.00	\$		
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE	M2	44.29	\$	1,157.81	\$	51,279.39	44.29	0.00	0.00	\$		
4 ALBANILERIA													
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN	M3	9.80	\$	293.70	\$	2,878.26	9.80	0.00	0.00	\$		
GP10	BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO	M2	49.00	\$	579.15	\$	28,378.35	49.00	0.00	0.00	\$		
GP11	FABRICACIÓN DE RAMPA DE MINUSVALIDOS A BASE DE	PZA	1.00	\$	3,326.16	\$	3,326.16	1.00	0.00	0.00	\$		
5 ACABADOS													
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL,	M2	9.00	\$	699.72	\$	6,297.48	8.50	0.00	0.00	\$		
GP15666	APLANADO FINO 10MM ESP. CON MEZCLA MORTERO-	M2	79.90	\$	459.85	\$	36,742.02	197.81	79.90	117.91	\$		
GP200	PINTURA VINILICA FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA	M2	238.07	\$	104.03	\$	24,766.42	238.07	0.00	0.00	\$		
GP108	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE DOS CAPAS DE	M2	110.21	\$	207.98	\$	22,921.48	44.56	0.00	0.00	\$		
GP3588	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO INCLUYE:	M2	70.71	\$	850.77	\$	60,157.95	68.24	0.00	0.00	\$		
GP3599	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CMS	ML	55.47	\$	260.63	\$	14,457.15	55.47	0.00	0.00	\$		
GP362	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS, INCLUYE:	M2	9.95	\$	587.35	\$	5,844.13	6.24	0.00	0.00	\$		
GP29	DESINSTALACION DE BARANDAL EN PUERTAS Y	M2	1.00	\$	1,617.44	\$	1,617.44	1.00	0.00	0.00	\$		
GP225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE	M2	19.44	\$	4,096.94	\$	79,644.51	18.85	0.00	0.00	\$		
GP252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 MTS X	PZA	2.00	\$	8,174.37	\$	16,348.74	2.00	0.00	0.00	\$		
GP253	REHABILITACION DE PUERTA DE 0.90 MTS X 2.10 MTS,	PZA	3.00	\$	2,935.98	\$	8,807.94	3.00	0.00	0.00	\$		
6 INSTALACIONES BASICAS													
GP657	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERIA DE 4"	SAL	1.00	\$	1,703.57	\$	1,703.57	1.00	0.00	0.00	\$		
GP220	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA CON TUBERIA DE 4"	SAL	1.00	\$	1,606.46	\$	1,606.46	1.00	0.00	0.00	\$		
GP240	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBERIA DE 2"	SAL	1.00	\$	1,545.50	\$	1,545.50	1.00	0.00	0.00	\$		
GP258	SALIDA SANITARIA PARA TARRAJA CON TUBERIA DE 2"	SAL	1.00	\$	1,647.71	\$	1,647.71	1.00	0.00	0.00	\$		
GP246	ALIMENTACIÓN HIDRAULICA PARA MUEBLE SANITARIO	SAL	4.00	\$	616.84	\$	2,467.36	4.00	0.00	0.00	\$		
GP248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC INCLUYE: WC,	PZA	1.00	\$	3,646.69	\$	3,646.69	1.00	0.00	0.00	\$		
GP249	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR	PZA	1.00	\$	3,233.96	\$	3,233.96	1.00	0.00	0.00	\$		

ELABORO

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

REVISÓ

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y. E.



CONTRATISTA:		DENISSE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		FECHA:		04/08/2025
DOMICILIO:		Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180		R.F.C.:		MAOD870924MZ9.		2 de 2		
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION										
		LOCALIDAD:		RINCON DE LOS MONTES		ESTIMACIÓN:		01 ADICIONAL FINIQUITO		
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.										
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$541,504.43		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$219,850.80		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$628,145.14
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GP259	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON	PZA	1.00	\$ 3,233.96	\$ 3,233.96	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
GP260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA, INCLUYE:	PZA	1.00	\$ 1,150.94	\$ 1,150.94	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
GP338	SALIDA ELÉCTRICA PARA DE ALUMBRADO CON POLIFLEX	SAL	8.00	\$ 1,462.83	\$ 11,702.64	8.00	8.00	0.00	0.00	\$ -
GP340	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR CON POLIFLEX DE	SAL	7.00	\$ 901.03	\$ 6,307.21	7.00	7.00	0.00	0.00	\$ -
GP226	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE	SAL	12.00	\$ 1,263.72	\$ 15,164.65	9.00	9.00	0.00	0.00	\$ -
GP178	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q8,	PZA	1.00	\$ 2,673.90	\$ 2,673.90	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20	PZA	2.00	\$ 452.31	\$ 904.62	2.00	2.00	0.00	0.00	\$ -
GP228	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO, INCLUYE:	PZA	8.00	\$ 929.97	\$ 7,439.76	8.00	8.00	0.00	0.00	\$ -
7	TRABAJOS FINALES									
GBR671	LETREO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO	PZA	1.00	\$ 4,326.02	\$ 4,326.02	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ -
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE	M2	154.91	\$ 25.11	\$ 3,889.79	154.91	154.91	0.00	0.00	\$ -
									SUBTOTAL \$	54,220.91
									IVA \$	8,675.35
									TOTAL \$	62,896.26
POR CIERRE DE ESTIMACION \$									\$	28,411.40

ELABORO
C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.-D.-U. Y E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:

DENISSE MACHADO OROZCO

REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE
LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
01 ADICIONAL
FINIQUITO

R.F.C. MAOD870924MZ9.

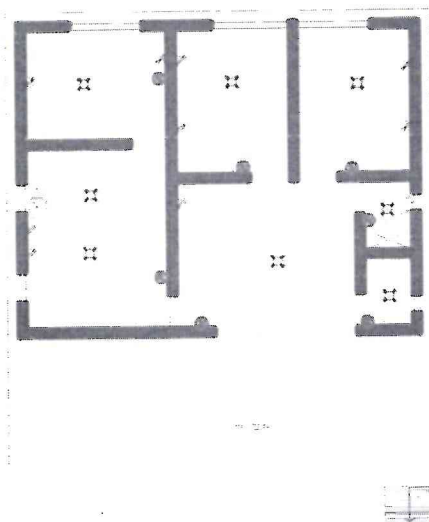
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
5	ACABADOS									
GP15506	APLANADO FINO 10MM ESP. CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:5 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELABORACION DE MARGAMASA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA			M2				AREA	197.81	
								TOTAL EJECUTADO	197.81	
								CONTRTADO	79.90	
								POR AJUSTE DE ESTIMACION	117.91	

ELABORO.-
C.DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-
ING RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

	
CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
DENISSE MACHADO OROZCO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DOMICILIO:	Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961,
R.F.C.	Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180
OBRA:	MAOD870924MZ9.
	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CROQUIS ESTIMACION:	
CLAVE	CONCEPTO
5	ACABADOS
GP15566	APLANADO FINO 10MM ESP. CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:5 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELABORACION DE MARGAMASA,



ELABORO.-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y E.

DENISSE MACHADO OROZCO



OBRA:		REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
ESTIMACION:		01 ADICIONAL FINIQUITO
REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION ACABADOS		
5	GP15566	APLANADO FINO 10MM ESP. CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:5 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELABORACION DE MARGAMASA, DESPERDICIOS, MATERIALES,



ELABORO:
C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-
ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:-
ING./RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta

21/08/2025 9:08:22 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00798320
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 01 AD FIN AD004

Importe de la operación: 17,533.62 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 0488130388

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: DENISSE MACHADO OROZCO

Fecha de creación: 21/08/2025

Fecha de aplicación: 21/08/2025

Hora: 21:08:20

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Motivo de pago: EST 01 AD FIN AD004

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0006839043

Folio único: I323202508212108200006839050

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/08/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/08/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
