

FECHA 12 OCT/2022.
OPPV - EST - ADJ - FISE - ELEC - 0710B - 2022.

OMCA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMBA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

01° SE JUNE A DISPOSICION XALIDAD PARA QUE CONTRATISTA INICIE TRABAJOS CONTEMPORANEO EN EL CONTRATO.

02° TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO

FECHA: 18-OCT-2022

03° EXCAVACION CON EQUIPO MAQUINA PARA ZANJAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

04° SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3" RELLENO Y COMPACTACION SOBRE TUBO EN CEDA.

FECHA: 26-OCT-2022

05° EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS DE 0.00 - 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD MATERIAL TIPO B5 ROCA INTERMEDIZADA.

FECHA: 26-10-2022.

06° SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3" RELLENO Y COMPACTACION SOBRE TUBO EN CEDA.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE.

OPW - EST - ALT - FISR - ELEC - CTIB - 2022

OPERA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMCA. MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA

07° - EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN TPO B CON AFLORE Y EXTRACCION DEL MATERIAL

08° - COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO PARA AGUA POTABLE

FECHA: 08-NOV-2022

09° - TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" INCLUYE MATERIALES EXCAVACION Y TPO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

10° - SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUBMERGIBLE MONO FASICO 220 VOLT

11° - REHABILITACION DE CASETA DE CONTROL INCLUYE RESANES PINTURA ETC Y TPO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

FECHA: 10-NOV-2022

12° - RECURSO GENERADORES PARA ESTIMACION C1 NORMAL PERIODO DEL 12-10-2022



SUPERVISOR SOP -



SUPERINTENDENTE

OPRU - EST - ART - FISE - ELEC - 07102 - 2022

OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMOA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

13° - APROYACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 12-10-2022 AL 10-11-2022

FECHA 16-NOV-2022

14° - RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 572,167.66 IVA MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 12-10-2022 AL 10-11-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

FECHA: 17-NOV-2022

15° - SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADORES A TENSION PLENA PARA UN EQUIPO DE 3.00 HP.

FECHA: 23-11-2022

16° - AFINE DE CALIES.

FECHA: 25-11-2022

17° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

25 11 2022
OPPV - EST - ADJ - FISE - ELRG - 0710B - 2022.

OPERA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COMOA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

18° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OZ FINQUITO PERIODO DEL 11-11-2022 AL 25-11-2022

FECHA: 28-11-2022.

19° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OZ FINQUITO PERIODO DEL 11-11-2022 AL 25-11-2022.

20° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 02-DIC-2022

21° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 16-DIC-2022.

22° - RECIBO ESTIMACION OZ FINQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 9,480.68 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 11-11-2022 AL 25-11-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

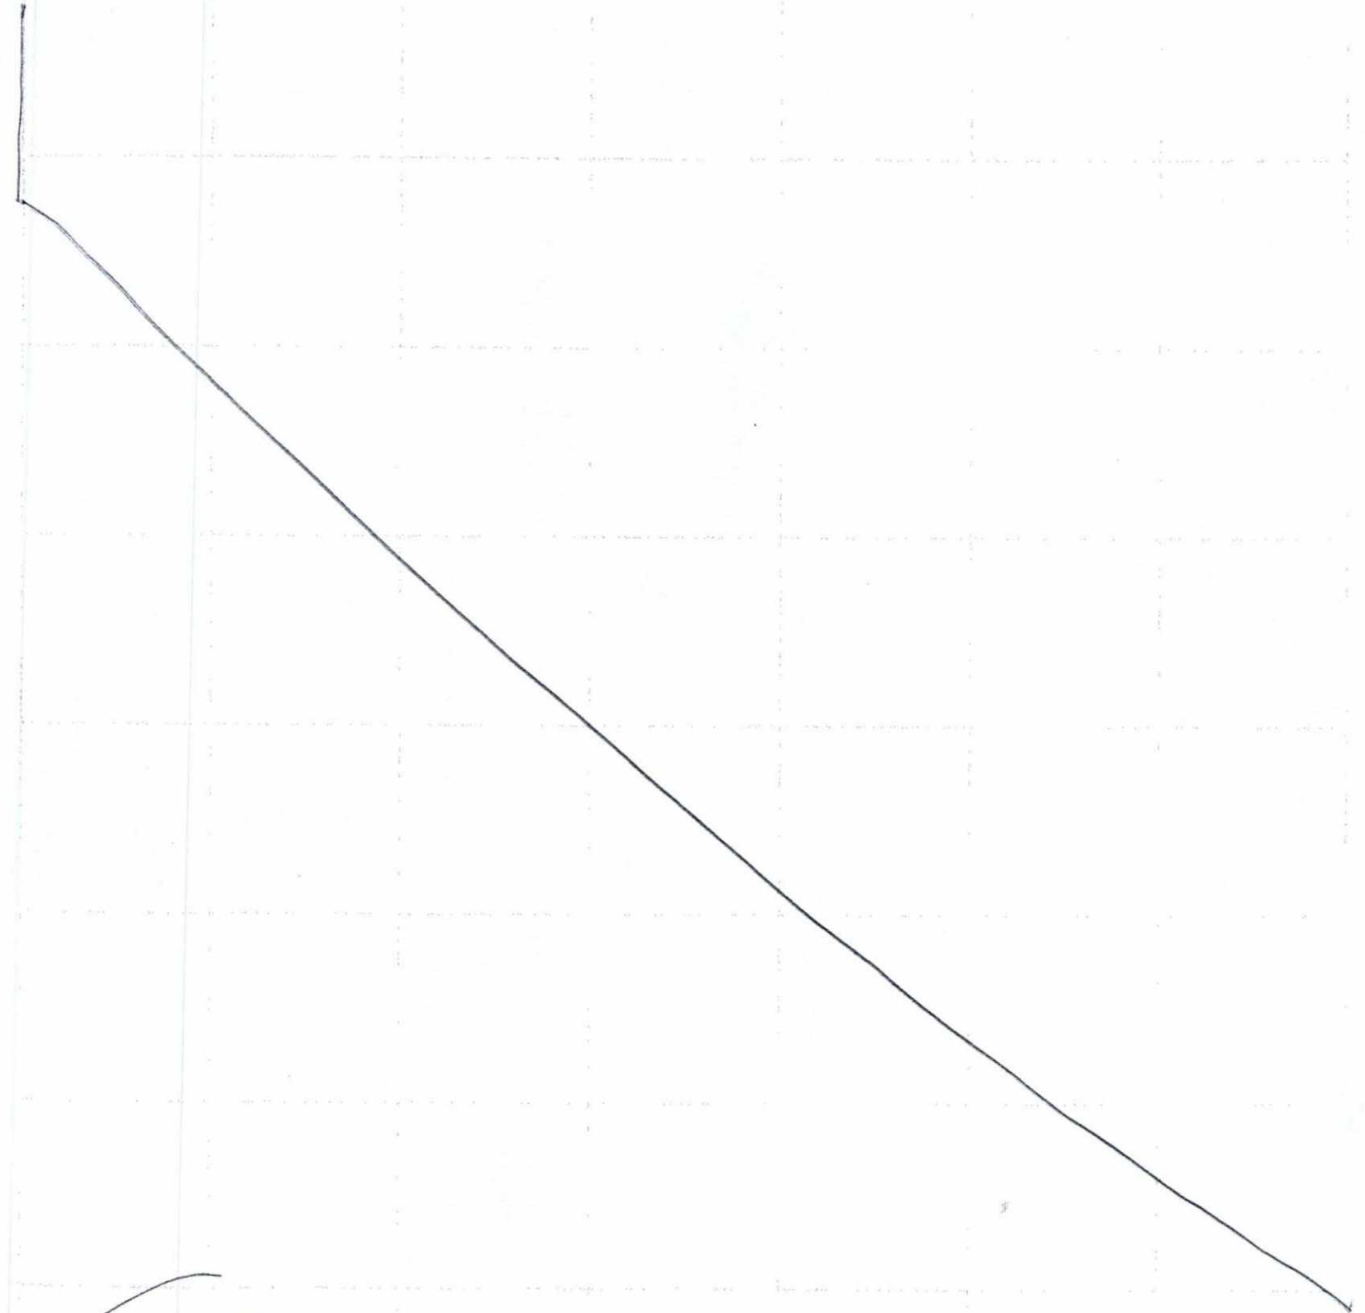

SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE


OPPO - EST - ADJ - FISE - ELEC - 07103 - 2022

OPERA: REHABILITACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO
DE SINALOA

23° - SE DECLARA CERRADA ESTA OBTACION




SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE
