

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE **ESTIMACIÓN 04 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZARÁ LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO **SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO NÚMERO 77 (SETENTA Y SIETE) DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-LP-GC-001/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$9,424,759.83 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 04 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$924,349.39 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CAM-871226-MS5
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4, 5 Y 6 MANZANA 18, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320.
- **FACTURA:** # -144, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE **ESTIMACIÓN 04 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZARÁ LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO **SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO NÚMERO 77 (SETENTA Y SIETE) DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-LP-GC-001/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$9,424,759.83 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 04 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$924,349.39 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CAM-871226-MS5
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4, 5 Y 6 MANZANA 18, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320.
- **FACTURA:** # -144, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE



C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.C.P. ARCHIVO.



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/380/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACIÓN

03 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 04 de Julio de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE **ESTIMACIÓN 04 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZARÁ LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO **SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO NÚMERO 77 (SETENTA Y SIETE) DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-LP-GC-001/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$9,424,759.83 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 04 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$924,349.39 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CAM-871226-MS5
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4, 5 Y 6 MANZANA 18, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320.
- **FACTURA:** # -144, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.C.P. ARCHIVO.

**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**
TESORERÍA

11:35 AM
04 JUL 2025

RECIBIDO

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

RFC: CAM871226M55

Lugar de Expedición: 81320

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago03 - Transferencia electrónica de fondos

Folio- 144

Método de pagoPUE - Pago en una sola exhibición

Fecha3/7/2025 08:24:56

MonedaMXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio.

Exportación:01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Uso CFDI: I01 - Construcciones.

R.F.C.:MBA850101214

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 80500

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	SERVICIO ESTIMACION 04 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-GC-001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 9,424,759.83 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 1,276,725.68 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 446,853.99 TOTAL: \$ 829,871.69 (+) MAS 16% IVA: \$ 132,779.47 TOTAL: \$ 962,651.16 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 38,301.77 SALDO LIQUIDO: \$ 924,349.39	829,871.69	002 - IVA - 132,779.47	829,871.69

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.	Subtotal	829,871.69
	Impuestos Traslados	132,779.47
	Ret. Local 3% SVICUT	0.00
	Total	962,651.16

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

04 - Sustitución de los CFDI previos

CCDD60E0-8A75-447C-A215-AD50C1A576A0



Serie del Certificado del emisor

00001000000714582475

Folio Fiscal

A8ED6977-24BE-4444-B65B-DB7C8C47F2B4

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación

Julio 4 2025 - 09:19:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

h3hMdpdtrKtJP3idf/NBxqrkrkb1esJAvxmsuHPhvyUJW79kJM8ogpkyH8FriK3uGlXnjS8hT7FowWMw0uAxe5y26O1gi1tJxnrryFbWy/Vjy4bcRuz6W0856zjNlSepUZvD0CDTJGcopnBW3M9C1M11BmqkLPkcNevnlULwxgLnA6aST4DPsb1cid+z1TVWGA2eKx2S8bm7VLZ3bg9n3NZjp4IEViKWgXrU608qYi3A6f//yFKwHQPH0W1SRMqZPmSj+swHGvDqqXYj7JFe1SqYohKkB4XtmENOApNY1FpPmFsozYCS3lLq1hUE/ALTUNnfXQXh3V3yZu1DMQ==

Sello del SAT

UtTOphMNY4WyrRkGRMJGtfQhblUJGAacfPRMdN4WJpxP/q2M7tqbNWNiLP+i0pZcV0vhbBmsmMZdZkvlxx21JzP556oDj45DB56eWuCh0BqJafbrzjXuhlywignNyeD1eTSvGuUriQoEvdbUkgwyFIL8xFH5f8B3b6weoiw9YfQdeOKKEyqFckiK3xVF7v8mDO/v+946p9TIGGu6OH9RTQXLKXBYLkQIUJ4onDCrTKQCoW18YMYCjXayycOYufcr6LXjG8bRnkUh59x5vv6I+WKp4fmWd5g47XwZe4sLz3kGu/MtkdiWgJYk2HOzrIKl4K7tpE2IZTz+6eYdgKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]A8ED6977-24BE-4444-B65B-DB7C8C47F2B4|2025-07-04T09:19:58|MAS0810247C0|h3hMdpdtrKtJP3idf/NBxqrkrkb1esJAvxmsuHPhvyUJW79kJM8ogpkyH8FriK3uGlXnjS8hT7FowWMw0uAxe5y26O1gi1tJxnrryFbWy/Vjy4bcRuz6W0856zjNlSepUZvD0CDTJGcopnBW3M9C1M11BmqkLPkcNevnlULwxgLnA6aST4DPsb1cid+z1TVWGA2eKx2S8bm7VLZ3bg9n3NZjp4IEViKWgXrU608qYi3A6f//yFKwHQPH0W1SRMqZPmSj+swHGvDqqXYj7JFe1SqYohKkB4XtmENOApNY1FpPmFsozYCS3lLq1hUE/ALTUNnfXQXh3V3yZu1DMQ==|00001000000709182898|]

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="144" Fecha="2025-07-
03T08:24:56"
Sello="h3hMdpdtrKtJP3idf/NBxqrkrkb1esJAvxmsuHPHyULJW79kJM8ogpkyH8FriK3uGlXnjS8hT7FowMw0uAxe5y2601gi1tJxnrryFPbWy/Vjy4bcRuz6W0856zjN1SepUZvD0CDTJGcopnBk
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000714582475"
Certificado="MIIGjzCCBHegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQ1ODI0NzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="829871.69" Moneda="MXN" Total="962651.16" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="81320">
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="CCDD60E0-8A75-447C-A215-AD50C1A576A0"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="CAM871226MS5" Nombre="COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="S01" Descripcion="SERVICIO ESTIMACION 04
(NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-LP-GC-001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 9,424,759.83 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $
1,276,725.68 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 446,853.99 TOTAL: $ 829,871.69 (+) MAS 16% IVA: $ 132,779.47 TOTAL: $ 962,651.16 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $
38,301.77 SALDO LIQUIDO: $ 924,349.39" ValorUnitario="829871.69" Importe="829871.69" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="829871.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="132779.47"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="132779.47">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="132779.47" Base="829871.69"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A8ED6977-248E-4444-B65B-DB7C8C47F2B4"
FechaTimbrado="2025-07-04T09:19:58" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="h3hMdpdtrKtJP3idf/NBxqrkrkb1esJAvxmsuHPHyULJW79kJM8ogpkyH8FriK3uGlXnjS8hT7FowMw0uAxe5y2601gi1tJxnrryFPbWy/Vjy4bcRuz6W0856zjN1SepUZvD0CDTJ
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="UtTophMNY4WyrRkGRMJGtfQhb1UJGAacfPRMdn4WJpxP/q2M7tqbNwNlLP+i0pZCv0vhbBmsmMzdkv1xxZ1JZpS56oDj45DB56eWuCh0BqJafbrzjXuhlywIgnNyeD1eTsvGuUrI
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Fecha: 14-may-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. C.P. 81320
TELÉFONO: 0 **CEL:** 668 861 92 28
R.F.C. CAM-871226-MS5

ESTIMACIÓN No: 04 (NORMAL)
PERIODO DE ESTIMACIÓN:
DEL 22-abr-25
AL 14-may-25
FECHA DE CONTRATO: 10-feb-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO **LOCALIDAD:** MUNICIPIO: BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
INICIO: 14-feb-25
TERMINACIÓN: 13-jun-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-LP-GC-001/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$8,124,792.96	\$9,424,759.83	\$3,298,665.94	\$9,424,759.83

BUENO POR: \$ 924,349.39**RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:**

\$ 924,349.39 (SON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 04 (NORMAL)

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 446,853.99	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 1,276,725.68
MAS I.V.A.:	\$ 71,496.64	MAS I.V.A 16 %	\$ 204,276.11
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 518,350.63	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 1,481,001.79
3 % SVIFYC:	\$ 38,301.77	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 556,652.40
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 556,652.40		
		SALDO A PAGAR:	\$ 924,349.39

ELABORO

C. JOSE EFREN JIMES BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ A. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

SUPLENTE RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

Control de Estimaciones**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	Estimación:
			Fecha: 14 de mayo de 2025	04 (NORMAL)
Periodo de la estimación:	22/04/2025	al	14/05/2025	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	14/02/2025	al	13/06/2025	MBGBR-LP-GC-001/2025
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo
\$ 9,424,759.83		\$ 8,124,792.96		\$ 3,298,665.94
				Importe Anticipo sin I.V.A
				\$ 2,843,677.53
				% de Avance
				16%
				% Avance Total
				59%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 1,276,725.68	ESTA ESTIMACION
\$ 518,350.63	16 % I.V.A (+) \$ 204,276.11	\$ 1,481,001.79
	Sub- Total A (=) \$ 1,481,001.79	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$ 446,853.99	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 1,439,150.51	16 % I.V.A (+) \$ 71,496.64	\$ 4,111,858.59
	Total (=) \$ 518,350.63	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 829,871.69	TOTAL ACUMULADO.
\$ 1,957,501.14	16 % I.V.A (+) \$ 132,779.47	\$ 5,592,860.38
	Total (=) \$ 962,651.16	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 38,301.77	CONTRATADO
\$ 3,298,665.94	Total Deducciones (=) \$ 38,301.77	\$ 9,424,759.83
	Importe T O T A L \$ 924,349.39	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 924,349.39	SALDO
\$1,341,164.80	Son: (SON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.)	\$ 3,831,899.45

ELABORO

C.JOSÉ EFRÉN URIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81326

FECHA: 14/05/2025

CONTRATISTA:

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA.
C P 81320

R.F.C.

CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

ESTADO DE CUENTA

			LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		04 (NORMAL)						
DESCRIPCIÓN:			CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.												
FECHA INICIO CONTRATO:		14-feb-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:		13-jun-25	CONTRATO:		MBGBR-LP-GC-001/2025		FECHA CONTRATO:		10-feb-25			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$8,124,792.96		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:											
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,298,665.94		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:				AL							
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,424,759.83		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:				IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$9,424,759.83					
No. DE ESTIMACIÓN		PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN		IMPORTE SIN IVA		3 % SVIFYC:		AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%		TOTAL DEDUCCIONES		LIQUIDO A PAGAR	
01 (NORMAL)		14-feb-25	14-mar-25	\$ 842,815.17		\$ 726,564.80		\$ 21,796.94		\$ 294,985.31		\$ 316,782.25		\$ 526,032.92	
02 (NORMAL)		15-mar-25	14-abr-25	\$ 1,035,061.61		\$ 892,294.49		\$ 26,768.83		\$ 362,271.56		\$ 389,040.39		\$ 646,021.22	
03 (NORMAL)		15-abr-25	21-abr-25	\$ 2,233,981.81		\$ 1,925,846.39		\$ 57,775.39		\$ 781,893.64		\$ 839,669.03		\$ 1,394,312.78	
04 (NORMAL)		22-abr-25	14-may-25	\$ 1,481,001.79		\$ 1,276,725.68		\$ 38,301.77		\$ 518,350.63		\$ 556,652.40		\$ 924,349.39	
TOTALES:				\$ 5,592,860.38		\$ 4,821,431.36		\$ 144,642.93		\$ 1,957,501.14		\$ 2,102,144.07		\$ 3,490,716.31	
SALDO DEL CONTRATO:				\$3,831,899.45		SALDO POR AMORTIZAR:				\$1,341,164.80					

ELABORAO


C. JOSÉ EFRÉN URIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA

14/05/2025

CONTRATISTA:**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.****DEPENDENCIA:****MUNICIPIO DE BADIRAGUATO****DOMICILIO:**MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.****R.F.C.****CAM-871226-MS5****RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	04 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$8,124,792.96
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,298,665.94
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,424,759.83

OBRA	IMPORTE
OBRA CIVIL	
CIMENTACIONES Y CONCRETOS	\$ 338,928.74
MUROS	\$ 19,799.34
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -
ESTRUCTURA METALICA	\$ 917,997.60
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 1,276,725.68
SUB TOTAL=	\$ 1,276,725.68
I.V.A AL 16 %	\$ 204,276.11
TOTAL =	\$ 1,481,001.79

ELABORÓ


C. JOSÉ EFRÉN URIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZÓ

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA 14/05/2025
HOJA: HOJA:1 DE 2

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	04 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$8,124,792.96
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,298,665.94
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,424,759.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA	HASTA	EXCEDENTE	DE ESTA	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL	ESTA ESTIM	ESTIM ANT		ESTIMACION	
	OBRA CIVIL									
	CIMENTACIONES Y CONCRETOS									
GBR085	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	756.35	\$ 585.80	\$ 443,069.83	578.57	0.00	0.00	578.57	\$ 338,928.74
GBR086	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,068.01	\$ 681.80	\$ 726,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
						TOTAL DE CIMENTACIONES Y CONCRETOS:				\$ 338,928.74
	MUROS									
GBR033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	598.63	\$ 523.10	\$ 313,143.35	324.12	286.27	0.00	37.85	\$ 19,799.34
						TOTAL DE MUROS:				\$ 19,799.34
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
GP230	SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, SOPORTES, ABRAZADERAS, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, FIJACIÓN, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	55.00	\$ 1,973.58	\$ 108,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
						TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS:				\$ -
	ESTRUCTURA METALICA									
GBR703	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA, INCLUYE: CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUJECIÓN DE POLIN A BASE DE ANGULAR 2"x3/16", FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA	6.00	\$ 183,599.52	\$ 1,101,597.12	6.00	1.00	0.00	5.00	\$ 917,997.60

ELABORO


C.JOSÉ EFRÉN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. ROBERTO RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81329

FECHA: 14/05/2025
HOJA: HOJA:2 DE:2

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA, C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	04 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$8,124,792.96
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,298,665.94
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,424,759.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GBR706	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLINES PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML	3,122.00	\$ 361.24	\$ 1,127,791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GBR707	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS A 6.00 MTS EL CONCEPTO INCLUYE. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	1,669.44	\$ 605.99	\$ 1,011,663.95	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE ESTRUCTURA METALICA:										\$ 917,997.60

TOTAL ESTIMACION	\$ 1,276,725.68
I.V.A.	\$ 204,276.11
TOTAL	\$ 1,481,001.79

ELABORO

C.JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ RAFAEL CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
	OBRA CIVIL								
	CIMENTACIONES Y CONCRETOS								
GBR085	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2				AREA	35.60		SANITARIO HOMBRES
						AREA	35.60		SANITARIO MUJERES
						AREA	8.81		PASILLO
						AREA	21.45		VESTIDOR
						AREA	33.22		VESTIDOR
						AREA	14.43		PASILLO
						AREA	34.49		VESTIDOR
						AREA	23.85		VESTIDOR
						AREA	17.23		ENFERMERIA
						AREA	48.96		CAFETERIA
						AREA	48.96		TEBACAS SHOP
						AREA	42.56		BODEGAS GRADAS B
						AREA	42.56		BODEGAS GRADAS B
						AREA	77.90		ACCESO ENTRADA A
						AREA	92.95415		LADO B
							TOTAL	578.57	
GBR086	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	

ELABORO

 ING. ORLANDO LÓPEZ GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
	MUROS								
GBR033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	3.9178			1.00	3.92		LADO "D" (CAFETERIA)
			5.07			1.00	5.07		
			13.02			1.00	13.02		LADO "D" (TEBACAS SHOP)
			13.02			1.00	13.02		
			2.82			1.00	2.82		
							TOTAL	37.85	
	INSTALACIONES ELECTRICAS								
GP230	SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, SOPORTES, ABRAZADERAS, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, FIJACIÓN, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL				NO SE EJECUTO	0.00		
							TOTAL	0.00	
	ESTRUCTURA METALICA								
GBR703	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA, INCLUYE: CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUJECCIÓN DE POLIN A BASE DE ANGULAR 2"x3/16", FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	PZA				5.00	5.00		
							TOTAL	5.00	

ELABORO

ING. ORLANDO LAZARTE GARCIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GBR706	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLINES PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	
GBR707	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS A 6.00 MTS EL CONCEPTO INCLUYE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	

ELABORO

 ING. ORLANDO LAMARCA CERVANTES
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

 REVISÓ
 Brce

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 14/05/2025

 DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**
CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


 CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**

OBRA:

 ESTIMACION: **04 (NORMAL)**
OBRA CIVIL
CIMENTACIONES Y CONCRETOS

GBR085

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

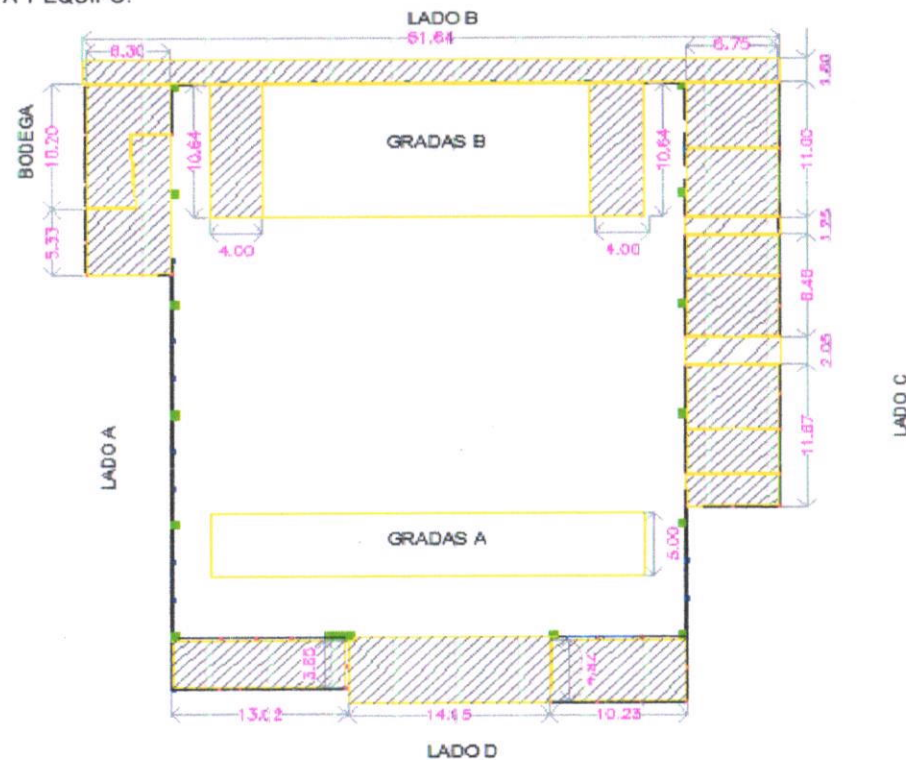

ELABORO

 ING. ORLANDO LAUREANO GARCIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

B. S. O.

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 14/05/2025

 DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**
CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


 CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**

OBRA:

 ESTIMACION: **04 (NORMAL)**
MUROS

GBR033

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

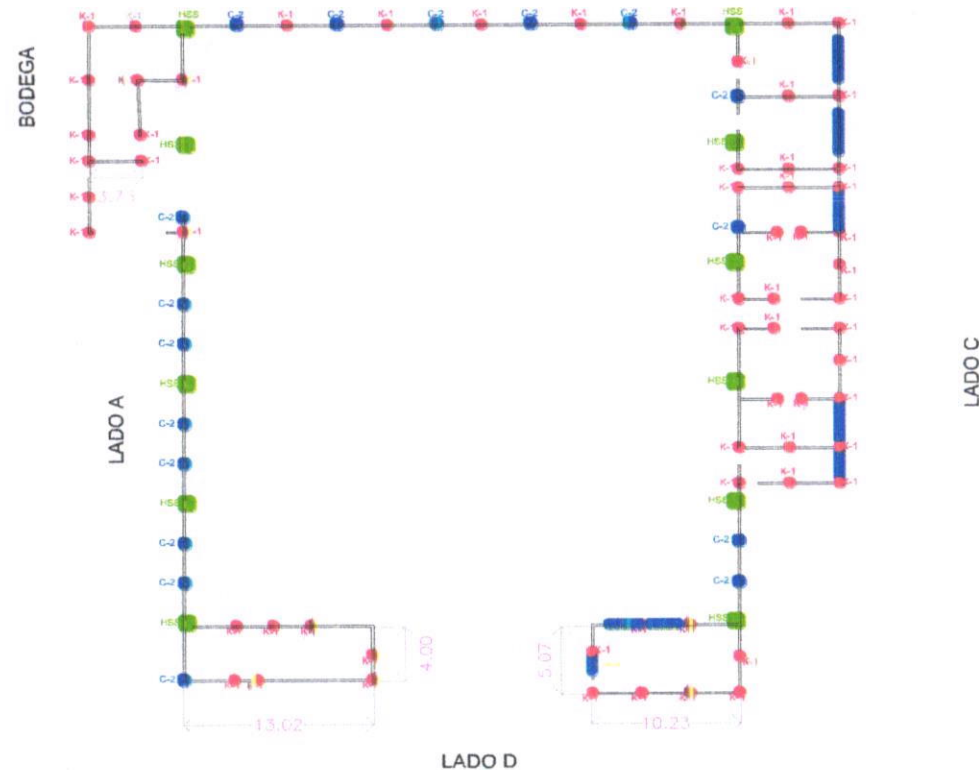

ELABORO

 ING. ORLANDO LADRONEROS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 14/05/2025

 DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**
CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "AREÑA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

 CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**


OBRA:

 ESTIMACION: **04 (NORMAL)**
ESTRUCTURA METALICA



GBR703

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA, INCLUYE: CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUJECIÓN DE POLIN A BASE DE ANGULAR 2"x3/16", FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

LADO B

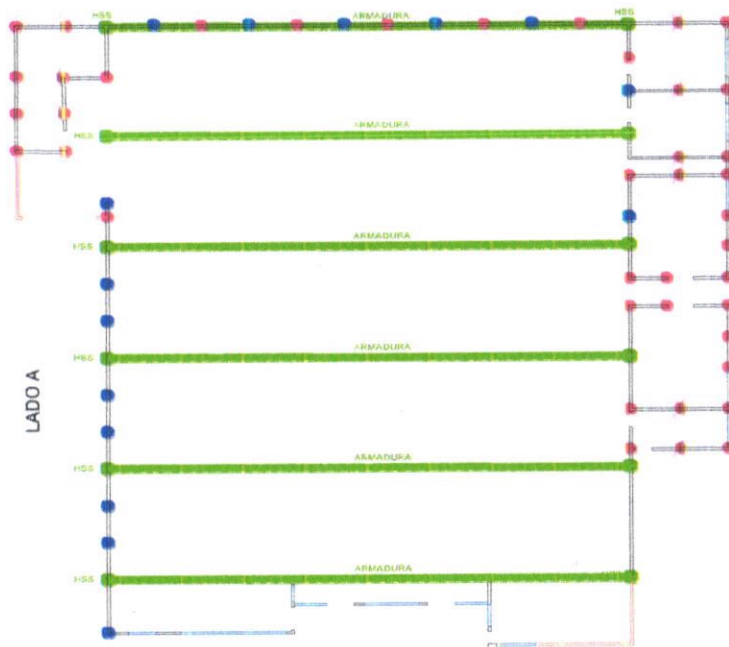

LADO D

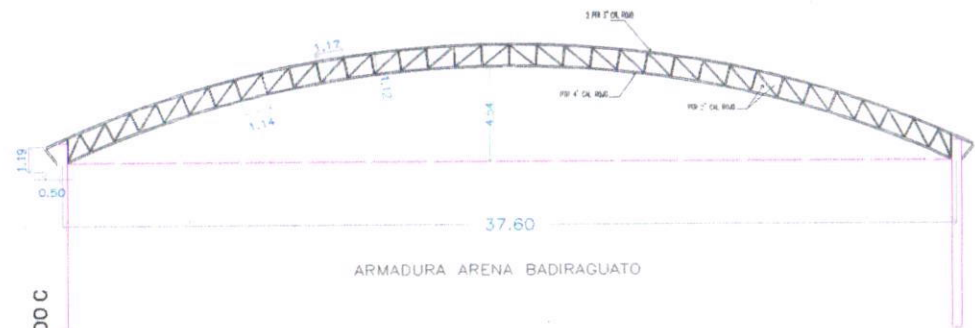

ELABORO

 ING. ORLANDO LAZARTE CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

Br

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 14/05/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

REPORTE FOTOGRAFICO




CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.** OBRA:

ESTIMACION: **04 (NORMAL)**

**OBRA CIVIL
CIMENTACIONES Y CONCRETOS**

GBR085 FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

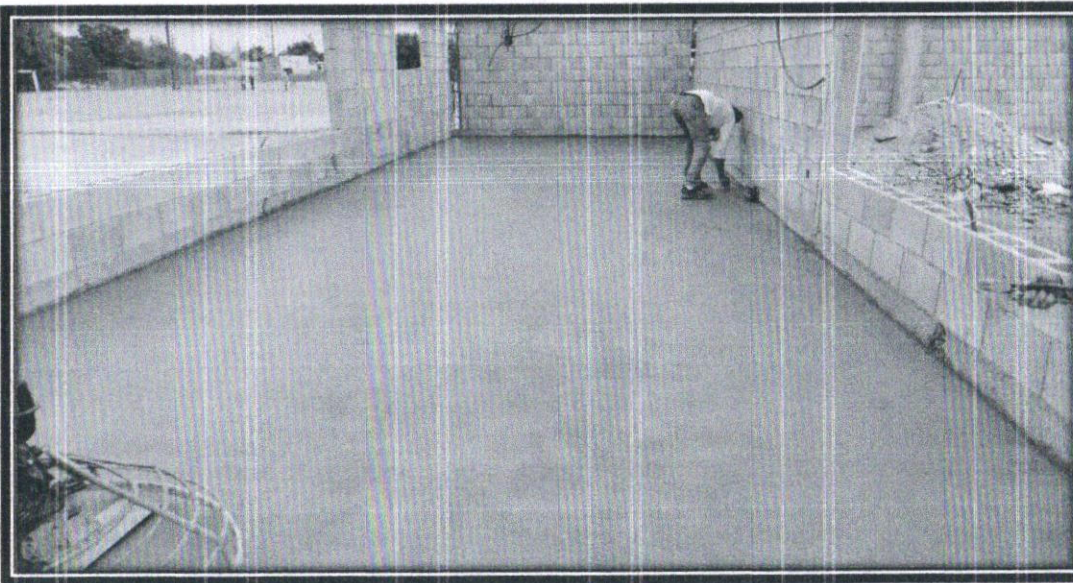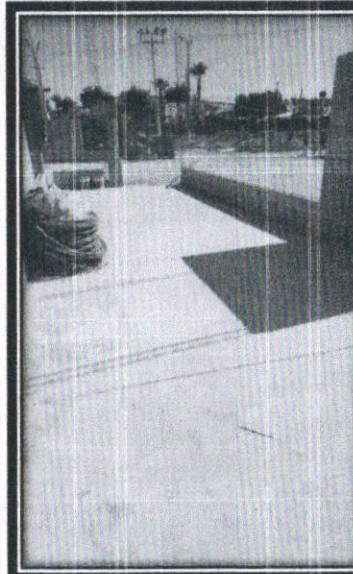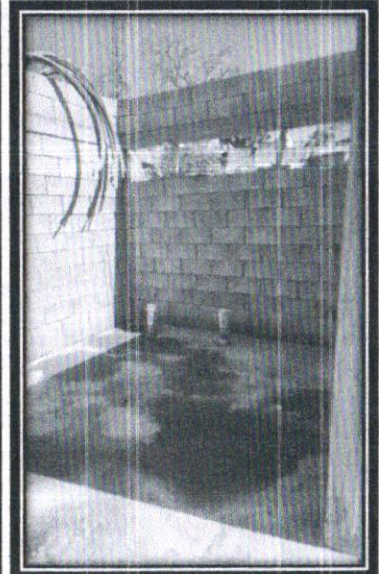

ELABORO

ING. ORLANDO LAURENCE VIVERANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

Br

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

R

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 14/05/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.



CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**

OBRA:

ESTIMACION: **04 (NORMAL)**

MUROS

GBR033 **FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA**

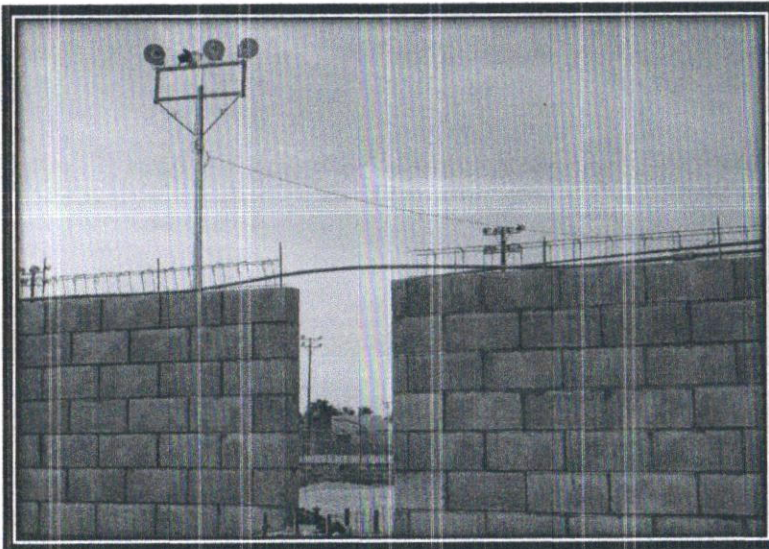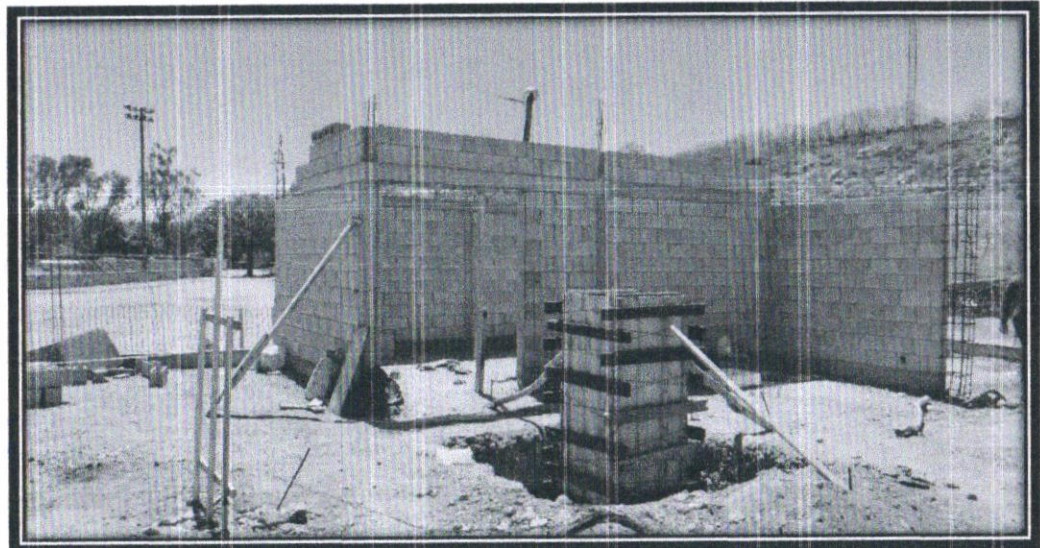

ELABORO

ING. ORLANDO MUÑOZ SERRANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

Bsd

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

FECHA: 14/05/2025

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y**
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN **OBRA:**
S.A. DE C.V.


ESTIMACION: 04 (NORMAL)

INSTALACIONES ELECTRICAS

GP230 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO A BASE DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, SOPORTES, ABRAZADERAS, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, FIJACIÓN, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

ESTRUCTURA METALICA

GBR703 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA, INCLUYE: CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUJECCIÓN DE POLIN A BASE DE ANGULAR 2"x3/16", FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

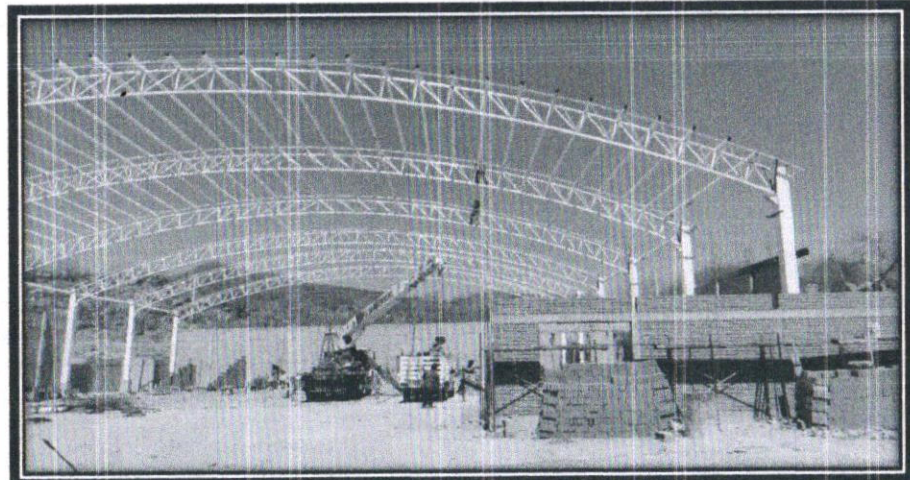

ELABORO

ING. ORLANDO ALONSO CERVANTES
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

Br sd

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

26/5/25, 12:24

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

26/05/2025 1:24:50 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 02 EXTR LP 001

Importe de la operación: 924,349.39 MXP

Cuenta de retiro: 0117899246

Cuenta de depósito: 002743700452705974

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONST

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 26/05/2025

Fecha de aplicación: 26/05/2025

Concepto de pago: EST 02 EXTR LP 001

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 13:24:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000619446

Clave de rastreo: 002601002505260000619446

Folio de firma: 0064560060

Folio único: I401202505261324400064560066

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	26/05/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/05/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
