



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/300/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACIÓN

05 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 14 de Junio de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE **ESTIMACIÓN 05 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZARÁ LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO **SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO NÚMERO 77 (SETENTA Y SIETE) DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-LP-GC-001/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$9,424,759.83 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 05 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$ 1,553,150.50 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 50/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CAM-871226-MS5
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4, 5 Y 6 MANZANA 18, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320.
- **FACTURA:** # -141, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.C.P. ARCHIVO.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

RFC: CAM871226MSS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 81320

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

- 141
13/6/2025 11:12:53

Datos del cliente

Cliente:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	Uso CFDI:	101 - Construcciones.
R.F.C.:	MBA850101214	Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal:	80500		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	SERVICIO ESTIMACION 05 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-GC-001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 9,424,759.83 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 2,145,235.49 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 750,832.42 TOTAL: \$ 1,394,403.07 (+) MAS 16% IVA: \$ 223,104.49 TOTAL: \$ 1,617,507.56 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 64,357.06 SALDO LIQUIDO: \$ 1,553,150.50	1,394,403.07	002 - IVA - 223,104.49	1,394,403.07

Importe con letra

UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 56/100 M.N.

Subtotal	1,394,403.07
Impuestos Traslados	223,104.49
Ret. Local 3% SVICUT	0.00
Total	1,617,507.56

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000714582475
Folio fiscal D33C4251-5C1B-4CDC-BB43-DE60AF0B7C01
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Junio 14 2025 - 12:07:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cc9Z4IGHzK6QAd2emlF46X/R76nn3x0rijDPZcJkK8ZS7XatP4QbZs1uQqE4oGQhQsGA13EXU6rjXo7nLpUJ3
X3zQkdj1M0B2gf9IbybPjKUX5nS0X3f4jW9AWcJ6S1XtqmyAuN7H0ZdGgsvkDKweaL29I3OrbqePHnqQV1r7U4
D+4UQPs6X0IT0Xqim0njPiZoo8oroCp0D0xl+pGsZAc4/iijUpY0xQsalkZL1SsSRFngiancU4AQvxXlQpMvp
6R7XHghheBZ7x6JGS3XjPeTiArMQ7Bmxb83cPH5CvS5D1hceoiaprOb7fvjVCNq6E/viOPTkOoRTuFIQxEw==

Sello del SAT

Svsg2PVBFSIPT/3aYrezkpzHHXbdL30Rg+XNpJWzcydr7kAkjHBRZ2Zf9p+kuP0iVHXc9n2uRwwCSXNd
fDTgvynNe07ofOW5HCAynRjsJkDUnCNXdXBJp3IgBQJXZkoOylzW1c0vgAVGGTzyXjixwT2TUAhy9T6
IDjNDyl3uCBcVVSj7uo/wr42PcSPQ7N444se8Jr4gl1o//9gJAxmyZ5v44PMkYX/fvfabC1y4zj2M4/a
Ghi2oCwaTg64Ii9KMm6V+9bejHhMQ97WvB8Nrenki9W2urCMObQF0t/XVzNizvKdZKrTgQg/yUg5Ad
6pJmpAcsVxRwJ7tpuXhJ/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1:1]D33C4251-5C1B-4CDC-BB43-DE60AF0B7C01|2025-06-14T12:07:55|MAS0810247C0|cc9Z
4IGHzK6QAd2emlF46X/R76nn3x0rijDPZcJkK8ZS7XatP4QbZs1uQqE4oGQhQsGA13EXU6rjXo7nLpU
J3XzQkdj1M0B2gf9IbybPjKUX5nS0X3f4jW9AWcJ6S1XtqmyAuN7H0ZdGgsvkDKweaL29I3OrbqePHnq
qZV1r7U4D+4UQPs6X0IT0Xqim0njPiZoo8oroCp0D0xl+pGsZAc4/iijUpY0xQsalkZL1SsSRFngian
cU4AQvxXlQpMvp6R7XHghheBZ7x6JGS3XjPeTiArMQ7Bmxb83cPH5CvS5D1hceoiaprOb7fvjVCNq6E
/viOPTkOoRTuFIQxEw==|00001000000709182898|]

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="141" Fecha="2025-06-
13T11:12:53"
Sello="cc9Z4lGHZK6QAd2emlF46X/R76nn3x0riJDPZcJKK8Z57XatP4QbZs1uQQE4oGQhQ5sGA13EXU6rjXo7nLpUJ3XzQKdj1M0B2gf9iybyPJkUX5nS0X3f4jW9AWcJ6S1XtqmyAuN7H0ZdG
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000714582475"
Certificado="MIIGjzCCBHEgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA3MTQ1ODI0NzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJ
SubTotal="1394403.07" Moneda="MXN" Total="1617507.56" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="81320">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="CAM871226MS5" Nombre="COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="S01" Descripcion="SERVICIO ESTIMACION
05 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-GC-001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 9,424,759.83 IMPORTE DE ESTA
ESTIMACION: $ 2,145,235.49 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 750,832.42 TOTAL: $ 1,394,403.07 (+) MAS 16% IVA: $ 223,104.49 TOTAL: $ 1,617,507.56
DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 64,357.06 SALDO LIQUIDO: $ 1,553,150.50" ValorUnitario="1394403.07" Importe="1394403.07" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1394403.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="223104.49"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="223104.49">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="223104.49" Base="1394403.07"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D33C4251-5C1B-4CDC-BB43-
DE60AF087C01" FechaTimbrado="2025-06-14T12:07:55" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="cc9Z4lGHZK6QAd2emlF46X/R76nn3x0riJDPZcJKK8Z57XatP4QbZs1uQQE4oGQhQ5sGA13EXU6rjXo7nLpUJ3XzQKdj1M0B2gf9iybyPJkUX5nS0X3f4jW9AWcJ6S1XtqmyAuN
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="Svsg2PVBf51PT/3aYrezkzpxHxHbdL30Rg+XNpJwzcydr7kAkjHBRZ2Zf9p+kuP01VHxC9n2uRwC5XNdfDTgvynNe07ofOWSHCAynRjsJkDUNCNXdXBj3p3IgBQJXZkoOyIzW1c1
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Fecha: 25-may-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN No: 05 (NORMAL)	
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 0		DEL	15-may-25
CEL: 668 861 92 28		AL	25-may-25
R.F.C. CAM-871226-MS5		FECHA DE CONTRATO:	
		10-feb-25	
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	LOCALIDAD: MUNICIPIO: BADIRAGUATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		INICIO:	14-feb-25
		TERMINACIÓN:	13-jun-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No: MBGBR-LP-GC-001/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$8,124,792.96	\$9,424,759.83	\$3,298,665.94	\$9,424,759.83
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:			BUENO POR: \$ 1,553,150.50
\$ 1,553,150.50 (SON UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 05 (NORMAL)			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 750,832.42	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 2,145,235.49
MAS I.V.A.:	\$ 120,133.19	MAS I.V.A 16 %	\$ 343,237.68
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 870,965.61	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 2,488,473.17
3 % SVIFYC:	\$ 64,357.06	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 935,322.67
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 935,322.67		
SALDO A PAGAR:		\$ 1,553,150.50	

ELABORO


C. JOSÉ EFREN LURIAZ BOJORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBÉN RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Control de Estimaciones**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	Estimación:
			Fecha: 25 de mayo de 2025	05 (NORMAL)
Periodo de la estimación:	15/05/2025	al	25/05/2025	Localidad:
Periodo de Ejecución:	14/02/2025	al	13/06/2025	BADIRAGUATO
Importe del contrato con I.V.A:	\$ 9,424,759.83	Imp. Contratado sin I.V.A	\$ 8,124,792.96	Anticipo
			\$ 3,298,665.94	Importe Anticipo sin I.V.A
				\$ 2,843,677.53
				% de Avance
				26%
				% Avance Total
				86%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 2,145,235.49	ESTA ESTIMACION
\$ 870,965.61	16 % I.V.A (+) \$ 343,237.68	\$ 2,488,473.17
	Sub- Total A (=) \$ 2,488,473.17	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 750,832.42	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 120,133.19	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 1,957,501.14	Total (=) \$ 870,965.61	\$ 5,592,860.38
	Importe TOTAL \$ 1,394,403.07	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 223,104.49	TOTAL ACUMULADO.
\$ 2,828,466.75	Total (=) \$ 1,617,507.56	\$ 8,081,333.55
	3 % SVIFYC: \$ 64,357.06	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 64,357.06	CONTRATADO
\$ 3,298,665.94	Importe T O T A L \$ 1,553,150.50	\$ 9,424,759.83
	NETO A PAGAR \$ 1,553,150.50	
SALDO DEL ANTICIPO	Son:	SALDO
\$470,199.19	(SON UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.)	\$ 1,343,426.28

ELABORO

C. JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/05/2025

CONTRATISTA:

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

R.F.C.

CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.**ESTADO DE CUENTA**

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	05 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
FECHA INICIO CONTRATO:	14-feb-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	13-jun-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-GC-001/2025
				FECHA CONTRATO:	10-feb-25

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$8,124,792.96	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,298,665.94	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,424,759.83	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:	IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$9,424,759.83

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	14-feb-25	14-mar-25	\$ 842,815.17	\$ 726,564.80	\$ 21,796.94	\$ 294,985.31	\$ 316,782.25	\$ 526,032.92
02 (NORMAL)	15-mar-25	14-abr-25	\$ 1,035,061.61	\$ 892,294.49	\$ 26,768.83	\$ 362,271.56	\$ 389,040.39	\$ 646,021.22
03 (NORMAL)	15-abr-25	21-abr-25	\$ 2,233,981.81	\$ 1,925,846.39	\$ 57,775.39	\$ 781,893.64	\$ 839,669.03	\$ 1,394,312.78
04 (NORMAL)	22-abr-25	14-may-25	\$ 1,481,001.79	\$ 1,276,725.68	\$ 38,301.77	\$ 518,350.63	\$ 556,652.40	\$ 924,349.39
05 (NORMAL)	15-may-25	25-may-25	\$ 2,488,473.17	\$ 2,145,235.49	\$ 64,357.06	\$ 870,965.61	\$ 935,322.67	\$ 1,553,150.50
TOTALES:			\$ 8,081,333.55	\$ 6,966,666.85	\$ 208,999.99	\$ 2,828,466.75	\$ 3,037,466.74	\$ 5,043,866.81
SALDO DEL CONTRATO:			\$1,343,426.28	SALDO POR AMORTIZAR:		\$470,199.19		

ELABORO

C. JOSÉ EFREN URTAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVIÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA

25/05/2025

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.
DE C.V.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.**

R.F.C.

CAM-871226-MS5

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

ELABORO


C. JOSÉ EFRÉN URIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVIEW

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/05/2025
HOJA: HOJA:1 DE:1

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MSS

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LÓCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	05 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$8,124,792.96
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,298,665.94
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,424,759.83

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA	HASTA	EXCEDENTE	DE ESTA	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL	ESTA ESTIM	ESTIM ANT		ESTIMACIÓN	
	OBRA CIVIL									
	MUROS									
GBR033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	598.63	\$ 523.10	\$ 313,143.35	335.17	324.12	0.00	11.05	\$ 5,780.26
								TOTAL DE MUROS: \$ 5,780.26		
	ESTRUCTURA METALICA									
GBR706	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLINES PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML	3,122.00	\$ 361.24	\$ 1,127,791.28	3,122.00	0.00	28.00	3,122.00	\$ 1,127,791.28
GBR707	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS A 6.00 MTS EL CONCEPTO INCLUYE. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	1,669.44	\$ 605.99	\$ 1,011,663.95	1,669.44	0.00	154.86	1,669.44	\$ 1,011,663.95
								TOTAL DE ESTRUCTURA METALICA: \$ 2,139,455.23		

TOTAL ESTIMACION	\$ 2,145,235.49
I.V.A.	\$ 343,237.68
TOTAL	\$ 2,488,473.17

ELABORÓ
C. JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO
ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBÉN RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

05 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
	OBRA CIVIL								
	MUROS								
GBR033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	5.08			1.00	5.08		LADO "D" (CAFETERIA)
			10.09			1.00	10.09		
			4.92			1.00	4.92		
			8.96			1.00	8.96		
			12.20			1.00	12.20		LADO "D" (TEBACAS SHOP)
			3.91			1.00	3.91		
			3.74			1.00	3.74		
							TOTAL	48.90	
							EN ESTIMACIÓN 04(NORMAL)	37.84844	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	11.05	
	ESTRUCTURA METALICA								
GBR706	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLINES PARA ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML	45.00			70.00	3,150.00		
							TOTAL	3,150.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	3,122.00	
							ADICIONAL	28.00	
GBR707	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS A 6.00 MTS EL CONCEPTO INCLUYE. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	45.00	40.54			1,824.30		
							TOTAL	1,824.30	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	1,669.44	
							ADICIONAL	154.86	

ELABORO

REVISÓ

Brsd

 ING. ORLANDO GARCIA GONZALEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/05/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

 CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y**
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.

OBRA:


ESTIMACION: 05 (NORMAL)

OBRA CIVIL

MUROS

GBR033

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

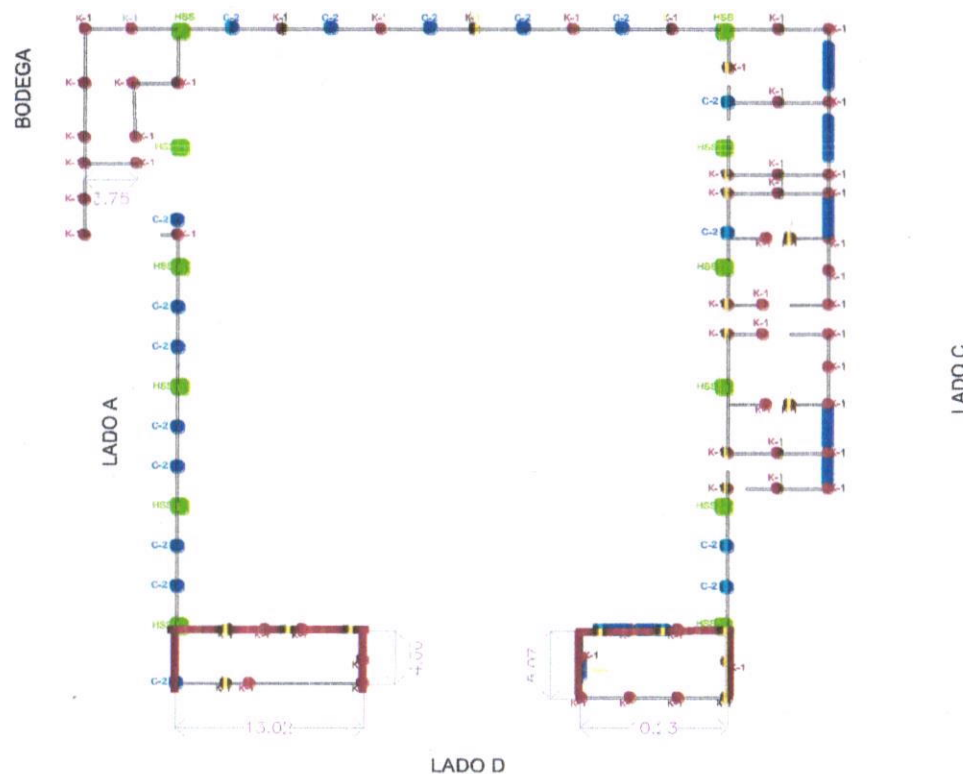

LADO D

ELABORO

 ING. ORLANDO L. RIVERA CERVANTES
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/05/2025


 DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**
CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

 CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**
OBRA:
ESTIMACION: 05 (NORMAL)
ESTRUCTURA METALICA

GBR706

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLINES PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

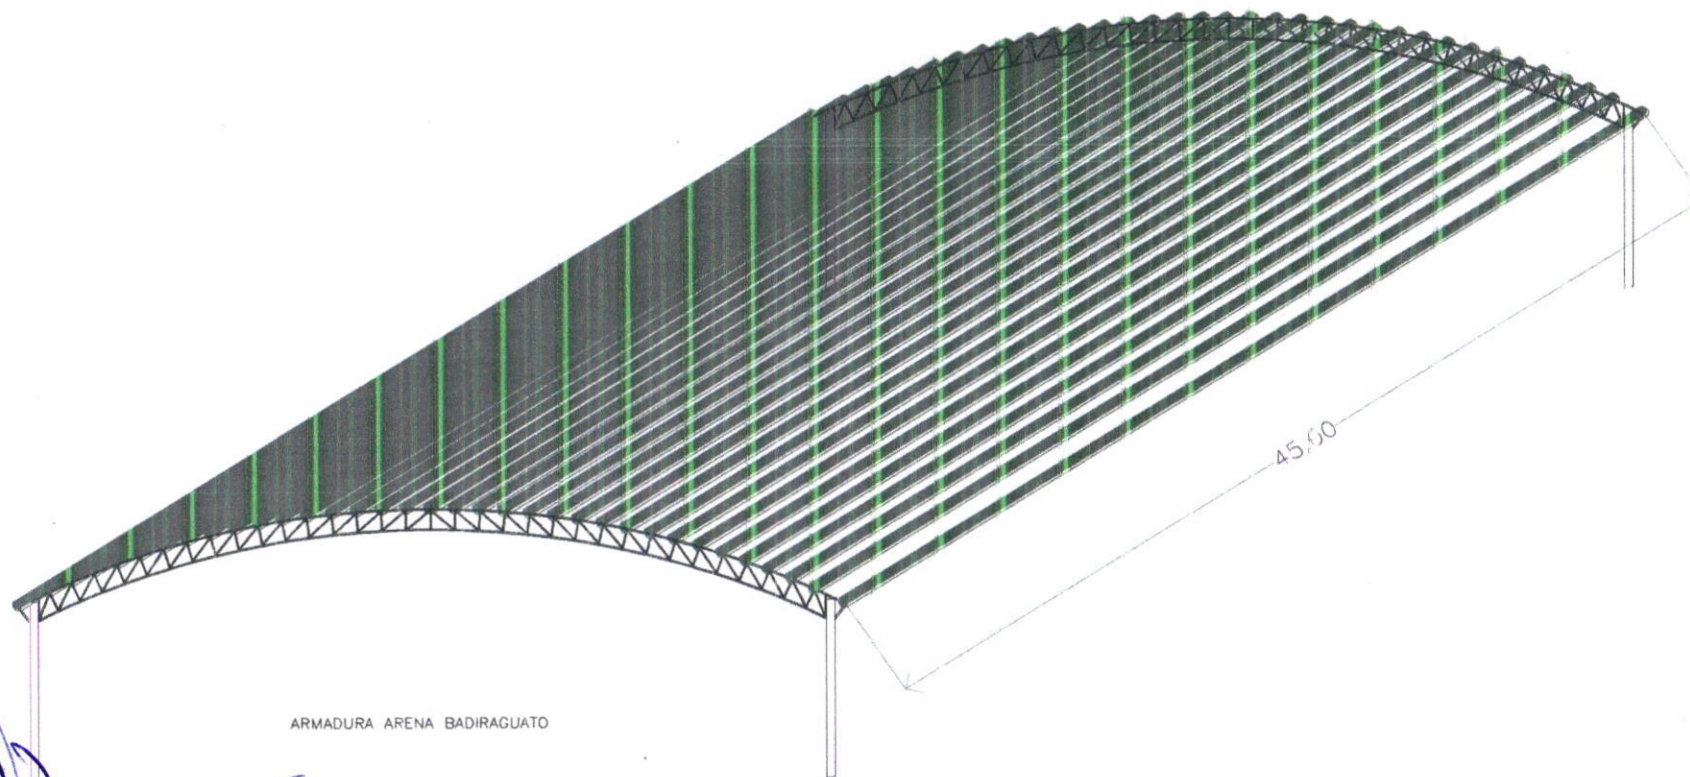

ARMADURA ARENA BADIRAGUATO

ELABORO

 ING. ORLANDO LALBA AN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHONTE, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/05/2025



 DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**
CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

 CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**
OBRA:
ESTIMACION: 05 (NORMAL)

GBR707

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS A 6.00 MTS EL CONCEPTO INCLUYE. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

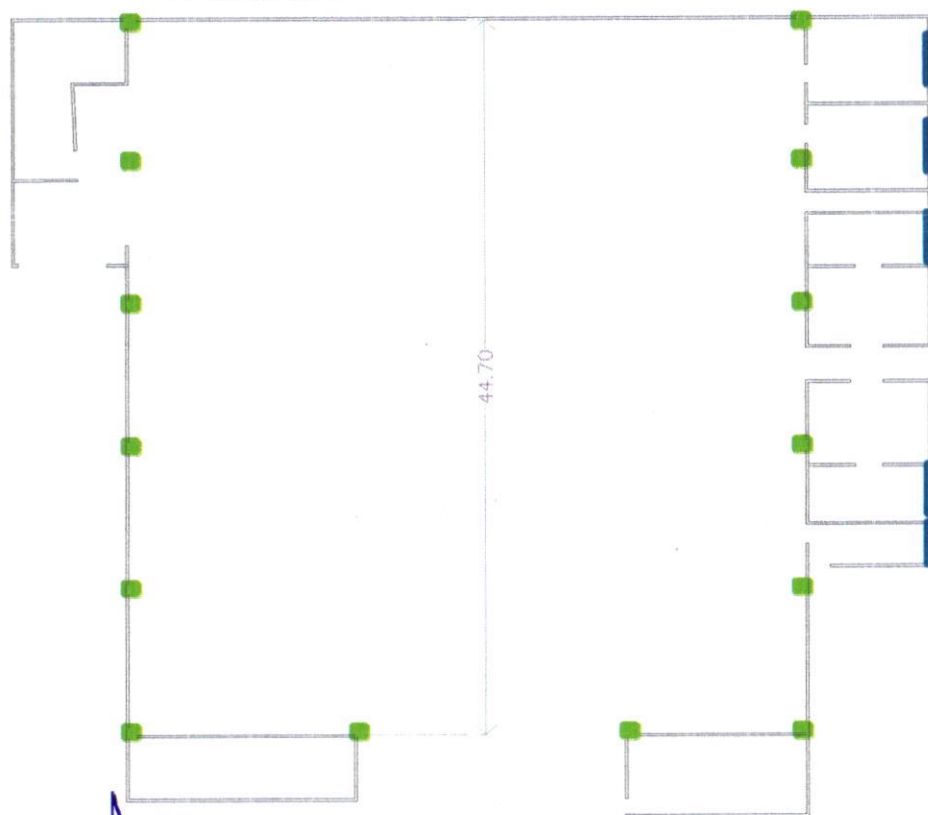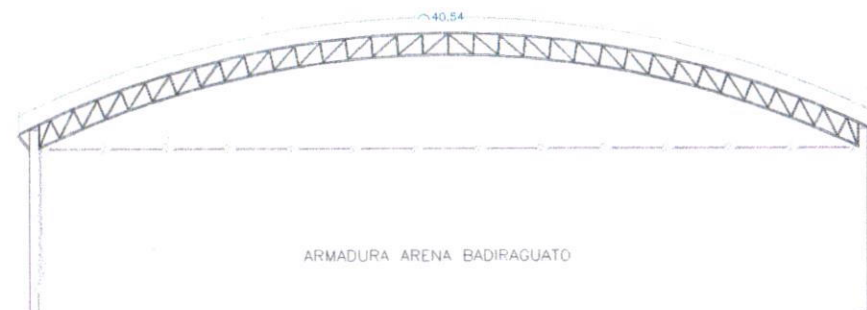

ELABORO

 ING. ORLANDO CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/05/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**





OBRA:

ESTIMACION: **05 (NORMAL)**

**OBRA CIVIL
MUROS**

GBR033

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

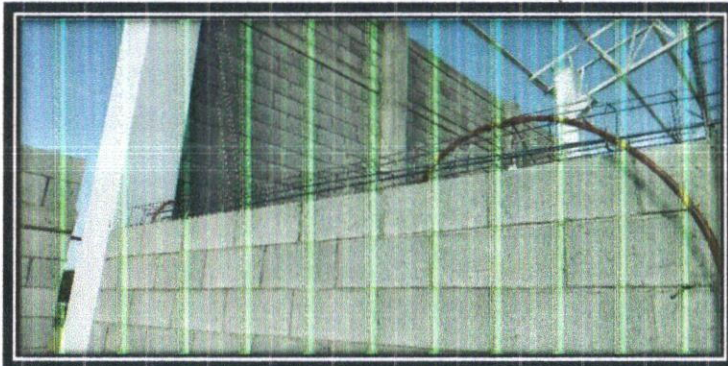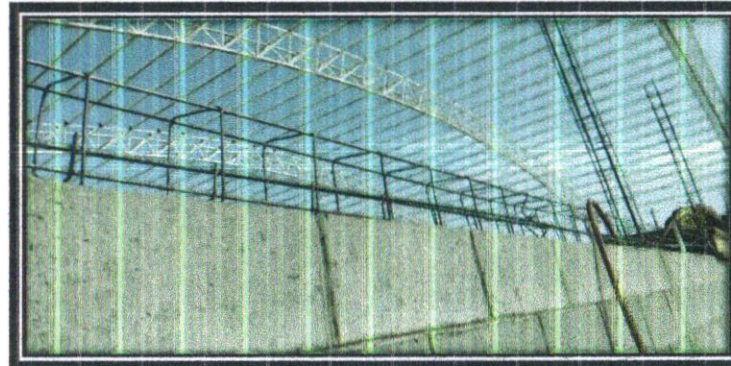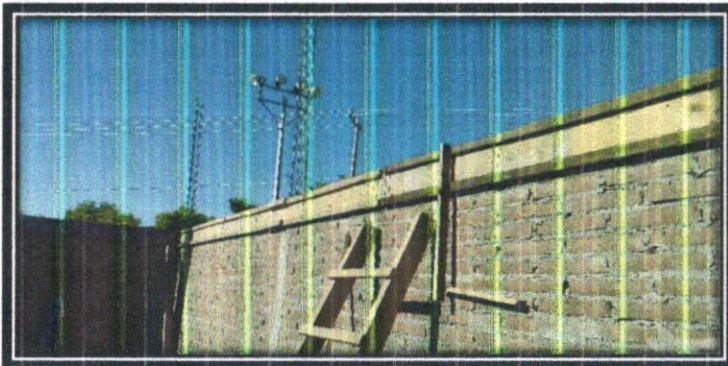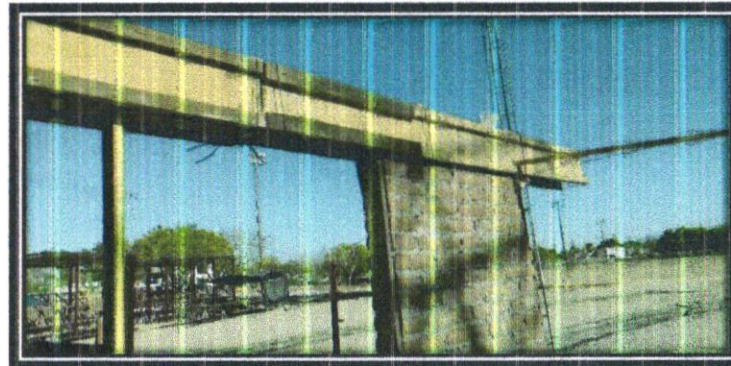

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREANO CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/05/2025

 DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**
REPORTE FOTOGRAFICO

 CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**





OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

 ESTIMACION: **05 (NORMAL)**
ESTRUCTURA METALICA

GBR706 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLINES PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO GRIS, PINTURA ESMALTE GRIS 7069 IRON ONE, SOLDADURA E-7018 6MM DE 1/4", ACARREOS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MENOR, GRÚA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.

GBR707 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 MTS A 6.00 MTS EL CONCEPTO INCLUYE. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

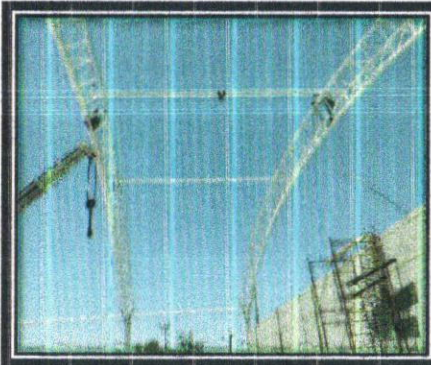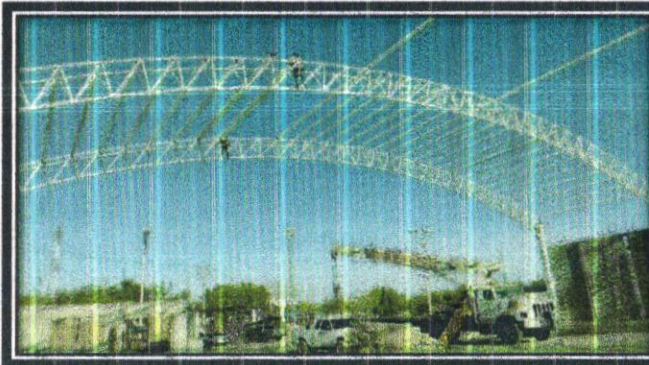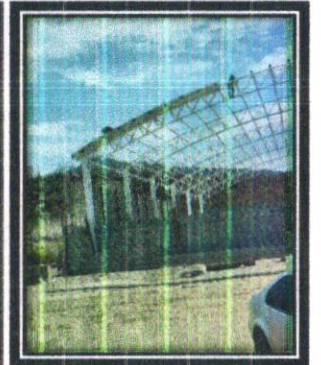

ELABORO

 ING. ORLANDO LUIS GONZALEZ GONZALEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

Brsd

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Fecha y hora de consulta

16/06/2025 9:01:38 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 05 NORM LP001

Importe de la operación: 1,553,150.50 MXP

Cuenta de retiro: 0117899246

Cuenta de depósito: 002743700452705974

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONST

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha valor: 17/06/2025

Fecha de creación: 16/06/2025

Fecha de aplicación: 16/06/2025

Concepto de pago: EST 05 NORM LP001

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 21:01:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000901965

Clave de rastreo: 002601002506170000901965

Folio de firma: 0046409023

Folio único: I401202506162101280046409029

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	16/06/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/06/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
