

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR CONCEPTO DE **ESTIMACIÓN 06 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZARÁ LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO **SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA DE CABILDO NÚMERO 77 (SETENTA Y SIETE) DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-LP-GC-001/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$9,424,759.83 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 06 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$ 596,297.20 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CAM-871226-MS5
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4, 5 Y 6 MANZANA 18, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320.
- **FACTURA:** # -145, DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

04 JUL 2025
Adrián C.
RECIBIDO
13:11 PM

C.C.P. ARCHIVO.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

RFC: CAM871226M55

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 81320

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos	Folio	- 145
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	3/7/2025 08:25:34
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica		

Datos del cliente

Cliente:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	Uso CFDI:	101 - Construcciones.
R.F.C.:	MBA850101214	Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal:	80500		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	SERVICIO ESTIMACION 06 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-GC-001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 9,424,759.83	535,349.70	002 - IVA - 85,655.95	535,349.70
				IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 823,614.93 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 288,265.23 TOTAL: \$ 535,349.70 (+) MAS 16% IVA: \$ 85,655.95 TOTAL: \$ 621,005.65 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 24,708.45 SALDO LIQUIDO: \$ 596,297.20			

Importe con letra	SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CINCO PESOS 65/100 M.N.	Subtotal	535,349.70
		Impuestos Traslados	85,655.95
		Ret. Local 3% SVICUT	0.00
		Total	621,005.65

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

Fecha y hora de certificación

00001000000714582475

9AB48110-1F73-4C73-A762-BEDEF79B22DD

00001000000709182898

Julio 4 2025 - 09:20:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BYCC2MRk6rvJbIYIX/1xmjZabIZIXBYB7fwV0c2PIATJgfiHDITx0mf2enTJhx5TSXheQfUt16enlo373tUieY
FoKq3zLIHH/199MwhTyEna6i7tac5CNzqb1Jn7OPwMQFTfTnKrZNPaoJgSXEja7YSp/g517qG375FRUE2UFX
v3K6WeJuAyl0pAXnXIVbV2cyzMX/ZLXTxmFuDonWVugBZAv1puQgugJ9Mr4BdHFxQhCcZ/47TVmSRrj/mma8eg
Y6QBPBocIALnURMpXUuNVXg+OHXCxqud4z/qJo1+zzSrjPJYLxD72+OOI+OPFamfiwb3psSwZFPyU5qSc2A==

Sello del SAT

cfMV6FS1U/HINX21GkKGvtuBxOclHZSUW08RYZI/Zyyl76EnwODCpqnXiGMCoeXGHoVgKCq47PzWmZ
iw2xPXzOkTmKQ/Yq+53rj1ypIDSTUkK+KruXszMiSrFonLRGp4MYWnSnlgg5H25PhESWcsL3uXsWqufe
jY8GmsUMkHvpaOFBDUUYXZYoud3c2e4vwHqLW3CbtGa5GCA6T3L7Wug8eStWU7H7Bscz81kSP1VcFI/n
ZFuQQF/miUOFsJPcky5Q1LDq+d/eK7qoHiPAWg+urSEqK1WcdbDc//Sty4z4iHrzHXZevkbi6KopTZWP
cqLos/3eLx+7Zi5JSWxmYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|9AB48110-1F73-4C73-A762-BEDEF79B22DD|2025-07-04T09:20:38|MAS0810247C0|BYCC
2MRk6rvJbIYIX/1xmjZabIZIXBYB7fwV0c2PIATJgfiHDITx0mf2enTJhx5TSXheQfUt16enlo373tUieY
eYFoKq3zLIHH/199MwhTyEna6i7tac5CNzqb1Jn7OPwMQFTfTnKrZNPaoJgSXEja7YSp/g517qG375F
RUUE2UFXv3K6WeJuAyl0pAXnXIVbV2cyzMX/ZLXTxmFuDonWVugBZAv1puQgugJ9Mr4BdHFxQhCcZ/47
TVmSRrj/mma8egY6QBPBocIALnURMpXUuNVXg+OHXCxqud4z/qJo1+zzSrjPJYLxD72+OOI+OPFamfi
wb3psSwZFPyU5qSc2A==|00001000000709182898|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="145" Fecha="2025-07-
03T08:25:34"
Sello="BYCC2MRk6rvJbIYIX/1xmJZabIZIX8YB7fwV0c2PIAtJgfiHDITx0mf2enTJhx5TSXheQfUt16enlo373tUieYFoKq3zLlHH/i99MwhTyEna6i7tac5CNzqb1Jn70PwmQFPTfNTkRzNPaoJgSX
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000714582475"
Certificado="MIIGjzCCBHeGAWIBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQ1ODI0NzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQUJNSU5JU1RSQUJ1T04gVFJQIUVU
SubTotal="535349.70" Moneda="MXN" Total="621005.65" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="81320">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="CAM871226MSS" Nombre="COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="501" Descripcion="SERVICIO ESTIMACION 06
(NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-LP-GC-001/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 9,424,759.83 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $
823,614.93 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 288,265.23 TOTAL: $ 535,349.70 (+) MAS 16% IVA: $ 85,655.95 TOTAL: $ 621,005.65 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $
24,708.45 SALDO LIQUIDO: $ 596,297.20" ValorUnitario="535349.70" Importe="535349.70" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="535349.70" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="85655.95"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="85655.95">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="85655.95" Base="535349.70"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="9A848110-1F73-4C73-A762-BEDEF79B22DD"
FechaTimbrado="2025-07-04T09:20:38" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="BYCC2MRk6rvJbIYIX/1xmJZabIZIX8YB7fwV0c2PIAtJgfiHDITx0mf2enTJhx5TSXheQfUt16enlo373tUieYFoKq3zLlHH/i99MwhTyEna6i7tac5CNzqb1Jn70PwmQFPTfNTkRzN
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="cfMV6FS1U/HINX21GkKGvtuBx0c1HZSUW08RYZI/Zyyz176Enw0DCpqnX1GMC0eXGHOvgKQcp47PzWmZiw2xPxZ0kTmKQ/Yq+53rj1ypIDSTUKk+KruXszMiSrFonLRGp4MYWnSnIgg
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Fecha: 13-jun-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. C.P. 81320
TELÉFONO: 0 **CEL:** 668 861 92 28
R.F.C.
CAM-871226-MS5

ESTIMACIÓN No: 06 (NORMAL)**PERIODO DE ESTIMACION:****DEL** 26-may-25**AL** 13-jun-25**FECHA DE CONTRATO:**

10-feb-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO **LOCALIDAD:** MUNICIPIO: BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. BADIRAGUATO

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**INICIO:** 14-feb-25**TERMINACIÓN:** 13-jun-25**DESCRIPCIÓN:**

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-LP-GC-001/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$8,124,792.96

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$9,424,759.83

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$3,298,665.94

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$9,424,759.83

BUENO POR:

\$ 596,297.20

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 596,297.20 (SON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 06 (NORMAL)**DEDUCCIONES:**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%

\$ 288,265.23

MAS I.V.A.:

\$ 46,122.44

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 334,387.67

3 % SVIFYC:

\$ 24,708.45

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 359,096.12

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 823,614.93

MAS I.V.A 16 %

\$ 131,778.39

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 955,393.32

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 359,096.12

SALDO A PAGAR:

\$ 596,297.20

ELABORO


C. JOSÉ EFRÉN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Control de Estimaciones**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		Estimacion:
			Fecha: 13 de junio de 2025		06 (NORMAL)
Periodo de la estimacion:	26/05/2025	al	13/06/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	14/02/2025	al	13/06/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-LP-GC-001/2025
Importe del contrato con I.V.A:	\$ 9,424,759.83	Imp. Contratado sin I.V.A	\$ 8,124,792.96	Anticipo	\$ 3,298,665.94
			Importe Anticipo sin I.V.A		\$ 2,843,677.53
			% de Avance		10%
			% Avance Total		96%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 823,614.93	ESTA ESTIMACION
\$ 334,387.67	16 % I.V.A (+) \$ 131,778.39	\$ 955,393.32
	Sub- Total A (=) \$ 955,393.32	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$ 288,265.23	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 2,828,466.75	16 % I.V.A (+) \$ 46,122.44	\$ 8,081,333.55
	Total (=) \$ 334,387.67	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 535,349.70	TOTAL ACUMULADO.
\$ 3,162,854.42	16 % I.V.A (+) \$ 85,655.95	\$ 9,036,726.87
	Total (=) \$ 621,005.65	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 24,708.45	CONTRATADO
\$ 3,298,665.94	Total Deducciones (=) \$ 24,708.45	\$ 9,424,759.83
	Importe T O T A L \$ 596,297.20	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 596,297.20	SALDO
\$135,811.52	Son: (SON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)	\$ 388,032.96

ELABORO

C.JOSÉ EFRÉN URIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 13/06/2025

CONTRATISTA:

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA.

DOMICILIO: C.P. 81320

R.F.C. CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.**

ESTADO DE CUENTA

			LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		06 (NORMAL)				
DESCRIPCIÓN:			CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.										
FECHA INICIO CONTRATO:		14-feb-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:		13-jun-25	CONTRATO:		MBGBR-LP-GC-001/2025		FECHA CONTRATO:		10-feb-25	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$8,124,792.96		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:									
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$3,298,665.94		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:				AL					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$9,424,759.83		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:				IMPORTE TOTAL CONTRATADO:				\$9,424,759.83	
No. DE ESTIMACIÓN		PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN		IMPORTE SIN IVA		3 % SVIFYC:		AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)		14-feb-25	14-mar-25	\$ 842,815.17		\$ 726,564.80		\$ 21,796.94		\$ 294,985.31		\$ 316,782.25	\$ 526,032.92
02 (NORMAL)		15-mar-25	14-abr-25	\$ 1,035,061.61		\$ 892,294.49		\$ 26,768.83		\$ 362,271.57		\$ 389,040.40	\$ 646,021.21
03 (NORMAL)		15-abr-25	21-abr-25	\$ 2,233,981.81		\$ 1,925,846.39		\$ 57,775.39		\$ 781,893.63		\$ 839,669.02	\$ 1,394,312.79
04 (NORMAL)		22-abr-25	14-may-25	\$ 1,481,001.79		\$ 1,276,725.68		\$ 38,301.77		\$ 518,350.63		\$ 556,652.40	\$ 924,349.39
05 (NORMAL)		15-may-25	25-may-25	\$ 2,488,473.17		\$ 2,145,235.49		\$ 64,357.06		\$ 870,965.61		\$ 935,322.67	\$ 1,553,150.50
06 (NORMAL)		26-may-25	13-jun-25	\$ 955,393.32		\$ 823,614.93		\$ 24,708.45		\$ 334,387.67		\$ 359,096.12	\$ 596,297.20
TOTALES:				\$ 9,036,726.87		\$ 7,790,281.78		\$ 233,708.44		\$ 3,162,854.42		\$ 3,396,562.86	\$ 5,640,164.01
SALDO DEL CONTRATO:				\$388,032.96		SALDO POR AMORTIZAR:				\$135,811.52			

ELABORO


C. JOSÉ EFRÉN URIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÉ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA

13/06/2025

CONTRATISTA:**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.****DOMICILIO:** MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA C.P. 81320**R.F.C.****CAM-871226-MS5****DEPENDENCIA:****MUNICIPIO DE BADIRAGUATO****DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.****RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	06 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$8,124,792.96
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$3,298,665.94
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$9,424,759.83

OBRA**IMPORTE****OBRA CIVIL**

CIMENTACIONES Y CONCRETOS

\$ 823,614.93

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 823,614.93

**SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =****\$ 823,614.93
\$ 131,778.39
\$ 955,393.32**

ELABORO

C. JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

06 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
	OBRA CIVIL								
	CIMENTACIONES Y CONCRETOS								
GBR085	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2				AREA	165.26		
							TOTAL	165.26	
GBR086	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2				AREA	1,208.90		
							TOTAL	1,208.90	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	1,066.01	
							ADICIONAL	142.89	

ELABORO

 ING. ORLANDO MONTECERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 13/06/2025

 DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**
CROQUIS


CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

 CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.** OBRA:

ESTIMACION: 06 (NORMAL)

**OBRA CIVIL
CIMENTACIONES Y CONCRETOS**

GBR085 FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

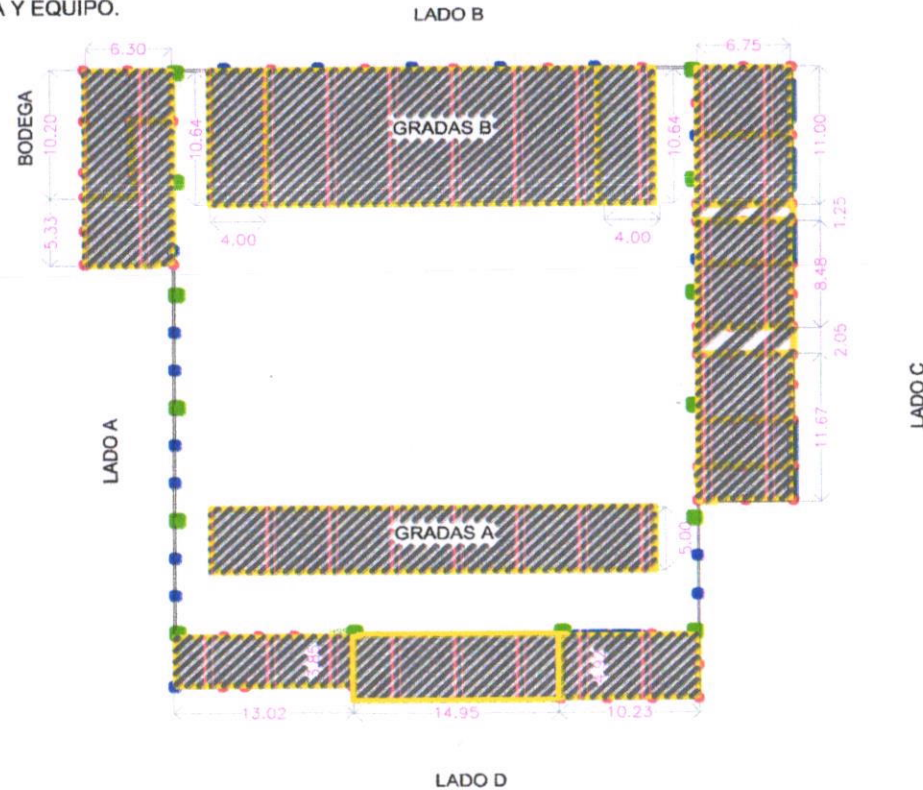

ELABORO

 ING. ORLANDO LAUREAN GERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 13/06/2025

 DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**
CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

 CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**


OBRA:

 ESTIMACION: **06 (NORMAL)**

GBR086

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN FC=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LADO B

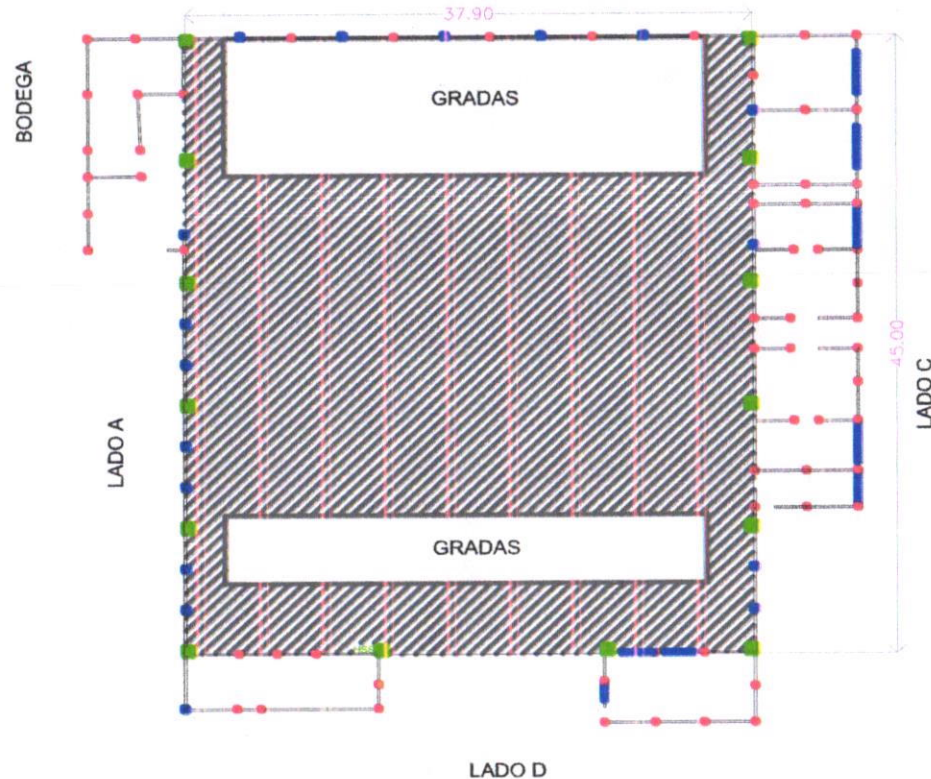

ELABORO

 ING. ORLANDO LAZAROS GONZALEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

Brst

 ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 13/06/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**


OBRA:

ESTIMACION: **06 (NORMAL)**

**OBRA CIVIL
CIMENTACIONES Y
CONCRETOS**

GBR085

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

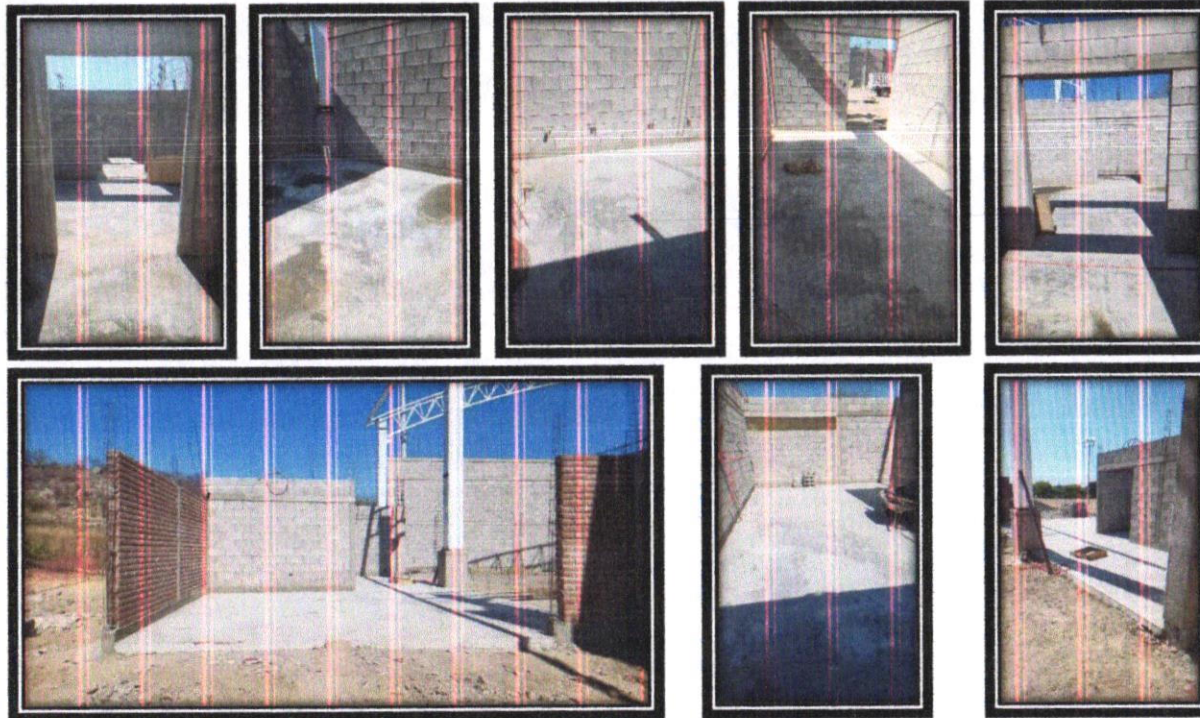

ELABORO

ING. ORLANDO MARTÍAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

Brse

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 13/06/2025

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.




CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**

OBRA:

ESTIMACION: **06 (NORMAL)**

GBR086

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

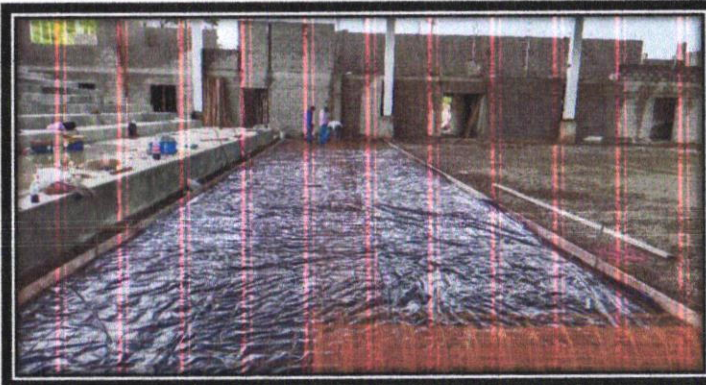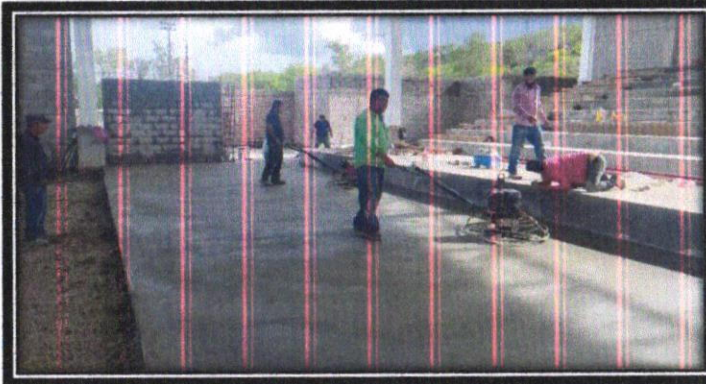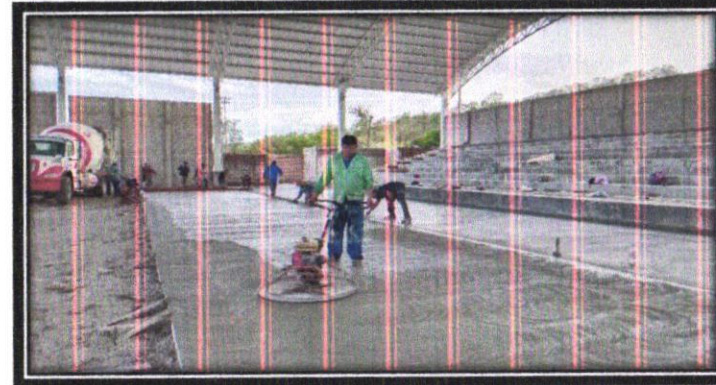

ELABORO

ING. ORLANDO RAMIREZ CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

ARQ. BRICEIDA GUADALUPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Fecha y hora de consulta

04/07/2025 6:52:26 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 06 NORM LP 001

Importe de la operación: 596,297.20 MXP

Cuenta de retiro: 0117899246

Cuenta de depósito: 002743700452705974

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONST

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha valor: 07/07/2025

Fecha de creación: 04/07/2025

Fecha de aplicación: 04/07/2025

Concepto de pago: EST 06 NORM LP GC 001

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 18:52:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000542291

Clave de rastreo: 002601002507070000542291

Folio de firma: 0092941023

Folio único: I401202507041852060092941029

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	04/07/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/07/2025
