


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$701,586.33 (SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$197,848.44 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CDO070612UY1
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
- **No. DE FACTURA:** # 300, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA
Alexs
19 AGO 2025
1:14 PM
RECIBIDO

CONSTRUCCIONES DORACO

CDO070612UY1

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214

USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
S/N, 80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 300

FOLIO FISCAL (UUID)

956AFED8-2A34-4FE7-9CD7-5E3DC33671BB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709569399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-08-19T13:57:36

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-08-19T12:45:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN

81000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025	\$ 175,087.11	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 175,087.11

CONTRATADO

IMPORTE: \$604,815.80

IVA: \$96,770.53

TOTAL: \$701,586.33

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$175,087.11

MAS IVA 16% : \$28,013.94

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$203,101.05

DEDUCCIONES

AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$0.00

MAS IVA 16%: \$0.00

TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$0.00

MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$175,087.11

IVA A FACTURAR (16%): \$28,013.94

TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$203,101.05

RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : \$5,252.61

TOTAL DE DEDUCCIONES: \$5,252.61

MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$197,848.44

Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 175087.11 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28,013.94

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO UN PESOS, 05/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 175,087.11

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 28,013.94

TOTAL

\$ 203,101.05



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GVWhnCLOM/nOXtewcwDHN9a5J8/oXUC0gvwn1R5Uklgg7OH/g30izAykrb2VQHjXA78wnl3MlwPxpCg+joN9Q6V4lgEjojHmE1x4nbSWC+xNljzZ1D+68R9IE+uNb60P
F5ucqQKtQGPjvJICDOgLPXUL/I5ty0p54C0UE2b0dFix3qMTsqFQJXpJxhLRiM/3CdOpTdWso0sHJsOTGMYa7QRvodcs6KcimvgSp0wzNKU4KS0+xxaXyowd4nzL5w
8FrzNLOgdZorpUOXtC9R8MwYXm/F5uzFVB5lgnTzoi9Jw/73/YwH43vPZa7abq/yqoT6HtYXr0uymaFU7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

URylZ0IX4TKY/SkD3vpcA1n0WVRioT2UQr5BqFrod2/kW76ewLgMHaZozOMJs16xGjdt4wYDn9KRMUbjM32JXiI3x3aq1pzuFJIIJmS72fypm0gEDWEDgguWok4sUFTu
2vlwnYXG4ivFw0ciT32OzcvcEPUq8bENEMUFbZd7905np48UQVfMR3K/BBVBdn2sHCFogIT9I1sWj1y2noMe/GPzsO72MB/D7i61wDFxZyjDVccZXS1TNmwdGW9ds7Nr
VAfp+pAertb+pvRdjZpNyjPjb/MFOJKPiut1zIRRElwCsTXbgJJOLHU43+/IIPY3RvgmjFJJsNWsZBE0L8SQdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|956AFED8-2A34-4FE7-9CD7-5E3DC33671BB|2025-08-19T13:57:36|STA0903206B9|GVWhnCLOM/nOXtewcwDHN9a5J8/oXUC0gvwn1R5Uklgg7OH/g30izAykrb2VQHjXA78wnl3MlwPxpCg+joN9Q6V4lgEjojHmE1x4nbSWC+xNljzZ1D+68R9IE+uNb60PF5ucqQKtQGPjvJICDOgLPXUL/I5ty0p54C0UE2b0dFix3qMTsqFQJXpJxhLRiM/3CdOpTdWso0sHJsOTGMYa7QRvodcs6KcimvgSp0wzNKU4KS0+xxaXyowd4nzL5w8FrzNLOgdZorpUOXtC9R8MwYXm/F5uzFVB5lgnTzoi9Jw/73/YwH43vPZa7abq/yqoT6HtYXr0uymaFU7A==||00001000000711762511||

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xmlPara facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XMT file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsl="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsl:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="300" Fecha="2025-08-19T12:45:41"
SeLlo="GVmNcL0W/nOxtCtwcWdHN9a5J8/oXUCBgWwNlRUKtgg/0H/g30IzaykrIbp2VQhJfAX78wnl3MlWpXpCg+jon9Q6v4lIgeJojHmE1x4nb5MC+xNIjJzID+68R9IE+uNB60PF5ucqQkTQGPjIVJ1CD0gLPXUL/I5tY0p54C0UE2b0dF1x3qMTsqFQJXPjxhLR1M/3C
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000709569399"
Certificado="MTIGIDCBAIgaIwIBAGfUWDAWDEdAwMDA3M0K1NjKzOTkwdQVjK0ZlThvcNAQELBQAwggGvMTUwMwYQODDCBxByBERUgU0VSVK1DSUs8gREUGqURNSUS5U1URSQUJNT04gVFJQZlVUQVJ3QTUuMwGALUEGclU0VSVK1DSUs8gREUGqURNSUS5U1URSQU
SubTotal="175087.11" Moneda="MXN" Total="203101.05" TipoDeComprobante="I" Exportaciones="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81000">
<cfdi:Emisor Rfc="CD0070612UV1" Nombre="CONSTRUCCIONES DORACO" RegimenFiscal="626"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA85010214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN
NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025 CONTRATADO IMPORTE:
$604,815.00 IVA: $96,770.53 TOTAL: $701,586.33 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $175,087.11 MAS IVA 16% : $28,013.94 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $203,101.05 DEDUCCIONES AMORTIZACION
ANTICIPO 35%: $0.00 MAS IVA 16%: $0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $175,087.11 IVA A FACTURAR (16%): $28,013.94 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION:
$203,101.05 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.): $5,252.61 TOTAL DE DEDUCCIONES: $5,252.61 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $197,848.44" Importe="175087.11" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="175087.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="28013.94"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28013.94">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="175087.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="28013.94"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B89" UUID="956AFED8-2A34-4FE7-9CD7-5E30DC3671B8" FechaTimbrado="2025-08-
19T13:57:36"
SeLloCFD="GVhNcL0W/nOxtCtwcWdHN9a5J8/oXUCBgWwNlRUKtgg/70H/g30IzaykrIbp2VQhJfAX78wnl3MlWpXpCg+jon9Q6v4lIgeJojHmE1x4nb5MC+xNIjJzID+68R9IE+uNB60PF5ucqQkTQGPjIVJ1CD0gLPXUL/I5tY0p54C0UE2b0dF1x3qMTsqFQJXPjxh
NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
SelloSAT="URYLX4TKV5K03vpcA1n0wRkUjOT2UQr5BqFrcd2/kw78eWlMhZozONJ516x5Gd74wlyDn9krHUBjJh32JXl13x3aq1pzuFJIIJmS27f2ypn0gEDHedggukokx4sUFTu2VlwnYXG41v1Fw0CiT3Z0zcvcPEuq8BENEMUFbZd7905np48UQfVVR3K/BBVBc
xsl:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Fecha: 14 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	30-jun-25
6671531178	6678229976		AL	09-jul-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
CDO070612UY1			28-jun-25	
DEPENDENCIA.-				
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
	BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:	30-jun-25
			TERMINACIÓN:	19-jul-25
DESCRIPCIÓN:				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				
CONTRATO No:				
MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025				
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$604,815.80	\$701,586.33	\$245,555.22	\$701,586.33	
			BUENO POR:	\$ 197,848.44
RECIBI:				
\$ 197,848.44	(SON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL				
DEDUCCIONES:				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	CÁLCULO DE ESTIMACIÓN		
MAS I.V.A.:	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	175,087.11
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$	28,013.94
3 % SVIFYC:	\$ 5,252.61	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$	203,101.05
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 5,252.61	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$	5,252.61
		MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$	203,101.05
			SALDO A PAGAR:	\$ 197,848.44

ELABORO.-

C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO,		Fecha:	Estimacion:
		14 de julio de 2025	01 NORMAL
Periodo de la estimación:	30/06/2025 09/07/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	30/06/2025 19/07/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A
\$ 701,586.33	\$ 604,815.80	\$ 245,555.22	\$ 211,685.53
		% de Avance	
		29%	
		% Avance Total	
		29%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 175,087.11	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+) \$ 28,013.94	
\$ -	Sub- Total A (=) \$ 203,101.05	\$ 203,101.05
	Amortizacion Anticipo 35% \$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ -	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 175,087.11	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 28,013.94	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=) \$ 203,101.05	\$ 203,101.05
	3 % SVIFYC: \$ 5,252.61	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 5,252.61	CONTRATADO
\$ 245,555.22	Importe T O T A L \$ 197,848.44	\$ 701,586.33
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 197,848.44	SALDO
\$245,555.22	Son:	\$ 498,485.28
	(SON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.)	

ELABORO.-

C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

ELABORO.- 
C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO.- 
ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.- 
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA:		14 de julio de 2025
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,			
R.F.C.	CDO070612UY1			

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA		

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 604,815.80
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 245,555.22
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 701,586.33

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 175,087.11
2	ESTRUCTURA	\$ -
3	INSTALACIONES BASICAS	
4	OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 175,087.11

SUB TOTAL =	\$ 175,087.11
I.V.A AL 16 %	\$ 28,013.94
TOTAL =	\$ 203,101.05

ELABORO:-

C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		FECHA: lunes, 14 de julio de 2025						
DOMICILIO:	CALLE: COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000			R.F.C.: CDO070612UY1	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN										
LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 01 NORMAL								
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA										
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$604,815.80		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$245,565.22		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$701,583.33						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	424.48	\$ 15.58	\$ 6,613.40	424.48	0.00	0.00	424.48	\$ 6,613.40
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FLUA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	183.94	\$ 133.09	\$ 24,480.57	183.94	0.00	0.00	183.94	\$ 24,480.57
GP03	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	334.44	\$ 37.61	\$ 12,578.29	334.44	0.00	0.00	334.44	\$ 12,578.29
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	334.44	\$ 157.55	\$ 52,661.02	334.44	0.00	0.00	334.44	\$ 52,661.02
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	334.44	\$ 196.07	\$ 65,573.65	334.44	0.00	0.00	334.44	\$ 65,573.65
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA ECH-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA ESTRUCTURA	M2	334.44	\$ 39.32	\$ 13,150.18	334.44	0.00	0.00	334.44	\$ 13,150.18
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO	ML	73.18	\$ 719.19	\$ 52,650.32	-	0.00	0.00	0.00	\$ -

ELABORÓ:
Miguel Méndez Acosta
C. MARIA MERLUZA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

REVISÓ:
G. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

AUTORIZO



DESGLOSE

CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA	lunes, 14 de julio de 2025
DOMICILIO:		CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.		CD0070612UY1			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN									
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA									
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$804,815.80		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$245,555.22		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
								\$701,586.33	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN
GP083	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE	ML	14.80	\$ 624.05	\$ 9,235.84	-	0.00	0.00	0.00
GP103	LOSA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON	M2	278.31	\$ 839.01	\$ 234,343.68	-	0.00	0.00	0.00
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE	ML	159.19	\$ 32.67	\$ 5,200.74	-	0.00	0.00	0.00
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	ML	133.73	\$ 33.75	\$ 4,513.39	-	0.00	0.00	0.00
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE AGERO	ML	43.96	\$ 77.12	\$ 3,380.20	-	0.00	0.00	0.00
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON	ML	72.18	\$ 81.89	\$ 5,910.82	-	0.00	0.00	0.00
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE	M3	18.41	\$ 160.09	\$ 2,947.26	-	0.00	0.00	0.00
GP10	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO	M2	92.07	\$ 417.72	\$ 38,459.48	-	0.00	0.00	0.00
3 INSTALACIONES BÁSICAS									
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE	ML	39.53	\$ 160.42	\$ 6,341.40	-	0.00	0.00	0.00
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLPE AL 3	ML	41.03	\$ 117.79	\$ 4,832.92	-	0.00	0.00	0.00
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO	PZA	1.00	\$ 1,194.74	\$ 1,194.74	-	0.00	0.00	0.00
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO	PZA	2.00	\$ 23,511.81	\$ 47,023.62	-	0.00	0.00	0.00
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE	PZA	3.00	\$ 1,219.83	\$ 3,659.49	-	0.00	0.00	0.00
GP30	INTERCONEXIÓN A RED ELÉCTRICA INCLUYE	PZA	1.00	\$ 1,298.84	\$ 1,298.84	-	0.00	0.00	0.00
4 OTROS									
GBR671	LETREO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA	PZA	1.00	\$ 4,771.52	\$ 4,771.52	-	0.00	0.00	0.00
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA,	M2	424.48	\$ 9.36	\$ 3,973.13	-	0.00	0.00	0.00
					SUB-TOTAL			175,087.11	
					IVA			28,013.94	
					MONTO TOTAL			203,101.05	

ELABORO: *Maria Merlida Acosta*
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: *Ing. Jose Rocclipo Contreras Lopez*
ING. JOSE ROCCLIPLO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO: *C. Ing. Rubiel Rincon Ramos*
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN
CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA
OTRA BANDA DE BADRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADRAGUATO,
SINALOA.

ESTIMACION
01 NORMAL


CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2						
		CADENAMIENTO								
		0+000.00	0+010.00		10.0000	10.00			100.00	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	10.00			100.00	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	12.22			122.20	
		0+030.00	0+033.96		3.9600	10.00			67.04	
									TOTAL EJECUTADO	484.14
									TOTAL EJECUTADO	424.48
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FLUA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.			M3						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO	ESPESOR			
		0+000.00	0+010.00		10.0000	17.44	0.55		95.02	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	7.90	0.55		43.45	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	9.48	0.55		52.14	
		0+030.00	0+033.96		3.9600	14.26	0.55		31.06	
									TOTAL EJECUTADO	222.57
									TOTAL EJECUTADO	183.94
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE INCLUYE ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.			M2						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO				
		0+000.00	0+010.00		10.0000	17.44			174.40	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	7.90			79.00	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	9.48			94.80	
		0+030.00	0+033.96		3.9600	14.26			56.47	
									TOTAL EJECUTADO	404.67
									TOTAL CONTRATADO	334.44
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.			M2						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO				
		0+000.00	0+010.00		10.0000	17.44			174.40	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	7.90			79.00	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	9.48			94.80	
		0+030.00	0+033.96		3.9600	14.26			56.47	
									TOTAL EJECUTADO	404.67
									TOTAL CONTRATADO	334.44
GP26	BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			M2						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO				
		0+000.00	0+010.00		10.0000	17.44			174.40	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	7.90			79.00	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	9.48			94.80	
		0+030.00	0+033.96		3.9600	14.26			56.47	
									TOTAL EJECUTADO	404.67
									TOTAL CONTRATADO	334.44
GP06	REGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA ECI-90, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			M2						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO				
		0+000.00	0+010.00		10.0000	17.44			174.40	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	7.90			79.00	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	9.48			94.80	
		0+030.00	0+033.96		3.9600	14.26			56.47	
									TOTAL EJECUTADO	404.67
									TOTAL CONTRATADO	334.44

ELABORADO
CARMEN MERLIDA AGOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO
ARQ. BRICEIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZADO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
	DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000			
	R.F.C.: CDO070612UYY1			
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CROQUIS ESTIMACION:				
PRELIMINARES				
1				
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON			
GP03	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE			
GP05	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO.			
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN,			
GP26	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,			

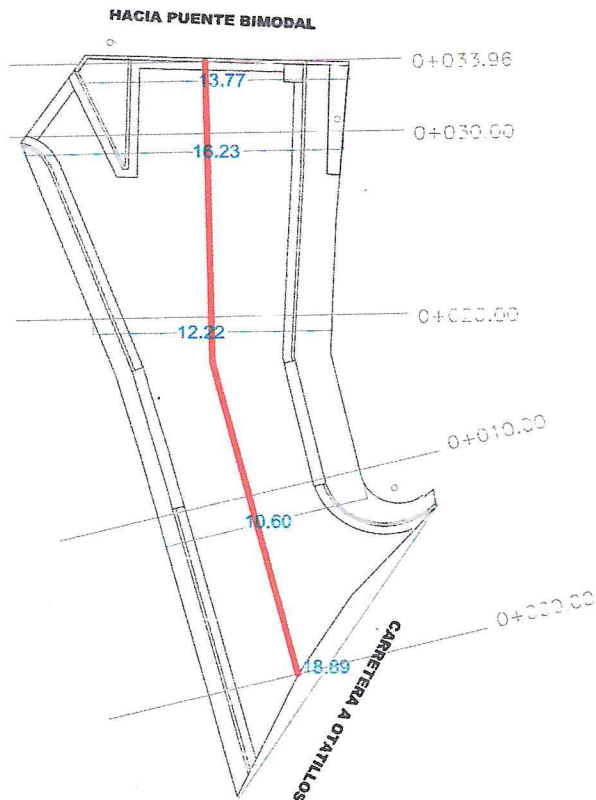

ELABORADO: *Manuel Acosta*
 C. MARIA MERLIDA ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: *Brigitte*
 ARQ. BRIGITTE GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO: *[Signature]*
 Q. ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FOTOS



CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DOMICILIO:

CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

CDO070612UY1

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ARCHIVO FOTOGRAFICO

PRELIMINARES

1

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%. INCLUYE MANO DE
GP25	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,



ELABORO.-

Maria Acosta

C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Briceida

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E



Fecha y hora de consulta03/09/2025 4:27:42 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NORM AD 010

Importe de la operación: 197,848.44 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 030730900045550793

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: CONSTRUCCIONES DORACO SA DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 03/09/2025

Fecha de aplicación: 03/09/2025

Concepto de pago: EST 01 NORM AD 010

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 16:27:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000341980

Clave de rastreo: 002601002509030000341980

Folio de firma: 0001628038

Folio único: I401202509031627400001628044

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	03/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/09/2025
