

OFICIO No. OPDUyE/500/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN
02 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 11 de Septiembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$701,586.33 (SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$446,220.52 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.
- R.F.C. CDO070612UY1
- DOMICILIO FISCAL: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
- No. DE FACTURA: # 306, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



CONSTRUCCIONES DORACO

CDO070612UY1

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214

USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
S/N, 80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 306

FOLIO FISCAL (UUID)

B651798B-3F3B-4EFC-B15C-CB34F8F9C94F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709569399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-09-11T13:41:36

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-09-11T12:30:17

LUGAR DE EXPEDICIÓN

81000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	<p>PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025</p> <p>CONTRATADO IMPORTE: \$604,815.80 IVA: \$96,770.53 TOTAL: \$701,586.33</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$394,885.41 MAS IVA 16% : \$63,181.67 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$458,067.08</p> <p>DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$0.00 MAS IVA 16%: \$0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$0.00</p> <p>MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$394,885.41 IVA A FACTURAR (16%): \$63,181.67 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$458,067.08</p> <p>RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.): \$11,846.56</p> <p>TOTAL DE DEDUCCIONES: \$11,846.56</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$446,220.52</p> <p>Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 394885.4137 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 63,181.67</p>	\$ 394,885.41	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 394,885.41
IMPORTE CON LETRA			SUBTOTAL		\$ 394,885.41
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS, 06/100 MXN			TRASLADO IVA TASA 0.160000		\$ 63,181.67
TIPO DE COMPROBANTE			TOTAL		\$ 458,067.08
FORMA DE PAGO			I - Ingreso		
MÉTODO DE PAGO			99 - Por definir		
MONEDA			PPD - Pago en parcialidades o diferido		
VERSION			MXN - Peso Mexicano		
EXPORTACION			4.0		
			01 - No aplica		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

KIE7dNSKcoA/EafoJOFyant+CEmjdskSYjyMIIHz37JUXF0am3UcgUR3rUSBE4a4z4PJabQuiY2mZuUbwDvlyE40eV06exh1ODQcHMn6NHctXyZW8ITEQKJNw3YqnrhFR+QNa9Aq+xomIKO4aRX7olXmkbbf5omECTfH/Dq54igBkzWSjcdxIRbtwRZWaCkmVohsDdx6OipXTfLySg80M2UJ1K4sXB0XgDv0r5qQIDjCpJoahKRMa7p0g7Uy

SELLO DIGITAL DEL SAT

I2SCShxnF1B0pO1HN0b+NYTGpKxARGvqcRksVNZIO77z5VoCH4c76somKYaHH0MyCMKPh4zUWwlt+0F4nOzRAQW2RXIge551ju8LRW3wRJA79Xy2UWL+NCahl e+JOV875kRM00P2ILbstzGOMwE7YHh+8YmSNysjUTCXhNZT8f+kPDhws/q4gX23Hh5pT6ldX4KAaL3y4pBumbommmKK3oolVTN3/Vqyq7g5T18P8TuvRBsUAAeX eAYpM8mHIGaIKzJvKRqev+Ky2q3MirDeYUWNmtFP8ceBCYxNA3a7AYaEJ6u8/X9TczBflpkW1UBRHWK0cElaSSOY1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1R651798B-3F3B-4EFC-B15C-CB34F8F9C94F|2025-09-11T13:41:36|STA0903206B9|KIE7dNSKcoA/EafoJOFyant+CEmjdskSYjyMIIHz37JUXF0am3UcgUR3rUSBE4a4z4PJabQuiY2mZuUbwDvlyE40eV06exh1ODQcHMn6NHctXyZW8ITEQKJNw3YqnrhFR+QNa9Aq+xomIKO4aRX7olXmkbbf5omECTfH/Dq54igBkzWSjcdxIRbtwRZWaCkmVohsDdx6OipXTfLySg80M2UJ1K4sXB0XgDv0r5qQIDjCpJoahKRMa7p0g7Uy|bKmrHHXlwtbg+W69DGLFszsI28r7s7ZywL62b1nhlvVcK2gEI0rYLBmzkfIMBFAhptEcrCMKWgUaA==|j00001000000711762511||

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

[illegible]



CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

Dependencia :

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO,			Fecha:	Estimación:
			28 de julio de 2025	02 NORMAL
Periodo de la estimación:	10/07/2025	19/07/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	10/07/2025	19/07/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 701,586.33	\$ 604,815.80	\$ -	\$ -	65%
				% Avance Total
				94%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 394,885.41	ESTA ESTIMACION
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 63,181.67	\$ 458,067.08
	Sub- Total A (=) \$ 458,067.08	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ -	\$ 203,101.05
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 394,885.41	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 63,181.67	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=) \$ 458,067.08	\$ 661,168.13
	3 % SVIFYC: \$ 11,846.56	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 11,846.56	CONTRATADO
\$ -	Importe T O T A L \$ 446,220.52	\$ 701,586.33
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 446,220.52	SALDO
\$0.00	Son:	\$ 40,418.20
	(SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N.)	

ELABORO.-

Maria Merlida Acosta
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



Fecha: 28 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		ESTIMACIÓN No:	02 NORMAL
DOMICILIO:	CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	10-jul-25
6671531178	6678229976		AL	19-jul-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
CDO070612UY1				28-jun-25
DEPENDENCIA:-				
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
	BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:	30-jun-25
			TERMINACIÓN:	19-jul-25
DESCRIPCIÓN:				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				
CONTRATO No:				
MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025				
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$604,815.80	\$701,586.33	\$0.00	\$701,586.33	
			BUENO POR:	\$ 446,220.52
RECIBI:				
\$ 446,220.52	(SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:	02 NORMAL			
DEDUCCIONES:	CALCULO DE ESTIMACIÓN			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	394,885.41
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$	63,181.67
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$	458,067.08
3 % SVIFYC:	\$ 11,846.56	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$	11,846.56
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 11,846.56	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$	458,067.08
		SALDO A PAGAR: \$ 446,220.52		

ELABORO.-

C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y I

ELABORO:..

Maria Mercedes Acosta
MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: 
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-
C. INIS: RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA: 28 de julio de 2025	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	
DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	CDO070612UY1		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$	604,815.80		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$	-		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$	701,586.33		

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 325,817.08
3	INSTALACIONES BASICAS	\$ 60,323.68
4	OTROS	\$ 8,744.65
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 394,885.41

SUB TOTAL=	\$ 394,885.41
I.V.A AL 16 %	\$ 63,181.67
TOTAL =	\$ 458,067.08

ELABORO.-

Maria Merlida Acosta
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Ing. Jose Rodolfo Contreras Lopez
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

Ing. Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



<div><div></div><div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</div></div>										FECHA		lunes, 28 de julio de 2025			
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V			DEPENDENCIA:			CDO070612UY1							
DOMICILIO:		CALLE, COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000			R.F.C.			9 de 3							
DESGL0SE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN															
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			LOCALIDAD:			BADIRAGUATO			ESTIMACIÓN:		02 NORMAL		
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$604,815.80			IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA			\$0.00			IMPORTE TOTAL DE CONTRATO			\$701,586.33	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO		TOTAL		HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE				
					P.U.										
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG. 600 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	41.03	\$	117.79	\$	4,832.92	31.80	0.00	31.80	\$	3,745.72			
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$	1,194.74	\$	1,194.74	1.00	0.00	1.00	\$	1,194.74			
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2X1 1/2X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4X1 1/4X1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$	23,511.81	\$	47,023.62	2.00	0.00	2.00	\$	47,023.62			
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2X1 1/2X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4X1 1/4X1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$	1,219.83	\$	3,659.49	2.00	0.00	2.00	\$	2,439.66			
GP30	EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	1,299.84	\$	1,299.84	1.00	0.00	1.00	\$	1,299.84			
OTROS															
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$	4,771.52	\$	4,771.52	1.00	0.00	1.00	\$	4,771.52			
GP1C1	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	424.48	\$	9.36	\$	3,973.13	424.48	0.00	424.48	\$	3,973.13			
SUB-TOTAL											\$94,885.41				
IVA											\$63,181.67				
MONTO TOTAL											\$458,067.08				

ELABORO:
M. Maria Mercedes Acosta
C. MARIA MERLIDA ACOSTA

REVISÓ:
ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O P U Y E

AUTORIZO:
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O P U Y E

DESNGLOSE



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		FECHA: lunes, 28 de julio de 2025	
DOMICILIO: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.: CDO070612UY1		2 de 3	
DESNGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN					
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA		LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 02 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$604,815.80		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$701,586.33	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL				
GP018	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	14.80	\$ 624.05	\$ 9,235.94	10.60	0.00	10.60	\$ 6,614.93
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	279.31	\$ 839.01	\$ 234,343.88	279.31	0.00	279.31	\$ 234,343.88
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	159.19	\$ 32.67	\$ 5,200.74	159.19	0.00	159.19	\$ 5,200.74
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX I.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	133.73	\$ 33.75	\$ 4,513.39	103.98	0.00	103.98	\$ 3,509.33
GP16	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE AGERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	43.96	\$ 77.12	\$ 3,390.20	34.66	0.00	34.66	\$ 2,672.98
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	72.18	\$ 81.89	\$ 5,910.82	48.30	0.00	48.30	\$ 3,955.29
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA, PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS.	M3	18.41	\$ 160.09	\$ 2,947.26	15.47	0.00	15.47	\$ 2,476.59
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	92.07	\$ 417.72	\$ 38,459.48	77.34	0.00	77.34	\$ 32,306.46
3	INSTALACIONES BASICAS								
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO 3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	39.53	\$ 160.42	\$ 6,341.40	28.80	0.00	28.80	\$ 4,620.10

ELABORO: *Maria Meruza Acosta*
 C. MARIA MERUZA ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: *Ing. Jose Rodolfo Contreras Lopez*
 ING JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO: *C. Ing. Rubiel Rincon Ramos*
 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLASE

CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:		FECHA				
DOMICILIO:		CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
				CDO070612UY1		1 de 3				
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN										
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		BADRAGUATO		ESTIMACIÓN:				
						02 NORMAL				
						CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$604,815.80		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA		\$0.00				
						IMPORTE TOTAL DE CONTRATO				
						\$701,586.33				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
1	PRELIMINARES									
2	ESTRUCTURA									
GP03	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESMIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	73.18	\$ 719.19	\$ 52,630.32	48.30	0.00	0.00	48.30	\$ 34,736.88

ELABORÓ:
Maria Merlida Acosta
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
Ing. Jose Rodolfo Contreras Lopez
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:
C. Ing. Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE
SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA
BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
02 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO		EN METROS					
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG	LADO				
		0+000.00	0+034.66		24.8000	IZQUIERDA			24.80	
		0+000.00	0+034.66		23.5000	DERECHA			23.50	
								TOTAL	48.30	
GP08	PATIN DE 10X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG	LADO				
		0+000.00	0+034.66		5.4000	IZQUIERDA			5.40	
		0+000.00	0+034.66		5.2000	DERECHA			5.20	
								TOTAL EJECUTADO	10.60	
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO				
		0+000.00	0+005.00		5.0000	12.8500			64.25	
		0+005.00	0+010.00		5.0000	12.1800			60.90	
		0+010.00	0+015.00		5.0000	10.4200			52.10	
		0+015.00	0+020.00		5.0000	9.6400			48.20	
		0+020.00	0+025.00		5.0000	9.2800			46.40	
		0+025.00	0+030.00		5.0000	11.9200			59.60	
		0+030.00	0+034.66		4.6600	6.7000			31.22	
								TOTAL EJECUTADO	382.67	
								ESTA EST	279.31	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C 3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO		CORTES		
		0+000.00	0+005.00		5.0000	12.8500		2.50	38.55	
		0+005.00	0+010.00		5.0000	12.1800		2.50	36.54	
		0+010.00	0+015.00		5.0000	10.4200		2.50	31.26	
		0+015.00	0+020.00		5.0000	9.6400		2.50	26.32	
		0+020.00	0+025.00		5.0000	9.2800		2.50	27.84	
		0+025.00	0+030.00		5.0000	11.9200		2.50	35.76	
		0+030.00	0+034.66		4.6600	6.7000		2.50	19.19	
								TOTAL EJECUTADO	218.06	
								ESTA EST	159.19	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG	LADO				
		0+000.00	0+034.66		34.6600	DERECHO			34.66	
		0+000.00	0+034.66		34.6600	CENTRO			34.66	
		0+000.00	0+034.66		34.6600	IZQUIERDO			34.66	
								TOTAL EJECUTADO	103.98	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG					
		0+000.00	0+034.66		34.6600				34.66	
								TOTAL	34.66	
GP11	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.			ML						
		CADENAMIENTO			LONG	LADO				
		0+000.00	0+034.66		24.8000	IZQUIERDA			24.80	
		0+000.00	0+034.66		23.5000	DERECHA			23.50	
								TOTAL	48.30	

ELABORÓ:
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZÓ:
ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE
SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA
BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
02 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN.			M3						
		LADO IZQUIERDO					0.20	47.14	9.43	
		LADO DERECHO					0.20	30.2	6.04	
								TOTAL	15.47	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIFERIAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.			M2						
		LADO IZQUIERDO						47.14		
		LADO DERECHO						30.2		
								TOTAL	77.34	
3	INSTALACIONES BASICAS									
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			ML						
		LAMPARA 1	LAMPARA 2		28.8000				28.80	
								TOTAL	28.80	
GP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			ML						
		LAMPARA 1	LAMPARA 2		28.8000				28.80	
		CORCA	0.50		3.0000				3.00	
								TOTAL	31.80	
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
									1.00	
								TOTAL	1.00	
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X300X95 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 160 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110			PZA						
									2.00	
								TOTAL	2.00	
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO.			PZA						
									2.00	
								TOTAL	2.00	
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA						
									1.00	
								TOTAL	1.00	
5	OTROS									
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
		CADENAMIENTO				LADO DERECHO		CANTIDAD		
		0+000.00	0+004.66					1.00		
								TOTAL	1.00	

ELABORADO
C.MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO
AROBREIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZADO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE
SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA
BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
02 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2						
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO				
		0+000.00	0+005.00		5.0000	16.6300			83.15	
		0+005.00	0+010.00		5.0000	16.2400			81.20	
		0+010.00	0+015.00		5.0000	14.4000			72.00	
		0+015.00	0+020.00		5.0000	16.6600			83.30	
		0+020.00	0+025.00		5.0000	13.2600			66.30	
		0+025.00	0+030.00		5.0000	15.7800			78.90	
		0+030.00	0+034.66		4.6600	15.4200			71.86	
								TOTAL EJECUTADO	536.81	
								TOTAL	424.48	

ELABORADO
C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO
ARQ. BRUCEIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZADO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.C.



CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON
VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C. CDO070612UY1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL,
DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

2	ESTRUCTURA
GP08	CUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS,
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y

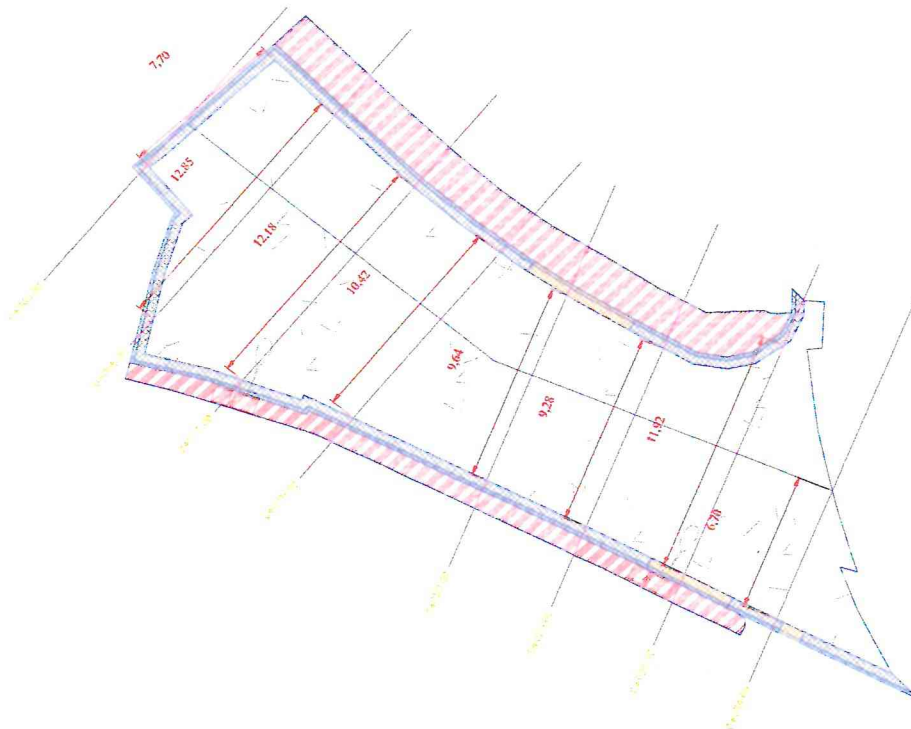

ELABORADO

C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZADO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON
VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.: CDO079812UY1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL,
DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

3	INSTALACIONES BÁSICAS
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO. INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720x300x93 MM, PROTECCIÓN
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40x40x40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO
GP30	INTERCONEXIÓN A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

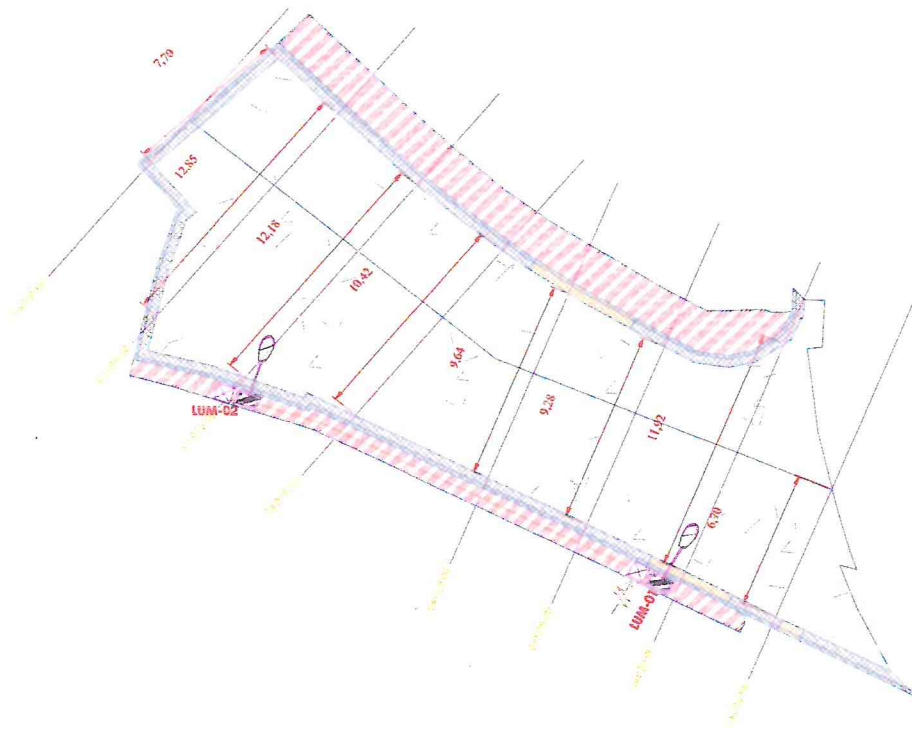

ELABORO:-


C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

CALLE: COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

DOMICILIO:

R.F.C. CDO070612UY1

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA
OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

DEPENDENCIA:


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ARCHIVO FOTOGRAFICO

ESTRUCTURA

2

GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP10	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE:
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y

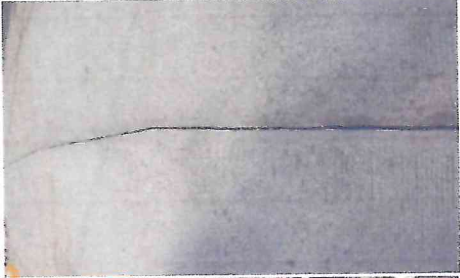

ELABORO.-


Maria Merlida Acosta
C. MARIA MERLIDA ACOSTA

REVISO.-

Arq. Briceida GPE Nieblas Martinez
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DOMICILIO:

CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

CDO070612UY1

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ARCHIVO FOTOGRAFICO

INSTALACIONES BASICAS

3

GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO.
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



ELABORO.-

Maria Merlida Acosta

C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Arq. Briceida GPE Nieblas Martinez

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta

22/09/2025 6:16:30 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago interbancario

Descripción: EST 02 NOR AD010

Importe de la operación: 446,220.52 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 030730900045550793

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta: CONSTRUCCIONES DORACOSA DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha valor: 23/09/2025

Fecha de creación: 22/09/2025

Fecha de aplicación: 22/09/2025

Concepto de pago: EST 02 NOR AD010

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 18:16:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000551454

Clave de rastreo: 002601002509230000551454

Folio de firma: 0027743025

Folio único: I401202509221816280027743031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	22/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/09/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
