



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/218/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 14 de Abril de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 01 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO NÚMERO: **60 (SESENTA) CON FECHA DE 19 DE FEBRERO DE 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE GARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-GC-002/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$235,556.73 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$108,367.97 (CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CDO070612UY1
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE COLON#375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
- **No. DE FACTURA:** # 282, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2025


SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE


C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

 **MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**
TESORERÍA
6:26 PM
14 ABR 2025

RECIBIDO
ALEXIS

CONSTRUCCIONES DORACO

CDO070612UY1
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214
USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
S/N, 80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 282

FOLIO FISCAL (UUID)
ECEE6FE3-9950-4AAF-B1D0-762995BFD086
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000709569399
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-04-14T15:15:25
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-04-14T14:03:17
LUGAR DE EXPEDICIÓN
81000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA." CONTRATO NO. MBGBR-AD-GC-002/2025	\$ 95,900.86	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 95,900.86
CONTRATADO					
IMPORTE: \$203,066.15					
IVA: \$32,490.58					
TOTAL: \$235,556.73					
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$95,900.85					
MAS IVA 16% : \$15,344.14					
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$111,245.00					
MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$95,900.86					
IVA A FACTURAR (16%): \$15,344.14					
TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$111,245.00					
RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : \$2,877.03					
TOTAL DE DEDUCCIONES: \$108,367.97					
MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$108,367.97					
Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 95900.8621 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15,344.14					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS,
00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 95,900.86
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 15,344.14
TOTAL \$ 111,245.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4,0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mihiR6TaaDJSy12PirfJ/TLstXsAvRfetSS4TaCAuDM3FL1xXCQAJm/hRBWZNbw8WQS/g2HdSKplfHmUIPaEqUhdn9xEi0jPs0Yi/OmPBXg5k3JVF3+LLIINmEX9q7IJXvx
U003oF303Ua3s7hEaVWOBkKNedUht5TWrf+XsMzhjkGjvMhoZrMLLRfmOwLRd9jSeipwNMyJmBOqhLsoYPtiQHZZqGE1Ndt4sr3Z3u/h141z1Guu9kGVYphw5ePzTKQU
iffEcYe1G18PYOvu89vQFcVs/5njugxb/o8NY3HEAnwyr+AM4j8Gr1pM/9JnAitYijXrof5nc4mBTsP2vQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1Q+XdKmdK7Ro5E+6sTkdzNTMRHvoj1Sq8hOT4Kiv0IY9wA/6O5xYyg6pZZMLxCcqrjXnkvitnSAEauzG9CaLb7bW03MvAaa7g2PcL4rj2AiJhbPORbcRFuEsva0wL4dfH
qliq2+dE8G1CwKbXNWT0JuOdbgUe0LaJtq9d5XpNei7hXh8pgUACS20Kp9Ct1ZGBUK2AADUwwol3i+BJbVsST/Z7pZrUXxAqbJwguPRI08Iwq5g3MGgMKPOqrwk3gA2
I9NlucCBGDdODD9X55jiuxcsL+U3jn5Ec4aYqfBRXBWLgo6KVnBhJb26UXcaYd3eG0F0BySp7DpKJQe7peg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ECEE6FE3-9950-4AAF-B1D0-762995BFD086|2025-04-14T15:15:25|STA0903206B9|mihiR6TaaDJSy12PirfJ/TLstXsAvRfetSS4TaCAuDM3FL1xXCQAJm/hRBWZNbw8WQS/g2HdSKplfHmUIPaEqUhdn9xEi0jPs0Yi/OmPBXg5k3JVF3+LLIINmEX9q7IJXvxU003oF303Ua3s7hEaVWOBkKNedUht5TWrf+XsMzhjkGjvMhoZrMLLRfmOwLRd9jSeipwNMyJmBOqhLsoYPtiQHZZqGE1Ndt4sr3Z3u/h141z1Guu9kGVYphw5ePzTKQUiffEcYe1G18PYOvu89vQFcVs/5njugxb/o8NY3HEAnwyr+AM4j8Gr1pM/9JnAitYijXrof5nc4mBTsP2vQ==|00001000000711762511|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="282" Fecha="2025-04-
14T14:03:17"
Sello="mihiR6TaaDJSy12PjrfJ/TLstXsAvRfetSS4TaCAuDM3FL11xXCQAJm/hRBWZNbw8WQS/g2HdSKp1lfHmULPaEqUhdn9xEi0jPs0Yi/OmPBXg5k3JVF3+LLIINmEX9q7iJXvxU003oF30
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000709569399"
Certificado="MIIGIDCCBAigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk1NjkzOTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQQDDCBQYBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
SubTotal="95900.86" Moneda="MXN" Total="111245.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81000">
  <cfdi:Emisor Rfc="CDO070612UY1" Nombre="CONSTRUCCIONES DORACO" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA:
    "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE EL MUNICIPIO DE
    BADIRAGUATO, SINALOA." CONTRATO NO. MBGBR-AD-GC-002/2025 CONTRATADO IMPORTE: $203,066.15 IVA: $32,490.58 TOTAL: $235,556.73 IMPORTE DE LA OBRA
    EJECUTADA SIN IVA: $95,900.85 MAS IVA 16% : $15,344.14 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $111,245.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN
    BRUTO: $95,900.86 IVA A FACTURAR (16%): $15,344.14 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $111,245.00 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y.C.) : $2,877.03 TOTAL
    DE DEDUCCIONES: $108,367.97 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $108,367.97" ValorUnitario="95900.8621" Importe="95900.8621" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="95900.8621" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="15344.137936"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15344.14">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="95900.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="15344.14"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="ECEE6FE3-9950-
    4AAF-B1D0-7629958FD086" FechaTimbrado="2025-04-14T15:15:25"
    SelloCFD="mihiR6TaaDJSy12PjrfJ/TLstXsAvRfetSS4TaCAuDM3FL11xXCQAJm/hRBWZNbw8WQS/g2HdSKp1lfHmULPaEqUhdn9xEi0jPs0Yi/OmPBXg5k3JVF3+LLIINmEX9q7iJXvxU0
    NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
    SelloSAT="1Q+XdKmdK7Ro5E+6sTkdzNTMRHvoj1Sq8hOT4Kiv0IY9wA/605xYyg6pZZMLxCcqrjXnkvitnSAEauzG9CaLb7bW03MvAaa7g2PcL4rj2AiJhbpORbcRFuEsva0wL4dfFhqIi
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:	Estimacion:
			16 de abril de 2025	01 NORMAL
Periodo de la estimacion:	07/04/2025	13/04/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	07/04/2025	18/04/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-GC-002-2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 235,556.73	\$ 203,066.15	\$ -	\$ -	47%
				% Avance Total
				47%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 95,900.86	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 15,344.14	
\$ -	Sub- Total A (=)	\$ 111,245.00	\$ 111,245.00
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ -	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR	\$ 95,900.86	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 15,344.14	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=)	\$ 111,245.00	\$ 111,245.00
	3 % SVIFYC:	\$ 2,877.03	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 2,877.03	CONTRATADO
\$ -	Importe TOTAL	\$ 108,367.97	\$ 235,556.73
	NETO A PAGAR		
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 108,367.97		SALDO
\$0.00			\$ 124,311.73
	(SON CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.)		

ELABORO.-

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



Fecha: 16 de abril de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	07-abr-25
66777963151	66777963151		AL	13-abr-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
CLE-070416-CP6			03-abr-25	
DEPENDENCIA.-				

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:	07-abr-25
		TERMINACIÓN:	18-abr-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-GC-002-2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$203,066.15	\$235,556.73	\$0.00	\$235,556.73

BUENO POR: \$ 108,367.97

RECIBI :

\$ 108,367.97 (SON CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL

DEDUCCIONES:

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 95,900.86
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 15,344.14
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 111,245.00
3 % SVIFYC:	\$ 2,877.03	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 2,877.03
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 2,877.03	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 111,245.00

SALDO A PAGAR: \$ 108,367.97

ELABORO.-


CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

C.ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

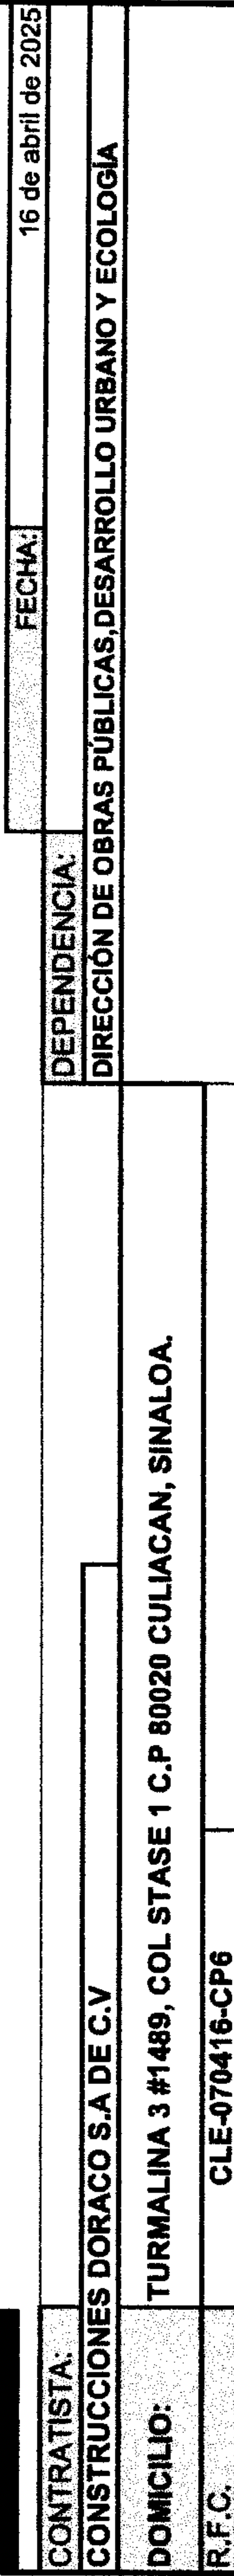

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
FECHA INICIO CONTRATO:	07-abr-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	18-abr-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-GC-002-2025
				FECHA CONTRATO:	03-abr-25

			CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$203,066.15								
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00						AL		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$235,556.73						IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE CIVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
01 NORMAL	07-abr-25	\$ 111,245.00	\$ 95,900.86	\$ 2,877.03		\$ 2,877.03	\$	108,367.97
TOTALES:			\$ 111,245.00	\$ 95,900.86	\$ 2,877.03	\$ -	\$ 2,877.03	\$ 108,367.97
SALDO DEL CONTRATO:			\$ 124,311.73	SALDO POR AMORTIZAR:		\$ -		

ELABORO:-
M. pad. Meneses
CONSTRUCCIONES DORADO S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR ~~1~~

 **AUTORIZO.-**
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA:	16 de abril de 2025
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	CLE-070416-CP6		

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 203,066.15
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ -
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 235,556.73

DESTAJO		IMPORTE
	OBRAS DIVERSAS	\$ 95,900.86
	SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 95,900.86

SUB TOTAL=	\$ 95,900.86
I.V.A AL 16 %	\$ 15,344.14
TOTAL =	\$ 111,245.00

ELABORADO-

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR-

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	FECHA: miércoles, 16 de abril de 2025 1 de 2
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		R.F.C.: CLE-070416-CP6

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$203,066.15	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
				\$235,556.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
	OBRAS DIVERSAS									
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	110.00	\$ 10.51	\$ 1,156.10	110.00	0.00	0.00	110.00	\$ 1,156.10
GPO	PLANTILLA DE DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS.	M2	93.00	\$ 359.92	\$ 33,472.56	93.00	0.00	0.00	93.00	\$ 33,472.56
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	110.00	\$ 557.02	\$ 61,272.20	110.00	0.00	0.00	110.00	\$ 61,272.20
GP102	ADOQUIN RECTANGULAR 05X20X40 CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	93.00	\$ 1,044.03	\$ 97,094.79	-	0.00	0.00	-	\$ -
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	110.00	\$ 91.55	\$ 10,070.50	-	0.00	0.00	-	\$ -
									SUB-TOTAL	\$ 95,900.86
									IVA	\$ 15,344.14
									MONTO TOTAL	\$ 111,245.00

ELABORADO: *[Firma]*
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO: *[Firma]*
C. ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO *[Firma]*
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA	miércoles, 16 de abril de 2025 2 de 2
DOMICILIO:		TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.			R.F.C.	CLE-070416-CP6		

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$203,066.15	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$235,556.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CAUT	P.U.					

En Representación de
[Signature]
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIDO
[Signature]
C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

[Signature]
AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.





CONTRATISTA:						FECHA		miércoles, 16 de abril de 2025	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V						DEPENDENCIA:			
						DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V							
R.F.C.		CLE-870416-CP6							
OBRA:		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
ESTIMACION		01 NORMAL							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
101.00							PARTIAL	TOTAL	
PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2						659.60	
				97.00	6.80		659.60		VER CROQUIS
							TOTAL EJECUTADO	659.60	
							ESTA EST	659.60	
GP0	PLANTILLA DE DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y	M3						7.00	
				13.28					VER CROQUIS
							TOTAL EJECUTADO	13.28	
							ESTA EST	7.00	
							ADICIONAL	6.28	
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA.	M3						342.42	
				97.00	6.80	0.55	362.78		VER CROQUIS
							TOTAL EJECUTADO	362.78	
							ESTA EST	342.42	
							ADICIONAL	20.36	

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

		FECHA: miércoles, 16 de abril de 2025	
CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA			
R.F.C:	CLE-070416-CP6		
OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
FOTOS DE ESTIMACION:			
FOTOS DE ESTIMACION:		01 NORMAL	
CLAVE	CONCEPTO		
PRELIMINARES			
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
GPO	PLANTILLA DE DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y HERRAMIENTAS.		
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES,		

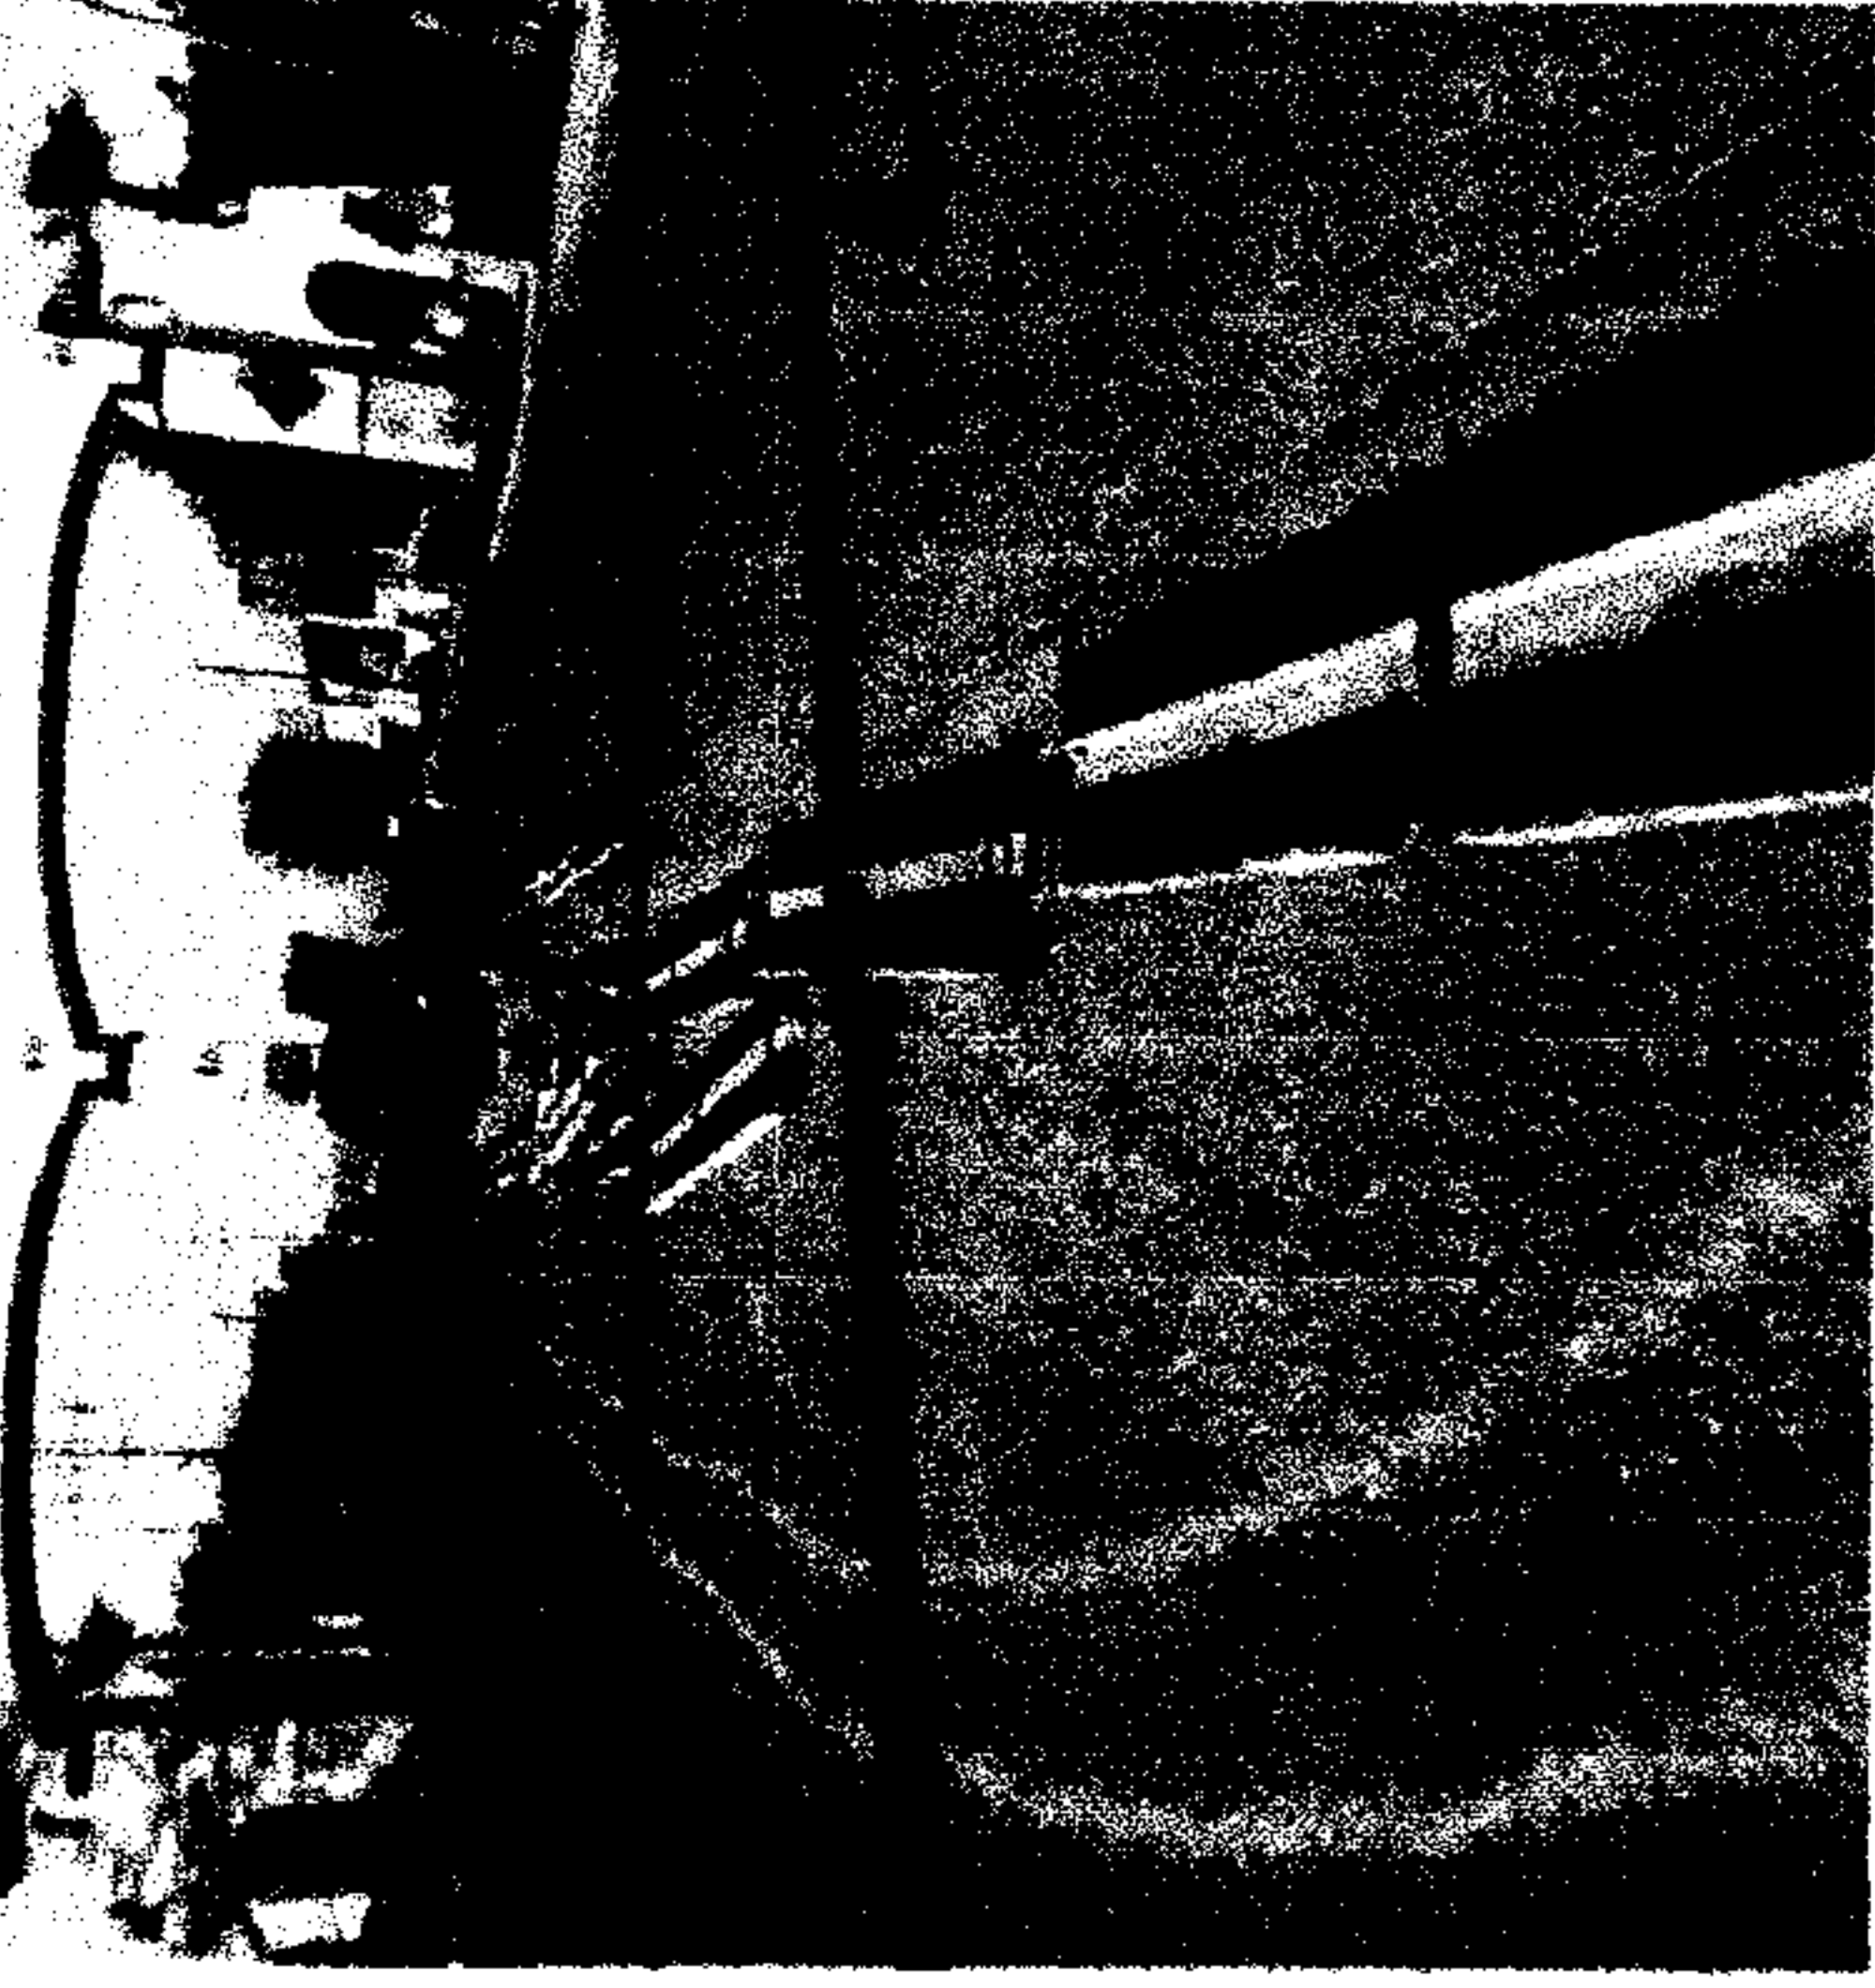
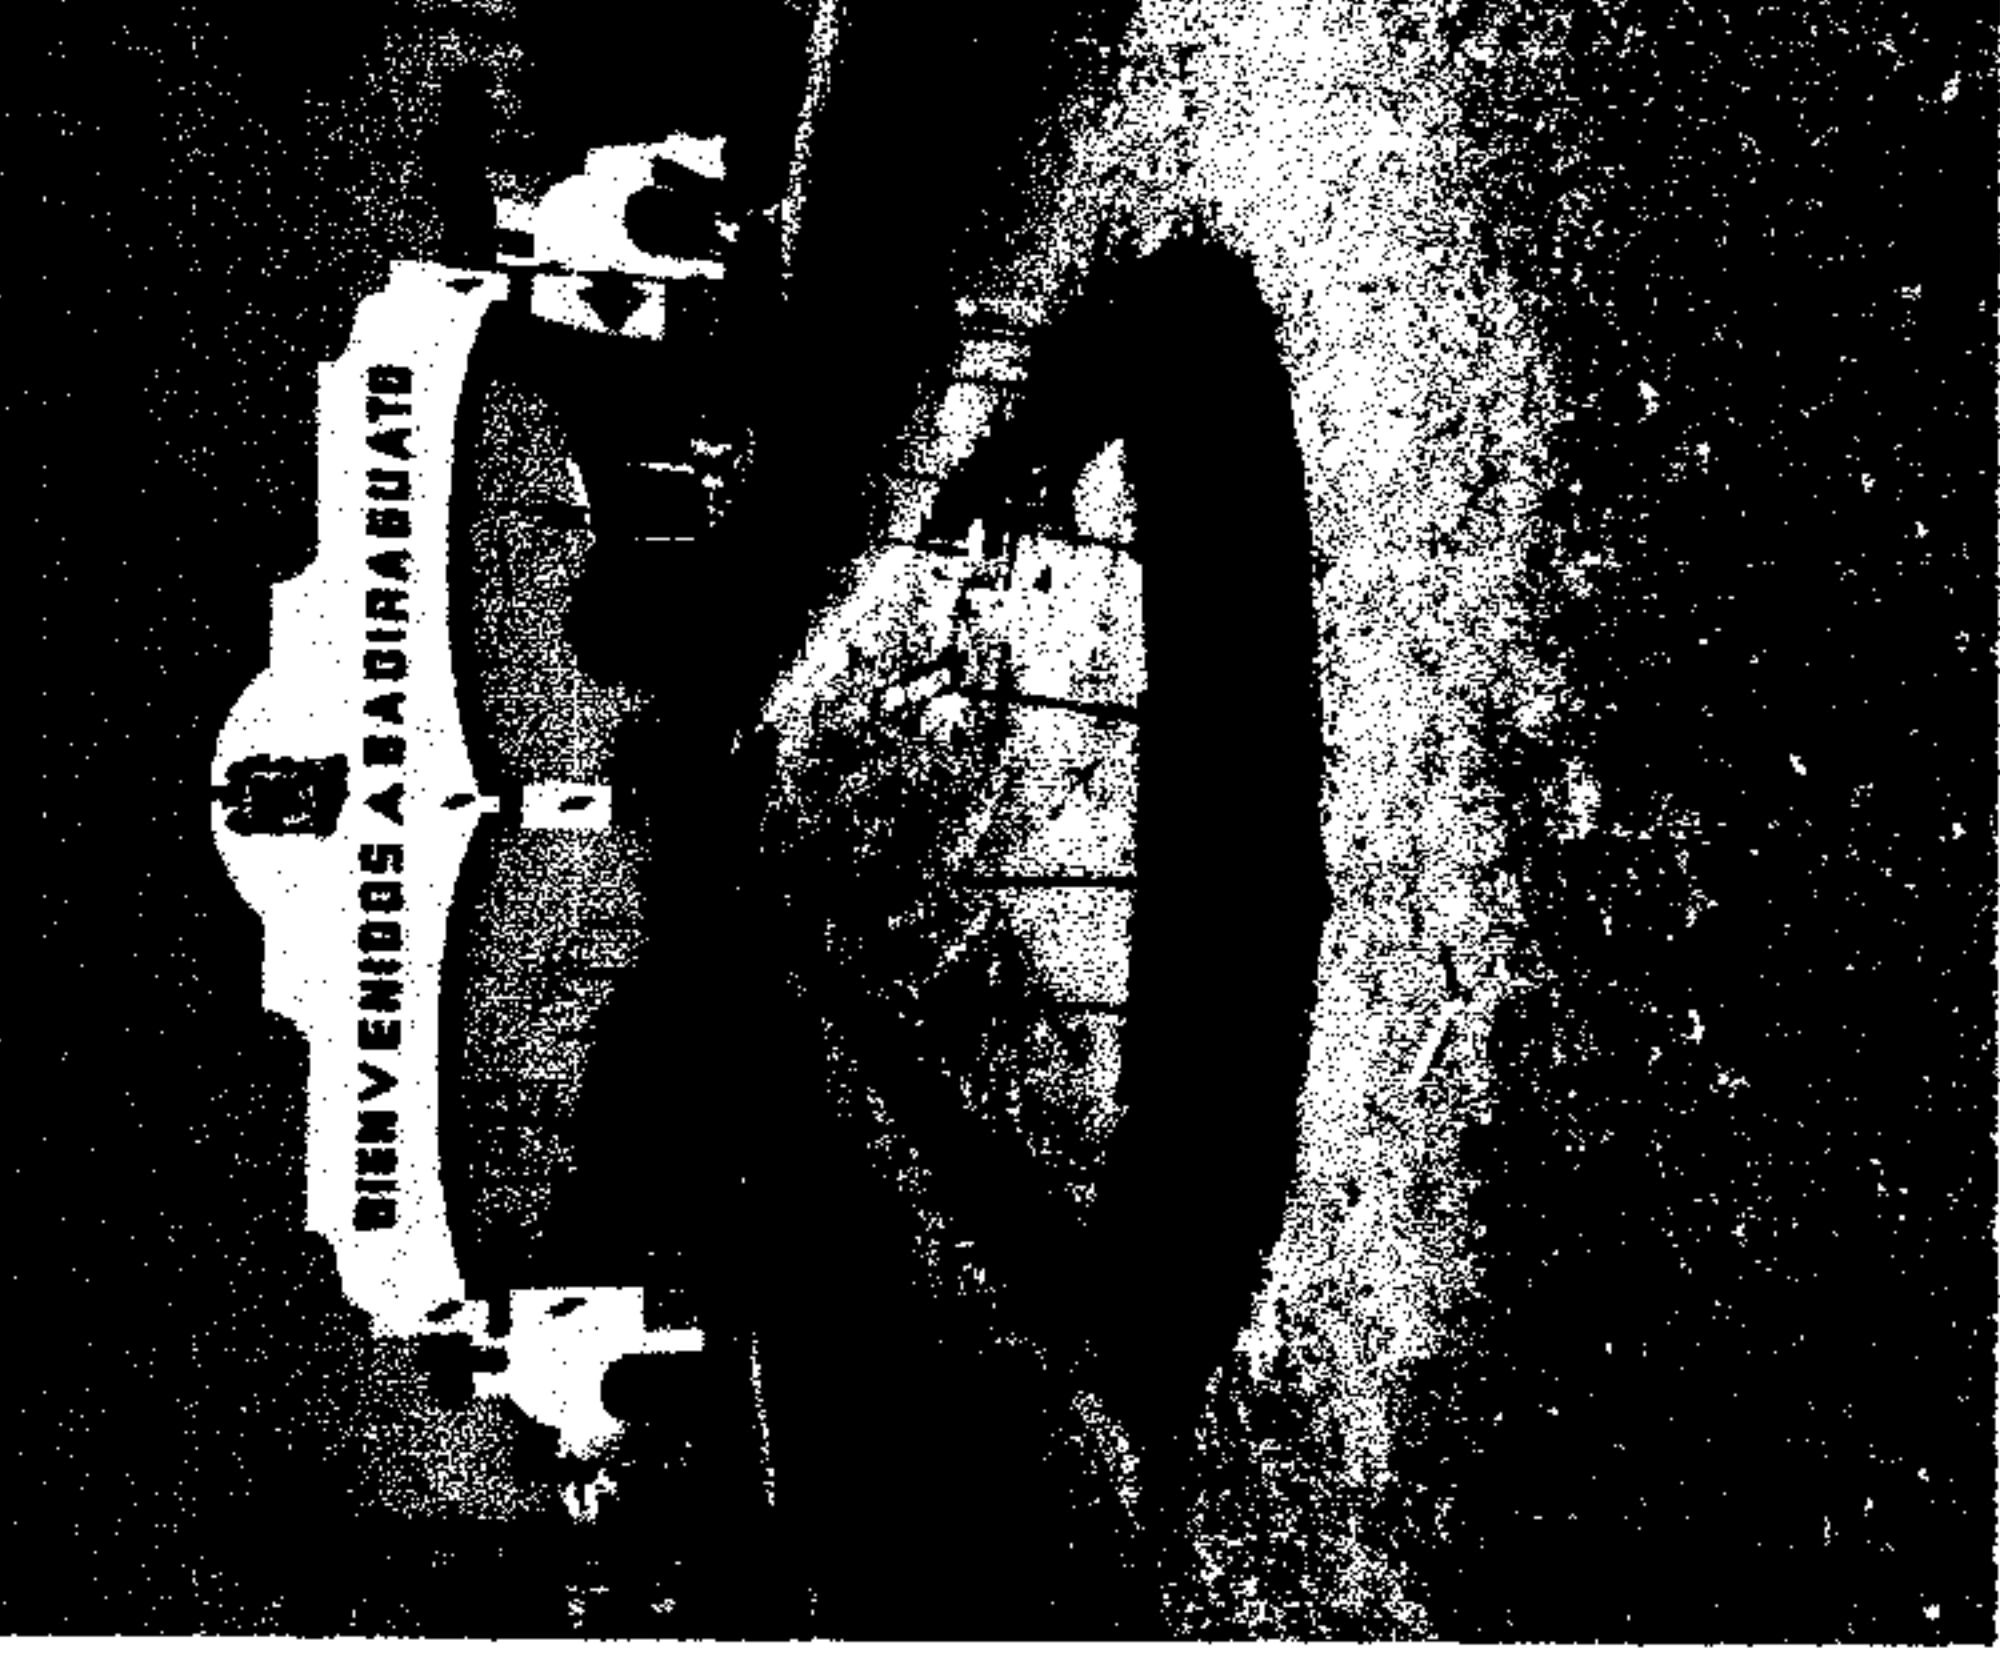


ELABORO:-
[Signature]
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-
[Signature]
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-
[Signature]
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

		FECHA: miércoles, 16 de abril de 2025	
CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA		
R.F.C.	CLE-070416-CP6		
OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
FOTOS DE ESTIMACION:			
FOTOS DE ESTIMACION:		01 NORMAL	
CLAVE	CONCEPTO		

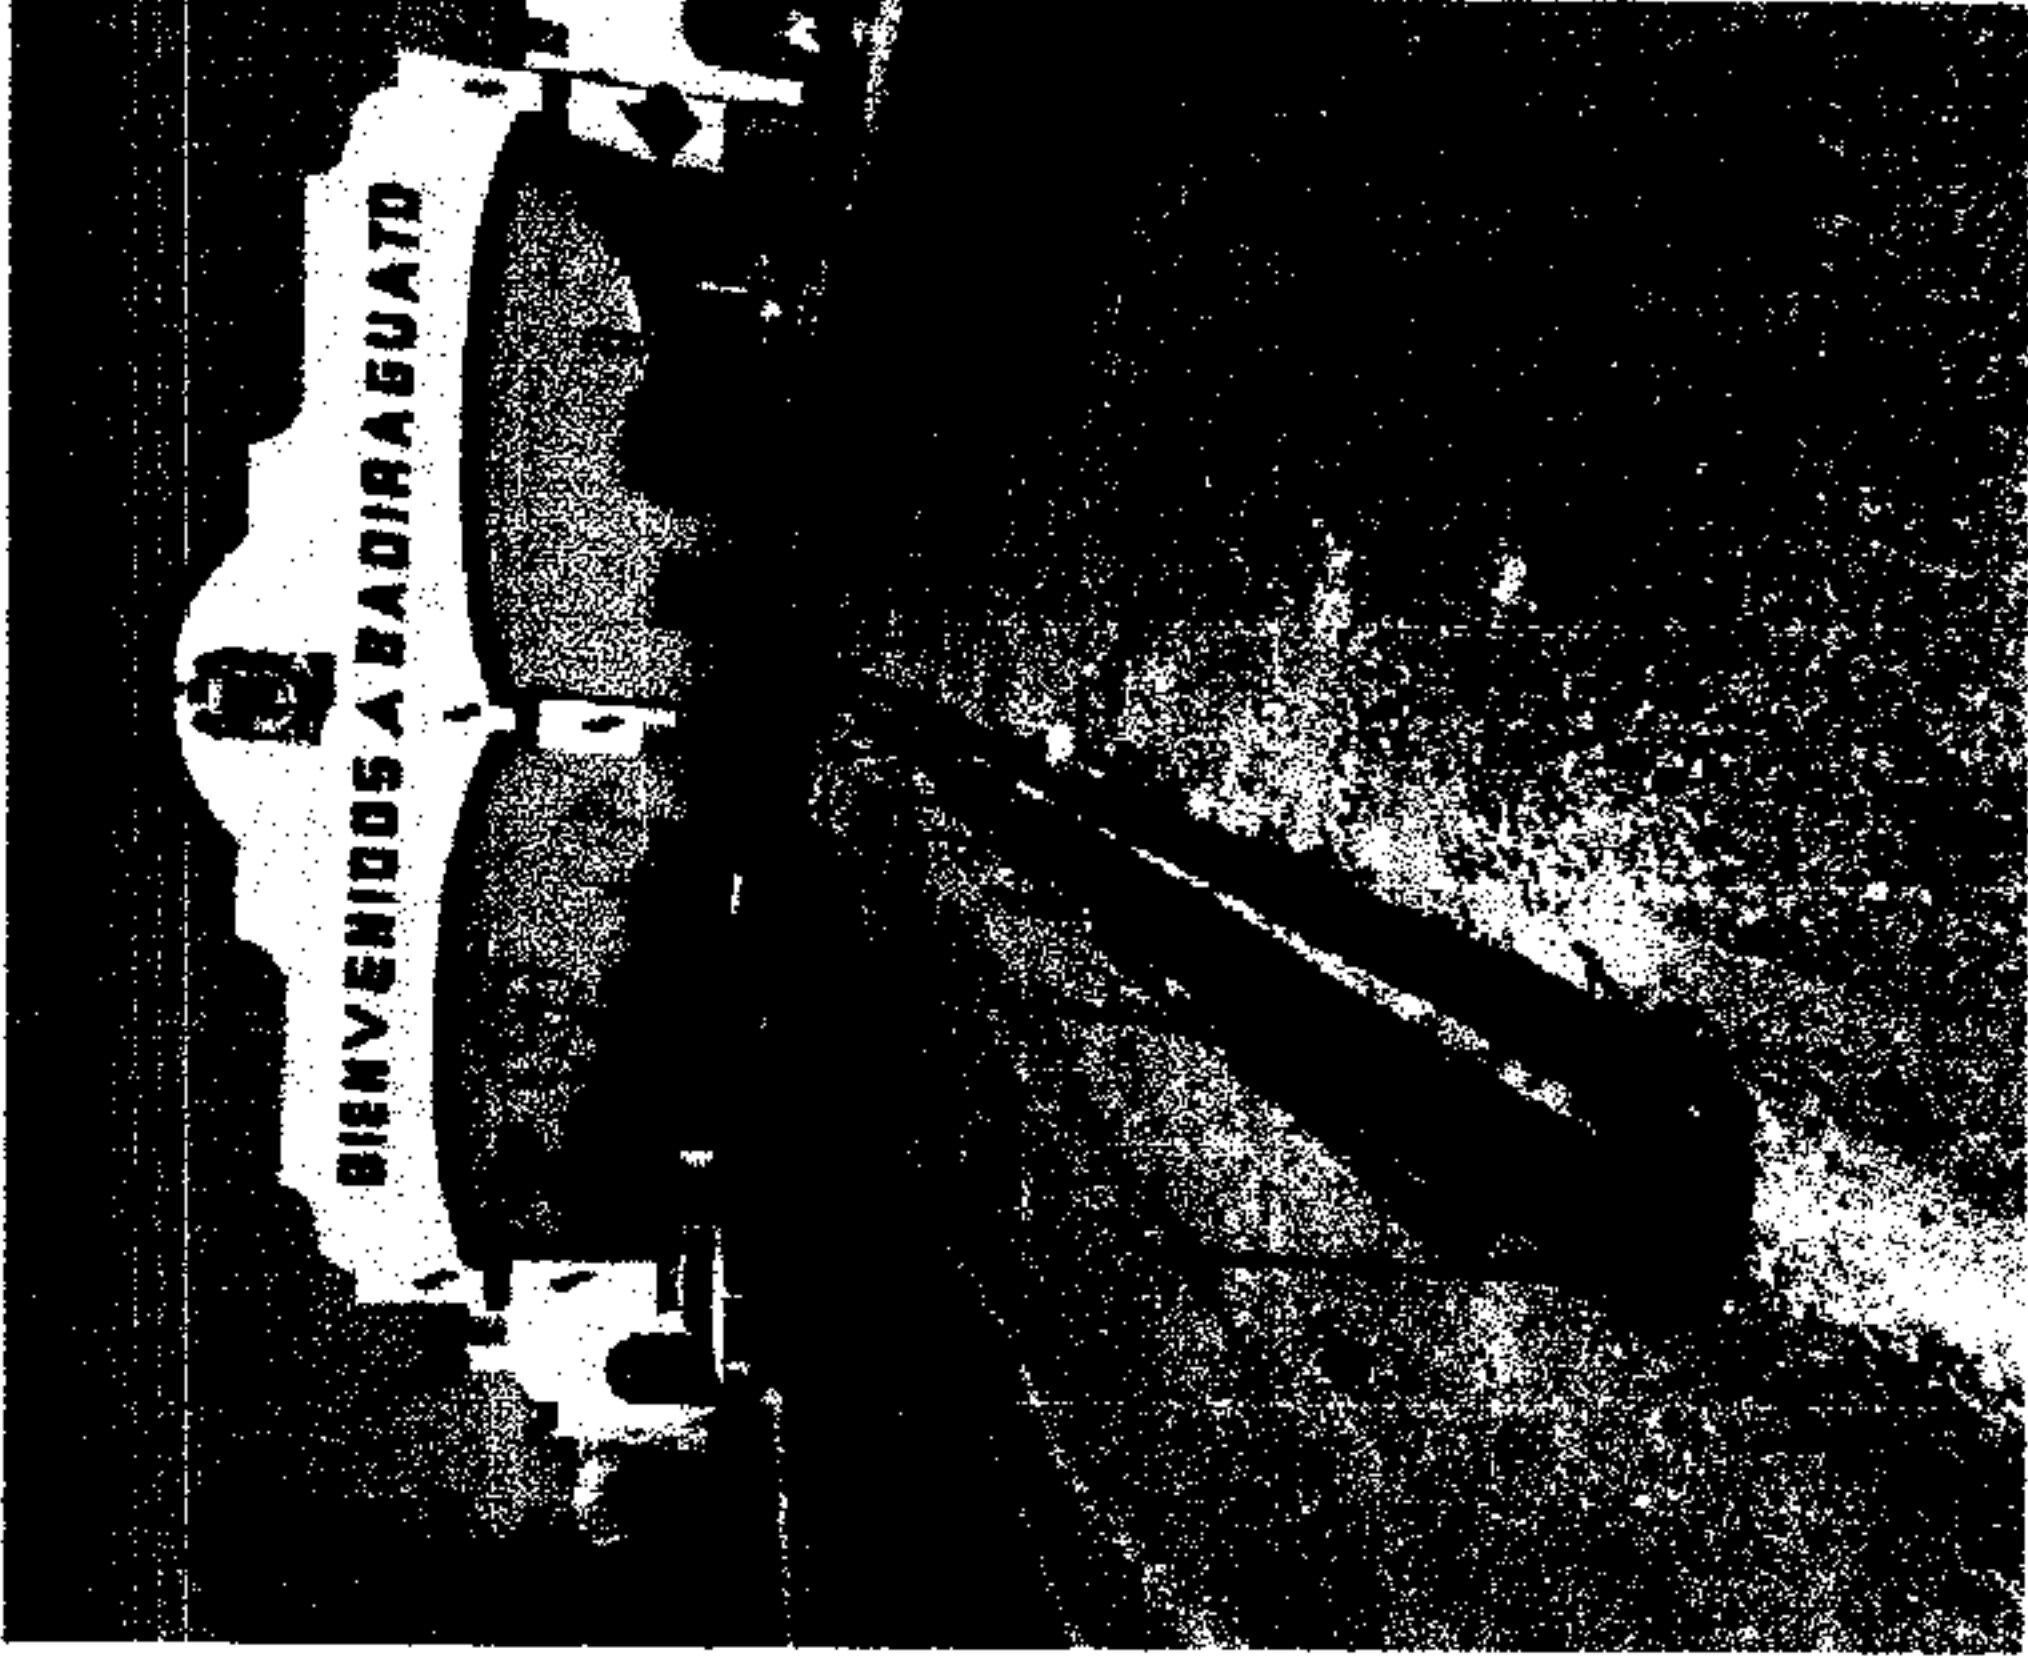

ELABORO:-
[Signature]
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-
[Signature]
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-
[Signature]
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		FECHA miércoles, 16 de abril de 2025
		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.	
R.F.C.	CLE-070416-CP6	
OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	

CROQUIS ESTIMACION:	
CROQUIS ESTIMACION:	
CLAVE	CONCEPTO
101	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GPO	PLANTILLA DE DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO Y
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES,

ARCO BADIRAGUATO

BOULEVARD JUAN S
MILLAN

BOULEVARD JUAN S
MILLAN

- ☐ ADOQUÍN
- ☐ GUARNICION TIPO "A"

ELABORADO
[Signature]
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO
[Signature]
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZADO
[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta

15/04/2025 2:07:03 PM

Contrato

00798320

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NORM AD002

Importe de la operación: 108,367.97 MXP

Cuenta de retiro: 0117899181

Cuenta de depósito: 021741040410671411

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: CONSTRUCCIONES DORACO SA DE CV

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 15/04/2025

Fecha de aplicación: 15/04/2025

Concepto de pago: EST 01 NORM AD002

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 14:06:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000690862

Clave de rastreo: 002601002504150000690862

Folio de firma: 0049116055

Folio único: 1401202504151406530049116061

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	15/04/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/04/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
