



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/262/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACIÓN

02 NORMAL FINIQUITO

Badiraguato, Sin., a 13 de Mayo de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO NÚMERO: **60 (SESENTA) CON FECHA DE 19 DE FEBRERO DE 2024**, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE GARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-GC-002/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$235,556.73 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO
- **IMPORTE A PAGAR:** \$121,096.77 (CIENTO VEINTIUN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- **EMPRESA:** CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CDO070612UY1
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE COLON#375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
- **No. DE FACTURA:** # 287, DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA




MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

Alexis
13 MAY 2025

RECIBIDO

C.C.P. ARCHIVO.



CONSTRUCCIONES DORACO

CDO070612UY1

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
COLON, 375, Centro, 81000, Guasave, Guasave, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80500

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
S/N, 80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 287

FOLIO FISCAL (UUID)

C36020E5-E964-43D1-83B6-EB76F280633F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709569399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-05-12T13:11:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-05-12T12:00:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

81000

		CONCEPTOS			
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	<p>PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA." CONTRATO NO. MBGBR-AD-GC-002/2025</p> <p>CONTRATADO IMPORTE: \$203,066.15 IVA: \$32,490.58 TOTAL: \$235,556.73</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$107,165.29 MAS IVA 16% : \$17,146.44 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$124,311.73</p> <p>AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$0.00 MAS I.V.A. \$0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00</p> <p>MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$107,165.29 IVA A FACTURAR (16%): \$17,146.44 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$124,311.73</p> <p>RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.): \$3,214.96</p> <p>TOTAL DE DEDUCCIONES: \$3,214.96</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$121,096.77</p> <p>Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 107165.284 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17,146.45</p>	\$ 107,165.28	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 107,165.28

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS,
73/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 107,165.28

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 17,146.45

TOTAL

\$ 124,311.73

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e2pGEMcZHVOFRUuR4M4ucHPDU8Qtpla1t24tSijPJOGWV+qnNFePXrLD+ssYI6+JV1wpNMvqjWUlpnCFbP8n6CeQ8f7pyKE/6qaMwhlvgo3f5TRg4v3/AN0nGLu8FhqiVbG8O/8TK+rwGsuSdAN83yyeNbBVu1yIf9uCzdSNOtGsZa7iQvCqFfoPs6YQM3EMats6zaO2339um1xV4IPN7BCgfuTNVzKipuOMVlyXWiHxna9sNvoNARIV39Nwbrj6GKWg3E2+CbdpT/Azf0aH+pxnl04RMUO1+iuUKqFZdCRhZEGcoSTlbBR0BFnztRznX36Rmf0wQaXirKx3JSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YI93iptwQ91H6XipmedZx7cejN4L2UqNSbqEf05jKD32pCxCXcn2v3K1OviQ/yVD9m1gBQtnRy2Ok5VGWvSMI8eDhMAMvM5bnxrK8DaJD29ijSwBgM61Tnt3L6UzEDEHh6y3/69YHvhc3CjIAEQFOSBAM6q1t49DFHqE37/LraKxWyGGe8OGLYC27vzFxJAN91BEKjm97SoU5mkM4U/TP3M89qY1vztgyY/CTguutUoHUcnz5Cto0TdQC1KSJJiZMmQv1B+BUNFegD04tauTiAkFjcw5GiVBs/SiDQSGiNtaloTccOuKjC4FeuC1P8FH7s+uMhCJNzbwz4CFV2Qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C36020E5-E964-43D1-83B6-EB76F280633F|2025-05-12T13:11:17|STA0903206B9|e2pGEMcZHVOFRUuR4M4ucHPDU8Qtpla1t24tSijPJOGWV+qnNFePXrLD+ssYI6+JV1wpNMvqjWUlpnCFbP8n6CeQ8f7pyKE/6qaMwhlvgo3f5TRg4v3/AN0nGLu8FhqiVbG8O/8TK+rwGsuSdAN83yyeNbBVu1yIf9uCzdSNOtGsZa7iQvCqFfoPs6YQM3EMats6zaO2339um1xV4IPN7BCgfuTNVzKipuOMVlyXWiHxna9sNvoNARIV39Nwbrj6GKWg3E2+CbdpT/Azf0aH+pxnl04RMUO1+iuUKqFZdCRhZEGcoSTlbBR0BFnztRznX36Rmf0wQaXirKx3JSw==|00001000000711762511||



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="287" Fecha="2025-05-
12T12:00:04"
Sello="e2pGEMcZHVofRUuR4M4ucHPDU8QtpIa1t24tSIjPJ0gWV+qnNFePXrLD+ssYI6+JV1wpNMvqjWUlpnCFbP8n6CeQ8fF7pyKE/6qaMwhlvgo3f5TRg4v3/AN0nGLu8Fhq1VbG80/8TK+rw
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000709569399"
Certificado="MIIGIDCCBAigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk1NjkzOTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVoQQDDCxBQyBERUwguU0VSVk1DSU8gREUgQURNSUSJU1RSQUNJT04gVFJ
SubTotal="107165.28" Moneda="MXN" Total="124311.73" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81000">
  <cfdi:Emisor Rfc="CD0070612UY1" Nombre="CONSTRUCCIONES DORACO" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE LA
    OBRA; "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO UBICADO EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE EL
    MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA." CONTRATO NO. MBGBR-AD-GC-002/2025 CONTRATADO IMPORTE: $203,066.15 IVA: $32,490.58 TOTAL: $235,556.73 IMPORTE
    DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $107,165.29 MAS IVA 16% : $17,146.44 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $124,311.73 AMORTIZACION ANTICIPO 35%
    $0.00 MAS I.V.A. $0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO $0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $107,165.29 IVA A FACTURAR (16%):
    $17,146.44 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $124,311.73 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.) : $3,214.96 TOTAL DE DEDUCCIONES: $3,214.96 MONTO LIQUIDO
    A RECIBIR : $121,096.77" ValorUnitario="107165.284" Importe="107165.284" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="107165.284" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17146.445440"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17146.45">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="107165.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17146.45"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="C36020E5-E964-
    43D1-83B6-EB76F280633F" FechaTimbrado="2025-05-12T13:11:17"
    SelloCFD="e2pGEMcZHVofRUuR4M4ucHPDU8QtpIa1t24tSIjPJ0gWV+qnNFePXrLD+ssYI6+JV1wpNMvqjWUlpnCFbP8n6CeQ8fF7pyKE/6qaMwhlvgo3f5TRg4v3/AN0nGLu8Fhq1VbG80,
    NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
    SelloSAT="Y193iptwQ91H6XlpimedZx7ceJN4L2UqNSbqEf05jKD32pCxxcn2v3K10v1Q/yVD9m1gBQtNRY20k5VGWvSM18eDhMAMvM5bnxrK8DaJD29ijSwBgM61Tnt3L6UzEDEHh6y3/6"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 28 de abril de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		ESTIMACIÓN No: 02 NORMAL FINIQUITO	
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	14-abr-25
66777963151	66777963151	AL	18-abr-25
R.F.C.:		FECHA DE CONTRATO:	
CLE-070416-CP6		03-abr-25	
DEPENDENCIA:-			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		INICIO:	
		07-abr-25	
TERMINACIÓN:		18-abr-25	
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No:			
MBGBR-AD-GC-002-2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$203,066.15	\$235,556.73	\$0.00	\$235,556.73
			BUENO POR:
			\$ 121,096.77
RECIBI :			
\$ 121,096.77 (SON CIENTO VEINTIUNO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		02 NORMAL FINIQUITO	
DEDUCCIONES:			
CALCULO DE ESTIMACIÓN			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 107,165.29
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 17,146.44
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 124,311.73
3 % SVIFYC:	\$ 3,214.96	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 3,214.96
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 3,214.96	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 124,311.73
SALDO A PAGAR:			\$ 121,096.77

ELABORO.-

MAIR M. GARCIA ACOSTA
 CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones


CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		Fecha:	Estimacion:
		28 de abril de 2025	02 NORMAL FINIQUITO
Periodo de la estimacion:	14/04/2025 18/04/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	14/04/2025 18/04/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-GC-002-2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A
\$ 235,556.73	\$ 203,066.15	\$ -	\$ -
		% de Avance	
		53%	
		% Avance Total	
		100%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 107,165.29	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 17,146.44	
\$ -	Sub- Total A (=)	\$ 124,311.73	\$ 124,311.73
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ -	
	Importe TOTAL A FACTURAR	\$ 107,165.29	\$ 111,245.00
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 17,146.44	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=)	\$ 124,311.73	\$ 235,556.73
	3 % SVIFYC:	\$ 3,214.96	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 3,214.96	CONTRATADO
\$ -	Importe T O T A L	\$ 121,096.77	\$ 235,556.73
	NETO A PAGAR	\$ 121,096.77	
SALDO DEL ANTICIPO			SALDO
\$0.00	Sort:		\$ -
	(SON CIENTO VEINTIUNO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)		

ELABORO.-

REVISOR

AUTORIZO

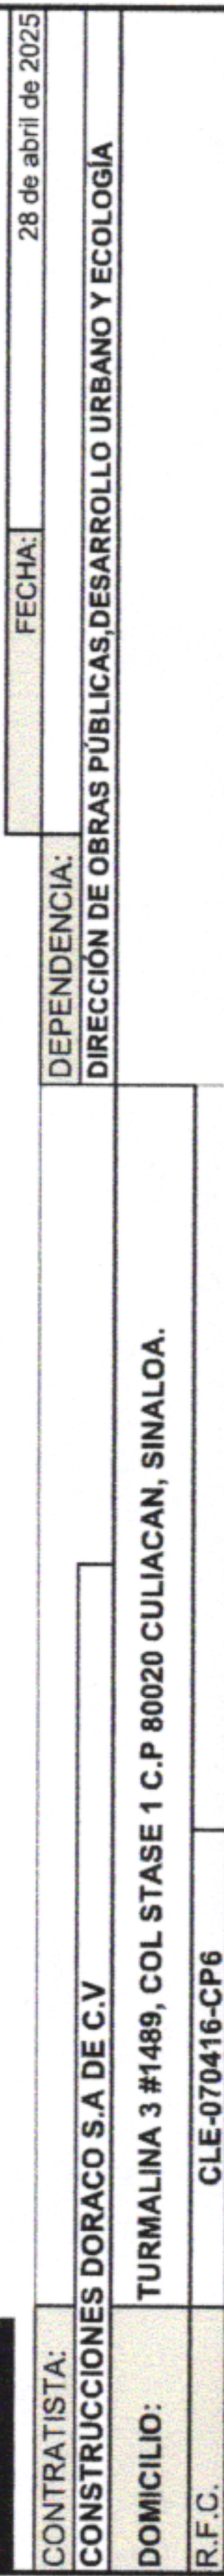

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
FECHA INICIO CONTRATO:	07-abr-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	18-abr-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-GC-002-2025
				FECHA CONTRATO:	03-abr-25

ELABORO.-
Miguel Meneses Agosto
CONSTRUCCIONES DORADO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
Jose Rodolfo Contreras Lopez
C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-
Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



FECHA 28 de abril de 2025

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020
CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.

CLE-070416-CP6

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:

BADIRAGUATO

ESTIMACIÓN:

02 NORMAL FINIQUITO

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA
ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:

\$ 203,066.15

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$ -

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$ 235,556.73

DESTAJO

IMPORTE

	OBRAS DIVERSAS	\$ 107,165.29
	SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 107,165.29

SUB TOTAL=	\$ 107,165.29
I.V.A AL 16 %	\$ 17,146.44
TOTAL =	\$ 124,311.73

ELABORO:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR:

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		FECHA lunes, 28 de abril de 2025	
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STAGE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		R.F.C. CLE-070416-CP6		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN					

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	LOCALIDAD: BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN: 02 NORMAL FINIQUITO
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$203,066.15	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$235,556.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			GANT	P.U.	TOTAL					
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	110.00	\$ 10.51	\$ 1,156.10	110.00	110.00	0.00	-	\$ -
GPO	PLANTILLA DE DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	93.00	\$ 359.92	\$ 33,472.56	93.00	93.00	0.00	-	\$ -
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	110.00	\$ 557.02	\$ 61,272.20	110.00	110.00	0.00	-	\$ -
GP102	ADOQUIN RECTANGULAR 05X20X40 CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	93.00	\$ 1,044.03	\$ 97,094.79	93.00	-	0.00	93.00	\$ 97,094.79
GP11	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	110.00	\$ 91.55	\$ 10,070.50	110.00	-	0.00	110.00	\$ 10,070.50
										SUB-TOTAL \$ 107,165.29
										IVA \$ 17,146.45
										MONTO TOTAL \$ 124,311.74
										POR CIERRE DE OBRA \$ 124,311.73

ELABORO: *Mano de Obrero Acosta*
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: *[Firma]*
C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO: *[Firma]*
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.		FECHA		lunes, 28 de abril de 2025			
R.F.C.		CLE-070416-CP6		DEPENDENCIA:					
OBRA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA							
ESTIMACION		02 NORMAL FINIQUITO							
CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.									
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
101.00	PRELIMINARES								
GP102	ADOQUIN RECTANGULAR 05X20X40 CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2						93.00	
				93.00					VER CROQUIS
							TOTAL EJECUTADO	93.00	
							ESTA EST	93.00	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,	ML						110.00	
				110.00					VER CROQUIS
							TOTAL EJECUTADO	110.00	
							ESTA EST	110.00	

ELABORADO

Mario Medina Acosta
CONSTRUCCIONES DORACO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO

Briceida
ARQ. BRICEIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZADO

Rubiel Rincon Ramos
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.U. Y E.



CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V

FECHA: lunes, 28 de abril de 2025

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C. CLE-070416-CP6

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
101	PRELIMINARES
GP102	ADOQUIN RECTANGULAR 05X20X40 CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,

ARCO BADIRAGUATO

BOULEVARD JUAN S
MILLAN

BOULEVARD JUAN S
MILLAN

☐ ADOQUÍN

☐ PINTURA

ELABORO:

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

		FECHA: lunes, 28 de abril de 2025	
CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.			
R.F.C.:	CLE-070416-CP6		
OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
FOTOS DE ESTIMACION:			
DE ESTIMACION: 02 NORMAL FINIQUITO			
CONCEPTO			
PRELIMINARES			
ADOQUIN RECTANGULAR 05X20X40 CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:			



O: *Mano de obra Acorde* **CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V**
REVISOR: *Briceida* **ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ**
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO: *Rubiel Rincon Ramos* **C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS**
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta 26/05/2025 1:07:56 PM
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 02 NOR FIN AD002 Importe de la operación: 121,096.77 MXP

Cuenta de retiro: 0117899181 Cuenta de depósito: 021741040410671411

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO Titular de la cuenta: CONSTRUCCIONES DORACO SA DE CV

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 26/05/2025 Fecha de aplicación: 26/05/2025

Concepto de pago: EST 02 NOR FIN AD002 Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382 Hora de captura en el canal: 13:07:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000615128 Clave de rastreo: 002601002505260000615128

Folio de firma: 0064560019 Folio único: I401202505261307480064560025

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	26/05/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/05/2025
