

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006-
2022.

NOTA NO. 1 20/JUNIO/2022.

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1006-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARÍA" ENCARGA A "LA CONTRATISTA", LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA: PAVIMENTACIÓN EN AV. PABLO DE VILLAVICENCIO, ENTRE CALLE EUTIMIO B. GÓMEZ Y CALLE LIC. FERNANDO B. HUIAR, UBICADA EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE COLACÁN, RO SALES, MUNICIPIO DE COLACÁN, ESTADO DE SINALOA.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 2'933,622.67 INCL. IVA.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SUMA, S.A. DE C.V.


REPRESENTANTE LEGAL: C. MANUEL LÓPEZ LÓPEZ.

PLAZO DE EJECUCIÓN:


INICIO: 20/JUNIO/2022.

TERMINO: 20/OCTUBRE/2022.

"LA SECRETARÍA" ASIGNA AL C. ING. MANUEL ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ, MEDIANTE CHICG NO. SOP-DIR-SUP-948-A-2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACIÓN SE REGISTRA SU FIRMA:



"LA CONTRATISTA" ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACIÓN SE REGISTRA SU FIRMA:



NOTA NO. 2 20/JUNIO/2022.

CONT-1006-2022.

"LA SECRETARIA" PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE REALIZAN A CABO LOS TRABAJOS VARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-948-DI-2022.

NOTA NO. 3 20/JUNIO/2022.

CON ESTA FECHA NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE DIERON INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO

NOTA NO. 4 20/JUN/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 50% DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL CUAL SERA NECESARIO EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES EN VIRTUD DE QUE LA LAPAC LAS SOLICITO, POR LO QUE SE AUTORIZA EJECUTARLAS SIN QUE SEA NECESARIO SUPLENIR EL FOLIO FINANCIERO AUTORIZADO.

NOTA NO. 5 11/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADO EL 100% DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, Y SE TIENE AVANCE DEL 50% EN EL DISEÑO SANITARIO, DE ACUERDO A LAS NUEVAS NECESIDADES SOLICITADAS POR JAPAC, DE LO CUAL SE AUTORIZAN CANTIDADES ADICIONALES.

NOTA NO. 6 18/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS CONCLUIDO EL DISEÑO SANITARIO 8" Ø Y DESCARGAS DE 6" Ø DIAM. POR OTRA PARTE TENEMOS UN AVANCE DEL 50% EN LA APERTURA DE CAJA.

NOTA NO. 7 25/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS FINALIZADA LA EXCAVACION DEL TOTAL DEL TUNEL: 0+000 AL 0+126.89 Y 0+137.98 AL 0+233.72; SE HAN INICIADO LOS ABRILLOS DE MATERIAL DE BANCO PARA SOBRESANTE.

NOTA NO. 8 29/JUNIO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL TOTAL DE LA CAPA SEDIMENTANTE CON MATERIAL DE BANCO Y ESPESOR DE 20 CMS. COMPACTADO AL 95%.

NOTA NO. 9 02/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO - Normal, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 20/JUNIO/2022 AL 31/JULIO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL	\$ 639,719.93
Amort. ANTICIPO	\$ 223,901.98
DEDUC. CONTATO	\$ 16,544.48
Liquido a PAGAR	\$ 399,273.47.

NOTA NO. 10 31/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA DEL KM 0+000 AL KM 0+126.

SE AUTORIZA UNA SOBRE EXCAVACION DE 20 CM. ADICIONALES AL PROYECTO (SECCIONES) Y SUSTITUCION CON MATERIAL DE SUBYACENTE (20 CM. ES PESOS), DADO QUE TENEMOS TIENNO DE DESPLANTE INESTABLE Y DE ESTA FORMA SE ESTABILIZA.

POR OTRA PARTE EN ESTE TRAMO TENEMOS EJECUTADA LA CAPA DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CUBRICION TIPO I, RIEGO DE IMPREGNACION Y BANCOS, ALUMBRADO PUBLICO.

➔ POR LO QUE SE AUTORIZAN CANTIDADES ADICIONALES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS METAS DE PROYECTO.

NOTA NO. 11 02/SEPTIEMBRE/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION DOS-ABRIL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 1,231,630.41
Amort. Anticipo	\$ 431,070.64
DEDUCC. ANTICIPO	\$ 31,852.51
Liquidado a pagar	\$ 768,707.26

NOTA NO. 12 30/SEPT/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO DEL KM 0+137.62 AL KM 0+233.72, LOS SIGUIENTES DATOS:

BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. CON MATERIAL PARCIALMENTE TRITURADO, RIEGO DE IMPREGNACION, GUARNICION TIPO I LI CON CONCRETO f'c = 250 KG/CM², BANQUETAS DE 10 CMS. ESPESOR CONCRETO f'c = 150 KG/CM², BASE DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO f'c = 300 KG/CM², ALUMBRADO PUBLICO.

NOTA NO. 13 03/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/SEPT/2022 AL 30/SEPT/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 889,274.25


AMORT. ANTICIPA \$ 371,795.31

DEDUC. CONTRATO \$ 72,998.47.

LIQUIDO A PAGAR \$ 444,480.47.

NOTA NO. 14 20/OCT/2022.


CON ESTA FECHA SE TIENEN CONCLUIDOS EL TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO.

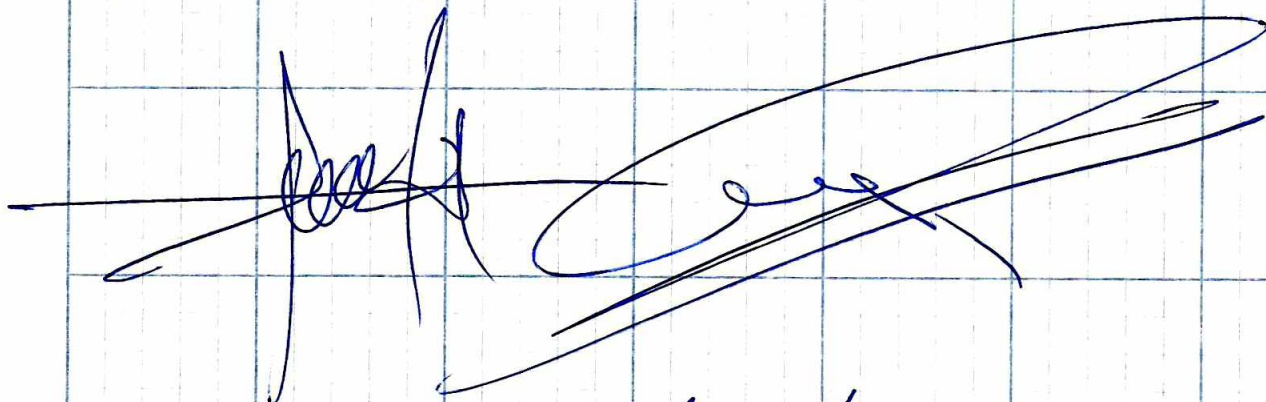

NOTA NO. 15 20/OCT/2022

CON ESTA FECHA SE DETERMINA LA ESTIMACION NUMERO CUATRO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/OCT/2022 AL 20/OCT/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$	30,209.73
Import. Envlope	\$	0.00
DEDUCC CONTOLTO	\$	781.29
Liquido a pagar	\$	29,428.44



NOTA NO. 16 21/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CINCO ADICIONAL FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/OCT/2022 AL 20/OCT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 142,788.34

AMORT. ANTICIPO \$ 0.00

DEDUCC. CONTRATO \$ 3,692.80

LIQUIDO A PAGAR \$ 139,095.54

NOTA NO. 17 21/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SE PROCEDE AL CIERRE FORMAL DE LA PRESENTE BITACORA.
