



Ahome
La Casa de Todos

Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/1317-26
Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 11 de agosto del 2026.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 2 (última)**: factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento a contraloría, oficio de transferencia para verificar fechas, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, acta de entrega de recepción, invitación a contraloría, acta administrativa de derechos y obligaciones contractuales, de la siguiente obra:

Importe contratado: \$ **601,986.23**
Importe contratado de la obra \$ **380,218.78**
Importe total estimado: \$ **380,218.78**
Importe total a pagar: \$ **237,308.96**

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026	(024AH26PR) Rehabilitación de red de alumbrado público en la localidad Ejido Plan de Guadalupe, sindicatura Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa.	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"AHOME, LA CASA DE TODOS"

DR. OLIVER GABRIEL LEAL AYALA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
OGLA/MYRG



GREENSTAR EDIFICACIONES SA DE CV

RFC emisor: GED190211TN4 Folio fiscal: 169F2412-322E-49EA-9BE5-6B223264E021
 Nombre emisor: GREENSTAR EDIFICACIONES No. de serie del CSD: 00001000000705454270
 Folio: 5 Serie: A
 RFC receptor: MAH1701013C0 Código postal, fecha y hora de emisión: 80105 2026-08-10 16:32:39
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE AHOME Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 81280 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Pagos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72151500		1.00	E48	Unidad de servicio	213,053.63	213,053.630000		Si objeto de impuesto.
Descripción	PAGO DE ESTIMACION 2 (ULTIMA) REFERENTE AL CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH -2026 POR LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN (024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE SINDICATURA TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. IMPORTE ESTIMACION NETO: \$ 380218.78 DEDUCCIONES: AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$ 133076.57 RET. VERIF.INSPECCION FIS. CONTROL 2% A.S.E.: \$ 6555.50 RET. VERIF. INSPECCION FIS. CONTROL 1% O.I.C.: \$ 3277.75 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 142909.82 IMPORTE A PAGAR: \$ 237308.96							
	Número de pedimento	Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 213,053.63
 Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 34,088.58
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 247,142.21
 Condiciones de pago: CREDITO

Sello digital del CFDI:

pOUIKGfSn0oe2hfy0kGE3eZSOIMftgN0uz79/5qqVgx+VozvECW0fVzqDy/FCQZH7QaWa5QqBhZRz1/Cc+YTOFm+Y1C2GX17sSm+tia/K1JkMBGDrFjmN0DMkCgFzm7mYc9fWIBb+JNO+WJ/5yLnfjk2tuDYlvrg+rgkk6riu82N7g5kABerxgJsvpT1MbkzYIEeqdUlxPQpeXRKybulkV3outNTicZOF24GRtp9KVHymv0A+Tu8+fk/efEslnxljbVx5q9TgakSp0E5M/vxu/2XTPwp6omrhG8yjs30gnkWTU+NpnfwRyrRyW511OV3Jrmdc8Zwgj5u0l23DtQ==

Sello digital del SAT:

aWaTDDX+ccMA0doyLVyLtpld6xq8WDBqc71R1ViHTxrDySdYlz2/OT+uT+qYa5SP3qe1gLE5TsP/Bvf3mHqS3i+ct1zNx+aDyWTDQD1a0z6ljYzwZMCE4K20yuoU1qM5npAV+uN7DET37ta8+twP1j1heHPSYml8vUcwl7pwAp/Kr9gNCWm5gA1BQHJV64KoUOQTqqJV8I2H+pAyCdatM2oDcSBLbriD7ygbmyu/jLPnXQq/CXDoqQdk8FMG8NOMZarSaxcEvqZTDEzG45EfAX90ZB2kGm1ejCbAuOZ8XaOGB4lik/AdV8V/Guou7cGW22LUXY9VYmbQ5IUAWB+wg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|169F2412-322E-49EA-9BE5-6B223264E021|2026-08-10T16:33:17|SAT970701NN3|pOUIKGfSn0oe2hfy0kGE3eZSOIMftgN0uz79/5qqVgx+VozvECW0fVzqDy/FCQZH7QaWa5QqBhZRz1/Cc+YTOFm+Y1C2GX17sSm+tia/K1JkMBGDrFjmN0DMkCgFzm7mYc9fWIBb+JNO+WJ/5yLnfjk2tuDYlvrg+rgkk6riu82N7g5kABerxgJsvpT1MbkzYIEeqdUlxPQpeXRKybulkV3outNTicZOF24GRtp9KVHymv0A+Tu8+fk/efEslnxljbVx5q9TgakSp0E5M/vxu/2XTPwp6omrhG8yjs30gnkWTU+NpnfwRyrRyW511OV3Jrmdc8Zwgj5u0l23DtQ=|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2026-08-10 16:33:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Versión 4.5.1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GED190211TN4	GREENSTAR EDIFICACIONES	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
169F2412-322E-49EA-9BE5-6B223264E021	2026-08-10T16:32:39	2026-08-10T16:33:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$247,142.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



[illegible]



Los Mochis, Sinaloa., a 05 de junio de 2026

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$380,536.34 (Son: Trescientos Ochenta Mil Quinientos Treinta y Seis pesos 34/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
FAISMUN-024/2026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2026	56	614964	1235/4/9/911/9311

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.


ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
DE AHOME

C.c.p. LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
2 (ULTIMA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.			
	DOMICILIO	Calle prolongación Palenque, número exterior 777, colonia Recursos Hidráulicos, entre calle Copilico y calle S/N, código postal 80105, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.			
	CIUDAD:	CULIACAN	ESTADO:	SINALOA	TELÉFONO:

DATOS DEL CONTRATO	No. de Contrato:	FECHA DE CONTRATO	22 DE JUNIO DE 2026.	IMPORTE DEL CONTRATO
	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.			\$601,986.23
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN			IMPORTE DE LA OBRA
	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO			\$380,218.78
PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.				AÑO 2026.

BUENO POR: \$237,308.96

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE: \$237,308.96

(Son: Doscientos Treinta y Siete Mil Trescientos Ocho Pesos con 96/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 27 DE JULIO DE 2026. AL 08 DE AGOSTO DE 2026.

DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$213,053.63		\$327,774.81
I.V.A. 16%:	\$34,088.58		\$52,443.97
SUMA:	\$247,142.21		\$380,218.78
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35%:			\$133,076.57
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.			\$6,555.50
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.			\$3,277.75
TOTAL DE DEDUCCIONES:			\$142,909.82
IMPORTE A PAGAR:			\$237,308.96
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A	08 DE AGOSTO DE 2026.		

RECIBI


C. XOCHIL MARIBEL GANIZALEZ LOBO

GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TARRA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR:	\$247,142.21
IMPORTE A PAGAR:	\$237,308.96



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




RESUMEN DE ESTIMACIÓN

ESTIMACION NO. 2
(ULTIMA)


El escudo nacional de El Salvador, que representa la agricultura, la industria y la navegación, con la leyenda "REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL" y el lema "DIEZ SEPTIEMBRE DE NOVENA" en la cinta inferior.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div></div><div><div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div><div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div></div><div><div><div><div>Ahome</div><div>La Casa de Todos</div></div></div></div><div><div>ESTIMACIÓN NO. 2 (ULTIMA)</div><div>HOJA 1</div><div>DE 1</div></div></div>									
		OBRA: (024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.		CONTRATO: FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.					
				CONTRATISTA: GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.					
PERIODO DEL : 27 DE JULIO DE 2026.		AL 08 DE AGOSTO DE 2026.	FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2026.						
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RED DE ALUMBRADO								
01	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA,	PZA	1 DE 1	41	41	0	41	\$7,979.95	\$327,177.95
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1 DE 1	1	1	0	1	\$596.86	\$596.86
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO						\$327,774.81			
IVA						\$52,443.97			
TOTAL						\$380,218.78			

CONFORME

XOXCHIL MARIBEL CAMARILLO LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARO. JESUS ERNESTO TELLEZ CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA 1		
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS												DE 1		
												ESTIMACION No. # 2 (ULTIMA)		
OBRA:	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.										CONTRATO:		FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.	
											CONTRATISTA:		GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	
												FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2026.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES		
1	RED DE ALUMBRADO													
01	LUMINARIAS													
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA.	PZA								41	41	41		
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA								1	1	1		

C. XOCHEL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Arg. Adán Rogelio Rios Jimenez



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.		
FECHA	08 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	2 (ULTIMA)

001

SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,

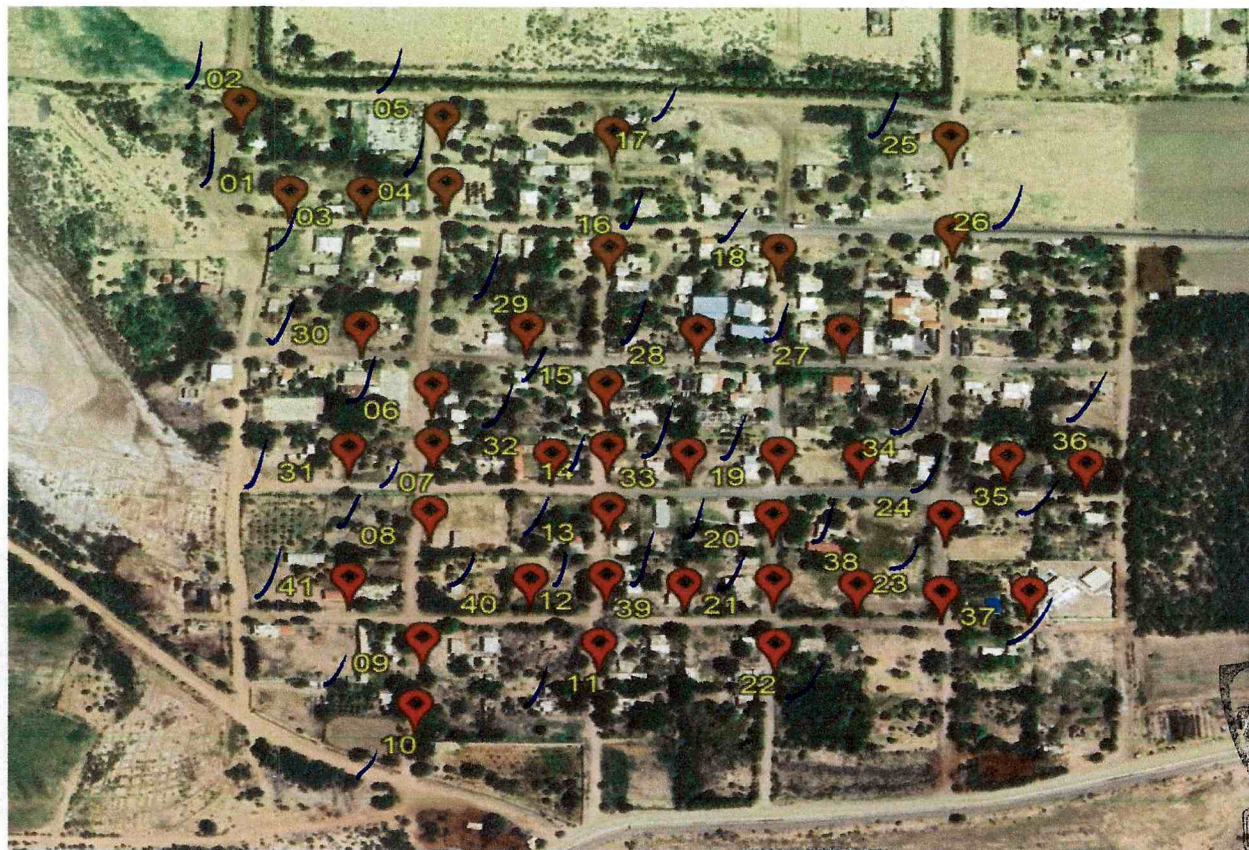

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO																																																									
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1																																																								
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	1																																																								
OBRA:	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026																																																								
							CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.																																																								
PERIODO DEL : 27 DE JULIO DE 2026. AL 08 DE AGOSTO DE 2026. FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2026.																																																																
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE																																																							
				E2	E3	TOTALES																																																										
	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.																																																															
1	RED DE ALUMBRADO																																																															
01	LUMINARIAS																																																															
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA.	PZA	41	41.00	0	41.00	0.00	\$7,979.95	\$0.00																																																							
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$596.86	\$0.00																																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="7">SUBTOTAL DE LUMINARIAS</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SUBTOTAL:</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">IVA:</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:</td> <td>\$380,218.78</td> </tr> <tr> <td colspan="7">INVERSIÓN EJERCIDA:</td> <td>\$380,218.78</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SALDO NO EJERCIDO:</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>									SUBTOTAL DE LUMINARIAS							\$0.00	SUBTOTAL:							\$0.00	IVA:							\$0.00	TOTAL							\$0.00	INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:							\$380,218.78	INVERSIÓN EJERCIDA:							\$380,218.78	SALDO NO EJERCIDO:							\$0.00
SUBTOTAL DE LUMINARIAS							\$0.00																																																									
SUBTOTAL:							\$0.00																																																									
IVA:							\$0.00																																																									
TOTAL							\$0.00																																																									
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:							\$380,218.78																																																									
INVERSIÓN EJERCIDA:							\$380,218.78																																																									
SALDO NO EJERCIDO:							\$0.00																																																									

CONFORME

 C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
 GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

REVISÁ

 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
 RESIDENTE DE OBRA


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.		
FECHA	08 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	2 (ULTIMA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA,		




C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.		
FECHA	08 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	2 (ULTIMA)

001


SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,




011



012




013




014




015




016



017



018



019



020

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS






AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.		
FECHA	08 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	2 (ULTIMA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA,		



C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO

GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE		
	GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.		
FECHA	08 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	2 (ULTIMA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.		
FECHA	08 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	2 (ULTIMA)


001

SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,

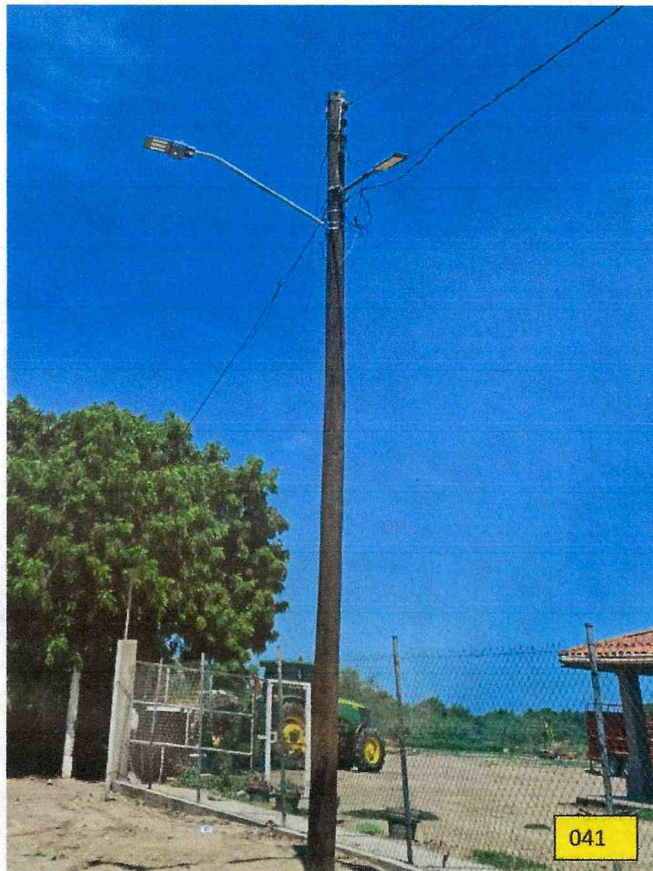

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.		
UBICACIÓN:	LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.		
No. CONTRATO:	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.		PROGRAMA
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 601,986.23	IMPORTE TOTAL	FONDODE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALESDEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026), autorizados por tesoreria Municipal mediante oficios con numero: FAISMUN-023/2026 Y FAISMUN-024/2026 ambos de fecha: 05 de junio de 2026; Obras que fueron autorizadas por el Subcomite de Desarrollo Social del municipio de Ahome, incluidas en el programa anual de inversion de obra publica (POA) 2026, con numeros: O-120 Y O-121. y aprobadas para su ejecucion por Presidencia Municipal, mediante oficios con numero: AHO/PRES/130/2026 Y AHO/PRES/131/2026 ambos con fecha 05 de junio de 2026.
MONTO DE LA OBRA:	\$ 380,218.78		SUBPROGRAMA
FECHA DE INICIO:	23 DE JUNIO DE 2026.	REAL:	27 DE JULIO DE 2026.
FECHA DE TERMINO:	22 DE JULIO DE 2026.	REAL:	08 DE AGOSTO DE 2026.
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Calle prolongación Palenque, número exterior 777, colonia Recursos Hidráulicos, entre calle Copilico y calle S/N, código postal 80105, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.		
TELÉFONOS:	(667) 199 78 33		
TIPO DE TRABAJO:	REHABILITACION DE LUMINARIAS		
REPRESENTANTE:	C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO		
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1.- C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA		ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA	
2.- FRAIRE VILLEGAS JESUS M. SUPERINTENDENTE			
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

1

UBICACIÓN:

LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE,
SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO

CONTRATISTA:

GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

22/07/2026

APERTURA

CON ESTA FECHA SE DECLARA ABIERTA ESTA
BITACORA DE LA OBRA:

(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO
PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

Fraire Villegas Jesus M.

FRAIRE VILLEGAS JESUS M.
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

2

UBICACIÓN:

LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE,
SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO

CONTRATISTA:

GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

1

02/08/2026

TRABAJO

4/ PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION CON GRUA DE
LUMINARIAS LED, PROMETEO BOW,
100-277V, FOTOCELDA, SUPRESOR DE PICO
DE 10KV, BRAZO DE 1.80 SEGUN ESPE-
CIFICACIONES TECNICAS DE CATALOGO
DE CONCEPTOS CON 10 AÑOS DE
GARANTIA.

Fraire Villegas Jesus M.

FRAIRE VILLEGAS JESUS M.
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

3

UBICACIÓN:

LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE,
SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO

CONTRATISTA:

GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.


CONTRATO:

FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	08/08/2026 ESTIMACION	CON ESTA FECHA SE PRESENTA ESTA ESTIMACION PARA SU REVISION Y TRAMITE DE PAGO; CON UNA CANTIDAD DE: \$ 380,218.78
	CIERRE	CON ESTA FECHA SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA DE LA OBRA (024AH26PR) CONTRATO: FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

Fraire Villegas Jesus M.

FRAIRE VILLEGAS JESUS M.
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN


CONTRATISTA:	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE		
	GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.		
FECHA	08 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	2 (ULTIMA)


UBICACIÓN


COORDENADAS

LOCALIDAD EJIDO PLAN DE
GUADALUPE, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME,
SINALOA.

25.692931°, -109.098253°

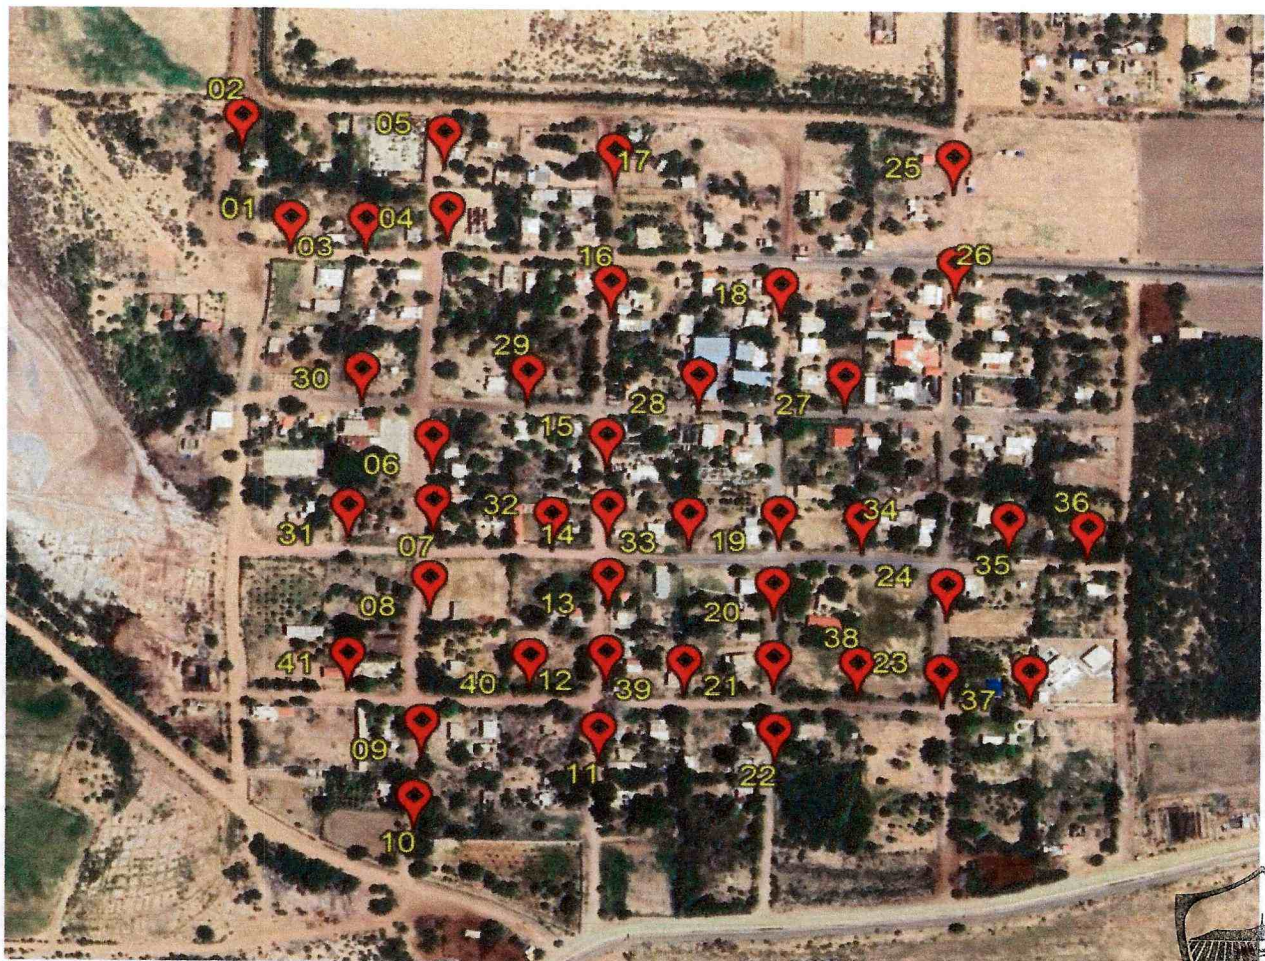


C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDADES: TOPOLOBAMPO y EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRAS: 1).- (023AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y 2).- (024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026)-1

CONTRATISTA: GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$601,986.23 (I.V.A. INCLUIDO)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 22 DE JUNIO DE 2026, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y LA MORAL DENOMINADA GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., CELEBRARON "EL CONTRATO PRINCIPAL" IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 24 DE JULIO DE 2026, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO, "EL CONTRATISTA" INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 27 DE JULIO DE 2026.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NÚMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA:

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 24 DE JULIO DE 2026




**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA**

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ Y REVISÓ

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. OLIVER GABRIEL LEAL AYALA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGÍA



**SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte la moral denominada **GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**, representada por la ciudadana **XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO**, en su carácter de apoderada, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 22 de junio de 2026, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad las obras: 1).- (023AH26PR) **REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; y 2).- (024AH26PR) **REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, el cual dice de la siguiente manera:

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 (TREINTA) días naturales, iniciando los trabajos el día 23 de junio de 2026 y a terminarlos a más tardar el día 22 de julio de 2026, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL: \$518,953.65 (SON: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.)
I.V.A. (16%): \$83,032.58 (SON: OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.)
TOTAL: \$601,986.23 (SON: SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N.)

I.6.- Se otorgo el anticipo a "EL CONTRATISTA" al que por Ley tiene derecho, con fecha 24 de julio de 2026.

I.7.- Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Diferimiento, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de los trabajos.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

. - Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de la obra que se encuentra en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de los trabajos, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de los trabajos.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de la obra contratada, quedando de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
1	(023AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
		23 de junio de 2026	22 de julio de 2026	27 de julio de 2026	25 de agosto de 2026
2	(024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
		23 de junio de 2026	22 de julio de 2026	27 de julio de 2026	25 de agosto de 2026

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026)-1

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente Convenio de Diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este Convenio de Diferimiento, continuaran vigentes todas las estipulaciones de "EL CONTRATO PRINCIPAL".

QUINTA. - El presente Convenio de Diferimiento comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por "LAS PARTES" que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día 24 de julio de 2026.

Por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"

C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL

Por "EL CONTRATISTA"

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
APODERADA DE LA MORAL DENOMINADA
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

TESTIGOS:

C. OLIVER GABRIEL LEAL AYALA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME




C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JOAQUÍN PAEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

C. MARÍA LUISA GÓMEZ LIZÁRRAGA
SÍNDICA PROCURADORA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran por una parte, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte la moral denominada GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., representada por la ciudadana XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO, en su carácter de apoderada, celebrado con fecha 24 de julio de 2026.

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A 27 DE JULIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO A USTED Y MANDARLE UN CORDIAL SALUDO REFERENTE A EL CONTRATO:

Nº. FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

CON EL NOMBRE DE:

(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

ESTOY SOLICITANDO UN DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2026.

FECHA DE TERMINO: 22 DE JULIO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES.

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRAZO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO: 27 DE JULIO DE 2026.

FECHA DE TERMINO: 25 DE AGOSTO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Calle prolongación Palenque, número exterior 777, colonia Recursos Hidráulicos, entre calle Copilico y calle S/N, código postal 80105, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1214-26

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento por retraso en la entrega del anticipo.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 28 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificaran a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato número: **FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026**, mismas que se detallan a continuación: **(023AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** **(024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Cuyas obras le fueron adjudicadas al contratista de nombre: **GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo con fecha del: **24 de julio del 2026**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

(023AH26PR)-(024AH26PR)	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	23/06/2026	27/07/2026
Fecha de termino:	22/07/2026	25/08/2026
Plazo de ejecución:	30 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.



ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.C.P. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
C.C.P. GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V./Contratista
C.C.P. Archivo
JETC/AARF

31/JUL/2026

LOS MOCHIS, SINALOA, A 24 DE JULIO DE 2024.

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE SE RECIBIO EL 35% DE ANTICIPO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME FUE EN LA FECHA DEL 24 DE JULIO DE 2024, DE LAS OBRAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

- 1).- (023AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
- 2).- (024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NÚM. DE CONTRATO: FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026

Estimado cliente: GREENSTAR EDIFICACIONES SA DE CV

La siguiente operación ha sido PROCESADA

Folio: 9374426
Clave de seguimiento: 8846APR1202607245571510151
Cuenta: *****908
Banco: AFIRME
Cuenta Beneficiaria: *****154
Concepto: PAGO ANT 35POR AP 7008 FACT A3
Cantidad: 210695.18
Rama: CENTRO ADMINISTRATIVO
Agencia: 0
Banco beneficiario: 62
Beneficiario: GREENSTAR EDIFICACIONES SA DE CV
Fecha de operación: 24/Jul/2026
Hora de operación: 10:14:00

SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA SALUDARLO.

ATENTAMENTE:


C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
REPRESENTANTE LEGAL





FECHA DE ENTREGA: 27 DE JULIO DE 2026.

FECHA DE INICIO: 27 DE JULIO DE 2026.

FECHA DE TERMINACION: 25 DE AGOSTO DE 2026.

DURACION: 30 DIAS NATURALES


(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

Reprogramacion de Obra de Montos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	Año 2026	
								01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago
	(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.			27/Jul/2026	30c	25/Ago/2026	\$327,774.81	\$68,162.14	\$259,612.67
1	RED DE ALUMBRADO			27/Jul/2026	30c	25/Ago/2026	\$327,774.81	\$68,162.14	\$259,612.67
01	LUMINARIAS			27/Jul/2026	30c	25/Ago/2026	\$327,774.81	\$68,162.14	\$259,612.67
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 100W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 100W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 15,500 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 100W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 100W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 15,500 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA	PZA	41.00	27/Jul/2026	30c	25/Ago/2026	\$327,177.95	\$68,162.14	\$259,015.81

ATENTAMENTE

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

PROLONGACIÓN PALENQUE #777-B, COL. RECURSOS HIDRÁULICOS, C.P. 80100 CULIACÁN,
RFC: GED190211TN4 TEL. 667 1997833 CORREO: greenedificaciones@gmail.com



FECHA DE ENTREGA: 27 DE JULIO DE 2026.

FECHA DE INICIO: 27 DE JULIO DE 2026.

FECHA DE TERMINACION: 25 DE AGOSTO DE 2026.

DURACION: 30 DIAS NATURALES

(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

Reprogramacion de Obra de Montos									
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	Año 2026	
								01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago
002	P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	19/Ago/2026	7c	25/Ago/2026	\$596.86		\$596.86
TOTAL PARCIAL:							\$327,774.81	\$68,162.14	\$259,612.67
TOTAL ACUMULADO:								\$68,162.14	\$327,774.81

ATENTAMENTE

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

PROLONGACIÓN PALENQUE #777-B, COL. RECURSOS HIDRÁULICOS, C.P. 80100 CULIACÁN, SINALOA

RFC: GED190211TN4 TEL. 667 1997833 CORREO: greenedificaciones@gmail.com



GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

22 DE JUNIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE ES EL ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA:
(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

N° DE CONSTRATO: FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA.

CEDULA PROFESIONAL:
No. 6768269

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Fraire Villegas Jesus M.

ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS
SUPERINTENDENTE

ATENTAMENTE

C. Xochil Maribel Canizalez Lobo

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL





SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Calle prolongación Palenque, número exterior 777, colonia Recursos Hidráulicos, entre calle Copilico y calle S/N, código postal 80105, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

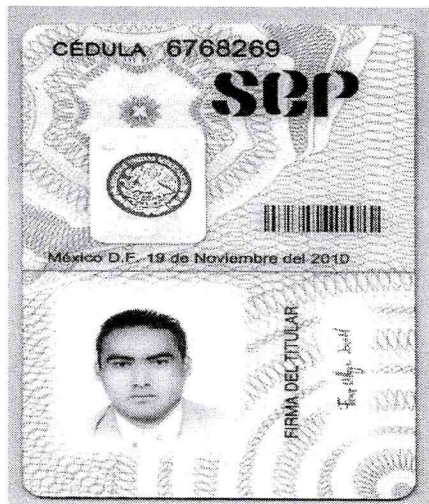

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Calle prolongación Palenque, número exterior 777, colonia Recursos Hidráulicos, entre calle Copilico y calle S/N, código postal 80105,
localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 23 de junio del 2026.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
PRESENTE.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de las siguientes:

(023AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Número de contrato: FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

Fecha: 22 de junio de 2026.

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

23/JUNIO/2026



C.c.p.- GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V./Contratista
C.c.p.- Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF



23/06/26



GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

27 DE JULIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

OFICIO DE INICIO DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL **INICIO** DE LA OBRA EMPEIZA REALIZARSE EN LA FECHA DEI **27 DE JULIO DE 2026**.
EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:
**(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.**

CONTRATO N°:
FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE


C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Calle prolongación Palenque, número exterior 777, colonia Recursos Hidráulicos, entre calle Copilco y calle S/N, código postal 80105, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome

Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología

Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1213-26.

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 28 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL


Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato numero: FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026., consistentes específicamente en: **(023AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**; cuyas obras le fueron adjudicadas a **"EL CONTRATISTA" GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,** con un importe total de hasta: **\$ 601,986.23**, identificándose como origen del recurso el correspondiente a: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026).**

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a las obras antes señaladas, quedaron establecidos como a continuación se indica:

(023AH26PR)-(024AH26PR)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
27/07/2026	25/08/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.



ATENTAMENTE
ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga /Síndica Procuradora
c.c.p. GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V./Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/AARF

31 JUL 2026





GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A 08 DE AGOSTO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

FINAL DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL **FINAL** DE LA OBRA EMPEZ'A REALIZARSE EN LA FECHA DEL **08 DE AGOSTO DE 2026**.
EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:
**(024AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.**

CONTRATO N°:
FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE


C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Calle prolongación Palenque, número exterior 777, colonia Recursos Hidráulicos, entre calle Copilico y calle S/N, código postal 80105, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
GREENSTAR EDIFICACIONES SA DE CV	POSITIVO

RFC	Folio
GED190211TN4	26NH6357542

Fecha y hora de emisión

07 de agosto de 2026 a las 15:44 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.



Cadena Original

||GED190211TN4|26NH6357542|07-08-2026|P||0000108888800000031||

Sello Digital

dxd38zt1WmGQvj0ShPNsBL74QKF6P8gUiTu+/gzA6icZRhUcyRW6sYT/jg7ngZQ3XbMx0bdeWKIKKH8QSaAMsGhWS
nDF64fbW9Esug8cK+6+9C+a3/jYNJdNBpGci6iLNBV0d0XcxZ50wd4fNIF+714oEOJKdWgCtfeChu14HsUMqGa7
Dyx0+AolaPvBk9NISjECJDdT2Y7/xS7WNqctXMa2vzLPxnBwCYZMpmRO0QxiHEPMktR3d2hISM36BF1mya8bLW63T
2+O6l6J78Xd/gUaV84QO4SBqE/fLiRPCLWfGbKI5PTOnl+4vZn9GIM/4WbX+dXvcWNM5Lb+w==



Gobierno de
México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2026-006392

Los Mochis, Sinaloa, 24 de junio de 2026

C. GREENSTAR EDIFICACIONES, SA DE CV, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.

Obligacion	Detalles	Al corriente
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RAMÓN VILLA HURTADO
DIRECTOR DE INGRESOS



Cadena de Seguridad
nhYYkH5rELrYNvqcYY0o3S0JaIU=





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1329-26

Asunto: El que se indica

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 12 de agosto de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: (024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Que tiene el número de contrato: **FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.**

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 08 de agosto de 2026, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día martes 18 de agosto de 2026 a las **09:00 a.m.** horas.

Se anexa croquis de localización.



~~ATENTAMENTE~~

~~ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO~~
~~DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS~~



C.C.P.- Joaquín Paez Roiz/Secretaría de Bienestar
C.C.P.- María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora
C.C.P.- GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V./Contratista
C.C.P.- Ing. Alejandro Gonzalez Connant/Residente De Obra
C.C.P.- Archivo
JETC/AARF

UBICACIÓN: LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

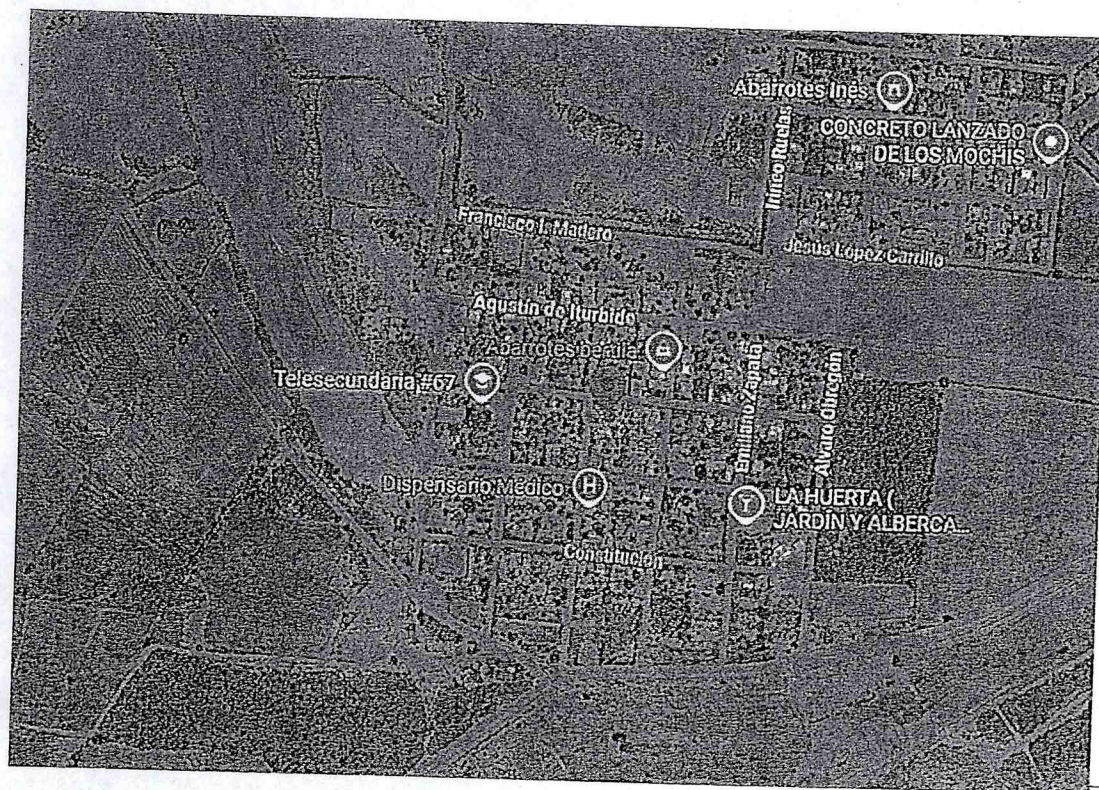

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.

(024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD
EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

COORDENADAS: 25°41'35.2"N 109°05'54.8"W



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra : (024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Localidad	EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
Municipio	AHOME
Num. De contrato	FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.
Contratista	GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
Importe de la obra	\$380,218.78
Anticipo entregado	\$133,076.57
Fianza de anticipo	26A29416, DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
Fianza de cumplimiento	26A29425, DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
Inicio de los trabajos	27 DE JULIO DE 2026
Termino de los trabajos	08 DE AGOSTO DE 2026
Plazo de días de ejecución de la obra	13 DIAS

En Los Mochis Sinaloa siendo las: 09:00 horas del día 18 de AGOSTO del 2026

Se reunieron para la entrega-recepción de la obra antes mencionada las siguientes personas:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

Residente de Obra

GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACIÓN NO. 2 (ULTIMA) (024AH26PR)	27/07/2026	08/08/2026	\$380,218.78	\$380,218.78	\$237,308.96	\$237,308.96
Saldo a cancelar			\$0.00			


El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leída la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
Residente de Obra



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

ENTREGO EL CONTRATISTA

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.



Municipio de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Datos generales de las Obras:

Obras:

(023AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. de contrato: **FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH-2026.**
Fecha de contrato: **22 de junio de 2026**
Inversión contratada: **\$ 601,986.23**
Inversión ejercida: **\$ 594,923.57**
Fecha de inicio: **27 de julio de 2026**
Fecha de término: **08 de agosto de 2026**

Siendo las **10:00** hrs. del día **18 de agosto** del año **2026** se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, ubicadas en Palacio Municipal, cita en Degollado y Cuauhtémoc, Los Mochis, Sinaloa; las siguientes personas:

Nombre

Cargo

Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro

Director de Obras Públicas

C. Xochil Maribel Canizalez Lobo
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

Contratista

Declaraciones

I.-EI H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que encomendó a GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., "El Contratista" la realización de las obras **(023AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (024AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**





Municipio de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Observando para ello todo lo establecido en el contrato, proyecto, especificaciones técnicas, presupuesto y programa de obra respectivos.

II.-El H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que "El Contratista" cumplió con dicha encomienda acatando para ello, lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el contrato, de acuerdo al presupuesto, proyecto, especificaciones técnicas y programa de ejecución respectivo. Se ha levantado el acta correspondiente a la entrega-recepción de la obra con fecha 18 de agosto de 2026, y se elaboró el finiquito con fecha 08 de agosto de 2026.

III.-Ambas partes, EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME y "El Contratista" declaran que a la fecha no existen adeudos por lo que se dan por terminadas las obligaciones establecidas en el contrato respectivo, sin derecho a posterior reclamación, reservándose EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME el derecho de hacer reclamaciones a "El Contratista" en lo que resulte por daños derivados de vicios ocultos, en los términos señalados en el contrato y fianza respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 10:15 horas del día 18 del mismo mes y año arriba señalado.

Por "El Contratante"

Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro
Director de Obras Públicas

Por "El Contratista"

C. Xochil Maribel Canizalez Lobo
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.



CONTRATO NO. FAISMUN-ALP

Pregunta a Gemini

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQhVrBZVSnnWKJQMLNMSPKCHnWN

M Gmail

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Categorías

Más

Etiquetas

Buscar en el correo electrónico

Activo

3 de 2,567

CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-023PR-024PR-AH -2026

External

Recibidos x

Green Star <greenstar.edifica@gmail.com>

para mi, facturas, egresos, RAMONLEAL_13, aaronrf1119

F-A5 - EST. 2 (ULTIMA)

LOCALIDAD EJIDO PLAN DE GUADALUPE

3 archivos adjuntos

Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

A5 MUNICIPIO DE...

A5 MUNICIPIO DE...

FA5_Verificación ...

Responder

Responder a todos

Reenviar

Compartir en el chat

Nuevo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESP

12:48
