

OFICIO No. OPDUyE/775/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 02 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 15 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SERGIO URIAS RUBIO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,345,444.37 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$407,109.11 (CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 11/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SERGIO URIAS RUBIO
- R.F.C. UIRS-830403-HH7
- DOMICILIO FISCAL: CALLE MAYO #1593 OTE, ENTRE CEIBA Y AMAPAS, FRACC. UAS 94, LOS MOCHIS, SINALOA, C.P. 81285
- No. DE FACTURA: # 0350, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.C.P. ARCHIVO.



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

15 DIC 2025
Adrian G.
RECIBIDO
17:52

SERGIO URIAS RUBIO
UIRS830403HH7
MAYO ORIENTE No. 1503 Universitario,
Los Mochis C.P. 81285 Ahomá
Sinaloa México
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 428

FECHA: 13/12/2025 12:48:27

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	R.F.C.:	MBAR50101214
DOMICILIO:	GABRIEL LEYVA SOLANO No. S/N COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: 101 - Construcciones.		
CIUDAD:	Badiraguato, Sinaloa, México C.P. 80500		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	E48	72101500 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN ESTIMACION 02 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBOBR-AD-FAISMUN- 023/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 1,345,444.37 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 502,305.40 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 196,806.89 TOTAL: \$ 365,498.51 (+) MAS 16% IVA: \$ 58,479.76 TOTAL: \$ 423,978.27 DEDUCCIONES 3% SWIFCO: \$ 16,868.16 SALDO LIQUIDO: \$ 407,109.11	365,498.51 502 - IVA - \$8,479.76	365,498.51

CANTIDAD CON LETRA: (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO*

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO: FPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	\$365,498.51
IVA 16%	\$58,479.76
TOTAL	\$423,978.27

COMPLEMENTO DE IMPUESTOS LOCALES (V1.0)

Monto total retenido

Impuesto local retenido	Tasa de Retención	Importe
AUD. SUP. EST.	2 %	0.00
CRG. DE CONTROL	1 %	0.00
SUP. MUN.	2 %	0.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de Expedición: 81285 Moneda: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL

7E8E76B0-8595-47EB-BBFD-05F705AF0350

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Diciembre 13 2025 - 13:48:29

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AMRfzwz55Mh2X1WdWw3PReZQ9M4TaL155CINuq9D0fYpLkkg24FUFyBlyOnzwLpUddriaNn2BvvcuV3FFyDf
Xa+gyGRHSL8m7YNQ1FpX21bIAWCS8+80yAwEBjMgbJsm0KghBaaIDP6CQZUWw65OoEI3qDA6YdAXaIlhdJ9KtDY5s9
NnHFJFM0XnpY2Me0bgCLbf1ErHwMxQ2Dw0ajFpCbmwRavS+MBquHwNA2O2pPR5j78NUcV7H8mw5M7Qc1HnxTwhRacdegPy
E8UJfuHEmolyHjKkVg8RkKpM2kmVw8LOScl1Kkng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]7E8E76B0-8595-47EB-BBFD-05F705AF0350/2025-12-13T13:48:29(MAS0610247C0)AMRfzwz55Mh2X1WdWw3P
ReZQ9M4TaL155CINuq9D0fYpLkkg24FUFyBlyOnzwLpUddriaNn2BvvcuV3FFyDfMw1gGRHSL8m7YNQ1FpX2
1bIAWCS8+80yAwEBjMgbJsm0KghBaaIDP6CQZUWw65OoEI3qDA6YdAXaIlhdJ9KtDY5s9NnHFJFM0XnpY2Me0bgCLbf
1ErHwMxQ2Dw0ajFpCbmwRavS+MBquHwNA2O2pPR5j78NUcV7H8mw5M7Qc1HnxTwhRacdegPyE8UJfuHEmolyHjKkVg8RkK
pM2kmVw8LOScl1Kkng==j0000100000709182896]]

SELLO DEL SAT

L8iROWZ6mU710D0M5QVUcHn2BAZMKTGnKtTicWw1s6ONN16ZLF3z8G6NMfacy13Xw7Mlur8DDJFKIALGYGd1CSu
ZP08DzcVw06M4ZZVDAYH8Kp3dmWmgNwH1Yv052PcT7KNGXTIN2A6XmcNE.TwncC9z4rc3t98KL1YuU4n8CXEaHCq02J/
PYseH8INB16EQ6EabCa5XJZV1LPKjwwDn22IPjEPjwW0HADfOpHZ1NBpeK04DFsbqL6EXuV2F2kDe+an1255K12NCmWMAEv
pLVHDnK2V173688F0c48MIdMwnOF+JL1ekJHmPZw==

Débo (smos) y pagará (mos) a la orden de SERGIO URIAS RUBIO, En esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, la cantidad CUATROCIENTOS
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. (423,978.27 M.N.) Valor de las mercancías arriba detalladas y que reboi (mos)
de conformidad, este pagará es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos
correlativos por no ser pagará domiciliado. Si este pagará no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5% mensual hasta la
fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="428" Fecha="2025-12-
13T12:48:27"
Sello="AMjr8zwsz55Mn2XlWdFW/3PRsZQ9M14Ta155fC1NugKhD0ffYBsIkxg24FUFysBiyOnzvLn+xidr+ekNm2Bvvcu4V3/FFyFDfXhr+gvG8HSL8m7YNIQ1FpsXz1bIAWC8E+SotyAwEb
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000511952375"
Certificado="MIIFzZCCA7egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE5NTIzNzUwQDYjKoZihvcNAQELBQAwggGEMSAWigYDVQ00B4BVVRPUk1EQUQsQ0QVSVE1G5UNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
SubTotal="365498.51" Moneda="MXN" Total="423978.27" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81285">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="UIR5038403HH7" Nombre="SERGIO URTAS RUBIO"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA650101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="01" Descripcion="SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN ESTIMACION
02 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 1,345,444.37 IMPORTE DE
ESTA ESTIMACION: $ 562,305.40 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 196,806.89 TOTAL: $ 365,498.51 (+) MAS 16% IVA: $ 58,479.76 TOTAL: $ 423,978.27
DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 16,866.16 SALDO LIQUIDO: $ 407,109.11" ValorUnitario="365498.51" Importe="365498.51" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="365498.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="58479.76"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58479.76">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="58479.76" Base="365498.51"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7E8E76B0-9595-47EB-BBFD-
05F705AF0350" FechaTimbrado="2025-12-13T13:48:29" RfcProvCertif="MBA65010247C0"
SelloCFD="AMjr8zwsz55Mn2XlWdFW/3PRsZQ9M14Ta155fC1NugKhD0ffYBsIkxg24FUFysBiyOnzvLn+xidr+ekNm2Bvvcu4V3/FFyFDfXhr+gvG8HSL8m7YNIQ1FpsXz1bIAWC8E+S
NoCertificadoSAT="00001000000709181898"
SelloSAT="L6PRDW/2eMcjY10BQb6QrVcrCt8hz9AZpHKIGnooISTh3nW+sfu0h0M10ZpF3ZuG05NMFe8Yk3Xw/MiU8a8SuFK1AfzGVSe0+CSu/ZP91BzsVIGNGbFJZZVDxV+HKp3p1mWmgA
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Fecha: 17-dic-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	SERGIO URIAS RUBIO	ESTIMACIÓN No:	02 (NORMAL)
DOMICILIO:	C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285, LOS MOCHIS, SINALOA.	PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	01-dic-25
0	6688569126	AL	17-dic-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
UIRS830403HH7			14-nov-25

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:
				17-nov-25
				TERMINACIÓN:
				17-dic-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,159,865.84	\$1,345,444.37	\$470,905.53	\$1,345,444.37

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 407,109.11 (SON CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 11/100 M.N.)

BUENO POR: \$ 407,109.11

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%

\$ 196,806.89

MAS I.V.A.:

\$ 31,489.10

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 228,295.99

3 % SVIFYC:

\$ 16,869.16

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 245,165.15

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 562,305.40

MAS I.V.A 16 %

\$ 89,968.86

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 652,274.26

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 245,165.15

SALDO A PAGAR:

\$ 407,109.11

ELABORÓ

Sergio Urias Rubio
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

Jose R. Contreras Lopez
ING. JOSE R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

Rubiel Rincon Ramos
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

Control de Estimaciones

SERGIO URIAS RUBIO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		Estimación: 02 (NORMAL)		
			Fecha: 17 de diciembre de 2025				
Periodo de la estimación: 01/12/2025 al 17/12/2025			Localidad:		No. De contrato:		
Periodo de Ejecución: 17/11/2025 al 17/12/2025			BADIRAGUATO		MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025		
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,345,444.37		\$ 1,159,865.84		\$ 470,905.53		\$ 405,953.04	48%
						% Avance Total	96%

Control Del Anticipo	Liquidación de Estimación		Control de Estimación
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimación (+)	\$ 562,305.40	ESTA ESTIMACION
\$ 228,295.99	16 % I.V.A (+)	\$ 89,968.86	\$ 652,274.26
	Sub- Total A (=)	\$ 652,274.26	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortización Anticipo 35%	\$ 196,806.89	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 235,250.02	16 % I.V.A (+)	\$ 31,489.10	\$ 672,142.89
	Total (=)	\$ 228,295.99	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$ 365,498.51	TOTAL ACUMULADO.
\$ 463,546.01	16 % I.V.A (+)	\$ 58,479.76	\$ 1,324,417.15
	Total (=)	\$ 423,978.27	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC:	\$ 16,869.16	CONTRATADO
\$ 470,905.53	Total Deducciones (=)	\$ 245,165.15	\$ 1,345,444.37
	Importe T O T A L	\$ 407,109.11	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$ 407,109.11	SALDO
\$ 7,359.52	Son:		\$ 21,027.22
	(SON CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS 11/100 M.N.)		

ELABORO

Sergio Urias Rubio
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

[Firma]
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

[Firma]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA

17/12/2025

CONTRATISTA:

SERGIO URIAS RUBIO

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P.
81285, LOS MOCHIS, SINALOA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C.
UIRS830403HH7

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,159,865.84
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$470,905.53
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,345,444.37

OBRA	IMPORTE
ESTRUCTURA	\$ 538,867.70
ALBAÑILERIA	\$ 14,828.76
TRABAJOS FINALES	\$ 8,608.94
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 562,305.40
SUB TOTAL=	\$ 562,305.40
I.V.A AL 16 %	\$ 89,968.86
TOTAL =	\$ 652,274.26

ELABORO

Sergio Urias Rubio
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

[Firma]
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

[Firma]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONTRATISTA:
SERGIO URIAS RUBIO

DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285,
LOS MOCHIS, SINALOA.

R.F.C.
UIRS930403HH7

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,159,865.84
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$470,905.53
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,345,444.37

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
03	ESTRUCTURA									
GP163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 15 x 20 CM X 1/2" DE ESPESOR PARA UNIR COLUMNAS CON VICAS Y VICAS CON VICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	FZA	64.00	\$ 685.00	\$ 43,840.00	64.00	0.00	0.00	64.00	\$ 43,840.00
GP164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PARA ASIENTO DE VIGA IPR 6" X 4" (12.70 KG/ML) CON DOS PLACAS DE 15 X 10 CM. X 1/2" DE ESPESOR (MENSULAS) SEGÚN DETALLE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$ 765.26	\$ 6,122.08	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 6,122.08
GP165	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO CIRCULAR DE 14" DE DIÁMETRO Y 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 908.66	\$ 5,451.96	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 5,451.96
GP167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 3" X 3" (BLANCO), COMO REFUERZOS CENTRALES. INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	35.10	\$ 710.02	\$ 24,921.70	35.10	0.00	0.00	35.10	\$ 24,921.70
GP168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA "I" 6" X 4", COMO REFUERZO LATERAL. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE).	ML	30.00	\$ 1,528.14	\$ 45,844.20	30.00	0.00	0.00	30.00	\$ 45,844.20
GP169	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUJECCIÓN DE POLIN A BASE DE ANGULAR DE 5" X 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	54.00	\$ 288.48	\$ 15,577.92	54.00	0.00	0.00	54.00	\$ 15,577.92
GP170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	315.90	\$ 403.57	\$ 127,487.76	315.90	0.00	0.90	315.90	\$ 127,487.76
GP171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA REDONDA LISA DE 5/8" CON EXTREMOS ROSCADOS PARA CONTRAVENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	84.86	\$ 169.11	\$ 14,350.87	84.85	0.00	0.00	84.85	\$ 14,348.98
GP172	SEPARADOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR DE 1.10 MTS. DE LONGITUD CON PLACA DE 2" X 4" X 1/4" EN LOS EXTREMOS. INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	48.00	\$ 410.81	\$ 19,718.88	48.00	0.00	0.00	48.00	\$ 19,718.88

ELABORO

ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

ING. JOSÉ CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONTRATISTA:
SERGIO URIAS RUBIO

DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285,
LOS MOCHIS, SINALOA.

R.F.C.
UIRS930403HH7

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,159,865.84
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$470,905.53
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,345,444.37

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA CONVADA DE LAMINA TERNIUM TO-100 GALVANIZADA CAL. 24 INCLUYE:PIJA AUTOROSCABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	307.65	\$ 607.18	\$ 186,796.93	307.65	0.00	0.00	307.65	\$ 186,796.93
GP174	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: MANO DE OBRA, SOPORTES PARA SUJECIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO.	ML	35.10	\$ 1,143.90	\$ 40,150.09	35.10	0.00	0.00	35.10	\$ 40,150.09
GP175	BAJANTE DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 4,302.20	\$ 8,604.40	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 8,604.40
04	ALBAÑILERIA									
GP177	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	27.48	\$ 539.62	\$ 14,828.76	27.48	0.00	34.20	27.48	\$ 14,828.76
05	TRABAJOS FINALES									
GP67	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LONA IMPRESA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,340.08	\$ 6,340.08	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 6,340.08
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	260.80	\$ 8.06	\$ 2,206.86	260.80	0.00	32.00	260.80	\$ 2,206.86
TOTAL DE ESTRUCTURA:										\$ 538,867.70
TOTAL DE ALBAÑILERIA:										\$ 14,828.76
TOTAL DE TRABAJOS FINALES:										\$ 8,606.94

TOTAL ESTIMACION	\$ 562,305.40
I.V.A.	\$ 89,968.86
TOTAL	\$ 652,274.26

ELABORO
Sergio Urias Rubio
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ
José R. Contreras López
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
Romel Rincón Ramos
ING. ROMEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
03	ESTRUCTURA								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 15 x 20 CM X 1/2" DE ESPESOR PARA UNIR COLUMNAS CON VIGAS Y VIGAS CON VIGAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				64.00	64.00		
							TOTAL	64.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO PARA ASIENTO DE VIGA IPR 6" X 4" (12.70 KG/ML) CON DOS PLACAS DE 15 X 10 CM. X 1/2" DE ESPESOR (MENSULAS) SEGÚN DETALLE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				8.00	8.00		
							TOTAL	8.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO CIRCULAR DE 14" DE DIÁMETRO Y 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				6.00	6.00		
							TOTAL	6.00	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 3" X 3" (BLANCO), COMO REFUERZOS CENTRALES. INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	17.55			2.00	35.10		
							TOTAL	35.10	

ELABORO

ING. VIANEY ESCOBAR RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP168	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA "1" 6" X 4", COMO REFUERZO LATERAL, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE).	ML	15.00			2.00	30.00		
							TOTAL	30.00	
GP169	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUJECIÓN DE POLIN A BASE DE ANGULAR DE 5" X 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				54.00	54.00		
							TOTAL	54.00	
GP170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	17.60			13.00	316.80		
							TOTAL	316.80	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	315.90	
							ADICIONAL	0.90	
GP171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA REDONDA LISA DE 5/8" CON EXTREMOS ROSCADOS PARA CONTRAVENTEO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.61			2.00	21.22		
			21.21			2.00	42.42		
			10.61			2.00	21.22		
							TOTAL	84.85	

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINALOA.
SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP172	SEPARADOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR DE 1.10 MTS. DE LONGITUD CON PLACA DE 2" X 4" X 1/4" EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				48.00	48.00		
							TOTAL	48.00	
GP173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA CONVADA DE LAMINA TERNIUM TO-100 GALVANIZADA CAL. 24 INCLUYE:PIJA AUTOROSCABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	17.55	17.53			307.65		
							TOTAL	307.65	
GP174	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA PINTO CAL. 22, INCLUYE: MANO DE OBRA, SOPORTES PARA SUJECIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO.	ML	17.55			2.00	35.10		
							TOTAL	35.10	
GP175	BAJANTE DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				2.00	2.00		
							TOTAL	2.00	

ELABORO

ING. VIANEY CARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
04	ALBAÑILERIA								
	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO								
	PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON								
	F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE:	M2	1.00	0.30		4.00	1.20		
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
			2.00	0.30		2.00	1.20		
			0.30	0.30		-4.00	-0.36		MENOS DADO
			0.60	0.30		-2.00	-0.36		
			15.00	1.00		2.00	30.00		
			15.00	1.00		2.00	30.00		
							TOTAL	61.58	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	27.48	
							ADICIONAL	34.20	
05	TRABAJOS FINALES								
	LETrero INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA								
	FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE								
	1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LONA IMPRESA								
	CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO								
	HECHO EN OBRA CON UN F'C=150 KG/CM2 EN	PZA				1.00	1.00		
	PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40								
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
							TOTAL	1.00	
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE	M2	18.40	17.00			312.80		
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
							TOTAL	312.80	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	280.80	
							ADICIONAL	32.00	

ELABORO

ING. JHANEY ESCOBAR RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUEIO

CIBRA:

SERGIO URIAS RUEIO

CONTRATISTA:



ESTIMACION: 02 (NORMAL)

GP167 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GP168 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE).

GP169 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIP MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

GP170 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLI
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

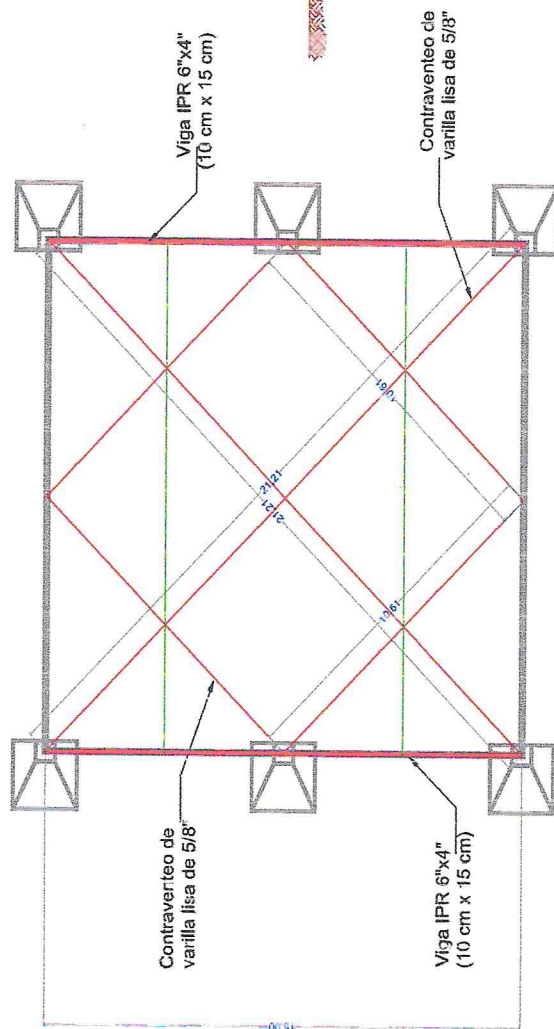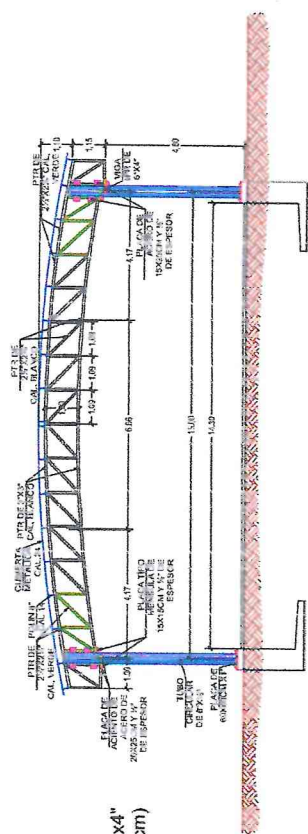

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.





CROQUIS

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUEIO** OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.**

ESTIMACION: **02 (NORMAL)**

- GP171 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA REDONDA LISA DE 5/8" CON EXTREMOS ROSCADOS PARA CONTRAVENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP172 SEPARADOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR DE 1.10 MTS. DE LONGITUD CON PLACA DE 2" X 4" X 1/4" EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP173 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA CONVADA DE LAMINA TERNIUM TO-100 GALVANIZADA CAL. 24 INCLUYE:PIJA AUTOROSCABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP174 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: MANO DE OBRA, SOPORTES PARA SUJECIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO.
- GP175 BAJANTE DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

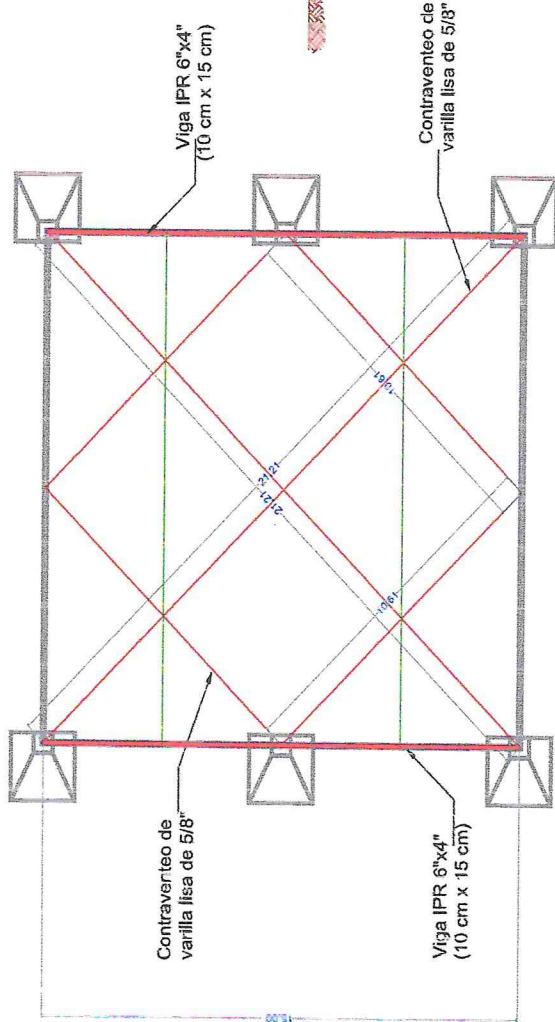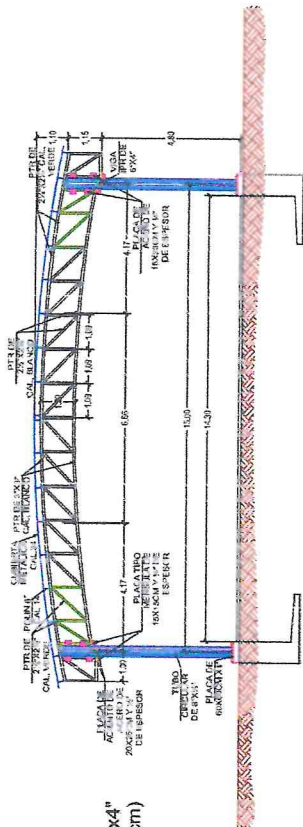

ELABORÓ

ING. VIANEY ESCOBAR RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS,
SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO


OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

04 ALBANILERIA

GP177

PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

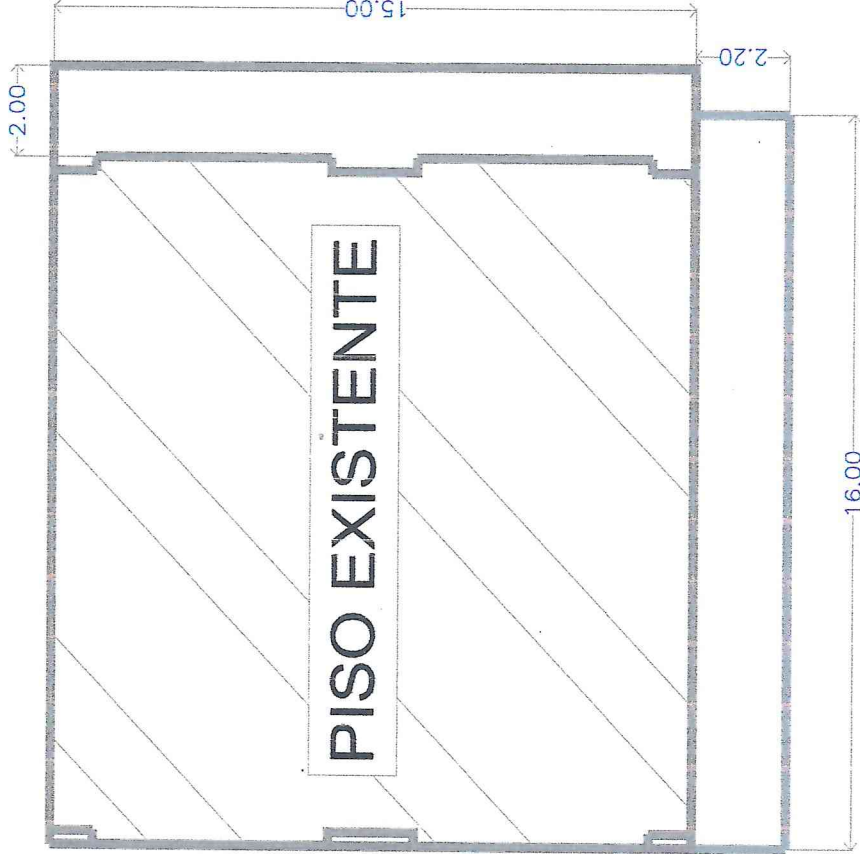

ELABORO

ING. VIANEY HERRERA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS,
SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)


05 TRABAJOS FINALES

GP67

LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LONA IMPRESA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GP101

LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

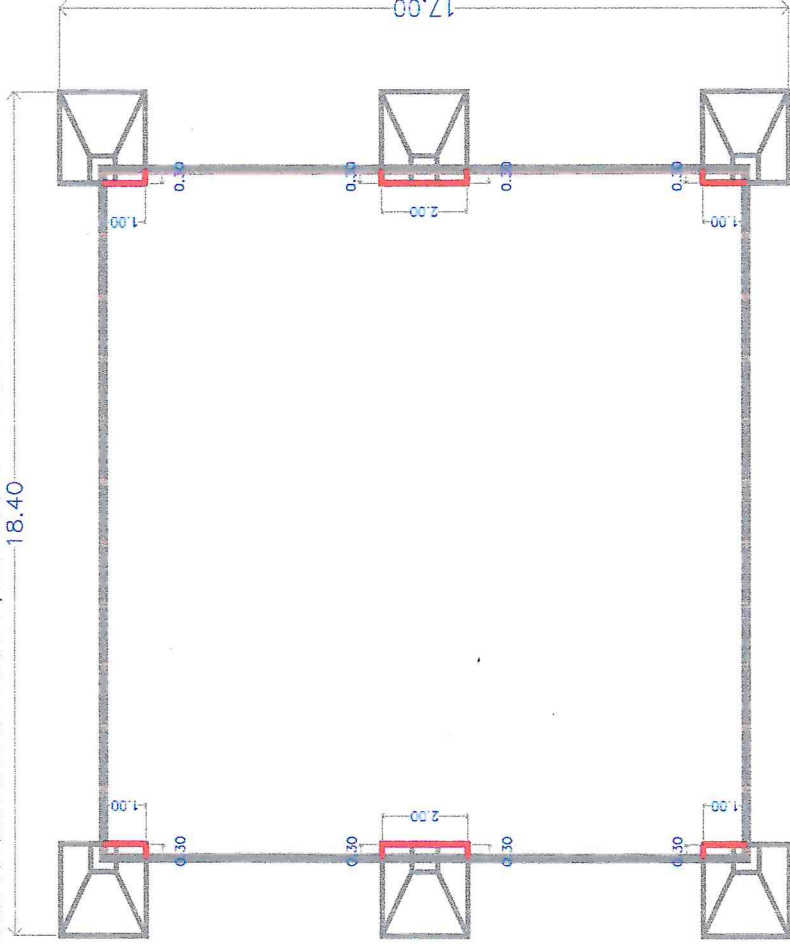

ELABORÓ

ING. JUAN ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO



CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

03 ESTRUCTURA

- GP163 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 15 x 20 CM X 1/2" DE ESPESOR PARA UNIR COLUMNAS CON VIGAS Y VIGAS CON VIGAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP164 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO PARA ASIENTO DE VIGA IPR 6" X 4" (12.70 KG/ML) CON DOS PLACAS DE 15 X 10 CM. X 1/2" DE ESPESOR (MENSULAS) SEGUN DETALLE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP165 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO CIRCULAR DE 14" DE DIÁMETRO Y 1/4" DE ESPESOR. INCLUYE: SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP167 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 3" X 3" (BLANCO), COMO REFUERZOS CENTRALES, INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP168 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA "I" 6" X 4", COMO REFUERZO LATERAL, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE).
- GP169 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIPS DE 20 CMS. DE LARGO PARA SUJECIÓN DE POLIN A BASE DE ANGULAR DE 5" X 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

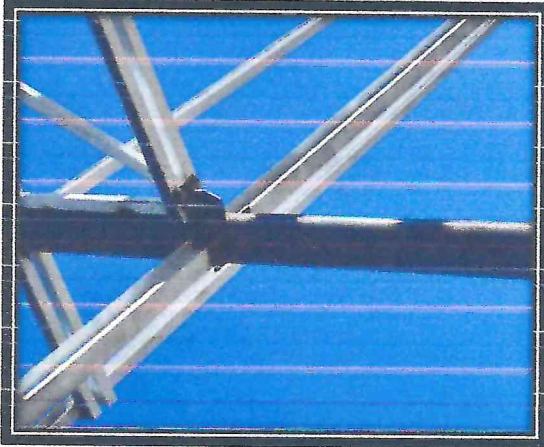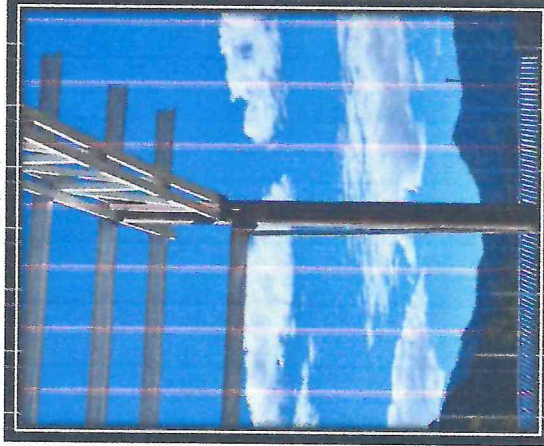

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO


CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO

OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

- GP170 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP171 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA REDONDA LISA DE 5/8" CON EXTREMOS ROSCADOS PARA CONTRAVENTEO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP172 SEPARADOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR DE 1.10 MTS. DE LONGITUD CON PLACA DE 2" X 4" X 1/4" EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP173 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA CONVADA DE LAMINA TERNIUM TO-100 GALVANIZADA CAL. 24 INCLUYE:PIJA AUTOROSCABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP174 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE LAMINA LISA PINTRO CAL. 22, INCLUYE: MANO DE OBRA, SOPORTES PARA SUJECIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO.
- GP175 BAJANTE DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

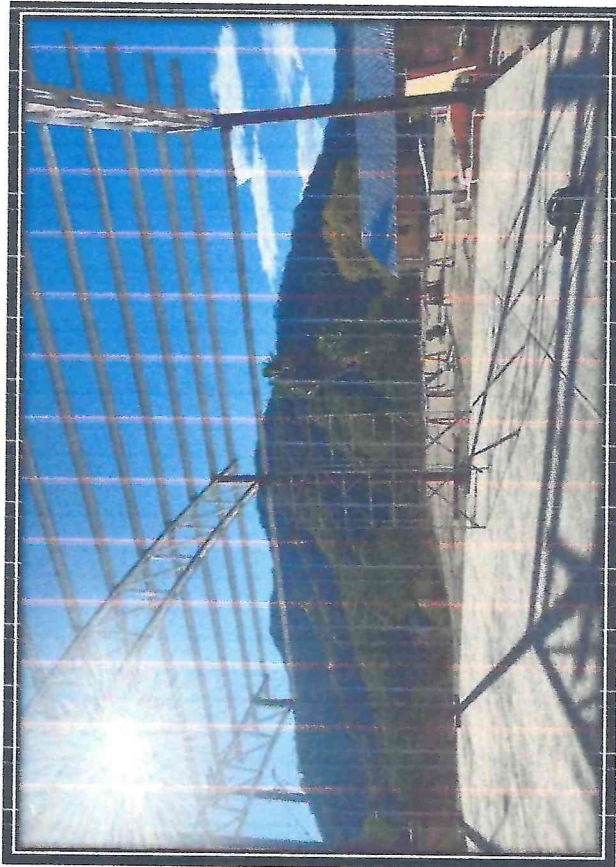

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS,
SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

OBRA:

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

ESTIMACION: **02 (NORMAL)**

04 ALBAÑILERÍA

GP177

PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F' C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORÓ

ING. VIANEY FERRERA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta 24/12/2025 4:34:52 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00798320
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 02 NORM AD 023

Importe de la operación: 407,109.11 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072743011836273107

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

Titular de la cuenta: SERGIO URIAS RUBIO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 24/12/2025

Fecha de aplicación: 24/12/2025

Concepto de pago: EST 02 NORM AD 023

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 16:34:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000715824

Clave de rastreo: 002601002512240000715824

Folio de firma: 0050525165

Folio único: I401202512241634450050525171

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	24/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
