

OFICIO No. OPDUyE/776/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 15 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SERGIO URIAS RUBIO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,345,444.37 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$13,123.89 (TRECE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 89/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SERGIO URIAS RUBIO
- R.F.C. UIRS-830403-HH7
- DOMICILIO FISCAL: CALLE MAYO #1593 OTE, ENTRE CEIBA Y AMAPAS, FRACC. UAS 94, LOS MOCHIS, SINALOA, C.P. 81285
- No. DE FACTURA: # F9CD, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
C.C.P. ARCHIVO
ATENTAMENTE
C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

15 DIC 2025
Adrian G
RECIBIDO
17:52

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 429

FECHA: 13/12/2025 12:49:04

Nombre y Firma

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="429" Fecha="2025-12-
13T12:49:04"
Sello="EIzYieP7wKuj01o2E0cJ6k2JsSL3D72tBYyRFInvMrtmTqaKETeJG7bp2W7ZQgV7PlyQ1y6cIZ5dPzU/hQpG1HGcSjUFcQAOB/p4VH97eFy8SVW9eXVdFE1+OcyNNoji4mpnBUNxt1wLw
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000511952375"
Certificado="MIIFzCCA7egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE5NTIzNzUwOQY3KzIhcnNAQELBQAwggGEMSAWigYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglU0V
SubTotal="11782.50" Moneda="MXN" Total="13667.70" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81285">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="UIRS830403HH7" Nombre="SERGIO URIAS RUBIO"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA550101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="01" Descripcion="SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN ESTIMACION
01 (ADICIONAL) FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA
DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $
1,345,444.37 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 18,126.91 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 6,344.41 TOTAL: $ 11,782.50 (+) MAS 16% IVA: $1,885.20 TOTAL: $
13,667.70 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 543.81 SALDO LIQUIDO: $ 13,123.89 ValorUnitario="11782.50" Importe="11782.50" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="11782.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1885.20"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1885.20">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1885.20" Base="11782.50"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4DD45D83-9A9E-48D7-95DD-
FF7F1CC1F9CD" FechaTimbrado="2025-12-13T13:49:05" RfcProvCertif="MAS0010247C0"
SelloCFD="EIzYieP7wKuj01o2E0cJ6k2JsSL3D72tBYyRFInvMrtmTqaKETeJG7bp2W7ZQgV7PlyQ1y6cIZ5dPzU/hQpG1HGcSjUFcQAOB/p4VH97eFy8SVW9eXVdFE1+OcyNNoji4mpnBUN
NoCertificadoSAT="00001000000709182895"
SelloSAT="eM8GfoY8Gfj038Nf4ZcYfUICGjBRas3jlP7EES8ff0g9VwXWU+QmbE/+DK/9IPg5nkrIQ1anYXpxGd2EheULxN1StYyddye7Se0mSfeUFXxHffOXhk2gPFTYwZPgHg/1LS:
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Fecha: 17-dic-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	SERGIO URIAS RUBIO	ESTIMACIÓN No:	01 (ADICIONAL)
DOMICILIO:	C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285, LOS MOCHIS, SINALOA.	PERIODO DE ESTIMACION:	FINIQUITO
TELÉFONO:	CEL:	DEL	01-dic-25
0	6688569126	AL	17-dic-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
UIRS830403HH7			14-nov-25

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:
				17-nov-25
				TERMINACIÓN:
				17-dic-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,159,865.84	\$1,345,444.37	\$470,905.53	\$1,345,444.37

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 13,123.89 (SON TRECE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 89/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

BUENO POR: \$ 13,123.89

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%

MAS I.V.A.:

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

3 % SVIFYC:

TOTAL DEDUCCIONES:

\$	6,344.41
\$	1,015.11
\$	7,359.52
\$	543.81
\$	7,903.33

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

MAS I.V.A 16 %

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$	18,126.91
\$	2,900.31
\$	21,027.22
\$	7,903.33

SALDO A PAGAR:

\$ 13,123.89

ELABORO

Sergio Urias Rubio
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

José R. Contreras López
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

Rubiel Rincón Ramos
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

Control de Estimaciones

SERGIO URIAS RUBIO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		Estimación: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO	
Fecha: 17 de diciembre de 2025						
Periodo de la estimación:		01/12/2025	al	17/12/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:		17/11/2025	al	17/12/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-023/2025
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$	1,345,444.37	\$	1,159,865.84	\$ 470,905.53	\$ 405,953.04	2%
						% Avance Total
						100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 18,126.91	ESTA ESTIMACION
\$ 7,359.52	16 % I.V.A (+)	\$ 2,900.31	\$ 21,027.22
	Sub- Total A (=)	\$ 21,027.22	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35%	\$ 6,344.41	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 463,546.01	16 % I.V.A (+)	\$ 1,015.11	\$ 1,324,417.15
	Total (=)	\$ 7,359.52	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$ 11,782.50	TOTAL ACUMULADO.
\$ 470,905.53	16 % I.V.A (+)	\$ 1,885.20	\$ 1,345,444.37
	Total (=)	\$ 13,667.70	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC:	\$ 543.81	CONTRATADO
\$ 470,905.53	Total Deducciones (=)	\$ 7,903.33	\$ 1,345,444.37
	Importe TOTAL	\$ 13,123.89	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$ 13,123.89	SALDO
\$ -	Son:		\$ -
	(SON TRECE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 89/100 M.N.)		

ELABORO


SERGIO URIAS RUBIO
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285, LOS MOCHIS, SINALOA.
R.F.C. UIRS830403HH7

FECHA: 17/12/2025

ESTADO DE CUENTA

LOCALIDAD:				BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 (ADICIONAL) FINIQUITO	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
FECHA INICIO CONTRATO:		17-nov-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:		17-dic-25	CONTRATO:		MBGER-AD-FAISMUN-023/2025 FECHA CONTRATO: 14-nov-25	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,159,865.84									
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA \$470,905.53									
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO \$1,345,444.37									
No. DE ESTIMACIÓN		PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN		IMPORTE SIN IVA		3 % SVIFYC:	
								AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	
								TOTAL DEDUCCIONES	
								IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,345,444.37	
								LIQUIDO A PAGAR	
01 (NORMAL)		17-nov-25	30-nov-25	\$	672,142.89	\$	579,433.53	\$	17,383.01
02 (NORMAL)		01-dic-25	17-dic-25	\$	652,274.26	\$	562,305.40	\$	16,869.16
01 (ADICIONAL)		01-dic-25	17-dic-25	\$	21,027.22	\$	18,126.91	\$	543.81
FINIQUITO								\$	7,359.52
								\$	7,903.33

ELABORO

Sergio Urias Rubio
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

CONTRATISTA:

SERGIO URIAS RUBIO

DOMICILIO:

C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P.
81285, LOS MOCHIS, SINALOA.

R.F.C.

UIRS830403HH7

FECHA

17/12/2025

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (ADICIONAL) FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,159,865.84
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$470,905.53
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,345,444.37

OBRA	IMPORTE
PRELIMINARES	\$ 428.48
ESTRUCTURA	\$ 363.21
ALBAÑILERIA	\$ 17,076.66
TRABAJOS FINALES	\$ 258.56
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 18,126.91
SUB TOTAL=	\$ 18,126.91
I.V.A AL 16 %	\$ 2,900.31
TOTAL =	\$ 21,027.22

ELABORO

Sergio Urias Rubio
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

Rubiel Rincon Ramos
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONTRATISTA:

SERGIO URIAS RUBIO

DOMICILIO: C. MAYO ENTRE CEIBA Y AMAPA #1593 OTE. FRACC. UAS 94 C.P. 81285,
LOS MOCHIS, SINALOA.

R.F.C.
UIRS830403HH7

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESCGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACIÓN: 01 (ADICIONAL)
FINQUITO

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,159,865.84
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$470,905.53
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,345,444.37

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
01	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	280.80	\$ 13.39	\$ 3,759.91	312.80	280.80	0.00	32.00	\$ 428.48
03	ESTRUCTURA									
GP170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	315.90	\$ 403.57	\$ 127,487.76	316.80	315.90	0.00	0.90	\$ 363.21
04	ALBAÑILERIA									
GP177	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	27.48	\$ 539.62	\$ 14,828.76	59.13	27.48	0.00	31.64571	\$ 17,076.66
05	TRABAJOS FINALES									
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	280.80	\$ 8.08	\$ 2,268.86	312.80	280.80	0.00	32.00	\$ 258.56

TOTAL ESTIMACION \$ 18,126.91
I.V.A. \$ 2,900.31
TOTAL \$ 21,027.22

ELABORO

SERGIO URIAS RUBIO
ING. SERGIO URIAS RUBIO
SERGIO URIAS RUBIO

REVISÓ

ING. JOSÉ A. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
01	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18.40	17.00			312.80		
							TOTAL	312.80	
							EN ESTIMACION 01 (NORMAL)	280.80	
							EN ESTA ESTIMACION	32.00	
03	ESTRUCTURA								
GP170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	17.60			18.00	316.80		
							TOTAL	316.80	
							EN ESTIMACION 02 (NORMAL)	315.90	
							EN ESTA ESTIMACION	0.90	
04	ALBANILERIA								
GP177	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.00	0.30		4.00	1.20		
			2.00	0.30		2.00	1.20		
			0.30	0.30		-4.00	-0.36		MENCIONS DADO
			0.60	0.30		-2.00	-0.36		
			15.00	2.00		1.00	30.00		
			16.00	2.20		1.00	35.20		
							TOTAL	66.38	
							EN ESTIMACION 02 (NORMAL)	27.48	
							EN ESTA ESTIMACION	31.64571	
							SIN COBRAR	7.75	

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. VIANEY ESCOBAR RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
05	TRABAJOS FINALES								
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.40	17.00			312.80		
							TOTAL	312.80	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		280.80	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		32.00	

ELABORÓ

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS,
SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO OBRA:

ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

01 PRELIMINARES

GP01

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

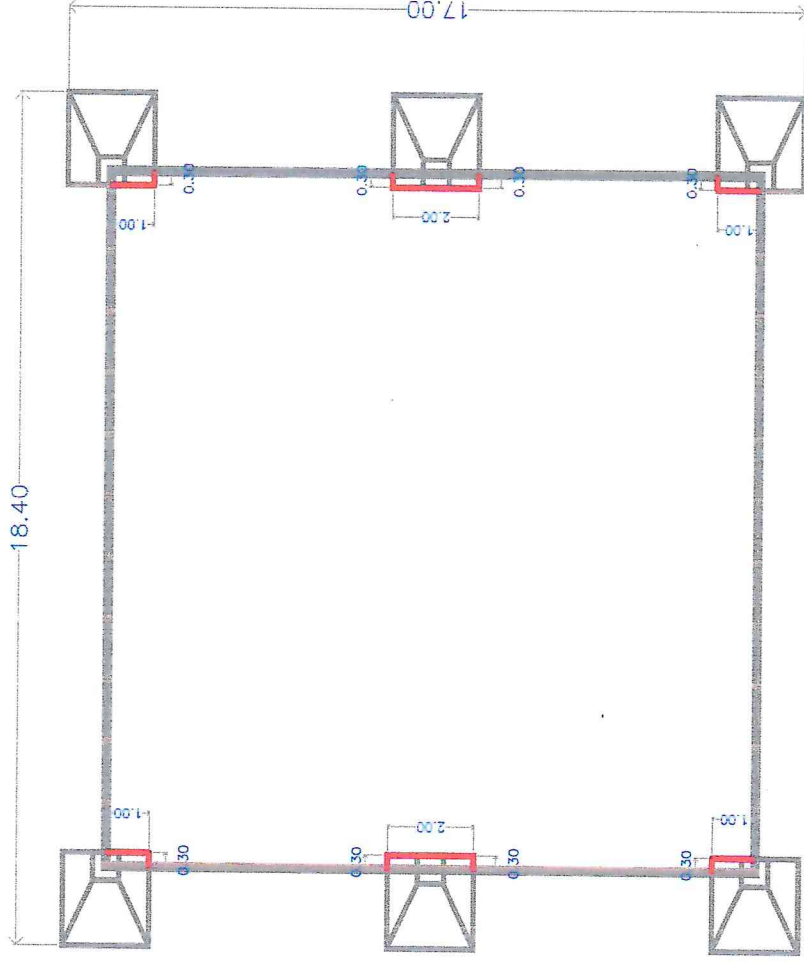

ELABORO

ING. VIANEY SCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUEIO**



OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO**

ESTRUCTURA

GP170

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

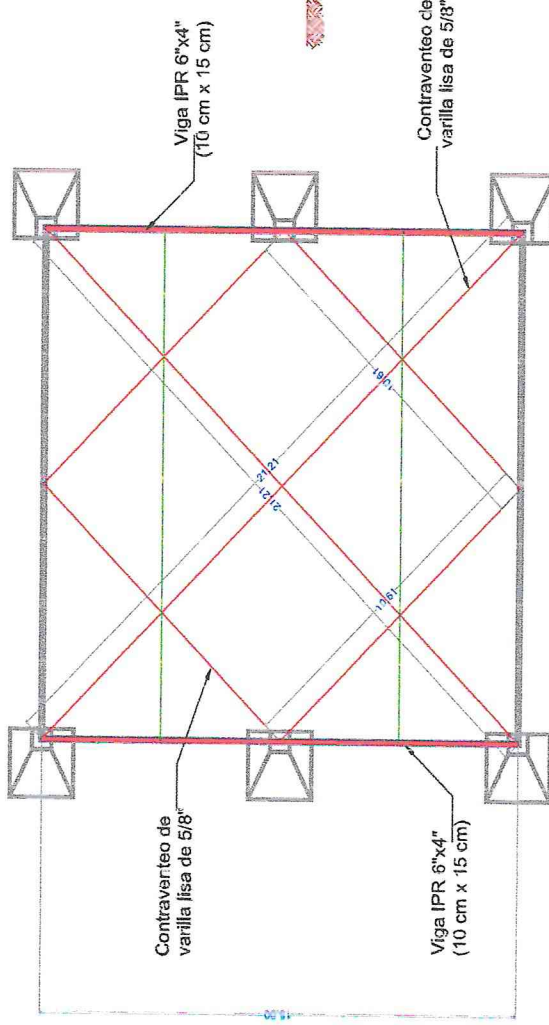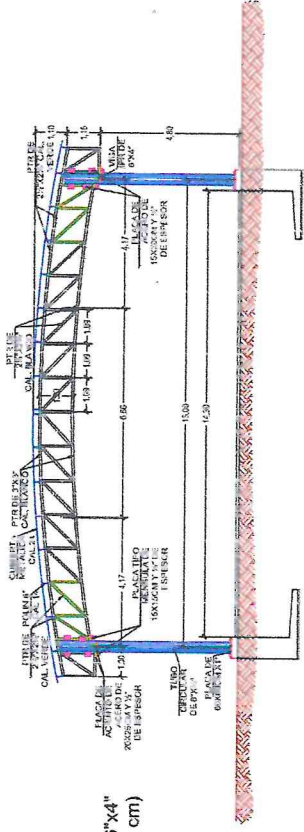

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO

ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

04 ALBAÑILERIA

GP177

PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F' C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.


CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

FECHA: 17/12/2025

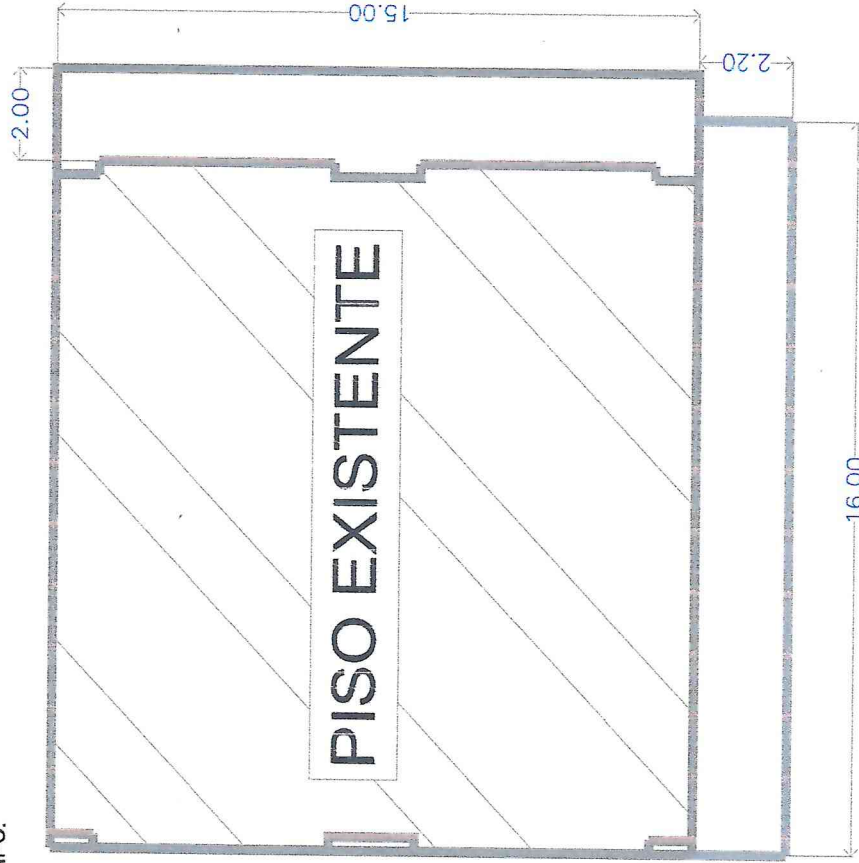

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS,
SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO OBRA:

ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

05 TRABAJOS FINALES

GP101

LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

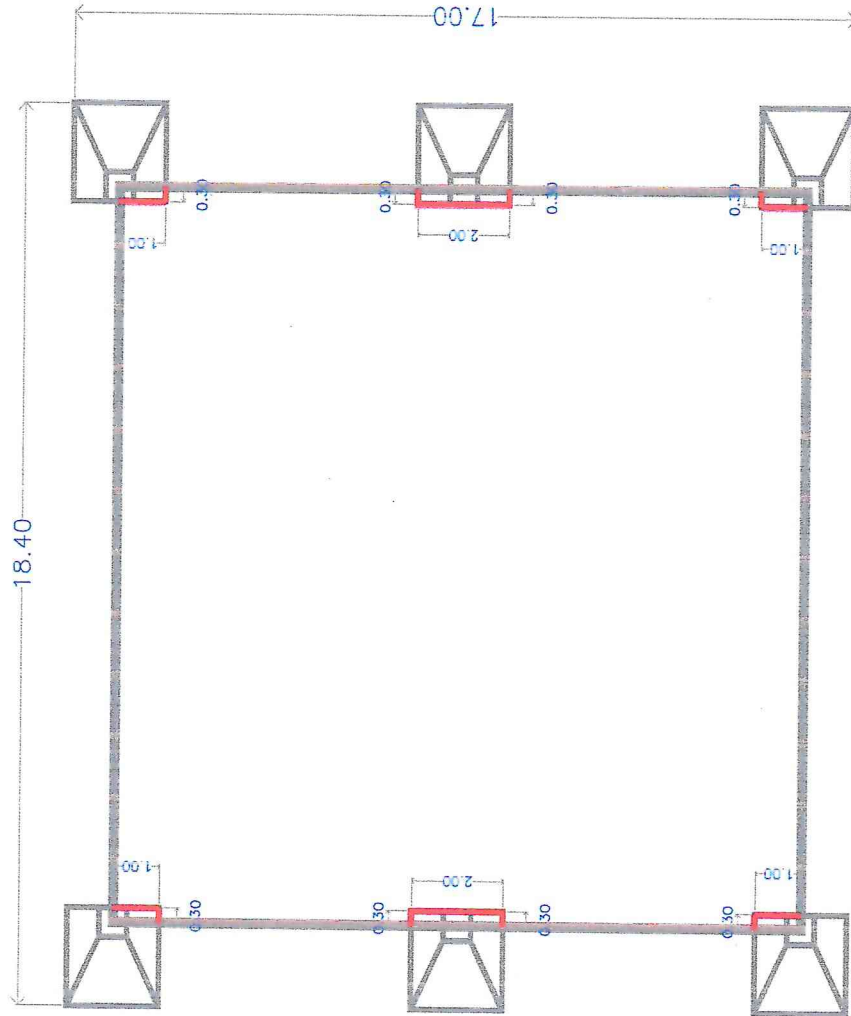

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS,
SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **SERGIO URIAS RUBIO**

OBRA:

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO**

PRELIMINARES

01

GP01

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

		FECHA: 17/12/2025	
		MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	
		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
		DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
REPORTE FOTOGRAFICO			
CONTRATISTA: SERGIO URIAS RUBIO		CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	
ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO		OBRA:	
03 ESTRUCTURA			
GP170		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN 8" CAL. 14 Y SOLDADA A VIGA CARGADORA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	



ELABORO	REVISÓ	AUTORIZO
		
ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA SUPERINTENDENTE DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	ING. RUBIEL RINCON RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 17/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


OBRA:

CONTRATISTA: **SERGIO URÍAS RUBIO**

ESTIMACION: **01 (ADICIONAL) FINIQUITO**

04 ALBAÑILERÍA

GP177 PISO DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

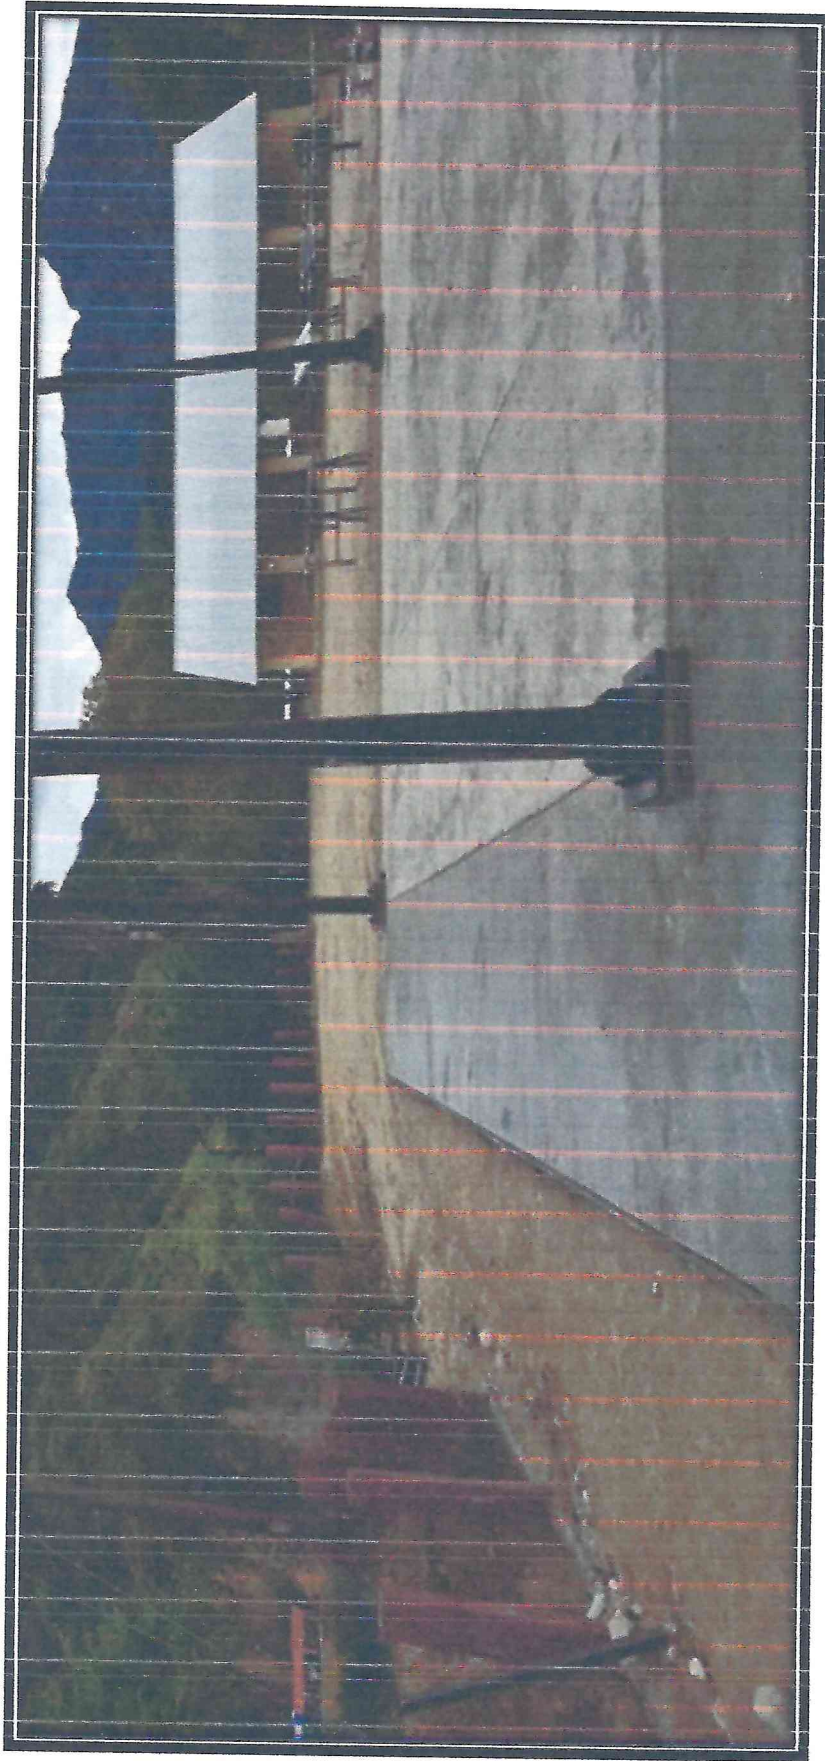

ELABORO

ING. VIANEY ESCARREGA RIVERA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta24/12/2025 4:42:15 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción:EST 01 AD FINQ AD023

Importe de la operación:13,123.89 MXP

Cuenta de retiro:0124174836

Cuenta de depósito:072743011836273107

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta: SERGIO URIAS RUBIO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación:24/12/2025

Fecha de aplicación:24/12/2025

Concepto de pago:EST 01 AD FINQ AD023

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:ASD 6551749382

Hora de captura en el canal:16:42:08

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000716006

Clave de rastreo:002601002512240000716006

Folio de firma:0050525183

Folio único:I401202512241642080050525189

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	24/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/12/2025
