



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/807/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO

Badiraguato, Sin., a 26 de diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL FINIQUITO** DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **DENISE ACELA CAZAREZ**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-026/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$360,524.28 (TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 28/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO
- **IMPORTE A PAGAR:** \$351,200.38 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 38/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
- **R.F.C.** SACD821117AJ7
- **DOMICILIO FISCAL:** BLVD. FRANCISCO I. MADERO #1798, COLONIA MIGUEL HIDALGO, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80090
- **No. DE FACTURA:** #BBAC, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
C.c.p. El Archivo. BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

26 DIC 2025

RECIBIDO



Emisor
DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

RFC: SACD821117AJ7

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: BLVD.FRANCISCO I MADERO 1798 Miguel Hidalgo Culiacán Sinaloa México 80090

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Gabriel Leyva Solano S/N Badiraguato Badiraguato, Sinaloa México 80500

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 582

Fecha: 26/Dic/2025 15:55:24

Lugar de expedición (C.P.): 80090

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	<p>PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-026/2025</p> <p>MONTO DEL CONTRATO: \$ 360,524.28</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 310,796.79</p> <p>MAS I.V.A 16 % \$ 49,727.49</p> <p>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 360,524.28</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 310,796.79</p> <p>MAS I.V.A \$ 49,727.49</p> <p>MONTO NETO A FACTURAR \$ 360,524.28</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 9,323.90</p> <p>TOTAL DEDUCCIONES: \$ 9,323.90</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 351,200.38</p>	\$310,796.79	IVA, - Importe: 49727.49	\$310,796.79

Sello digital del CFDI

h2W0nem5YIRHu04CduTYR03uR2/Buk+e7FRISPDAQeeHwSA1vnAGuHoWvF2rainYnDnT/PIMur+ev2i3h4avQln3ISRPAPKEFzlvSSdAC11ar7FVvsaQIRdndr+7hwOFI

Total con letra:
trescientos sesenta mil quinientos veinticuatro Pesos 28/100 M.N.

Subtotal: \$310,796.79

: \$0.00

IVA 16 %: \$49,727.49

Total: \$360,524.28



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000703927080

Folio Fiscal: 49D60FFF-83D7-48DD-B5E0-3C36270BBBAC

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-12-26T16:55:30

Sello del SAT

Yf8eCRS1PzXbM+AksparD%0KdWdNp23qXCF1y1Kg9FVWeAGF73SEwLWC+TU+++CyBQD3nYf66c1hjw/wrFRo5HhO3kasqYUcqNsDPdQbcYesrVeHzGjMY/FETQ+VYx6Q9/TP5RL5yt
q5uohAoiQNVH3e5NpI5PdQLbarkqH5E4llcLRMLcJPYuhVOWeALe/hZRgMYpPQ6hw+DA/xS5I29r2bJHeDPJSc29YN2GPPW4qN377N.JxshbpIwKNuR+RFcxifZrzyS5pPMKvaojA.KAAnA
0sashTc44LVQ9+slE1jw5es0Wa6MpJip/2KwDPBeLTuwsPYo/bLhB8ow==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|49D60FFF-83D7-48DD-B5E0-3C36270BBBAC|2025-12-26T16:55:30||MA90810247C0|b2WQgemSiYIBHvQ4CduDYR03u82/8cuk+e7FRlSPDAOvvytHwtpSA1xnAGytHaWe0xF2r
ajqYgDqnT/PJtMucs+xx2u3lb4eyOfg3i5FRPAKEzbxSSdAC11arZPVava9dRrj/g4c+ZhwOFtNGRY5D5RvgJ4c4FurBoddYoAyzof7oWNzwFbaG8yybCiw2u6f1dvak3yDfGkgf25a3C
0b/Cig/qmSFY2X3Z6Kaf49H9QsPe+ex+p6otzMPcVwSJVMeMMxH9LueDQzYFdAQ6D1pmQgNx7313LsAur01G07s7b18eL1VgMHHoahV0IA0CtSKVf9IJKRX9owXj6WypNYA==|00001000
000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SACD821117AJ7	DENISE ACELA SALAS CAZAREZ	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49D60FFF-83D7-48DD-B5E0-3C36270BBBAC	2025-12-26T15:55:24	2025-12-26T16:55:30	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360,524.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwTBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDMSMjcwODAwDQY3KoZIHvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQDDCxBQyBERUwUgU0VSVk1DSU0gREUgQURNUSU1RSQUNJT04gVFJjQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-12-26T15:55:24" Folio="582" FormaPago="03" LugarExpedicion="80090" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000703927080"
Sello="b2W0gemSiYlBHVQ4CduDYR03u82/8cuk+e7FRISPDAOVvYHwtpSA1xnAGyHawE0xF2rajqYgDqNT/PJtMucs++x2u3Ib4ey0lg3i5FRPAKEzixSSdAC11arZfVsva9dRnj/g4c+ZhwoFTNGRY5
SubTotal="310796.79" TipoDeComprobante="I" Total="360524.28" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="DENISE ACELA SALAS CAZAREZ" RegimenFiscal="612" Rfc="SACD821117A37"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72151500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE SISTEMAS ELÉCTRICOSPAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
FINQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-026/2025MONTO DEL CONTRATO: $ 360,524.28IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 310,796.79MAS
I.V.A 16 % $ 49,727.49TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 360,524.28Importe TOTAL A FACTURAR $ 310,796.79MAS I.V.A $ 49,727.49MONTO NETO A FACTURAR
$ 360,524.28RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $ 9,323.90TOTAL DEDUCCIONES: $ 9,323.90MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 351,200.38" Importe="310796.79"
NoIdentificacion="SER01" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="310796.7900">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="310796.79" Importe="49727.49" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49727.49">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="310796.79" Importe="49727.49" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="49D60FFF-83D7-480D-B5E0-3C36270000AC"
FechaTimbrado="2025-12-26T16:55:30" RfcProvCertif="MAS0010247C0"
SelloCFD="b2W0gemSiYlBHVQ4CduDYR03u82/8cuk+e7FRISPDAOVvYHwtpSA1xnAGyHawE0xF2rajqYgDqNT/PJtMucs++x2u3Ib4ey0lg3i5FRPAKEzixSSdAC11arZfVsva9dRnj/g4c+Zhwo
NoCertificadoSAT="00001000000709182896"
SelloSAT="Yf8oCR91PzXBm+Akspar1D3t0fKdWoNp23qXCF1y1Kg9FVWwAGF73SEwLWC+TU++CyBQD3nYf66c1hjwf/wrFR05Hh03kasqYUcqNsDPdQbcYesrVeHzCjMY/FETQ+VYK6Q9/TP5RL
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 03-dic-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL FINIQUITO	
DOMICILIO: Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: (66) 71 06 34 89		DEL: 24-nov-25	
CEL: (66) 71 06 34 89		AL: 01-dic-25	
R.F.C. SACD821117AJ7.		FECHA DE CONTRATO: 22-nov-25	
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		LOCALIDAD: EL VAREJONAL MUNICIPIO: BADIRAGUATO	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
		INICIO: 24-nov-25	
		TERMINACIÓN: 01-dic-25	
CONTRATO No: MBGBR-AD-FAISMUN-026/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$360,524.28	\$360,524.28	\$0.00	\$360,524.28
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:			BUENO POR: \$ 351,200.38
\$ 351,200.38 (SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 38/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL FINIQUITO			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 310,796.79
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 49,727.49
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 360,524.28
3 % SVIFYC:	\$ 9,323.90	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 9,323.90
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 9,323.90		
SALDO A PAGAR:			\$ 351,200.38

ELABORO

C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Control de Estimaciones

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		Estimación: 01 NORMAL FINIQUITO
Fecha: 3 de diciembre de 2025					
Periodo de la estimación: 24/11/2025 al 01/12/2025			Localidad:		No. De contrato:
Periodo de Ejecución: 24/11/2025 al 01/12/2025			EL VAREJONAL		MBGBR-AD-FAISMUN-026/2025
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	
\$ 360,524.28		\$ 310,796.79		\$ -	
				Importe Anticipo sin I.V.A	
				\$ -	
				% de Avance	
				100%	
				% Avance Total	
				100%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 310,796.79	ESTA ESTIMACION
\$ -	16 % I.V.A (+)	\$ 49,727.49	
	Sub- Total A (=)	\$ 360,524.28	\$ 360,524.28
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ -	\$ -
	Importe TOTAL	\$ 310,796.79	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 49,727.49	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=)	\$ 360,524.28	\$ 360,524.28
	3 % SVIFYC:	\$ 9,323.90	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 9,323.90	CONTRATADO
\$ -	Importe TOTAL	\$ 351,200.38	\$ 360,524.28
	NETO A PAGAR	\$ 351,200.38	
SALDO DEL ANTICIPO	Son:		SALDO
\$ -	(SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 38/100 M.N.)		\$ -

ELABORO

Denise Salas
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

Ing. Jose Rodolfo Contreras Lopez
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

Ing. Rubiel Rincon Ramos
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONTRATISTA:

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DOMICILIO:

Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090

R.F.C.

SACD82117AJ7.

FECHA:

03/12/2025

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA

ESTADO DE CUENTA

LOCALIDAD:	EL VAREJONAL	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINQUITO
------------	--------------	-------------	-----------------------

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FECHA INICIO CONTRATO:	24-nov-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	01-dic-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-FAISMUN-026/2025	FECHA CONTRATO:	22-nov-25
---------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------	---------------------------	-----------------	-----------

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$360,524.28	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$360,524.28	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:	

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
----------------------	---------	-----------------------------	--------------------	-------------	------------------------------	----------------------	--------------------

01 NORMAL FINQUITO	24-nov-25	01-dic-25	\$ 360,524.28	\$ 310,796.79	\$ 9,323.90	\$ 9,323.90	\$ 351,200.38
-----------------------	-----------	-----------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------

TOTALES:

	\$ 360,524.28	\$ 310,796.79	\$ 9,323.90	\$ -	\$ 9,323.90	\$ 351,200.38
--	---------------	---------------	-------------	------	-------------	---------------

ELABORO

Denise Salas
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

[Signature]
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

[Signature]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA

03/12/2025

CONTRATISTA:

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán,
Sinaloa, C.P. 80090DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C.

SACD821117AJ7.

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	EL VAREJONAL	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$360,524.28

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$360,524.28

OBRA		IMPORTE
1	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 310,796.79
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 310,796.79

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =\$ 310,796.79
\$ 49,727.49
\$ 360,524.28

ELABORO

Denise Salas C.
C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA
HOJA:

03/12/2025

CONTRATISTA:

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DOMICILIO:

Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa,

C.P. 80090

R.F.C. SACD821117AJ7.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD		EL VAREJONAL		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL		
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.								FINIQUITO		
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:				\$360,524.28						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:				\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:				\$360,524.28						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	INSTALACIONES ESPECIALES									
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO DE CUALQUIER TIPO B O C, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	140.00	\$ 629.17	\$ 88,083.80	140.0	0.00	0.00	140.00	\$ 88,083.80
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG. 600 VOLTS, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	142.50	\$ 262.99	\$ 37,476.08	142.5	0.00	0.00	142.50	\$ 37,476.08
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 2,882.13	\$ 5,764.26	2.0	0.00	0.00	2.00	\$ 5,764.26

ELABORO

Denise Salas
C:DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA
HOJA:

03/12/2025

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

CONTRATISTA:
DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
Bivd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa,
C.P. 80090
R.F.C. SACD821117AJ7.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$360,524.28
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$360,524.28

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	\$ 30,756.42	\$ 153,782.10	5.0	0.00	0.00	5.00	\$ 153,782.10
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$ 4,210.27	\$ 21,051.35	5.0	0.00	0.00	5.00	\$ 21,051.35
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,639.20	\$ 4,639.20	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 4,639.20
TOTAL DE ESTIMACION										\$ 310,796.75

ELABORO
DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

<div>  <div> NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. </div> </div>									
01 NORMAL FINIQUITO									
GENERADORES ESTIMACION:									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
1							PARCIAL	TOTAL	
	INSTALACIONES ESPECIALES								
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO DE CUALQUIER TIPO B O C; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	140.00				140.00	140.00	VER CROQUIS
						TOTAL EJECUTADO		140.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		140.00	
GP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	140.00				140.00		VER CROQUIS
			0.50	5.00			2.50		
						TOTAL EJECUTADO		142.50	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		142.50	
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA							VER CROQUIS
			2.00				2.00	2.00	
						TOTAL EJECUTADO		2.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		2.00	

ELABORO

Denise Salas
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ


SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA									
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
01 NORMAL FINIQUITO									
GENERADORES ESTIMACION:									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MODULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN E INSTALACIÓN.	PZA	5.00				5.00	5.00	VER CROQUIS
						TOTAL EJECUTADO EN ESTA ESTIMACIÓN	5.00	5.00	
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00				5.00	5.00	VER CROQUIS
						TOTAL EJECUTADO EN ESTA ESTIMACIÓN	5.00	5.00	
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00				1.00	1.00	VER CROQUIS
						TOTAL EJECUTADO EN ESTA ESTIMACIÓN	1.00	1.00	

ELABORO

Denso Salazar
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

[Firma]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

[Firma]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



FECHA: 03/12/2025

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

CROQUIS


CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ OBRA:

ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO

1 INSTALACIONES ESPECIALES

GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO DE CUALQUIER TIPO B O C, RELLENO CON MAT
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TO
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, C
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

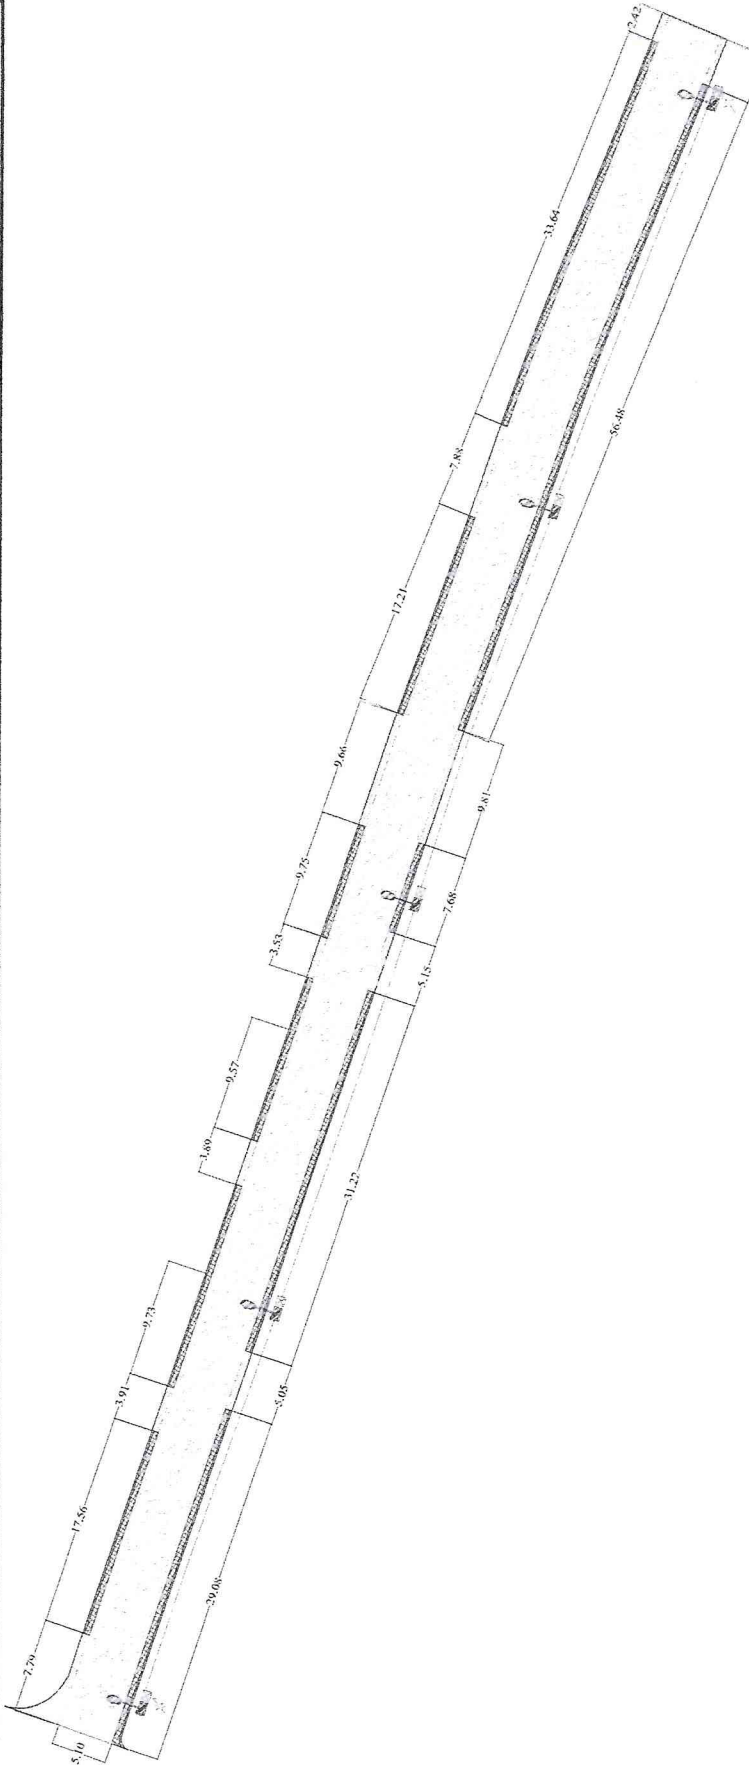

ELABORO

Denise Salas
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

[Signature]

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

		FECHA: 03/12/2025	
		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
REPORTE FOTOGRAFICO			
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATISTA:	DENISE ACELA SALAS CAZAREZ	OBRA:	
ESTIMACION:	01 NORMAL FINIQUITO		
	1	INSTALACIONES ESPECIALES	



ELABORO


DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ


SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO


ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Fecha y hora de consulta30/12/2025 5:27:18 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción:	EST 01 NOR FIN AD026	Importe de la operación:	351,200.38 MXP
Cuenta de retiro:	0124174836	Cuenta de depósito:	072730012540654561
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	Titular de la cuenta:	DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
Nombre banco destino:	BANORTE		
Fecha de creación:	30/12/2025	Fecha de aplicación:	30/12/2025
Concepto de pago:	EST 01 NOR FIN AD026	Referencia numérica:	
Instrumento de seguridad:	ASD 6551749382	Hora de captura en el canal:	17:27:16

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000760981

Clave de rastreo:002601002512300000760981

Folio de firma:0016152147

Folio único:I401202512301727160016152153

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/12/2025
