

OFICIO No. OPDUyE/704/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 02 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-017/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$907,672.14 (NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$ 873,963.61 (OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
- R.F.C. BOAI461105TB6
- DOMICILIO FISCAL: CALLE AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
- No. DE FACTURA: # 53a5, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



C.C.P. ARCHIVO.



Emisor:
JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
BOAI461105TB6
TURMALINA 3 1489 STASE, CP: 80020, CULIACAN,
SINALOA, México
Lugar de Expedición: 80020 SINALOA
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Tel: 6673722952
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214
Código postal: 80500
Uso del CFDI: I01 - Construcciones
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
dc6b6764-9aff-41ee-87b7-4c65d49b53a5
Exportacion:
01 - No aplica

Fecha / Hora de Emisión:
2/12/2025 - 16:13:31

No. de Certificado Digital:
000010000000709570684

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
72101500	1	E48 - Unidad de servicio	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: "EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA",. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-017/2025	\$773,419.12	\$773,419.12

CONTRATADO
IMPORTE: \$782,475.98
IVA: \$125,196.16
TOTAL: \$907,672.14

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$773,419.12
MAS IVA 16% : \$123,747.06
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$897,166.18

DEDUCCIONES
AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$0.00
MAS IVA 16%: \$0.00
TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$0.00

MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO:
\$773,419.12
IVA A FACTURAR (16%): \$123,747.06
TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$897,166.18

RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : \$23,202.57

TOTAL DE DEDUCCIONES: \$23,202.57

MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$873,963.61

02 - Con objeto de impuesto
Traslados:
IVA: 002, Base: \$773,419.12, Tasa: 0.160000, Importe: \$123,747.06

Subtotal: \$773,419.12
IVA 16%: \$123,747.06

Moneda: MXN
- Peso
Mexicano

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
18/100 MXN

Total: \$897,166.18

Forma de Pago:
99 - Por definir

Método de Pago:
PPD - Pago en
parcialidades ó diferido

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha / Hora de Certificación:
2/12/2025 - 17:13:31

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[[1]dc66764-9aff-41ee-87b7-4c65d49b53a5[2025-12-02T17:13:31]LSO130689R5jWHOZyE/x7aPtD2i3uqqagChA/0a+JpYAg8LuH9L6E2gJ0vCKz2hMoNCTVH8yP3h7Kb+hcz3QPL044Xu06LPvHZ1eyG3WwR0yFcDeURtn2AkkYU/d0xw/r/cF/sxRbawprIX/6DxKNmxxRBcUmajDDEODlwqTn3T2ipwd7/5PgIw+6k4SpsqjsUFIF00SMGFRWYV/uCsHH5LwM9jd8x00xJg7AQBAaw0KjSiU/NYMa+bcas8wLZ332M/ZyHYZNGPwCQbIXDkrE7qrZ1q3gsAIZzLFQoW6nbnVjBRm32bUvXCLH+JQ+Dg/kTcCHhLHSI34Av3+uH0rJBa6HQ==j0000100000079545303]]

Sello Digital del CFDI

jWHOZyE/x7aPtD2i3uqqagChA/0a+JpYAg8LuH9L6E2gJ0vCKz2hMoNCTVH8yP3h7Kb+hcz3QPL044Xu06LPvHZ1eyG3WwR0yFcDeURtn2AkkYU/d0xw/r/cF/sxRbawprIX/6DxKNmxxRBcUmajDDEODlwqTn3T2ipwd7/5PgIw+6k4SpsqjsUFIF00SMGFRWYV/uCsHH5LwM9jd8x00xJg7AQBAaw0KjSiU/NYMa+bcas8wLZ332M/ZyHYZNGPwCQbIXDkrE7qrZ1q3gsAIZzLFQoW6nbnVjBRm32bUvXCLH+JQ+Dg/kTcCHhLHSI34Av3+uH0rJBa6HQ==

Sello Digital del SAT

Fo3GpXv1ZYu0P0R2C31mriDy60x/bPHuDuMasqbhOB/iikBjeLCZxLZ/hKUmZ9KpD3FP6SK/KaGHWRwumFKCQcWCGPrFoe9U7wCLGewGrCYzvpZfIQXAVcz94n96uDBhdnECSWFw0Xh2OAB1k9hyR3XygChcF3V/nafM18VgdHadQCaOFMRpPN+u3nQ7wh5yN8njj3noK4F5IrmD1txb0SdmdEaQpm3vCY9%8TXIfN8h2U0Sx9aWEpupDW/KwmRT/VtWf3JH28VojatNUChXyXWN+EviaNDyVkpE/xs5VU0zplRjP/YZujES2hw3IZXccUXkyM4UE1x3g==

Número de Serie Certificado del SAT:
000600000079545303

RFC del PAC:
LSO130689RS

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha: 6 de octubre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL	
DOMICILIO: CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	22-sep-25
6678229976	6678229976	AL	01-oct-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
BOAI461105TB6		21-oct-25	
DEPENDENCIA:-			
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	INICIO: 24-oct-25
			TERMINACIÓN: 22-nov-25
DESCRIPCIÓN:			
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No:			
MBGBR-AD-FAISMUN-017/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$782,475.98	\$907,672.14	\$0.00	\$907,672.14
			BUENO POR: \$ 873,963.61
RECIBI :			
\$ 873,963.61		(SON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)	
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 773,419.12
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 123,747.06
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 897,166.18
3 % SVIFYC:	\$ 23,202.57	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 23,202.57
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 23,202.57	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 897,166.18
		SALDO A PAGAR: \$ 873,963.61	

ELABORO.-

C. JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZA

C. ING. RUBIEL RINCON RAMIREZ
DIRECTOR DE O.P.D.U.



JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

Dependencia :
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
Control de Estimaciones

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,			Fecha:		Estimacion:	
			6 de octubre de 2025		01 NORMAL	
Periodo de la estimacion:	22/09/2025	01/10/2025	Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	22/09/2025	22/11/2025	BADIRAGUATO		MBGBR-AD-FAISMUN-017/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance	
\$ 907,672.14	\$ 782,475.98	\$ -	\$ -	\$ -	99%	
					% Avance Total	
					99%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 773,419.12	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 123,747.06	
\$ -	Sub- Total A (=)	\$ 897,166.18	\$ 897,166.18
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ -	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR	\$ 773,419.12	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 123,747.06	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=)	\$ 897,166.18	\$ 897,166.18
	3 % SVIFYC:	\$ 23,202.57	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 23,202.57	CONTRATADO
\$ -	Importe TOTAL	\$ 873,963.61	\$ 907,672.14
	NETO A PAGAR		
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 873,963.61		SALDO
\$0.00	Son:		\$ 10,505.96
	(SON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)		

ELABORO.-

C. JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



ESTADO DE CUENTA

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

FECHA:

6 de octubre de 2025

ESTADO DE CUENTA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

DOMICILIO:

CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791,
COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P.

R.F.C.

BOAI461105TB6

FECHA

6 de octubre de 2025

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$	782,475.98		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$	-		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$	907,672.14		

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 273,963.30
2	ESTRUCTURA	\$ 422,399.19
3	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 68,041.31
4	TRABAJOS FINALES	\$ 9,015.32
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 773,419.12

SUB TOTAL=	\$	773,419.12
I.V.A AL 16 %	\$	123,747.06
TOTAL =	\$	897,166.18

ELABORO.-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

FECHA

lunes, 6 de octubre de 2025

DOMICILIO:

CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

BOA0461105TB6

1 de 3

DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:

BADIRAGUATO

ESTIMACIÓN:

01 NORMAL

DESCRIPCIÓN:

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:

\$782,475.98

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$907,672.14

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO		TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
				P.U.							
1	PRELIMINARES										
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	444.00	\$	15.58	\$ 6,917.52	444.00	0.00	0.00	444.00	\$ 6,917.52
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	224.20	\$	133.09	\$ 29,838.78	224.20	0.00	0.00	224.20	\$ 29,838.78
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	444.00	\$	37.61	\$ 16,698.84	444.00	0.00	0.00	444.00	\$ 16,698.84
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	444.00	\$	195.96	\$ 87,006.24	444.00	0.00	0.00	444.00	\$ 87,006.24
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	444.00	\$	260.09	\$ 115,479.96	444.00	0.00	0.00	444.00	\$ 115,479.96
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECH-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	M2	444.00	\$	40.59	\$ 18,021.96	444.00	0.00	0.00	444.00	\$ 18,021.96
2	ESTRUCTURA										
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	133.00	\$	746.73	\$ 99,315.09	133.00	0.00	0.00	133.00	\$ 99,315.09
GP088	PATÍN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	21.00	\$	646.80	\$ 13,582.80	13.14	0.00	0.00	13.14	\$ 8,498.95

ELABORA:

REVISÓ:

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



FECHA: lunes, 6 de octubre de 2025

CONTRATISTA:	JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA	DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO:	CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000	R.F.C.	BOA461105TB6

DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN			
LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$782,475.98	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$907,672.14

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT.	P.U.					
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C-250 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	355.20	\$ 833.90	\$ 296,201.28	355.20	0.00	355.20	296,201.28
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	222.00	\$ 33.75	\$ 7,492.50	222.00	0.00	222.00	7,492.50
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	35.70	\$ 77.12	\$ 2,753.18	-	0.00	-	-
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	133.00	\$ 81.89	\$ 10,891.37	133.00	0.00	133.00	10,891.37
3	INSTALACIONES ESPECIALES								
GP20	POLIDUCTO NARANJA, REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	54.00	\$ 160.42	\$ 8,662.68	54.00	0.00	54.00	8,662.68
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG. 600 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	63.00	\$ 117.79	\$ 7,420.77	63.00	0.00	63.00	7,420.77
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO. INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO. SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,194.74	\$ 1,194.74	1.00	0.00	1.00	1,194.74

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

FECHA

lunes, 6 de octubre de 2025

DOMICILIO:

CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

BOA1461105TB6

3 de 3

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:

BADIRAGUATO

ESTIMACIÓN:

01 NORMAL

DESCRIPCIÓN:

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:

\$782,475.98

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$907,672.14

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.						
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 108 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	\$ 23,511.81	\$ 47,023.62	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 47,023.62
GP24	40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 1,219.83	\$ 3,659.49	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 2,439.66
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,299.84	\$ 1,299.84	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,299.84
4	TRABAJOS FINALES									
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,859.48	\$ 4,859.48	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,859.48
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	444.00	\$ 9.36	\$ 4,155.84	444.00	0.00	0.00	444.00	\$ 4,155.84
									SUB-TOTAL	\$ 773,419.12
									IVA	\$ 123,747.06
									MONTO TOTAL	\$ 897,166.18

ELABORADO:
C. JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA

REVISADO:
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

AUTORIZADO:
C. JNG. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VOLUMENES GENERADORES

		CONTRATISTA: JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA							EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				ESTIMACION 01 NORMAL	
RFC:		BOAI461105TB6												
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES				
1	PRELIMINARES	EJE	TRAMO		EN METROS									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2										
		CADENAMIENTO												
		0+000.00	0+077.35		77.35	6.05				467.97				
										TOTAL EJECUTADO	467.97			
										ESTA ESTIMACION	444.00			
										ADICIONAL	23.97			
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.			M3										
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO	ESPESOR							
		0+000.00	0+077.35		77.35	6.05	0.5			233.98				
										TOTAL EJECUTADO	233.98			
										ESTA ESTIMACION	224.20			
										ADICIONAL	9.78			
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE INCLUYE ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.			M2										
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO								
		0+000.00	0+077.35		77.35	6.05				467.97				
										TOTAL EJECUTADO	467.97			
										ESTA ESTIMACION	444.00			
										ADICIONAL	23.97			
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.			M2										
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO								
		0+000.00	0+077.35		77.35	6.05				467.97				
										TOTAL EJECUTADO	467.97			
										ESTA ESTIMACION	444.00			
										ADICIONAL	23.97			
GP25	BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			M2										
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO								
		0+000.00	0+077.35		77.35	6.05				467.97				
										TOTAL EJECUTADO	467.97			
										ESTA ESTIMACION	444.00			
										ADICIONAL	23.97			
GP06	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA EC-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			M2										
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO								
		0+000.00	0+077.35		77.35	6.05				467.97				
										TOTAL EJECUTADO	467.97			
										ESTA ESTIMACION	444.00			
										ADICIONAL	23.97			
2	ESTRUCTURA													

ELABORADO:
JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO:
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZADO:
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
01 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML						
				IZQUIERDA	69.76			69.76	69.76	
				DERECHA	71.44			71.44	71.44	
								TOTAL EJECUTADO	141.20	
								ESTA ESTIMACION	133.00	
								ADICIONAL	8.20	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			ML						
				IZQUIERDA	8.14			8.14	8.14	
				DERECHA	5.00			5.00	5.00	
								TOTAL EJECUTADO	13.14	
GP66	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			M2						
				CADENAMIENTO		LONG	ANCHO			
				0+000.00	0+077.35	77.35	4.97		376.69	
								TOTAL EJECUTADO	376.69	
								ESTA ESTIMACION	355.20	
								ADICIONAL	21.49	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.			ML						
				IZQUIERDA	77.00			77.00	77.00	
				DERECHA	77.00			77.00	77.00	
				CENTRO	77.00			77.00	77.00	
								TOTAL EJECUTADO	231.00	
								ESTA ESTIMACION	222.00	
								ADICIONAL	9.00	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.			ML						
				IZQUIERDA	69.76			69.76	69.76	
				DERECHA	66.44			66.44	66.44	
								TOTAL EJECUTADO	136.20	
								ESTA ESTIMACION	133.00	
								ADICIONAL	3.20	
3	INSTALACIONES ESPECIALES									
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			ML						
				ALIMENTACION	POSTE 1	30.15		30.15	30.15	
				POSTE 1	POSTE 2	40.36		40.36	40.36	
								TOTAL EJECUTADO	70.51	
								ESTA ESTIMACION	54.00	
								ADICIONAL	16.51	
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			ML						
				ALIMENTACION	POSTE 1	30.15		30.15	30.15	
				POSTE 1	POSTE 2	40.36		40.36	40.36	
					REGISTRO	3.00	0.50	1.50	1.50	
								TOTAL EJECUTADO	72.01	
								ESTA ESTIMACION	63.00	
								ADICIONAL	9.01	
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

VOLUMENES GENERADORES

VOLUMENES GENERADORES										
 CONTRATISTA: JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA				EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					ESTIMACION 01 NORMAL	
RFC:	BOAI461105TB6									
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
								1.00	1.00	
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			PZA						
								1.00	1.00	
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			PZA						
								1.00	1.00	
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA						
								1.00	1.00	
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
4	TRABAJOS FINALES									
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
								1.00	1.00	
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2						
		CADENAMIENTO								
		0+000.00	0+077.35		77.35	6.05			467.97	
								TOTAL EJECUTADO	467.97	
								ESTA ESTIMACION	444.00	
								ADICIONAL	23.97	

ELABORADO
 CNP SE IGNACIO BROWN ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZADO
 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



CONTRATISTA:
JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P.
81000

R.F.C. BOA461105TB6

OBRA: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO,
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN,
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,

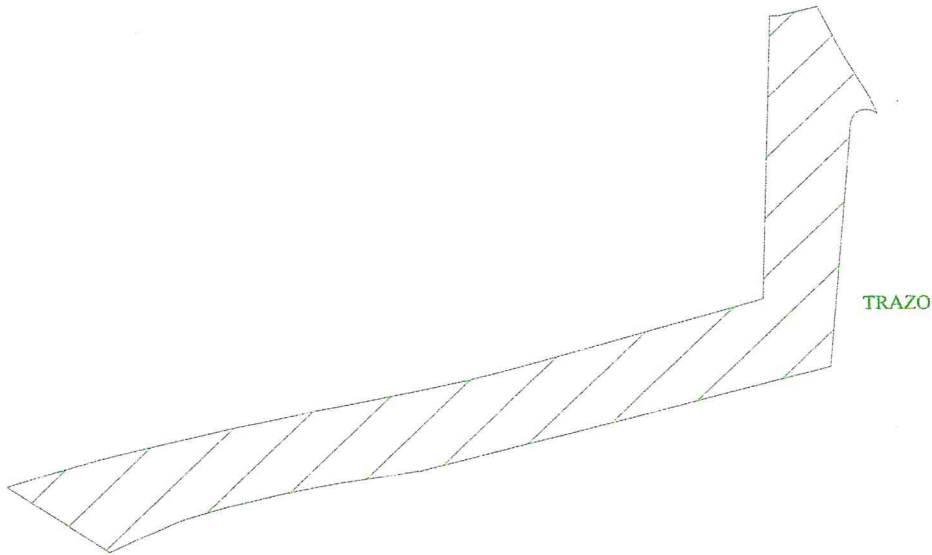

ELABORO-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

DOMICILIO:

CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C. BOA/461105TB6

OBRA:

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ARCHIVO FOTOGRAFICO

ESTRUCTURA

2

GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:



ELABORO:-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REUSO:-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO:

CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

BOAI461105TB6

OBRA:


EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE, DE LA COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

INSTALACIONES ESPECIALES

3

GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

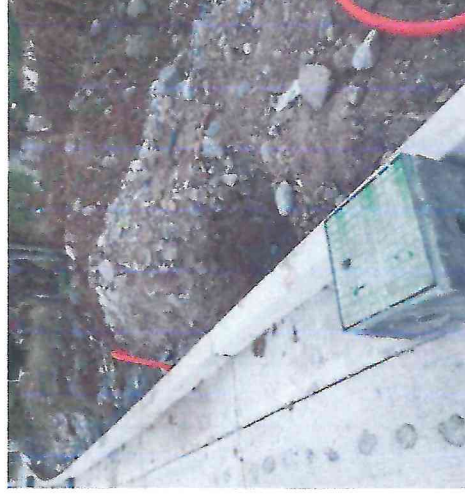

ELABORO.-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta

10/12/2025 7:39:23 PM

Contrato

00798320

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NORM AD 017

Importe de la operación: 873,963.61 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 030730900033057253

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: JOSE IGNACIO BROWN
ACOSTA

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha valor: 11/12/2025

Fecha de creación: 10/12/2025

Fecha de aplicación: 10/12/2025

Concepto de pago: EST 01 NORM AD 017

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 19:39:20

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000222622

Clave de rastreo: 002601002512110000222622

Folio de firma: 0069267167

Folio único: I401202512101939200069267173

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
