

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA. CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES		HOJA 1
		DE 1

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO	PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025	IMPORTE: \$ 75,915.08
LUGAR: GUAMUCHIL SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		
OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		CONTRATISTA: ALEJANDRO CASTRO GASTELUM
		PERIODO DE CONTRATO
		DEL : 22-sep-25
		AL : 12-oct-25
PRESUPUESTO \$ 77,670.78 + I.V.A.		

ESTADO CONTABLE

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACION		LIQUIDACION ESTIM. No. 1 (UNO) FINIQUITO	
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO IMPORTE
MONTO CONTRATO S/IVA	\$ 77,670.78	\$ 77,670.78	MONTO ANTICIPO S/IVA	\$ 38,835.39	\$ 38,835.39	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 75,915.08
ESTIM. No.1 FINIQUITO	\$ 75,915.08	\$ 1,755.70	ESTIM. No.1 FINIQUITO	\$ 38,835.39	-	
						MENOS AMORTIZACION \$ 38,835.39
						SUMA \$ 37,079.69
						MAS 16% IVA \$ 5,932.75
						SUBTOTAL \$ 43,012.44
						DEDUCCIONES \$ 2,277.45
						3 % SECRET. DE TRANSP. \$ 2,277.45
						SUMA DE DEDUCCIONES = \$ 2,277.45
						SALDO LIQUIDO \$ 40,734.99

CONTRATISTA: <i>Alejandro Castro G</i> ALEJANDRO CASTRO GASTELUM	REVISO: <i>Oscar Dautt Leyva</i> DEPARTAMENTO TECNICO DE JAPASA ING. OSCAR DAUTT LEYVA	AUTORIZA: <i>Maria Isaura Bejarano Lugo</i> GERENTE GENERAL DE JAPASA LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
---	--	---



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE SALVADOR ALVARADO**

LAZARO CARDENAS # 1200 COL DEL EVORA, C.P. 81460

RESUMEN DE ESTIMACION No. 1 FINIQUITO

FECHA : 13 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR : GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA
PERIODO : 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL
HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE
GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO:
JAPASA-MUNICIPIO-FISM-002-2025

CONTRATISTA: ALEJANDRO CASTRO
GASTELUM

IMPORTE DE ESTIMACION

\$75,915.08

No.	PARTIDA	MONTO DE ESTA ESTIMACION A PRECIOS INICIALES	
A11	EXCAVACIONES	\$ 30,589.90	
A12	TUBERIA PVC	\$ 14,413.54	
A13	PIEZAS ESPECIALES	\$ 1,328.22	
A14	TOMAS DOMICILIARIAS EXTRAORDINARIOS	\$ 23,580.24	
		\$ 6,003.18	
	SUMA =	\$ 75,915.08	
	IVA (16 %) =	\$ 12,146.41	
	TOTAL =	\$ 88,061.49	

CONTRATISTA:
Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

REVISO:
Oscar Dautt Leyva
DEPARTAMENTO TECNICO DE JAPASA
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

AUTORIZA:
Lic. Maria Isaura Bejarano Lugo
GERENTE GENERAL DE JAPASA
LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
DEPARTAMENTO TECNICO
NUMEROS GENERADORES
VOLUMENES DE OBRA

CONTRATO No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-002-2025

OBJETO: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO, SINALOA
CONTRATISTA: ALEJANDRO CASTRO GASTELUM
LUGAR: GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

HOJA: 1 de 5

COD.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	TOTAL	
A	AGUA POTABLE										
A11	EXCAVACIONES										
AGP1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				ML					84.27	
	TRAMO 1							1.00	1.10		
	TRAMO 2							1.00	82.07		
	TRAMO 3							1.00	1.10		
								SUMA =	84.27		
AGP2	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCEPTO ROCA FIJA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE TUBERIA, MEDIDO EN ZANJA.				M3					65.73	
	ESTACION ó CRUCERO DE INICIO										
	ESTACION ó CRUCERO DE FINAL										
	CRUCERO 2					0.60	1.30	0.86			
	CRUCERO 3					0.60	1.30	64.01			
	CRUCERO 4					0.60	1.30	0.86			
								SUMA =	65.73		
AGP4	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCION DE CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE TODO UN CUADRANTE DE LA TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.				M3					5.06	
	TRAMO 1					0.60	0.10	1.00	0.07		
	TRAMO 2					0.60	0.10	1.00	4.92		
	TRAMO 3					0.60	0.10	1.00	0.07		
								SUMA =	5.06		

CONTRATISTA:

Alejandro Castro G
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISAUURA BEJARANO LUGO

DEPARTAMENTO TECNICO DE JAPASA

LIC. OSCAR DAUTT LEYVA

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
DEPARTAMENTO TECNICO**

**NUMEROS GENERADORES
VOLUMENES DE OBRA**

CONTRATO Nº JAPASA-MUNICIPIO-FISM 002-2025

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN CULIACÁN
EL 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD
DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

MUNICIPIO:	SALVADOR ALVARADO, SINALOA
-------------------	----------------------------

CONTRATISTA:	ALEJANDRO CASTRO CASTELUM
--------------	---------------------------

LIIGAR-	GUAMIICHI SALVADOR ALVARADO SINALOA.
---------	--------------------------------------

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

2 de 5

[illegible]

CONTRATISTA:

CONTRATISTA: Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

DEPARTAMENTO TECNICO DE JAPASA

ING/ OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
DEPARTAMENTO TECNICO
NUMEROS GENERADORES
VOLUMENES DE OBRA

CONTRATO No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-002-2025

OBJETO: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN DE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO, SINALOA
CONTRATISTA: ALEJANDRO CASTRO GASTELUM
LUGAR: GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

HOJA: 3 de 5

COD.	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	
	TRAMO 2				82.07			1.00	82.07		
	TRAMO 3				1.10			1.00	1.10		
								SUMA =	84.27		
A12	TUBERIA PVC										
AGT1	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC (S.I.) CON COPLER INTEGRAL ANGER DE 3" DE DIAMETRO RD-32.5. INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOTI Y EL I.T.P.			ML						84.27	
	TRAMO 1				1.10			1.00	1.10		
	TRAMO 2				82.07			1.00	82.07		
	TRAMO 3				1.10			1.00	1.10		
								SUMA =	84.27		
A13	PIEZAS ESPECIALES										
2320038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBAUT DE 3" DE DIAMETRO.			PZA						1.00	
	CRUCERO 1								1.00		
								SUMA =	1.00		
A14	TOMAS DOMICILIARIAS										
AGP15	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA (ABRAZADERA 3"x13 MM, LLAVE DE INSERCIÓN, LLAVE DE BANQUETA, BOTA DE TUBO PVC 4" CON TAPA, MANGUERA EXTRUPAK DE 1/2"), INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			PZA						12.00	
	TOMA 1 IZQUIERDA								1.00		
	TOMA 2 IZQUIERDA								1.00		
	TOMA 3 DERECHA								1.00		
	TOMA 4 IZQUIERDA								1.00		
	TOMA 5 IZQUIERDA								1.00		
	TOMA 6 IZQUIERDA								1.00		
	TOMA 7 IZQUIERDA								1.00		
	TOMA 8 DERECHA								1.00		

CONTRATISTA:

Alejandro Castro G
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

Maria Isaura Bejarano Lugo

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO

DEPARTAMENTO TECNICO DE JAPASA

ING. OSCAR DAUTT LEYVA

Oscar Dautt Leyva



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
DEPARTAMENTO TECNICO
NUMEROS GENERADORES
VOLUMENES DE OBRA

CONTRATO No. JAPASA-MUNICIPIO-FISM-002-2025

OBJETO: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN, MUNICIPIO DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA. DEL 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

PERIODO DE EJECUCION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO, SINALOA
CONTRATISTA: ALEJANDRO CASTRO GASTELUM
LUGAR: GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

HOJA: 4 de 5

COD.	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO				UNIDAD	PARCIAL	TOTAL
	TOMA 9 IZQUIERDA								1.00	
	TOMA 10 IZQUIERDA								1.00	
	TOMA 11 IZQUIERDA								1.00	
	TOMA 12 IZQUIERDA						SUMA =		12.00	
	EXTRAORDINARIOS									
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE REPARACION CON CAMPANAS DE 3" DE PVC HCO. INCLUYE: ANILLO EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA						2.00
	CRUCERO 1								1.00	
	CRUCERO 2								1.00	
							SUMA =		2.00	
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° DE 3" DE PVC HCO. INCLUYE: ANILLO EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA						4.00
	CRUCERO 1								2.00	
	CRUCERO 2								2.00	
							SUMA =		4.00	
EXT-003	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", MEDIDAS PROMEDIO DE 0.40 X 0.40 X 0.040 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			PZA						4.00
	CRUCERO 1								2.00	
	CRUCERO 2								2.00	
							SUMA =		4.00	

CONTRATISTA:

Alejandro Castro G


ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

DEPARTAMENTO TECNICO DE JAPASA

ING. OSCAR DAUTT LEYVA



**NUMEROS GENERADORES
VOLUMENES DE OBRA**

CONTRATO Nº JAPASA-MUNICIPIO-FISM-002-2025

OBJETO: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JON CULIACAN
DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.
FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD

PERIODO DE EFICACIA: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

MUNICIPIO:	SALVADOR ALVARADO, SINALOA
-------------------	----------------------------

CONTRATISTA:	ALEJANDRO CASTRO CASTELUM
--------------	---------------------------

LUGAR:	GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.
--------	--

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

HOJA: 5 de 5

5 de 5

[illegible]

CONTRATISTA:

ALFONSO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

DEPARTAMENTO TECNICO DE JAPASA

ING. OSCAR DAUTT LEYVA



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE SALVADOR ALVARADO**
LAZARO CARDENAS # 1200 COL DEL EVORA, C.P. 81460

ESTIMACION No. 1 FINIQUITO

FECHA : 13 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR : GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA
PERIODO : 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO:
JAPASA-MUNICIPIO-FISM-002-2025

CONTRATISTA: ALEJANDRO CASTRO
GASTELUM


IMPORTE DE ESTIMACION
\$75,915.08

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$	
COD.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
A	AGUA POTABLE								
A11	EXCAVACIONES								
AGP1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EIJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	86.50	84.27	0.00	0.00	84.27	\$26.37	\$2,222.20
AGP2	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCEPTO ROCA FIJA EN ZONA "B", INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE TUBERIA, MEDIDO EN ZANJA.	M3	84.34	65.73	0.00	0.00	65.73	\$96.63	\$6,351.49
AGP4	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: CONSTRUCCION DE CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE TODO UN CUADRANTE DE LA TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	5.62	5.06	0.00	0.00	5.06	\$453.67	\$2,295.57
AGP5	RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA, APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CMS DE ESPESOR, (HASTA 30 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	20.76	18.32	0.00	0.00	18.32	\$487.83	\$8,937.05

CONTRATISTA:
Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA
[Signature]
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

DEPARTAMENTO TECNICO
[Signature]
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



ESTIMACION No. 1 FINIQUITO

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE SALVADOR ALVARADO**

LAZARO CARDENAS # 1200 COL DEL EVORA, C.P. 81460

FECHA : 13 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR : GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA
PERIODO : 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUJCHIL. MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO. SINALOA.

CONTRATO:
JAPASA-MUNICIPIO-FISM-002-2025

CONTRATISTA: ALEJANDRO CASTRO
GASTELUM

IMPORTE DE ESTIMACION

\$75,915.08

[illegible]

CONTRATISTA:

GERENTE GENERAL DE JAPASA

DEPARTAMENTO TECNICO

ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

MARIA ISaura BEJARANO LUGO

ING. OSCAR DAUTT LEYVA



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE SALVADOR ALVARADO**

LAZARO CARDENAS # 1200 COL DEL EVORA, C.P. 81460

ESTIMACION No. 1 FINIQUITO

HOJA 3 DE 4

FECHA : 13 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR : GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA
PERIODO : 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL
HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE
GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO:
JAPASA-MUNICIPIO-FISM-002-2025

CONTRATISTA: ALEJANDRO CASTRO
GASTELUM

IMPORTE DE ESTIMACION
\$75,915.08

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
COD.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.
A13	PIEZAS ESPECIALES							
2320038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBULT DE 3" DE DIAMETRO	PZA	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,328.22
	TOTAL DE PIEZAS ESPECIALES							\$1,328.22
A14	TOMAS DOMICILIARIAS							
AGP15	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA (ABRAZADERA 3"X13 MM, LLAVE DE INSERCIÓN, LLAVE DE BANQUETA, BOTA DE TUBO PVC 4" CON TAPA, MANGUERA EXTRUPAK DE 1/2"), INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$1,965.02
	TOTAL DE TOMAS DOMICILIARIAS							\$23,580.24
	EXTRAORDINARIOS							
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPL DE REPARACION CON CAMPANAS DE 3" DE PVC HCO. INCLUYE: ANILLO EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	\$420.67
								\$841.34
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90º DE 3" DE PVC HCO. INCLUYE: ANILLO EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	\$456.23
								\$1,824.92

CONTRATISTA:

Alejandro Castro G
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

DEPARTAMENTO TECNICO

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

CONTRATISTA: Alexander Castañeda
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 1 DE 2


CROQUIS DE OBRA

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.


ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

CRUCERO 1

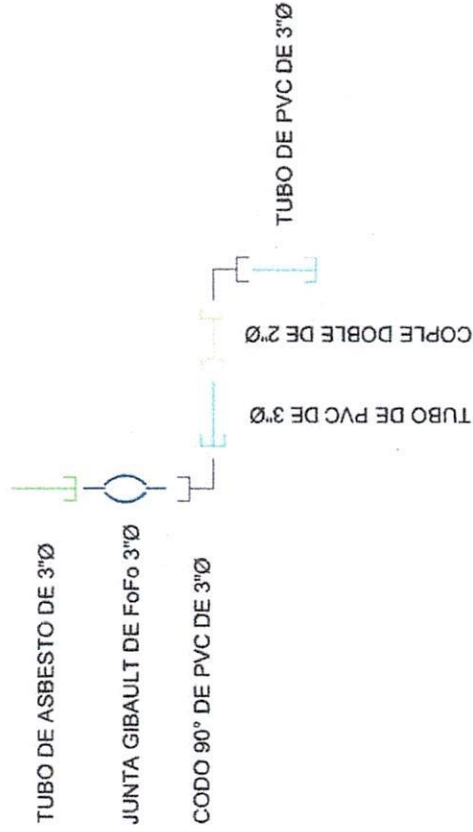

CRUCERO 2

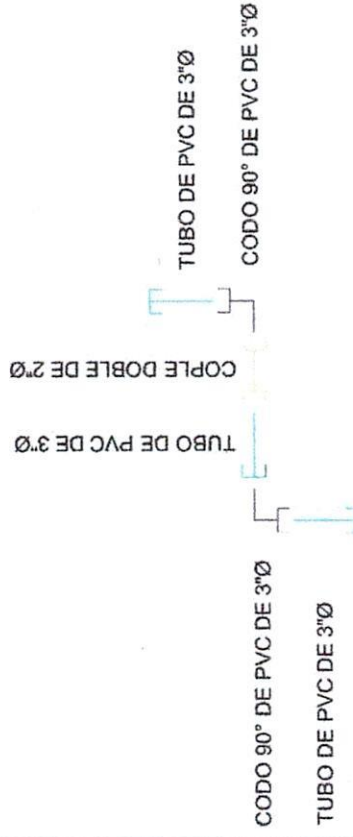

CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.


HOJA 2 DE 2

CROQUIS DE OBRA

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

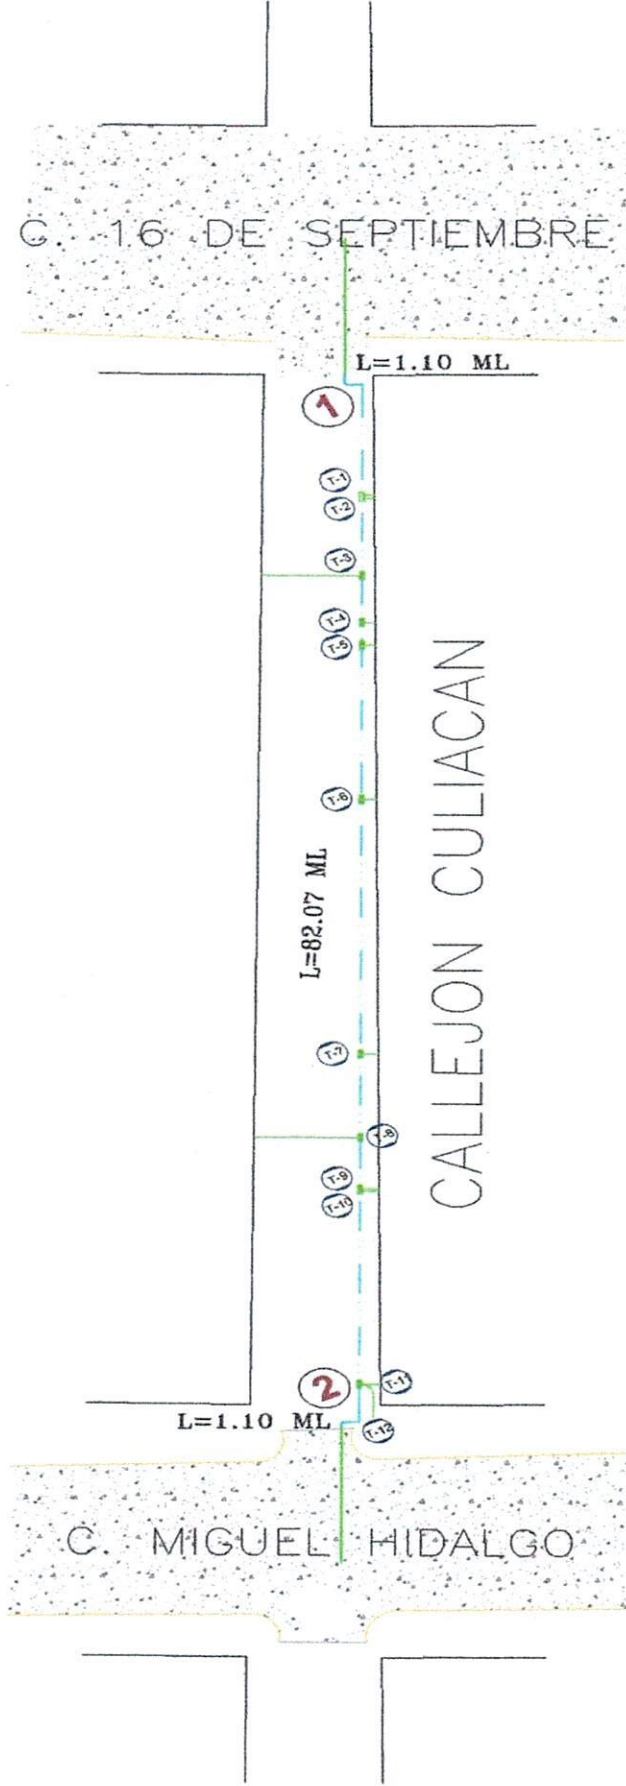

CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 1 DE 14

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

AGP1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO



CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 2 DE 14

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

AGP2 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS



CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 3 DE 14



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

AGP4 PLANTILLA APISONADA

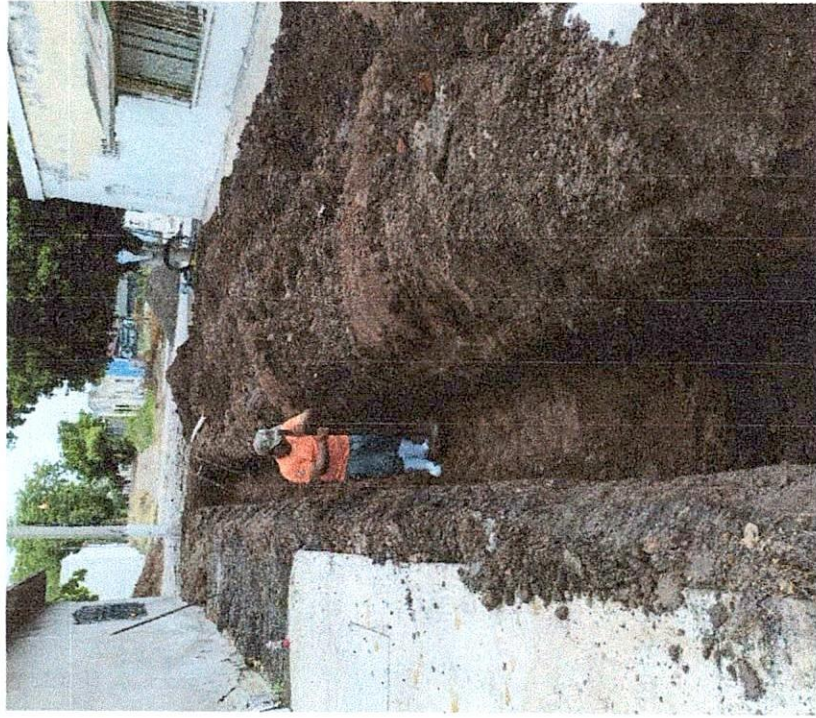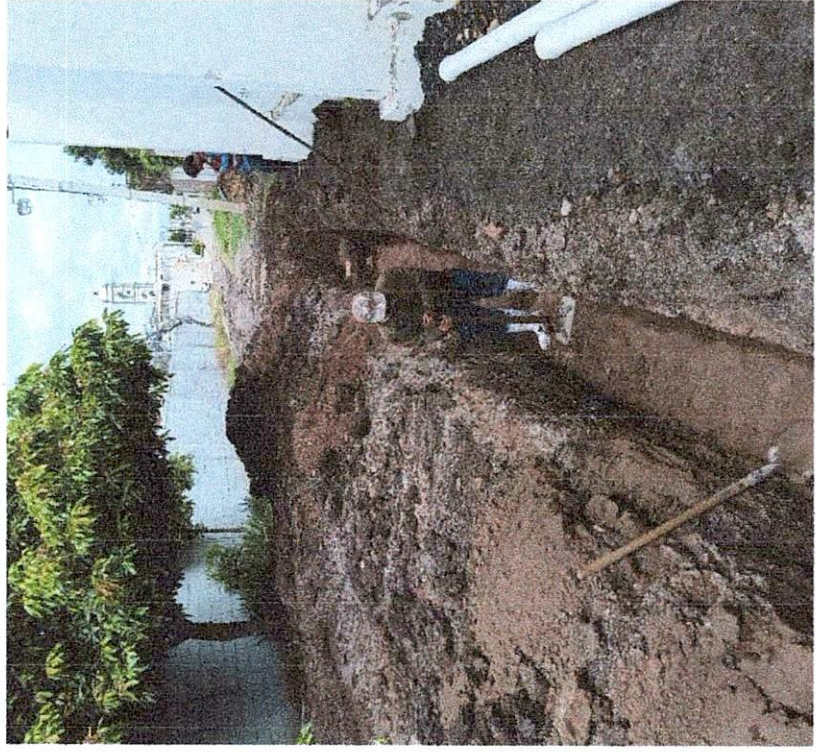

CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

[Signature]

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

[Signature]
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.


HOJA 4 DE 14

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO	PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025
---	---

AGP5 RELLENO ACOSTILLADO

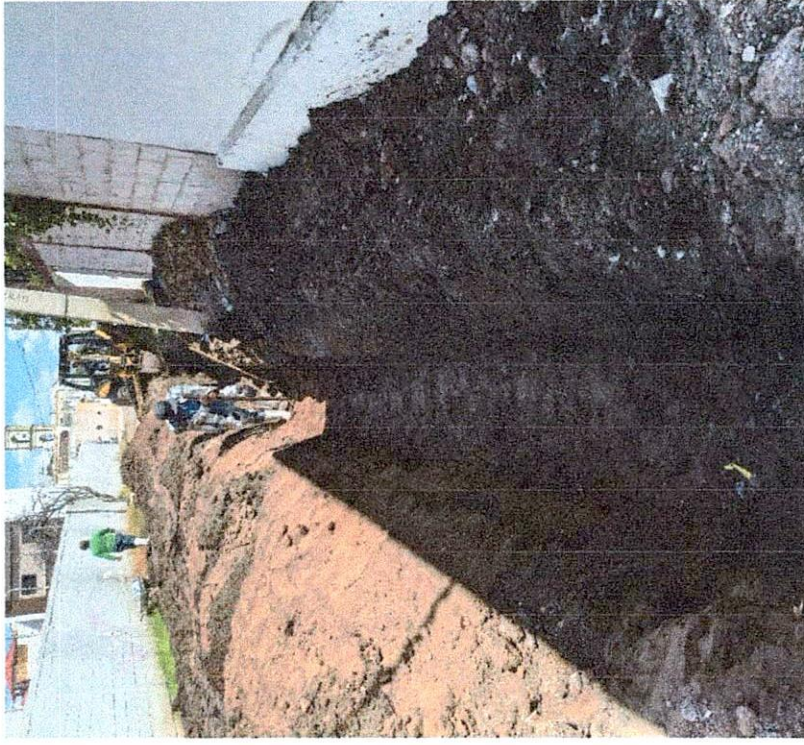

CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 5 DE 14

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

AGPRC RELLENO COMPACTADO



CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 6 DE 14

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

AGP7 RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION



CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 7 DE 14


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

*TEMP15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

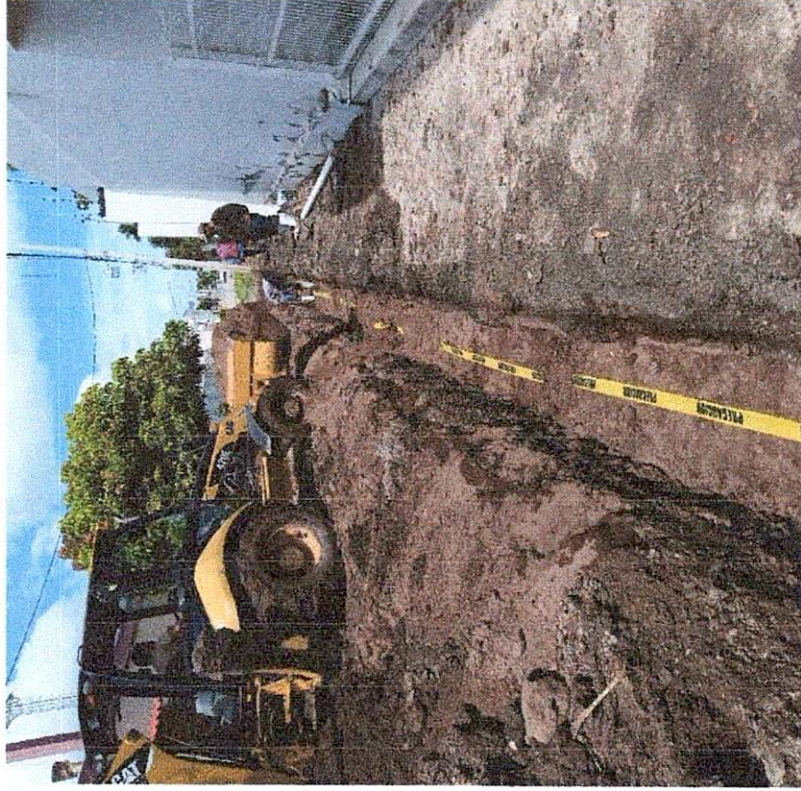

CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 8 DE 14

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

AGT1

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, INST., JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 3" DE DIAMETRO RD-32.5



CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 9 DE 14


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

2320038 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE DIAMETRO.

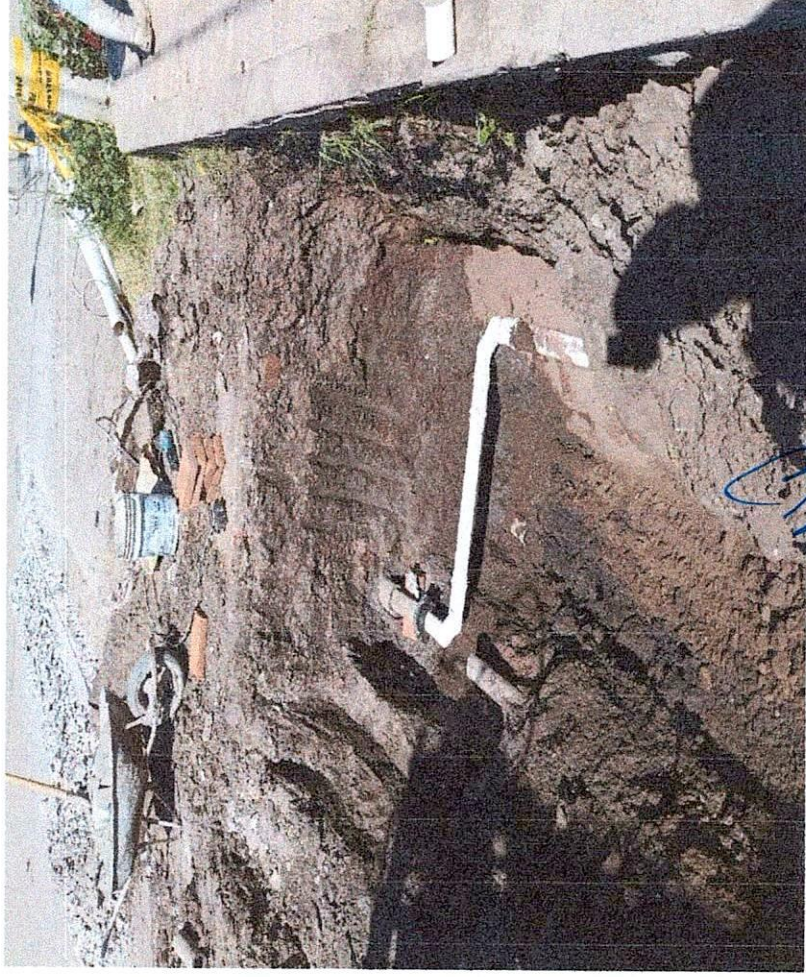

CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 10 DE 14



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

AGP15 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA

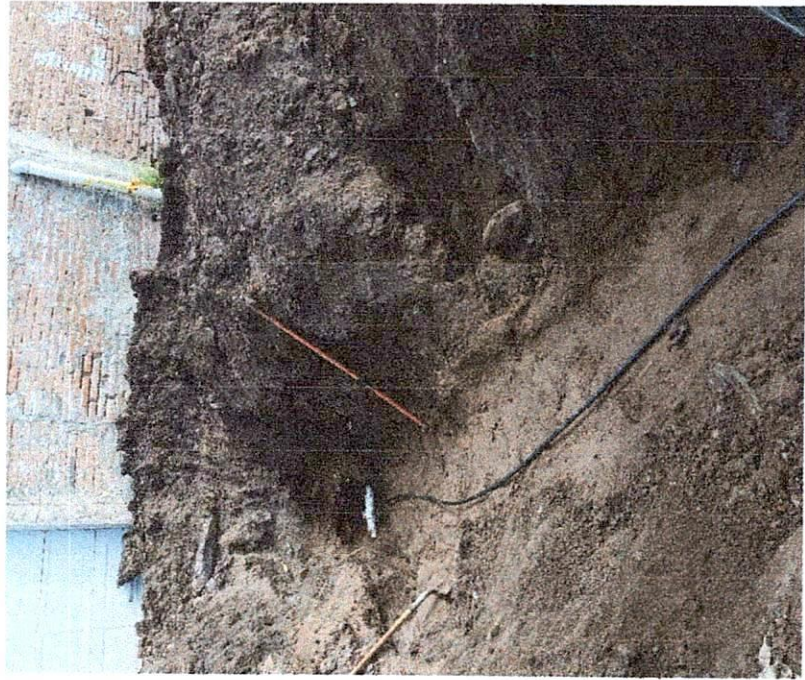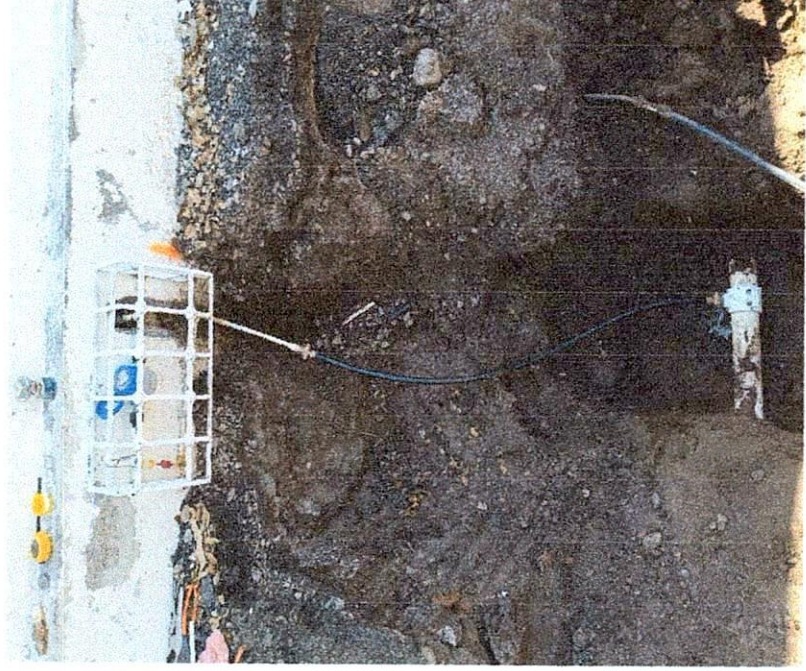

CONTRATISTA:

Alejandro Castro G
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 11 DE 14


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

AGP15 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA

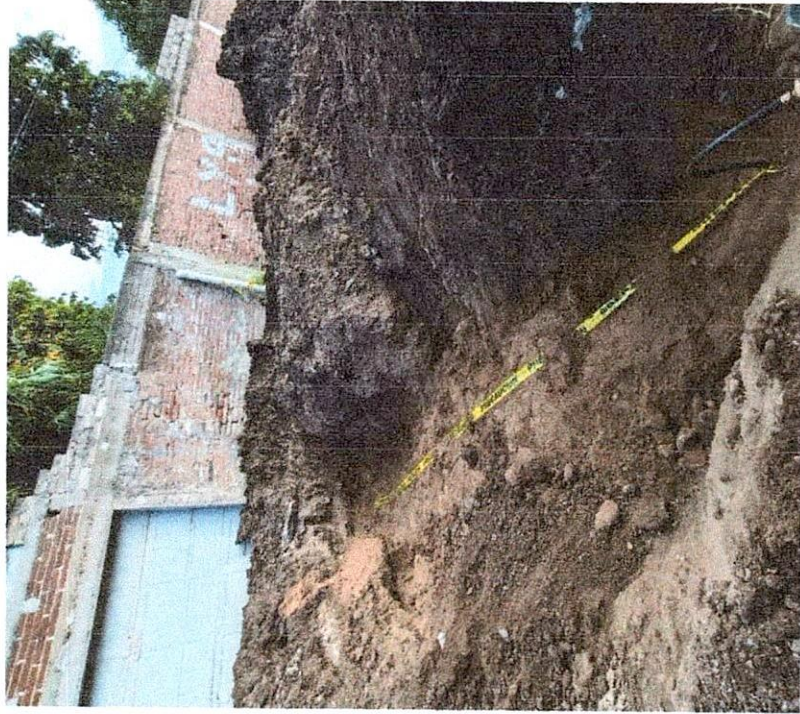

CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 12 DE 14



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

EXTRAORDINARIOS (INSTALACION DE COPLES DE REPARACION, CODOS 45° Y ATRAQUES)

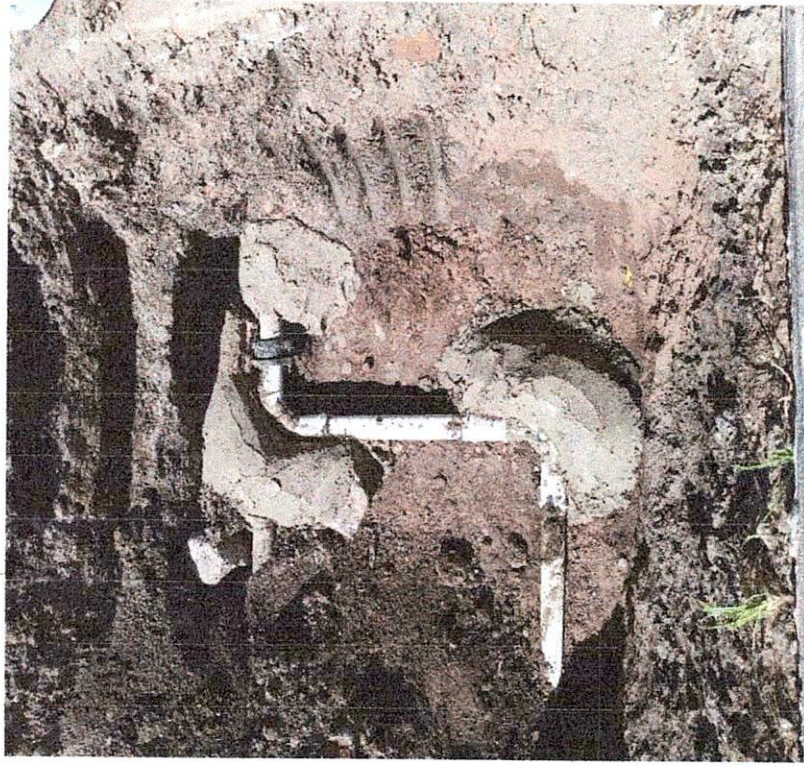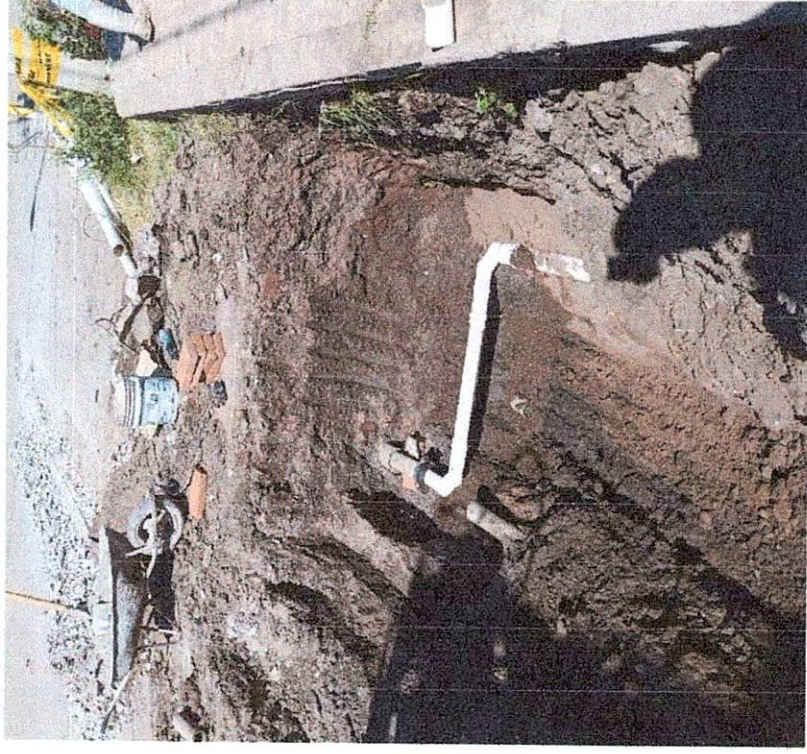

CONTRATISTA:

Alejandro Castro G
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

[Signature]

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

[Signature]
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 13 DE 14

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

EXTRAORDINARIOS (INSTALACION DE COPILES DE REPARACION, CODOS 45° Y ATRAQUES)



CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Levva
ING. OSCAR DAUTT LEVVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS # 1200, COL. DEL EVORA, C.P. 81460, GUAMUCHIL, SINALOA.

HOJA 14 DE 14


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA : REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CULIACAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2025

EXT-004 SONDEO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 3" EN MATERIAL TIPO B EN SECO

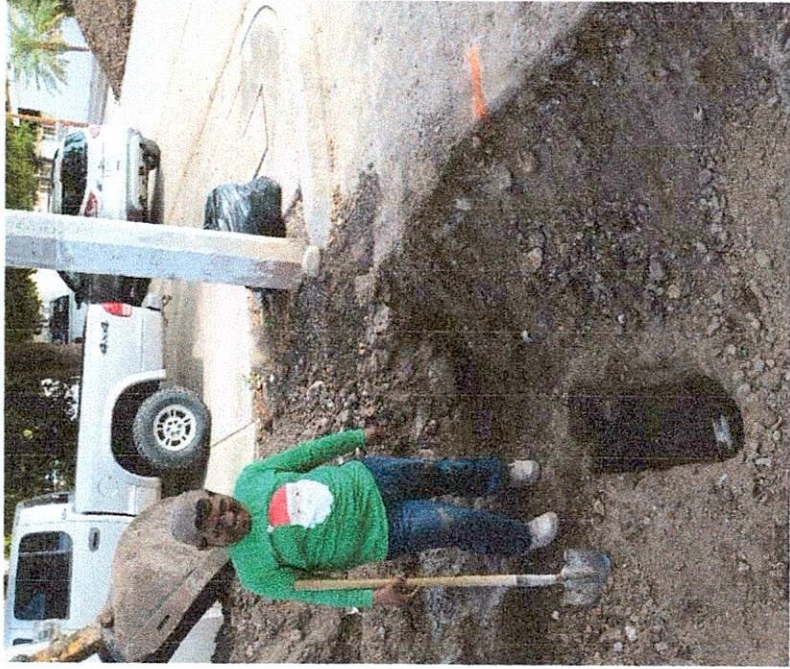

CONTRATISTA:

Alejandro Castro
ALEJANDRO CASTRO GASTELUM

GERENTE GENERAL DE JAPASA

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO

SUPERVISOR DE JAPASA

Oscar Dautt Leyva
ING. OSCAR DAUTT LEYVA
