

NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SACUMIANZO Y LABORA PAVIMENTACION EN CALLE ERNESTO SARRIA, ENTRE CALLE DR. JESUS HUERTA Y CALLE ARMONIA, EN LA LOCALIDAD DEL ARCOBO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EN LA MODALIDAD MIMBA Y LA CONTRATATA ABASTIARE CONSTRUCTORA S.A DE CV. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO ORPU-EST-005-REST-VIAL-2006A-2022, CON UN IMPORTE \$ 1,371,284.07 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 25 DE AGOSTO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS INCLUIDAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Cen A. Calderon
AL COM CALO
RESIDENTE DE LA SUP



NOTA NO 2

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA CON EL CONTRATATA SE LE HACE ENTREGA DEL VIVIABLE (VIALIDAD). SE LE NOTIFICA DEBERA PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES Y OFICIO DE DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE YU RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE Cedula Profesional, DEBEN DIRIGIRSE A ING. JOSE CARLOS MARTINEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ACUARO A LA CLASICA QUINTA DE ESTE CONTRATO. DEBEAN PRESENTAR DEL MENCIONADO UNA VEZ A MES. PRESENTAR COMPARATIVOS DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES ADICIONALES CON JUSTIFICACION PARA SU REVISION EN OFICINA DE SUPERVISION Y, DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO. SOLICITADOS CONVENIMOS DE SER NECESARIOS DENTRO DEL PERIODO DE CONTRATO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.


Cen A. Calderon



MTA No 3

CONTRATISTA SIN INICIAR TRABAJOS CONTRATADOS
DEBIDO A QUE NO CUENTA CON PROYECTO, SE SOLICITA
A DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SDP
EN ESPERA DE RESPUESTA.

Car / Cato Meru



MTA No 4

06 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA SIN INICIAR, NO HAN DADO PROYECTO
POR PARTE DE DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA
SDP, SE METE OFICIO A SUMARIN PARA VER STATUS DE
INSTALACIONES, CONTRATO SOLO CONTEMPLA SUSTITUCION
A RED DE LENA PUTABLE.

Car / Cato Meru




MTA No 5

12 DE JULIO DE 2022

RESPUESTA POR PARTE DE SUMARIN FUE NEGATIVA, SOLO
SE CAMBIARA RED DE LENA, EN ESPERA DE OFICIO CON RESPUESTA.
SE PROBARON PLANO PARA SUSTITUCION DE RED DE LENA POR
PUTABLE, EN ESPERA DE PROYECTO DE LA CALLE PARA VE-
RIFICAR TRAZO.


Car / Cato Meru



NOTA N 6

SE PROPUSIERON PROYECTO DE VALLADO Y CONTRATISTA, OBRA PUBLICA MUNICIPAL ENTREGO PROYECTO DISEÑO A QUE DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SUP. NO HA DADO RESPUESTA. SE VERIFICARAN COTAS EN PUNTO OBLIGADO.

Cerr I Coto Aca



NOTA N 7

21 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA INICIO TRABAJOS DE SUBSTITUCION DE RAO DE AGUA POTABLE Y TUBOS DOMICILIARIAS, INICIO TIRAZO Y ACERCAVACIONES.

Cerr I Coto Aca



NOTA N 8

26 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS CON LUBRIFICACION EN LA ZONA. SE PROGRAMA PRUEBA CON PRESENCIA DE PERSONAL DE SUMAPAM.

Cerr I Coto Aca



NOTA N 9

29 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA CONCLUYO PRUEBA E INTERCONEXION DE RAO A CATA DE VALLADO. ENTONCES PU CAL DE HUMEDA. SE HA CUIDO CORTA DE CATA Y RASTRO DE MATERIAL PRODUCIDO DE EXCAVACION.


Cerr I Coto Aca



NOTA N° 10

CON ESTA SECONDA CONTRATITA CONTINUA OTRA Y RETIRO DE CASA LLEVANDO UN 50% DE TRABAJO. LUNTO POR LLEVIA LIGERAS.

Cen t Cahu Aca



NOTA N° 11

04 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATITA CONCLUYE TRABAJO EN CORTO DE CASA, REALIZO COMPOSICION DE TARRANO NATURAL A INICIO SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL SUMINISTRE. SE OBSERVAN VOLUNTARI ADICIONALES Y SE REALIZO REALIZACION

Cen t Cahu Aca




NOTA N° 12

09 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATITA INICIO SUMINISTRO DE BPA A CONCLUIDA TRABAJO DE TENDIDO. AFINO Y COMPOSICION A SUBRODANTE TRABAJO DEJO PRESUN POR PROPOSITOS DE LLUVIAS EN LA ZONA.

Cen t Cahu Aca

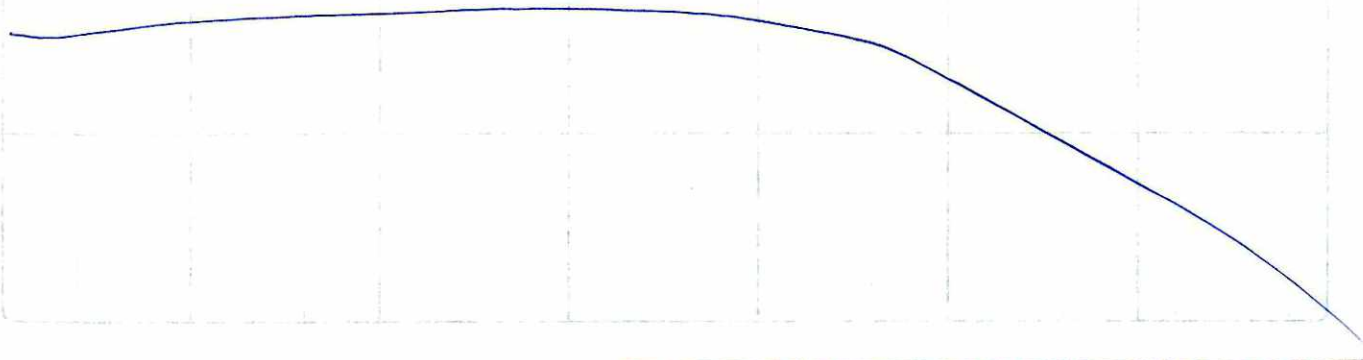

NOTA NO 13

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS DE AFIANZ, TAMPION, Y COMPLETACION A BASE HORMIGON. SE PROGRAMO PARA EL SIGUIENTE DIA MAÑO DE IMPANTACION, POR LUVIM LIGANDS.

Cen / Ceto Mera



NOTA NO 14

13 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 1 NORMAL PARA SU RAMA EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE EMANZO SERRA, ENTRE CALLE DR. JESUS HUMATE Y CALLE ANTONIA EN LA LOCALIDAD EL RECUER, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. DEL CONTRATO OPPU-EST-AOS-PEST-VIAL-2006A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 457,463.65 IVA INCLUIDO CON UN PAGO DE LOS TRABAJOS DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 12 DE AGOSTO DE 2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 913,820.42.

Cen / Ceto Mera



NOTA NO 15

13 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 1 (NVO) NORMAL CON OTROS ESPECIFICADOS EN LA NOTA ANTERIOR CON UN IMPORTE DE \$ 457,463.65 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.


Cen / Ceto Mera



NOTA N° 16

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIO TRABAJOS DE TRAZO Y COLOCACION DE CORDON EN GUARNICHUAS, PARA SUMINISTRO DE CONCRETO. PRESENTAN PODER TACU PARA SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO.

Cen I Cota Acen



NOTA N° 17

17 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICHUAS E INICIO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO. COLOCACION DE BRUJAS EN POZO REINVIOLADO.

Cen I Cota Acen



NOTA N° 18

22 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TIENE CONCLUIDO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICHUAS, CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO, INICIO CIMENTADO EN GUARNICHUAS Y LOSAS.

Cen I Cota Acen



NOTA N° 19

15 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYU TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMENTADO DE LOSAS Y LA PIZZA FINAL DE LA OBRA.




ACTA No 20

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO ESTIMACION No 2 NORMAL PARA SUPERVISIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAVIMENTO EN CALLE ARNATO SABIN, ENTRE CALLE DE JESUS HUMOTE Y CALLE ARMONIA, EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SONORA, DEL CONTRATO OPRU-EST-005-REST-VIA-2006A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 793,261.79 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 13-AGOSTO-2020 AL 25-AGOSTO-2022. CUANTO CUMPLE COMO OBRERO DE CONTRATO \$120,556.23

Cerr 1 Caba Aca



ACTA No 21

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION No 2 (Ora) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA POR UN IMPORTE DE \$ 793,261.79 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE OBRA EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.

Cerr 1 Caba Aca



NOTA NO 22

CON ESTA FECHA CONTARANTA PRESENTO ESTIMACION NO 3 FINIQUITO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION PARA CONTINUAR PROCESO DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE ERNESTO SARRIA, ENTRE CALLE DE JESUS HUMATE Y CALLE ARMONIA, EN LA LOCALIDAD DE EL RECOBO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPPU-EST-ADJ-REST-VIAL-2006A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 85,403.77 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 27-JUNIO-2022 AL 25-AGOSTO-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 35,154.86 IVA INCLUIDO.


Cen / Cacho Mera



NOTA NO 23

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 3 (TAS) FINIQUITO CON OTROS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 85,403.77 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cen / Cacho Mera



NOTA NO 24

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE ERNESTO SARRIA, ENTRE CALLE DE JESUS HUMATE Y CALLE ARMONIA, EN LA LOCALIDAD DE EL RECOBO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRÓ A LA COMPAÑIA -- ABANTIARE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-REST-VIAL-2006A-2022 CON UN IMPORTE - \$ 1,371,284.07 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 25 DE AGOSTO DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 35,154.86.

Cen / Cacho Mera
 ARO, CACHO CASTRO
 RESIDENTE DE LA SOP

