



PROVEEDORA LOS COCUILTLES, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCION DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-056
UBICACION:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA					
ESTIMACION: 1						
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL	21 DE JULIO DE 2025	AL	29 DE AGOSTO DE 2025	HOJA : 1	DE : 1
			MONTO DEL CONTRATO (CON IVA)=		\$1,230,259.14	

IMPORTE	
1- TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES	\$267,347.35
2- TOTAL RED DE BAJA TENSION	\$291,471.45
3- TOTAL ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
4- TOTAL OTRA	\$3,837.52

SUBTOTAL DE OBRA = \$562,656.32
16% DE IVA = \$90,025.01
TOTAL DE ESTIMACION = \$652,681.33

RETENCIONES

50% DE ANTICIPO (INCLUYE IVA) = \$326,340.67
3 % INSPECCION Y VIGILANCIA (SIN IVA) = \$16,879.69
TOTAL DE RETENCIONES= \$343,220.36
TOTAL LIQUIDO= \$326,340.67
NETO A RECIBIR= \$309,460.98

FECHA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	AVANCE FISICO	100%
SUPERVISOR	ING. JESUS GERMAN AYALA	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS	CONTRATISTA
		ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO	C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



**H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS**

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE OBRA:		FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCION DE LA OBRA:		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD		CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-056	
UBICACION:		LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA									
PERIODO DE CONTRATO:		DEL		21 DE JULIO DE 2025		AL		19 DE OCTUBRE DE 2025		HORA : 1 DE : 1	
MONTO CONTRATADO DE OBRA (CON IVA)=		\$1,230,259.14									
IMPORTE DE ANTICIPO (CON IVA)=		\$615,129.67									
IMPORTE DE CONVENIO ADICIONAL=		PERIODO DE CONVENIO ADICIONAL=									

ESTIMACION N	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIONES (CON IVA)	3% INS. Y VIG	AMORTIZACION ANTICIPO (CON IVA)	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A RECIBIR
1 PARCIAL	21 DE JULIO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025	\$662,681.33	\$16,879.69	-	\$326,340.67	\$309,460.98
	TOTALES=	\$652,681.33	\$16,879.69		\$326,340.67	\$343,220.36
	SALDO DE CONTRATO=	\$577,577.82	\$14,937.36		\$288,788.90	\$303,726.26

SUPERVISOR ING. JESÚS DOMÍNGUEZ AYALA	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO	CONTABILISTA C. ANA MARÍA DOMÍNGUEZ HEREDIA
---	--	---



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION



NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO:	FUJ25-FISMDF/OP-056
UBICACIÓN:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA				MONTO DEL CONTRATO (CON IVA) =	\$1,230,259.14
ESTIMACIÓN: 1	PERIODO DE ESTIMACIÓN:					
	DEL	21 DE JULIO DE 2025	AL	29 DE AGOSTO DE 2025		

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
				SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN		
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES								
1.1	RED DE MEDIA TENSION								
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE ENTROQUE RP-IN PARA 33KV EN POSTE EXISTENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: AISLADOR ASUZ 34.5 KV, CLEMA RECTA RAL-8, OJO RE, TORNILLO MAQUINA 5/8X15, GRAPA REMATE RAL 8, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, OJO RE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO		EST.	1.00	1.00	0.00	1.00	\$15,168.55	\$15,168.55
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA AP-IN PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUZ 34.5 KV, GRAPA REMATE RAL-8, CRUCETA PV-75, AISLADOR 33 PD, ABRAZADERA UL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO		EST.	2.00	2.00	0.00	2.00	\$46,921.59	\$97,843.18
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP-IN PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUZ 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO		EST.	1.00	1.00	0.00	1.00	\$44,076.15	\$44,076.15
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RDA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.		EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	\$16,267.10	\$0.00

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION



NUMERO DE OBRA: FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO: FUJ25-FISMDF/OP-056	
UBICACIÓN: LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA		MONTTO DEL CONTRATO (CON IVA)=		\$1,230,259.14	
ESTIMACIÓN: 1					
PERIODO DE ESTIMACIÓN:		DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025			

PARTIDA			CANTIDAD DE OBRA						PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN				
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES									
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RBA EN POSTE DE CONCRETO. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, GRAPA Y BASE RB, TUBO GALVANIZADO DE 2", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	\$13,506.65	\$0.00		
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RSA PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO., DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: ANCLA CONICA C3,PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R,REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	4.00	4.00	0.00	4.00	\$13,307.19	\$53,228.76		
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJANTE DE TIERRA PARA LINEA PRIMARIA NO SE NECESITA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: CONECTOR A COMPRESION VCL-54, ALAMBRE DE COBRE CU-4, VARILLA COPPERWELD 5/8" X 3.5 MTS. CARGA CADWELD No. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	3.00	3.00	0.00	3.00	\$7,616.76	\$22,850.28		
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG. 1 FASE. 2 HILOS. DE NO SE NECESITA ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	ML	131.70	131.70	0.00	131.70	\$221.73	\$29,201.84		

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION



NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCION DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-056
UBICACION:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA				MONTO DEL CONTRATO (CON IVA)=	\$1,230,259.14
ESTIMACION:	1					
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL	21 DE JULIO DE 2025	AL	29 DE AGOSTO DE 2025		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	(\$)	(\$)
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES							
1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 1TR1A DE 37.5 kVa 13,200YT/7620-120/240 VOLTS, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ESTRIBO COMPLETO, CONECTOR LINEA VIVA PERICO, CRUCETA GALV. PV-75, APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC 27 KV, CORTACIRCUTOS FUSIBLES 27 KV, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA 33,000YT/19050-120/240 VOLTS, SOPORTES CV1, VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGAS CADWELD No. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	\$143,222.28	\$0.00
1.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO PARA POSTE CON TRANSFORMADOR INCLUYE: CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW CAL. 1/0, BASTIDORES B3, AISLADOR 1C, FLEJE DE ACERO, HBILLA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	1.00	1.00	0.00	1.00	\$4,978.59	\$4,978.59
2	RED DE BAJA TENSION							
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADORES 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	4.00	3.00	0.00	3.00	\$13,950.63	\$41,851.89

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION



NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCION DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-056
UBICACION:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA				MONTO DEL CONTRATO (CON IVA) =	\$1,230,259.14
ESTIMACION: 1						
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL	21 DE JULIO DE 2025	AL	29 DE AGOSTO DE 2025		

CLAVE	PARTIDA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION		
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES							
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA PASO LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	1.00	1.00	0.00	1.00	\$11,510.10	\$11,510.10
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R-R LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	1.00	1.00	0.00	1.00	\$22,618.72	\$22,618.72
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R/R LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400 DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	1.00	1.00	0.00	1.00	\$34,667.97	\$34,667.97
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS., DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: PCR-9-400, BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	5.00	5.00	0.00	5.00	\$27,974.77	\$139,873.85

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION



NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS	CONTRATO:	FU25-FISMDF/OP-056
UBICACIÓN:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA			MONTO DEL CONTRATO (CON IVA) =	\$1,230,259.14
ESTIMACIÓN:	✓	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 21 DE JULIO DE 2025	AL 29 DE AGOSTO DE 2025	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN			
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES								
2.06	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	ML	145.70	145.70	0.00	145.70		\$281.53	\$41,018.92
2.07	SUMINISTRO DE MURETE DE MEDICION EN BAJA TENSION 220 VOLTS, INCLUYE: MURETE DE MEDICION DE CONCRETO NORMALIZADO, CEPÁ, COLOCACION EN SITIO, CABLEADO CON CABLE CAL. 8 AWG PARA 220 VOLTS DENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. CORRECTA COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA, BASE SOCKET	EST.	0.00	0.00	0.00	0.00		\$23,169.80	\$0.00
3	ALUMBRADO PUBLICO								
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO, MODELO FORLEXXA DE 100 WATTS CON FOTOCELDA 127 V-220 V, INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO A BASE DE TUBO DE 2" DE 76 CMS DE LONGITUD CED-20 CON SOLERA DE 2" X 8" X 3/16" SOLDADA A TUBO EN UN EXTREMO, SUJETO A POSTE MEDIANTE 1 FLEJE DE ACERO DE 5/8" CON HEBILLA, CABLE THW CAL. 14, 2 CONECTORES L CALIBRE 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE GRUA.	EST.	0.00	0.00	0.00	0.00		\$9,474.89	\$0.00
4	OTRA								
4.01	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	EST.	0.00	0.00	0.00	0.00		\$2,450.18	\$0.00

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION



NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS	CONTRATO:	FL25-FISMDF/OP-056
UBICACIÓN:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA			MONTO DEL CONTRATO (CON IVA)=	\$1,230,259.14
ESTIMACIÓN: 1					
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL	21 DE JULIO DE 2025	AL	29 DE AGOSTO DE 2025	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA							PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN			(\$)		(\$)	
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES											
4.02	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO POR 9-400, EN LINEA SECUNDARIA EXISTENTE, INCLUYE: TRASLADO DE LOS POSTES A LAS INSTALACIONES DE CFE, QUE INDIQUEN LOS SUPERVISORES.	EST.	0.00	0.00	0.00	0.00			\$8,847.14		\$0.00	
4.03	PODA DE ARBOL PARA LINEA SECUNDARIA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	EST.	4.00	4.00	0.00	4.00			\$959.38		\$3,837.52	
FECHA												AVANCE FISICO
02 DE SEPTIEMBRE DE 2025												82%

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA

NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCION DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS	CONTRATO	FU25-FISMDF/OP-056
UBICACION:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA		IMPORTE DEL CONTRATO (SIN IVA)=	\$1,060,568.22	
ESTIMACION:					
PERIODO DE ESTIMACION:	1	DEL	21 DE JULIO DE 2025	AL	29 DE AGOSTO DE 2025

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA							RESULTADO	
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	PARCIAL	TOTAL
1	RED DE MEDIA TENSION		EJE	TRAMO						
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE ENTONQUE R/PIN PARA 33KV EN POSTE EXISTENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: AISLADOR ASUZ 34.5 KV, CLEMA RECTA RAL-8, OJO RE, TORNILLO MAQUINA 5/8X15, GRAPA REMATE RAL 8, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, OJO RE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	POSTE 1					1.00	1.00	1.00
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R/PIN PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUZ 34.5 KV, GRAPA REMATE RAL-8, CRUCETA PV-75, AISLADOR 33 PD, ABRAZADERA UL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	POSTE 2					1.00	1.00	2.00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R/PIN PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUZ 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	POSTE 4					1.00	1.00	1.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RDA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/8", CABLE DE ACERO AG-5/8", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	POSTE 1					1.00	1.00	4.00
			POSTE 2					2.00	2.00	
			POSTE 3					1.00	1.00	

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA

NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCION DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS	CONTRATO	FU25-FISMDF/OP-056
UBICACION:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA			IMPORTE DEL CONTRATO (SIN IVA)=	\$1,060,568.22
ESTIMACION:	1				
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 21 DE JULIO DE 2025		AL 29 DE AGOSTO DE 2025		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						RESULTADO	
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	PARCIAL	TOTAL
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RBA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 6/16", CABLE DE ACERO AG-6/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, GRAPA Y BASE RB, TUBO GALVANIZADO DE 2", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	POSTE 4				0.00	0.00	0.00
			POSTE 5				0.00	0.00	
			POSTE 7				1.00	1.00	
			POSTE 8				1.00	1.00	
			POSTE 9				1.00	1.00	
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RSA PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3,PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	POSTE 10				1.00	1.00	4.00
			POSTE 2				1.00	1.00	
			POSTE 7				1.00	1.00	
			POSTE 10				1.00	1.00	
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJANTE DE TIERRA PARA LINEA PRIMARIA NO SE NECESITA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CONECTOR A COMPRESION VCL-54, ALAMBRE DE COBRE CU-4, VARILLA COPPERWELD 5/8" X 3.5 MTS, CARGA CADWELD NO. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	POSTE 2						3.00
			POSTE 7						
			POSTE 10						
			POSTE 10						
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, 1 FASE, 2 HILOS, DE NO SE NECESITA ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	ML	POSTE 1 A POSTE 2	55.20				55.20	131.70
			POSTE 2 A POSTE 3	48.80				48.80	
			POSTE 3 A POSTE 4	27.70				27.70	

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA

NUMERO DE OBRA: FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCION DE LA OBRA: APLICACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO FU25-FISMDF/OP-056	
UBICACION: LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA		ESTIMACION: 1		IMPORTE DEL CONTRATO (SIN IVA)= \$1,060,568.22	
PERIODO DE ESTIMACION:		DEL 21 DE JULIO DE 2025		AL 28 DE AGOSTO DE 2025	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						RESULTADO	
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	PARCIAL	TOTAL
1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 1TR1A DE 37.5 Kva 13,200V/77820-120/240 VOLTS, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ESTRIBO COMPLETO, CONECTOR LINEA VIVA PERICO, CRUCETA GALV, PV-75, APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC 27 KV, CORTACIRCUTOS FUSIBLES 27 KV, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA 33,000V/19050-120/240 VOLTS, SOPORTES CV1, VARILLAS COPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGAS CADWELD No. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	POSTE 4				0.00	0.00	0.00
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO PARA POSTE CON TRANSFORMADOR INCLUYE: CABLE THW CAL. 30, CABLE THW CAL. 10, BASTIDORES B3, AISLADOR 1C, FLEJE DE ACERO, HEBILLA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	POSTE 4				1.00	1.00	1.00
2	RED DE BAJA TENSION								
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADORES 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.					3.00	3.00	3.00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA PASO LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	POSTE 2				1.00	1.00	1.00

SUPERVISOR
ING. JESUS SERRANO ARRIAGA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA

NUMERO DE OBRA: FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO	FU25-FISMUN/OP-056
UBICACION: LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA		ESTIMACION: 1		IMPORTE DEL CONTRATO (SIN IVA)= \$1,060,568.22	
PERIODO DE ESTIMACION:		DEL	21 DE JULIO DE 2025	AL	29 DE AGOSTO DE 2025

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						RESULTADO	
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	PARCIAL	TOTAL
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R/R LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	POSTE 3				1.00	1.00	1.00
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R/R LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400 DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	EST.	POSTE 5				1.00	1.00	1.00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS., DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: PCR-9-400, BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	POSTE 6				1.00	1.00	5.00
			POSTE 7				1.00	1.00	
			POSTE 8				1.00	1.00	
			POSTE 9				1.00	1.00	
			POSTE 10				1.00	1.00	

SUPERVISOR
ING. JESUS GARCIA AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA

NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCION DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS	CONTRATO	FU25-FISMDF/OP-056
UBICACION:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA	IMPORTE DEL CONTRATO (SIN IVA)=	\$1,060,568.22		
ESTIMACION:	1	PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 21 DE JULIO DE 2025	AL	29 DE AGOSTO DE 2025

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA							RESULTADO
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	PARCIAL	TOTAL
2.06	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRALEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO NEUTRALEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO	ML.	POSTE 4 A POSTE 5	27.00				27.00	
			POSTE 5 A POSTE 6	12.90				12.90	
			POSTE 6 A POSTE 7	29.80				29.80	
			POSTE 4 A POSTE 8	24.80				24.80	
			POSTE 4 A POSTE 9	17.10				17.10	
			POSTE 4 A POSTE 10	34.10				34.10	
								146.70	

SEPERVISOR
ING. JESUS SERRAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA

NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCION DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS	CONTRATO	FU25-FISMDF/OP-056
UBICACION:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA			IMPORTE DEL CONTRATO (SIN IVA)=	\$1,060,568.22
ESTIMACION:	1				
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 21 DE JULIO DE 2025		AL 29 DE AGOSTO DE 2025		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						RESULTADO	
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	PARCIAL	TOTAL
2.07	SUMINISTRO DE MURETE DE MEDICION EN BAJA TENSION 220 VOLTS, NO LUYE, MURETE DE MEDICION DE CONCRETO NORMALIZADO, CEPAL, COLOCACION EN SITIO, CABLEADO CON CABLE CAL. 8 AWG PARA 220 VOLTS DENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP, CORRECTA COLOCACION DE BALANTE DE TIERRA, BASE SOCKET	EST.					0.00	0.00	0.00
3	ALUMBRADO PUBLICO								
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO, MODELO FORLEXA DE 100 WATTS CON FOTOCELA, 127 V.-220 V, INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO A BASE DE TUBO DE 2" DE 76 CMS DE LONGITUD CED-20 CON SOLERA DE 2" X 8" X 3/16" SOLDADA A TUBO EN UN EXTREMO, SUJETO A POSTE MEDIANTE 1 FLEJE DE ACERO DE 5/8" CON HEBILLA, CABLE THW CAL. 14, 2 CONECTORES L CALIBRE 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE GRUA.	EST.	POSTE 2				0.00	0.00	0.00
			POSTE 4				0.00	0.00	
			POSTE 5				0.00	0.00	
			POSTE 6				0.00	0.00	
			POSTE 7				0.00	0.00	
4	OTRA		POSTE 8				0.00	0.00	
			POSTE 9				0.00	0.00	
4.01	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	EST.					0.00	0.00	0.00

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AVILA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA

NUMERO DE OBRA:	FAISMUN-10-25-45	DESCRIPCION DE LA OBRA:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS	CONTRATO	FU25-FISMDF/OP-056
UBICACION:	LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA		IMPORTE DEL CONTRATO (SIN IVA)= \$1,060,568.22		
ESTIMACION:	1				
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 21 DE JULIO DE 2025		AL 29 DE AGOSTO DE 2025		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA							RESULTADO	
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	PARCIAL	TOTAL	
4.02	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO POR 9-400, EN LINEA SECUNDARIA EXISTENTE. INCLUYE: TRASLADO DE LOS POSTES A LAS INSTALACIONES DE CFE, QUE INDIQUEN LOS SUPERVISORES.	EST.					0.00	0.00	0.00	
4.03	PODA DE ARBOL PARA LINEA SECUNDARIA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	EST.					4.00	4.00	4.00	
02 DE SEPTIEMBRE DE 2025		FECHA							AVANCE FISICO	
									8.2%	

YALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARG. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTABILISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMERO DE OBRA: FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-056	
UBICACION: LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA					
ESTIMACION: 1 PARCIAL		IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA)= \$1,230,259.14			
PERIODO DE CONTRATO		DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025			
PARTIDA		CROQUIS DE LOCALIZACION			
CLAVE	CONCEPTO				
1	RED DE MEDIA TENSION				
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE ENTORONQUE RP-1N PARA 33KV EN POSTE EXISTENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: AISLADOR ASUZ 34.5 KV, CLEMA RECTA RAL-8, OJO RE, TORNILLO MAQUINA 5/8X15, GRAPA REMATE RAL 8, BASTIDOR B1, AISLADOR TC, OJO RE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO				
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA AP-1N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUZ 34.5 KV, GRAPA REMATE RAL-8, CRUCETA PLY75, AISLADOR 33 PD, ABRAZADERA UL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO				

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA


DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

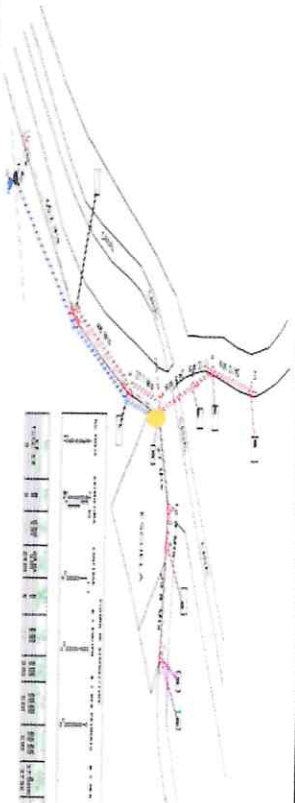

NUMERO DE OBRA: FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-056	
UBICACIÓN: LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA				IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA) = \$1,230,259.14	
ESTIMACIÓN: 1 PARCIAL					
PERIODO DE CONTRATO		DEL	21 DE JULIO DE 2025	AL	29 DE AGOSTO DE 2025
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP-IN PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: POSTE DE CONCRETO POR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO				
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RDA EN POSTE DE CONCRETO. DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PIERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.				

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMERO DE OBRA: FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-056	
UBICACIÓN: LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA					
ESTIMACIÓN: 1 PARCIAL		IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA) = \$1,230,259.14			
PERIODO DE CONTRATO		DEL 21 DE JULIO DE 2025		AL 29 DE AGOSTO DE 2025	
1.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RBA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, GRAPA Y BASE RB, TUBO GALVANIZADO DE 2", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.				
1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RSA PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.				

SUPERVISOR
ING. JESUS GERRMAN AYALA




DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

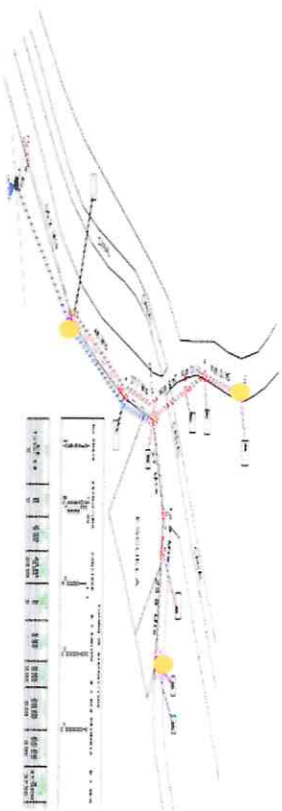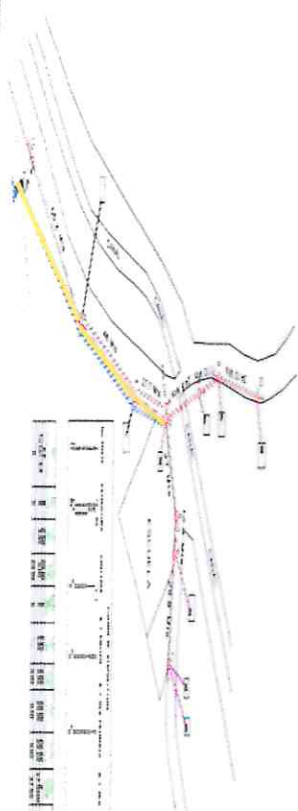

NUMERO DE OBRA:		FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-056	
UBICACIÓN:		LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA						IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA) =		\$1,230,259.14	
ESTIMACIÓN:		1 PARCIAL		DEL		21 DE JULIO DE 2025		AL		29 DE AGOSTO DE 2025	
PERIODO DE CONTRATO											
1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJANTE DE TIERRA PARA LINEA PRIMARIA NO SE NECESITA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CONECTOR A COMPRESION VOL-54, ALAMBRE DE COBRE CU-4, VARILLA COPPERWELD 5/8" X 3.5 MTS. CARGA CADWELD No. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO										
1.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, 1 FASE, 2 HILOS, DE NO SE NECESITA ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO										
1.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 11R1A DE 37.5 Kva 13,200V/17620-120240 VOLTS, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ESTRIBO COMPLETO, CONECTOR LINEA VIVA PERICO, CRUCETA GALV. PV-75, APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC 27 KV, CORTACIRCUTOS FUSIBLES 27 KV, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA 33,000V/119050-120240 VOLTS, SOPORTES CV1, VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGAS CADWELD No. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.										

SUPERVISOR
ING. JESUS SERRANO AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMERO DE OBRA: FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-056
UBICACIÓN: LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA				
ESTIMACIÓN: 1 PARCIAL		IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA) = \$1,230,259.14		
PERIODO DE CONTRATO DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025				
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO PARA POSTE CON TRANSFORMADOR INCLUYE: CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW CAL. 1/0, BASTIDORES B3, AISLADOR 1C, FLEJE DE ACERO, HEBILLA PARA FLEJE, ALAMBRE AS4, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO			
2	RED DE BAJA TENSION			
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADORES 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO			

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS




NUMERO DE OBRA: FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO: FU25-FISMDF/OP-056
UBICACIÓN: LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA		IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA)= \$1,230,259.14		
ESTIMACIÓN: 1 PARCIAL				
PERIODO DE CONTRATO DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2026				
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA PASO LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO			
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R.R LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO			
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA R.R LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400 DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO			

SUPERVISOR
ING. JESUS GARCIA AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMERO DE OBRA:		FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-056	
UBICACIÓN:				LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA				IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA) = \$1,230,259.14			
ESTIMACIÓN:		1 PARCIAL		PERIODO DE CONTRATO		DEL 21 DE JULIO DE 2025		AL 29 DE AGOSTO DE 2025			
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS., DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: PCR-9-400, BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 10, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSF, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.										
2.06	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE. INCLUYE: CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO										
2.07	SUMINISTRO DE MURETE DE MEDICION EN BALA TENSION 220 VOLTS, INCLUYE: MURETE DE MEDICION DE CONCRETO NORMALIZADO, CERA, COLOCACION EN SITIO, CABLEADO CON CABLE CAL. 8 AWG PARA 220 VOLTS DENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. CORRECTA COLOCACION DE BALANTE DE TIERRA, BASE SOCKET										

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMÁN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



NUMERO DE OBRA:		FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO:		FU25-FISMDF/OP-056	
UBICACION:				LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA				IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA)= \$1,230,259.14			
ESTIMACIÓN:		1 PARCIAL									
PERIODO DE CONTRATO		DEL		21 DE JULIO DE 2025		AL		29 DE AGOSTO DE 2025			
3	ALUMBRADO PUBLICO										
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO, MODELO FORLEXX DE 100 WATTS CON FOTOCELDA 127 V.220 V. INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO A BASE DE TUBO DE 2" DE 76 CMS DE LONGITUD CED-20 CON SOLERA DE 2" X 8" X 3/16" SOLDADA A TUBO EN UN EXTREMO, SUJETO A POSTE MEDIANTE 1 FLEJE DE ACERO DE 5/8" CON HEBILLA, CABLE THW/CAL. 14, 2 CONECTORES L CALIBRE 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE GRUA.										
4	OTRA										
4.01	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION										

SUPERVISOR
LMA. JESUS GERMAN AYALA


DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA




H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

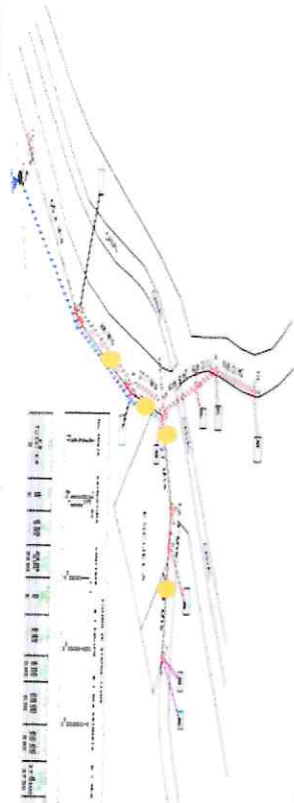


NUMERO DE OBRA: FAISMUN-10-25-45		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LOS PATOS		CONTRATO: FU25-FISMIDE/OP-056
UBICACIÓN: LOMA DE LOS PATOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA		IMPORTE DEL CONTRATO (CON IVA)= \$1,230,259.14		
ESTIMACIÓN: 1 PARCIAL				
PERIODO DE CONTRATO		DEL	21 DE JULIO DE 2025	AL 29 DE AGOSTO DE 2025
4.02	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-400, EN LINEA SECUNDARIA EXISTENTE. INCLUYE: TRASLADO DE LOS POSTES A LAS INSTALACIONES DE CFE, QUE INDIQUEN LOS SUPERVISORES.			
4.03	PODA DE ARBOL PARA LINEA SECUNDARIA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.			


SUPERVISOR
ING. JESUS RAMON AYALA


DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO


CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DEL EL FUERTE, SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS




NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-10-25-45	PERIODO DE ESTIMACION: 21 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LOS PATOS	REPORTE FOTOGRAFICO



SUPERVISOR
ING. JESÚS GERMÁN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DEL EL FUERTE, SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-10-25-45	REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LOS PATOS	PERIODO DE ESTIMACION: 21 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025



SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DEL EL FUERTE, SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS




NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-10-25-45		REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LOS PATOS		PERIODO DE ESTIMACION: 21 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025



SUPERVISOR
ING. JESUS GERRMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO


CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DEL EL FUERTE, SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-10-25-45		PERIODO DE ESTIMACION: 21 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LOS PATOS		
		REPORTE FOTOGRAFICO	

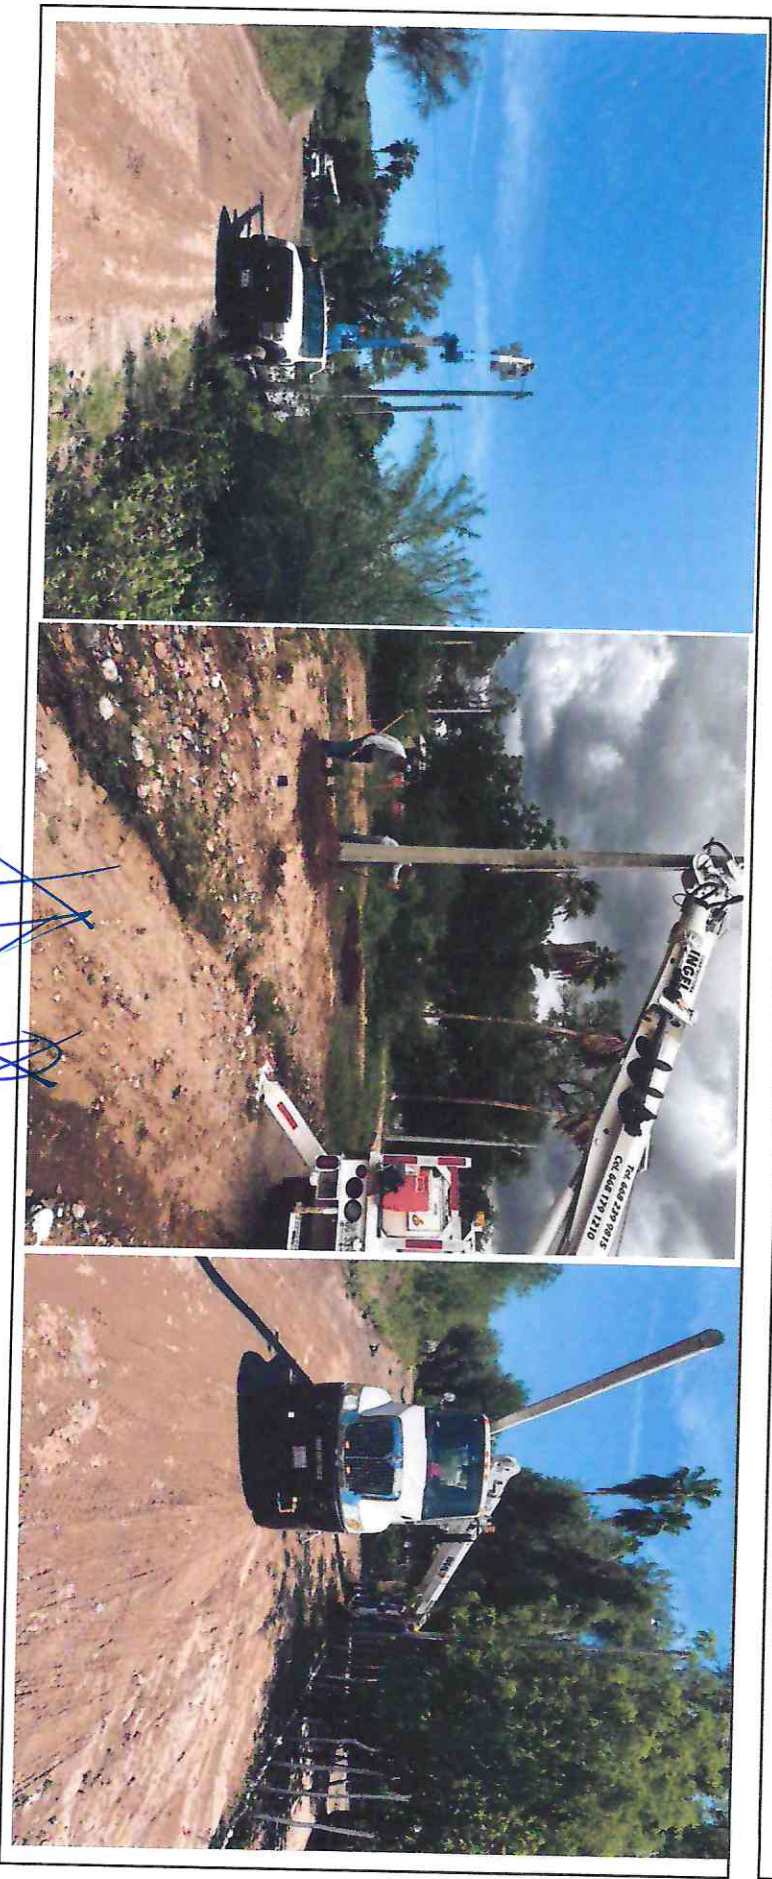

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DEL EL FUERTE, SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-10-25-45	REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LOS PATOS	PERIODO DE ESTIMACION: 21 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Supervisor
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA




H. AYUNTAMIENTO DEL EL FUERTE, SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS




NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-10-25-45	REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LOS PATOS	PERIODO DE ESTIMACION: 21 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025




SUPERVISOR
ING. JESÚS GERMAN AYALA


DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO




CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORNES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DEL EL FUERTE, SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS




NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-10-25-45	REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LOS PATOS	PERIODO DE ESTIMACION: 21 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

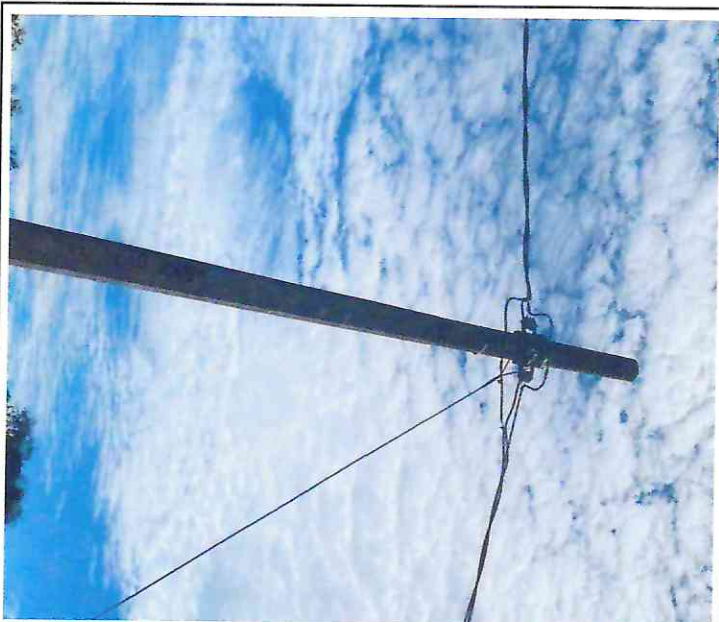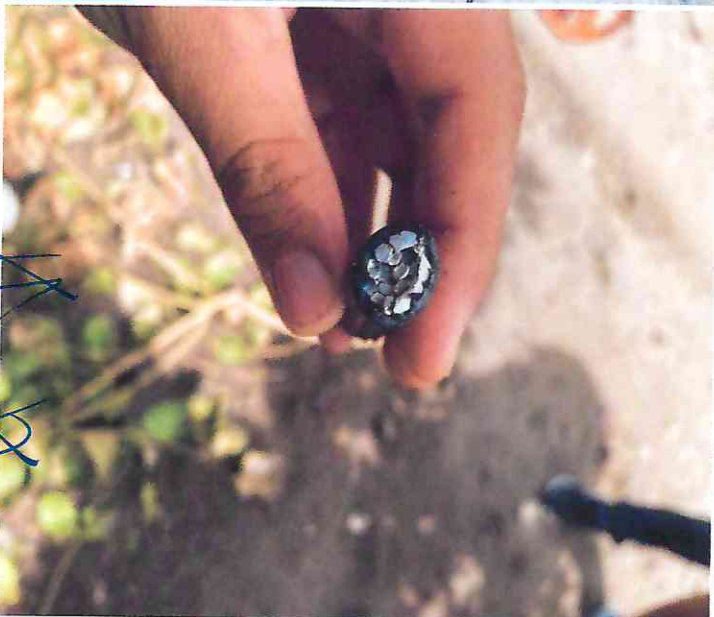

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DEL EL FUERTE, SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-10-25-45	REPORTE FOTOGRAFICO	
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LOS PATOS	PERIODO DE ESTIMACION: 21 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	



SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. JUAN CARLOS SEBRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA



H. AYUNTAMIENTO DEL EL FUERTE, SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-10-25-45	REPORTE FOTOGRAFICO
OBRA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LOS PATOS	PERIODO DE ESTIMACION: 21 DE JULIO DE 2025 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
  		

SUPERVISOR
ING. JESUS GERMAN AYALA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
ARO. JUAN CARLOS SERRANO ARELLANO

CONTRATISTA
C. ANA MARIA TORRES HEREDIA
