



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/820/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO

Badiraguato, Sin., a 26 de diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO** DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **JESUS AMADO CAMACHO OSUNA**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-027/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$1,719,542.67 (UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO
- **IMPORTE A PAGAR:** \$381,921.12 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 12/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
- **R.F.C.** CAOJ810630ST4
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE SIN NOMBRE, S/N, COLONIA: LOC. LOS NARANJOS, C.P. 80080, CULIACAN, SINALOA.
- **No. DE FACTURA:** #369C, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE



Dir. El Archivo
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**

TESORERÍA

26 DIC 2025

RECIBIDO



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 138

Fecha: 26/Dic/2025 16:05:55

Lugar de expedición (C.P.) 80080

Emisor

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio: Profesionales

LOS NARANJOS Culiacán Sinaloa México 80080

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servi cio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121101 - Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos	PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-027/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,719,542.67 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 527,515.35 MAS I.V.A 16 % \$ 84,402.46 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 611,917.81 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 184,630.37 MAS I.V.A.: \$ 29,540.86 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 214,171.23 Importe TOTAL A FACTURAR \$ 342,884.98 MAS I.V.A \$ 54,861.60 MONTO NETO A FACTURAR \$ 397,746.58 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : \$ 15,825.46 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 229,996.69 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 381,921.12	\$342,884.98	IVA, - Importe: 54861.60	\$342,884.98

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

trescientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y seis Pesos 58/100 M.N.

Subtotal: \$342,884.98

I.E.S.P.S \$0.00

IVA 16 %: \$54,861.60

Total: \$397,746.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830284

Folio Fiscal: FB86D0AD-5E30-4A4F-9B53-659BD1A1369C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-12-26T17:06:01

Sello digital del CFDI

A+OPtKyMZfn6jcA+9TTAvoVBub47x8m9ohX8GO+DUCcfzaNo6b2NO3DU0K4IEHJYShx4Ofk24yCe5TUDbB0jjIMvPGZz1wRps1IHplfK+U6BvIEgZPX82qNL7LLZ305DbP3HBIGZb
cRjUsS803TvGucmJmwQR/B9+dxSwWo/hmdYwbyvhTQRx8Fb3Z3MTF0JFctq2IAvsb9gNAazXDCYIG0HTWuVRGnPWvLm4JCAK5L1X+gJW+jho3lrHTIErLv/gx+Z0S5Fsf0H3+c4oS3
HkvKfILDY7AidSCAFMaA50EZ+8H0PAJWZfnMIMWRziEUdO2w03h50I5N9mZTseVg==

Sello del SAT

VLIDG+umRPIYQFireDjQ/llNm5nAurTojU1dh+4eE1NtLRp71HSx6pyH1GH3lzMb8VnJn5L2tNau6ZKcgc3lqoj++z0B6Qa65hwP6HmHlgraqyeDjBpGUAjKP+NV5iK8eKvgzNKs7
J0H0147BzR64Q3E1rgOT94hw81QS7NPg/Mgr2spQ4tNWGYDlei3fEWwjDS0GKvPJr+kadsuC20OL1paVozGjPZy19DYqz2GYSnfh0MsHninQGkksvExivAdW0J4HWNqbCoHv9wOyGqHN
Uxn4noeHxHQb4fC+P7LR0yCYNu1pVbQhuDKGBovk1sY5QRWuyUQVfBfBCzh1A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FB86D0AD-5E30-4A4F-9B53-659BD1A1369C|2025-12-26T17:06:01|MAS0810247C0|A+OPtKyMZfn6jcA+9TTAvoVBub47x8m9ohX8GO+DUCcfzaNo6b2NO3DU0K4IEHJYSh
x4Ofk24yCe5TUDbB0jjIMvPGZz1wRps1IHplfK+U6BvIEgZPX82qNL7LLZ305DbP3HBIGZbcRjUsS803TvGucmJmwQR/B9+dxSwWo/hmdYwbyvhTQRx8Fb3Z3MTF0JFctq2IAvsb9gNA
azXDCYIG0HTWuVRGnPWvLm4JCAK5L1X+gJW+jho3lrHTIErLv/gx+Z0S5Fsf0H3+c4oS3HkvKfILDY7AidSCAFMaA50EZ+8H0PAJWZfnMIMWRziEUdO2w03h50I5N9mZTseVg=||00001
000000709182898||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGCDDCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4MzAyODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-12-26T16:05:55" Folio="138" FormaPago="03" LugarExpedicion="80080" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711830284"
Sello="A+OPtKyMZfn6jCA+9TtAvovBub47x8m9ohX8GO+DUCcfzaNo6b2NO3DU0K4IEHJYShx40Fk24yCe5TUDbB0jj/IMvPG2z1w1RpS1IHplfK+U6Bv1EgZPX82qNL7LLZ305DbP3HB1GZbcRjUsS8
SubTotal="342884.98" TipoDeComprobante="I" Total="397746.58" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="JESUS AMADO CAMACHO OSUNA" RegimenFiscal="612" Rfc="CA0J810630ST4"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72121101" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE CONSTRUCCIONPAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL
FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.CONTRATO NO.:
MBGBR-AD-FAISMUN-027/2025MONTO DEL CONTRATO: $ 1,719,542.67IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 527,515.35MAS I.V.A 16 % $ 84,402.46TOTAL DE LA
OBRA EJECUTADA CON IVA $ 611,917.81AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 184,630.37MAS I.V.A.: $ 29,540.86TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 214,171.23Importe
TOTAL A FACTURAR $ 342,884.98MAS I.V.A $ 54,861.60MONTO NETO A FACTURAR $ 397,746.58RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $ 15,825.46TOTAL DEDUCCIONES: $
229,996.69MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 381,921.12" Importe="342884.98" NoIdentificacion="SER07" ObjetoImp="02" ValorUnitario="342884.98">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="342884.98" Importe="54861.60" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54861.60">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="342884.98" Importe="54861.60" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="FB86D0AD-5E30-4A4F-9B53-6598D1A1369C"
FechaTimbrado="2025-12-26T17:06:01" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="A+OPtKyMZfn6jCA+9TtAvovBub47x8m9ohX8GO+DUCcfzaNo6b2NO3DU0K4IEHJYShx40Fk24yCe5TUDbB0jj/IMvPG2z1w1RpS1IHplfK+U6Bv1EgZPX82qNL7LLZ305DbP3HB1GZb
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="VltDG+umRPiYQfireDjQ/f1Nm5nAurTojU1dh+4eE1NtLRp7H5x6pyH1GH3IzMb8VnJn5t2tNau6ZKCgci3Iqoj++z0B6Qa65hwP6HmHlgrafqyeDjBpGUAjKP+NV5iK8eKvgzNKS
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAQJ810630ST4	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FB86D0AD-5E30-4A4F-9B53-659BD1A1369C	2025-12-26T16:05:55	2025-12-26T17:06:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$397,746.58	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Fecha: 26 de diciembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		ESTIMACIÓN No:	02 NORMAL FINIQUITO
DOMICILIO:	Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa			
TELÉFONO:	CEL:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
			DEL	08-dic-25
			AL	26-dic-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
CAOJ810630ST4.				15-jul-25
DEPENDENCIA:-				
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO				
	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
	BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:	17-nov-25
			TERMINACIÓN:	26-dic-25
DESCRIPCIÓN:				
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
CONTRATO No:	MBGBR-AD-FAJSMUN-027/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$1,482,364.37	\$1,719,542.67	\$601,839.93	\$1,719,542.67	
			BUENO POR:	\$ 381,921.12
RECIBI:				
\$ 381,921.12	(SON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 12/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO			
DEDUCCIONES:	CALCULO DE ESTIMACIÓN			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 184,630.37	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 527,515.35	
MAS I.V.A.:	\$ 29,540.86	MAS I.V.A 16 %	\$ 84,402.46	
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 214,171.23	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 611,917.81	
3 % SVIFYC:	\$ 15,825.46	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 229,996.69	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 229,996.69	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 397,746.58	
		SALDO A PAGAR:	\$ 381,921.12	

ELABORO.-

Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR.-

Ing. José Rodolfo Contreras López
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Dependencia:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				Fecha:	Estimación:
				26 de diciembre de 2025	02 NORMAL FINIQUITO
Periodo de la estimación:	08/12/2025	26/12/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	08/12/2025	26/12/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-027/2025	
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance	
\$ 1,719,542.67	\$ 1,482,364.37	\$ 601,839.93	\$ 518,827.53	36%	
				% Avance Total	
				100%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 527,515.35	ESTA ESTIMACION
\$ 214,171.23	16 % I.V.A (+) \$ 84,402.46	\$ 611,917.81
	Sub- Total A (=) \$ 611,917.81	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 184,630.37	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 29,540.86	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 387,668.70	Total (=) \$ 214,171.23	\$ 1,107,624.86
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 342,884.98	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 54,861.60	TOTAL ACUMULADO.
\$ 601,839.93	Total (=) \$ 397,746.58	\$ 1,719,542.67
	3 % SVIFYC: \$ 15,825.46	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 229,996.69	CONTRATADO
\$ 601,839.93	Importe TOTAL \$ 381,921.12	\$ 1,719,542.67
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 381,921.12	SALDO
\$0.00	SON:	\$ -
	(SON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 12/100 M.N.)	

ELABORO.-

Jesús Amado Camacho Osuna
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO:	Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		
R.F.C.	CAQJ810630ST4.		

FECHA	26 de diciembre de 2025
--------------	-------------------------

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,482,364.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 601,839.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,719,542.67

DESTAJO	IMPORTE
PRELIMINARES	\$ -
ESTRUCTURA	\$ 527,515.35
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 527,515.35

SUB TOTAL=	\$ 527,515.35
I.V.A AL 16 %	\$ 84,402.46
TOTAL =	\$ 611,917.81

ELABORO.-

Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

Ing. José Rodolfo Contreras López
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincón Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA: Viernes, 26 de diciembre de 2025							
DOMICILIO:	Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa			R.F.C. CAQJ810630ST4.							
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 02 NORMAL FINIQUITO									
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.											
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,482,364.37	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$601,839.93	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,719,542.67									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
PRELIMINARES											
ESTRUCTURA											
GBR122	LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC= DE 250 KG/CM. ARMADO CON VARILLA DE 5/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	195.00	\$	2,246.67	\$ 438,100.65	195.00	0.00	0.00	195.00	\$ 438,100.65
GBR123	DENTELLON DE CONCRETO 20X45 CMS DE CONCRETO HECHO A MANO DE FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	ML	50.00	\$	655.41	\$ 32,770.50	50.00	0.00	0.00	50.00	\$ 32,770.50
GBR126	TRABE DE CONCRETO 20X45 CMS DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLA DE 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	30.00	\$	1,883.14	\$ 56,644.20	30.00	0.00	0.00	30.00	\$ 56,644.20
SUB-TOTAL \$									527,515.35		
IVA \$									84,402.46		
MONTO TOTAL \$									611,917.81		

ELABORO:

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA				CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.						ESTIMACION 02 NORMAL FINQUITO	
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA											
RFC:	CAOJ810630ST4.										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES	
		EJE	TRAMO								EN METROS
GBR121	ESTRUCTURA			M2						VER CROQUIS	
	LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM. ARMADO CON VARILLA DE 5/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS										
		CADENAMIENTO									
		0+260.00	0+260.00		195.00				195.00		


ELABORO: 
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: 
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO: 
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n, Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa			
R.F.C.: CAOJ810630ST4.		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.	

CROQUIS ESTIMACION:	
CLAVE	CONCEPTO
ESTRUCTURA	
GBR122	LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 5/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS,
GBR123	DENTELLON DE CONCRETO 20X45 CMS DE CONCRETO HECHO A MANO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA Y DESCIMBRA,
GBR126	TRABE DE CONCRETO 20X45 CMS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLA DE 5/8" Y ESTIBOS DE 3/8" @ 20 CMS, INCLUYE:

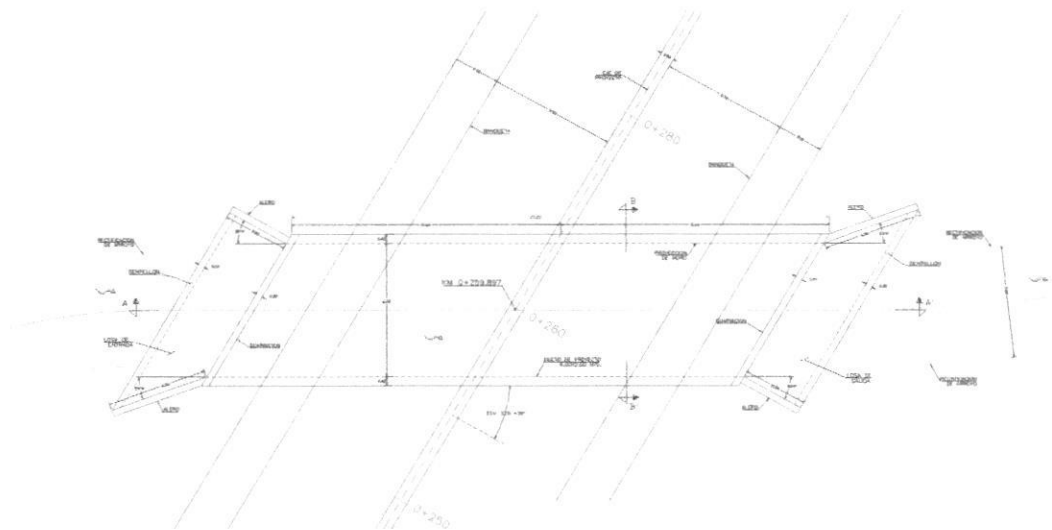

ELABORO.
Jesús Amado
 C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.
[Signature]
 ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA





AUTORIZO.
[Signature]
 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

FOTOS

		CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
R.F.C.: CAOJ810630ST4.			
OBRA:			

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
1	ESTRUCTURA
GP01	LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM ² , ARMADO CON VARILLA DE 5/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS,
GP02	DENTELLON DE CONCRETO 20X45 CMS. DE CONCRETO HECHO A MANO DE F'C= 250 KG/CM ² , INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA Y DESCIMBRA,
GP03	TRABE DE CONCRETO 20X45 CMS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM ² ARMADO CON 8 VARILLA DE 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA Y

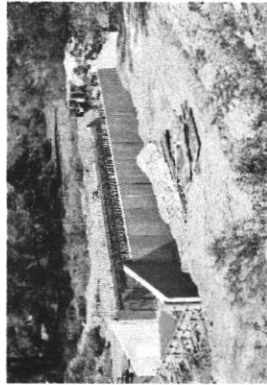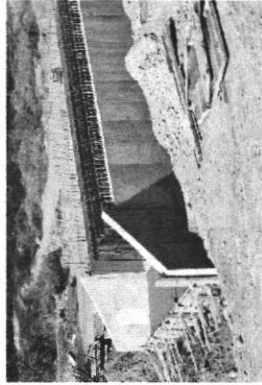

ELABORO.-


 C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-




 ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-


 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.


FOTOS

		CONTRATISTA: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa					
R.F.C.: CAOJ810630ST4.					
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
FOTOS DE ESTIMACION:					
CVE		CONCEPTO			

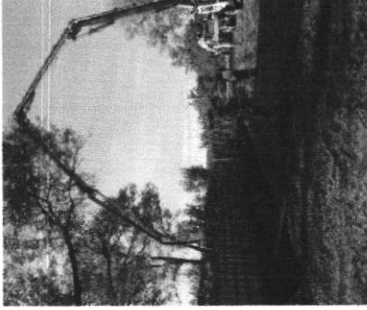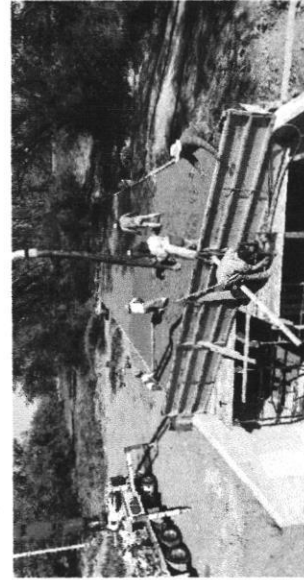


ELABORO.-


 C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
 REPRESENTANTE LEGAL

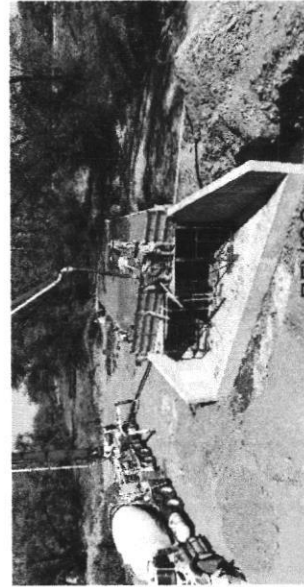

REVISO.-


 ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

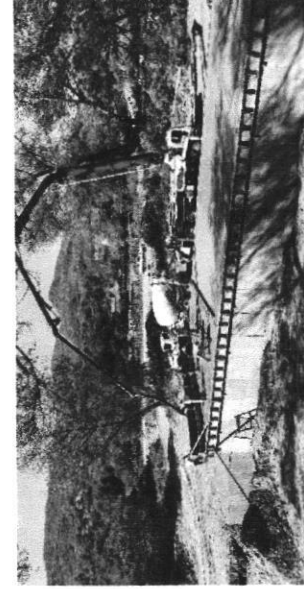

AUTORIZO.-


 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta30/12/2025 5:23:52 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario	
Descripción: EST 02 NOR FIN AD027	Importe de la operación: 381,921.12 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836	Cuenta de depósito: 072730012781361749
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	Titular de la cuenta: JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
Nombre banco destino: BANORTE	
Fecha de creación: 30/12/2025	Fecha de aplicación: 30/12/2025
Concepto de pago: EST 02 NOR FIN AD027	Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382	Hora de captura en el canal: 17:23:49

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000759226	Clave de rastreo: 002601002512300000759226
Folio de firma: 0016152113	Folio único: I401202512301723490016152119

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/12/2025
