

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL.
BUGANVILIAS, CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145

[illegible]

FECCHA: 20 DE OCTUBRE DE 2025

TOTALES		\$327,435.61	\$0.00	\$163,717.80	\$0.00	\$163,717.80
SALDO OBRA		\$871,089.10				
SALDO POR AMORTIZAR				\$435,544.55		

AUTORIZO:

C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
CONTRATISTA
ELABORO

ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE P.C.O.
Vo. Bo.

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILLIAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

[illegible]

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA
GERENCIA TÉCNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 20/10/2025
AUTORIZO: ING. VIANEY DENISSE LEIVA GERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA

ELABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

REPRESENTANTE LEGAL

COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILLAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 1 (UNO)		PERIODO DEL : DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025		IMPORTE: \$163,717.80					
LUGAR: BUEN RETIRO, GUASAVE, SIN.		CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO							
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/03/2025							
		PRESUPUESTO: \$1,033,210.96 SIN INCLUIR I.V.A.		FECHA : 20/10/2025					
		CANTIDAD DE OBRA							
NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 0.15X2"ø.	PZA	1.00				\$ 273.87	\$	-
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1/2"ø	PZA	1.00				\$ 134.66	\$	-
PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO									
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO. DE 3" X 3" ø	PZA	1.00			0.50	\$ 3,754.88	\$	1,877.44
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3" DE DIAMETRO.	PZA	1.00			0.50	\$ 2,616.14	\$	1,308.07
VALVULAS									
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 3" DIAM.	PZA	1.00			0.50	\$ 7,826.38	\$	3,913.19
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" ø	PZA	2.00			1.00	\$ 9,566.37	\$	9,566.37
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" ø	PZA	1.00				\$ 2,069.72	\$	-
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE DE 2" DE DIAMETRO, MARCA A.R.I, MODELO D-040 P "BARAK", CUERPO DE NYLON REFORZADO. FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00				\$ 7,449.39	\$	-
1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0.7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2")ø ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO. INCLUYE AMORTIGUADOR DE PULSACIONES, JUEGO DE VALVULAS DE PASO DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO.	PZA	1.00				\$ 5,192.03	\$	-
							SUMA HOJA: 16,665.07		
NOTAS:									
CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA		LUGAR: GUASAVE, SINALOA							
GERENCIA TECNICA		FECHA: 20/10/2025							
		SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES							
		SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG							
		Vo.Bo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO							
		COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA							
		REPRESENTANTE LEGAL							
		ELABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO							
		REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ							
		JEFE DE SUPERVISION DE OBRA							

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILLAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 1 (UNO)			PERIODO DEL : DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025			IMPORTE: \$163,717.80		
LUGAR: BUEN RETIRO, GUASAVE, SIN.			CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO					
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.			CONTRATO N°: JUMIAPAG/R33/03/2025			FECHA : 20/10/2025		
PRESUPUESTO: \$1,033,210.96 SIN INCLUIR I.V.A.			CANTIDAD DE OBRA			IMPORTE		
NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
EMPAQUES Y TORNILLOS								
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" ø	PZA	7.00			3.00	\$ 163.37	\$ 490.11
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 5/8X21/2	PZA	28.00				\$ 66.02	\$ -
OBRA CIVIL								
1.21	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE F'c= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 1.20 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLERA DE 4"X1/4" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBO DE 3", INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE.	PZA	1.00				\$ 5,425.36	\$ -
2.- CASETA DE CLORACION Y CONTROLES ELECTRICOS								
CIMENTACIÓN								
2.1	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, ESPESOR DE 7 CMS. INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO Y ACARREO A UNA DISTANCIA DE 1KM.	M2	2.00				\$ 241.94	\$ -
2.2	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA.	M2	18.60				\$ 19.19	\$ -
2.3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	2.05				\$ 325.65	\$ -
2.4	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	1.37				\$ 168.55	\$ -
2.5	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=100 KG/CM2 PARA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CM; INCLUYE ACARREO DE MATERIALES PETREOS.	M3	0.13				\$ 4,603.35	\$ -
2.6	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F'c=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1").	M3	0.55				\$ 6,059.63	\$ -
SUMA HOJA:								490.11

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTHA CERVANTES LEYVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 20/10/2025
SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISSA LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
V.O.B.: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILIAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 1 (UNO)				PERIODO DEL :		DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025		IMPORTE:		\$163,717.80	
LUGAR: BUEN RETIRO, GUASAVE, SIN.				CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO							
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				CONTRATO N°:		JUMAPAG/R33/03/2025		FECHA :		20/10/2025	
NUMERO	PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL		
				SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTA ESTIMACION ANTERIOR					
2.7	ACERO #3.	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE	KG	35.78			\$	60.59	\$		
2.8	ACERO #2	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE	KG	6.50			\$	76.73	\$		
2.9		SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2	3.52			\$	684.81	\$		
2.10		DALA DE DESPLANTE	M3	0.37			\$	6,059.63	\$		
2.11	ACERO #3.	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE	KG	28.62			\$	60.59	\$		
2.12	ACERO #2	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE	KG	16.92			\$	76.73	\$		
2.13		SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2	4.92			\$	684.81	\$		
2.14		MUROS Y CASTILLOS	M2	18.33			\$	601.63	\$		
2.15		SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZGLADO CON F'C=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1").	M3	0.30			\$	6,059.63	\$		
2.16	ACERO #3.	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE	KG	45.61			\$	60.59	\$		
NOTAS:				LUGAR: GUASAVE, SINALOA			SUMA HOJA:		0.00		
				FECHA: 20/10/2025							
				SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISSE LEZUA CERVANTES							
				CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA							
				GERENCIA TECNICA							
				ELABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO							
				REPRESENTANTE LEGAL							
				REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ							
				JEFE DE SUPERVISION DE OBRA							

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILLIAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 1 (UNO)		PERIODO DEL : DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025		IMPORTE: \$163,717.80			
LUGAR: BUEN RETIRO, GUASAVE, SIN.		CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO					
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/03/2025					
PRESUPUESTO: \$1,033,210.96 SIN INCLUIR I.V.A.		FECHA : 20/10/2025					
NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.17	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2	KG	25.59			\$ 76.73	\$
2.18	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2	5.28			\$ 684.81	\$
2.19	LOSA RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	1.08			\$ 168.55	\$
2.20	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F'c=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1").	M3	1.56			\$ 6,059.63	\$
2.21	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3.	KG	79.49			\$ 60.59	\$
2.22	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO TIPO MALLA LAC, PARA LOSA INFERIOR (PISO)	M2	10.07			\$ 50.93	\$
2.23	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2	11.56			\$ 684.81	\$
2.24	ACABADOS APLANADO PULIDO EN MUROS Y COLUMNAS DE CASETA DE CONTROLES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, FABRICACION Y MANO DE OBRA.	M2	48.06			\$ 323.47	\$
2.25	APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS, LOSAS Y PRETIL DE LOSA SUPERIOR A DOS MANOS, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	48.06			\$ 84.72	\$
2.26	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	16.80			\$ 195.94	\$
2.27	IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	10.26			\$ 414.02	\$
NOTAS:			SUMA HOJA:		0.00		
CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA GERENCIA TECNICA		LUGAR: GUASAVE, SINALOA FECHA: 20/10/2025 SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG		ELABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO REPRESENTANTE LEGAL			
		Vo.Bo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA		REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ JEFE DE SUPERVISION DE OBRA			

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILIAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 1 (UNO)			PERIODO DEL :		DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025		IMPORTE:	
LUGAR: BUEN RETIRO, GUASAVE, SIN.			CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO					
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.			CONTRATO N°:		JUMAPAG/R33.03/2025			
PRESUPUESTO:			\$1,033,210.96 SIN INCLUIR I.V.A.		FECHA :		20/10/2025	
NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	CANTIDAD DE OBRA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
				HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR			
2.28	PROTECCION EN EL AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CASETA DE CONTROLES, FABRICADA CON LAMINA ESTRIADA CALIBRE 8 CON DOS LATERALES FIJAS DE 2.00 X 0.7 MTS Y DOS PUERTAS DE ABATIMIENTO EXTERIOR DE 2.00 X 1.15 MTS. CADA UNA, CON CHAPA FANAL, PINTURA ROJO OXIDO, MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL PTR Y 6 BISAGRAS DE 1" ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION.	PZA	1.00			\$ 12,970.07		
2.29	PROTECCION EN EL AREA DE INSTALACIONES DE CLORACION DE CASETA CONTROLES, FABRICADA CON MALLA CICLONICA DE 2.00 X 0.7 MTS Y DOS PUERTAS DE ABATIMIENTO EXTERIOR DE 2.00 X 1.15 MTS. CADA UNA, CON ABRAZADERAS PARA CANDADO, 1 JUEGO DE CANDADOS, PINTURA ESMALTE, MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL PTR Y 6 BISAGRAS DE 1" ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION (VER DETALLES EN PLANO)	PZA	1.00			\$ 7,127.25		
2.30	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO, APAGADOR Y CONTACTO DE 110 VOLT. CON CAJA OCTAGONAL, CABLE #10, CAJA CHALUPA DE DOS VENTANAS, APAGADOR, CONTACTO O ROSETA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00			\$ 1,389.96		
3.1	3.- CLORACION SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE PRODUCTO QUIMICO MARCA PULSSA FEDEER, MODELO: PULSATRON ADP, CON CAPACIDAD DE 30 GPD, 100 PSI, COLTAGE 110 VOLTS.	PZA	1.00			\$ 19,255.05		
3.2	MATERIAL ELECTRICO E HIDRAULICO PARA INSTALAR A BOMBA DOSIFICADORA, INCLUYE: CABLE ELECTRICO THW#14 AWG, MANGUERA PARA PROTECCION DE CABLE ELECTRICO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REGULADOR DE VOLTAJE.	LOTE	1.00			\$ 5,485.83		
4.1	4. OBRA ELECTRICA ACOMETIDA EN BAJA TENSION DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR HASTA EL CONTROL DE MOTOR							
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X100 AMP S.D.	PZA	2.00			\$ 365.27		
4.2		PZA	1.00			\$ 6,481.08		
NOTAS:							SUMA HOJA:	0.00
LUGAR: GUASAVE, SINALOA			ELABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO					
FECHA: 20/10/2025			REPRESENTANTE LEGAL					
SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISE JETVA CERVANTES			REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ					
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG			JEFE DE SUPERVISION DE OBRA					
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA								
CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA GERENCIA TECNICA								

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILIAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 1 (UNO)										PERIODO DEL :		DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025		IMPORTE:			
LUGAR: BUEN RETIRO, GUASAVE, SIN.										CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO							
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.										CONTRATO N°:		JUMAPAG/R33/03/2025		FECHA :		20/10/2025	
PRESUPUESTO:										\$1,033,210.96 SIN INCLUIR I.V.A.							
PARTIDA		UNIDAD		DESCRIPCION		SEGÚN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION		CANTIDAD DE OBRA		ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
NUMERO		UNIDAD		DESCRIPCION		SEGÚN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION		CANTIDAD DE OBRA		ESTA ESTIMACION		PRECIO UNITARIO		IMPORTE TOTAL	
4.3			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTE EQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERA.	1.00									\$ 5,666.24	\$ -	
ALIMENTACION ELECTRICA A MOTOR SUMERGIBLE																	
4.4			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1"	2.00									\$ 111.10	\$ -	
4.5			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" PARED GRUESA	3.00									\$ 384.10	\$ -	
4.6			ML		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 8 AWG DE COBRE	100.00									\$ 95.63	\$ -	
4.7			ML		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	50.00									\$ 64.94	\$ -	
4.8			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" ø	3.00									\$ 201.79	\$ -	
4.9			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1"	1.00									\$ 404.84	\$ -	
4.10			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1"	6.00									\$ 50.72	\$ -	
4.11			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC DE 1"ø	2.00									\$ 76.26	\$ -	
4.12			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 1".	1.00									\$ 112.53	\$ -	
4.13			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 8 AWG	6.00									\$ 78.33	\$ -	
4.14			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1".	4.00									\$ 51.88	\$ -	
ALUMBRADO																	
4.15			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS	1.00									\$ 1,037.42	\$ -	
4.16			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 15 A S.D.	2.00									\$ 423.29	\$ -	
4.17			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 20 A S.D.	1.00									\$ 1,002.34	\$ -	
4.18			PZA		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	2.00									\$ 284.09	\$ -	
4.19			ML		SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	200.00									\$ 100.87	\$ -	
NOTAS:										LUGAR: GUASAVE, SINALOA		FECHA: 20/10/2025		SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES		SUMA HOJA: 0.00	
CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA										GERENCIA TECNICA		SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG		ELABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO		REPRESENTANTE LEGAL	
REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ										JEFE DE SUPERVISION DE OBRA							

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILLAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 1 (UNO)		PERIODO DEL :	DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025	IMPORTE:	\$163,717.80					
LUGAR: BUEN RETIRO, GUASAVE, SIN.		CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO								
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		CONTRATO N°:								
		PRESUPUESTO:		\$1,033,210.96 SIN INCLUIR I.V.A.						
		CANTIDAD DE OBRA		JUMAPAG/R33/03/2025						
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FECHA :	20/10/2025
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR					
4.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE	ML	100.00				\$	46.27	\$	-
4.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	200.00				\$	64.94	\$	-
4.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA	2.00				\$	525.64	\$	-
4.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA	2.00				\$	77.75	\$	-
4.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA	2.00				\$	5,360.87	\$	-
4.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M	PZA	2.00				\$	11,176.52	\$	-
4.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL	PZA	2.00				\$	5,395.98	\$	-
4.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 70 X 70 X 70 CM	PZA	2.00				\$	2,419.02	\$	-
4.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA	PZA	3.00				\$	83.37	\$	-
4.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W	PZA	3.00				\$	225.93	\$	-
4.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS	PZA	3.00				\$	173.48	\$	-
4.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA	PZA	3.00				\$	88.07	\$	-
4.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS	PZA	1.00				\$	95.64	\$	-
4.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS	PZA	1.00				\$	99.19	\$	-
4.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4"	PZA	3.00				\$	95.70	\$	-
4.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2" Ø.	PZA	2.00				\$	49.71	\$	-
4.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 1 1/4"	PZA	1.00				\$	104.27	\$	-
4.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2"	PZA	2.00				\$	44.37	\$	-
4.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUA AUTORROSCABLE 25 MM.	PZA	10.00				\$	16.90	\$	-
4.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2"	PZA	2.00				\$	175.77	\$	-
							SUMA HOJA:		0.00	

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 20/10/2025
SUPERVISOR: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILLAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM. 1 (UNO)				PERIODO DEL :		DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025		IMPORTE:	
LUGAR: BUEN RETIRO, GUASAVE, SIN.				CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO					
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				CONTRATO N°:		JUMAPAG/R33/03/2025			
				PRESUPUESTO:		\$1,033,210.96 SIN INCLUIR I.V.A.		FECHA : 20/10/2025	
NUMERO	PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	CANTIDAD DE OBRA ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE									
PRELIMINARES									
5.1		TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE	ML	1,105.00	536.00		536.00	\$ 10.39	\$ 5,569.04
5.2		EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	790.08	442.20		442.20	\$ 57.41	\$ 25,386.70
5.3		PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	71.83	40.20		40.20	\$ 122.77	\$ 4,935.35
5.4		RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	287.30	158.66		158.66	\$ 193.84	\$ 30,754.65
5.5		RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	430.95	241.20		241.20	\$ 29.03	\$ 7,002.04
TUBERIAS									
5.6		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	1,105.00	1,105.00		1,105.00	\$ 99.53	\$ 109,980.65
5.7		INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	1,105.00	536.00		536.00	\$ 29.78	\$ 15,962.08
PIEZAS ESPECIALES									
5.8		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 4" X 3" ø	PZA	1.00				\$ 638.76	\$ -
5.9		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC DE 3" X 3" ø	PZA	4.00				\$ 570.27	\$ -
5.10		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 45° X 3" ø	PZA	3.00				\$ 351.55	\$ -
5.11		SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 4" ø	PZA	1.00				\$ 400.56	\$ -
5.12		SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3"	PZA	3.00				\$ 292.31	\$ -
5.13		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" ø	PZA	2.00				\$ 410.56	\$ -
								SUMA HOJA:	199,590.51

NOTAS:

LUGAR: GUASAVE, SINALOA

FECHA: 20/10/2025

SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA

GERENCIA TECNICA

LABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

REPRESENTANTE LEGAL

Vo.Bo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO

COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

REVISOR: ING. JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILIAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

[illegible]

NOTAS:

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA

FECHA: 20/10/2025

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

Vo.Bo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO

COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

SUMA HOJA:

0.00

FERNANDO SAVIN DIA MONA D.
ELABORO: C. FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGUINO

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

BOULEVARD JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO.2855 COL. BUGANVILIAS,
CULIACAN ROSALES, SINALOA C.P. 80145



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

[illegible]

NUMEROS GENERADORES											
OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.										ESTIMACION NO: 1 (UNO)	
UBICACIÓN: BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA										PERIODO DE ESTIMACION: DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025	
CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO											
IMPORTE DE CONTRATO: \$1,198,524.71 CON I.V.A.											
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/03/2025											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	1.- ARREGLO HIDRAULICO										
	EQUIPO DE BOMBEO										
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA EN MODELO KORI0 R75-4/6" AC/6" CON DESCARGA DE 3". PARA UN GASTO DE 9 LPS Y 40 M.C.A. ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 7.5HP 3F 60HZ 230 VOLTS 3450 RPM, 10 TRAMOS DE COL. ACERO A53 3.05 MTS RC C-40 DE 3". CABEZAL PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3" Y 40 MTS DE CABLE SUMERGIBLE 3X10 600V.	PZA						0.50	0.50	0.50 PZA	
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA SIEMENS PARA 10 HP 200V TRIFASICO, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INCORPORADO TODO EN GABINETE METALICO	PZA						0.50	0.50	0.50 PZA	
	PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO										
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO. FO. DE 3" X 3" Ø	PZA						0.50	0.50	0.50 PZA	
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3" DE DIAMETRO.	PZA						0.50	0.50	0.50 PZA	
	VALVULAS										
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 3" DIAM.	PZA						0.50	0.50	0.50 PZA	
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 3" Ø	PZA						1.00	1.00	1.00 PZA	
AUTORIZO: ING. VIANEY DENISSE LEON PERVANTES										REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ	
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG										JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	
CONTRATISTA											

<div>NUMEROS GENERADORES</div> <div>OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA</div> <div>UBICACIÓN: BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA</div> <div>CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO</div> <div>IMPORTE DE CONTRATO: \$1,198,524.71 CON I.V.A.</div> <div>CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/03/2025</div>										<div></div> <div>ESTIMACION NO: 1 (UNO)</div> <div>PERIODO DE ESTIMACION: DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2025</div>	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD PARCIAL	TOTAL	OBSERVACION
1.19	EMPAQUES Y TORNILLOS										
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" ø	PZA						3.00	3.00	3.00 PZA	
	5. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE										
	PRELIMINARES										
5.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE	ML	1	35	536				536.00	536.00 ML	
5.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	1	35	536	0.75	1.10		442.20	442.20 M3	
5.3	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	1	35	536	0.75	0.10		40.20	40.20 M3	
AUTORIZO: ING. VIANEY DENISSE LEYVA PERVANTES SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG										REVISO: ING. JOSE DE JESUS TORRES GONZALEZ JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	
ELABORO: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO CONTRATISTA											

FOTOS

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
UBICACIÓN: BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
IMPORTE DE CONTRATO: \$1, 198,524.71 CON I.V.A.
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/03/2025






ESTIMACION NO: 1 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	

FOTOS

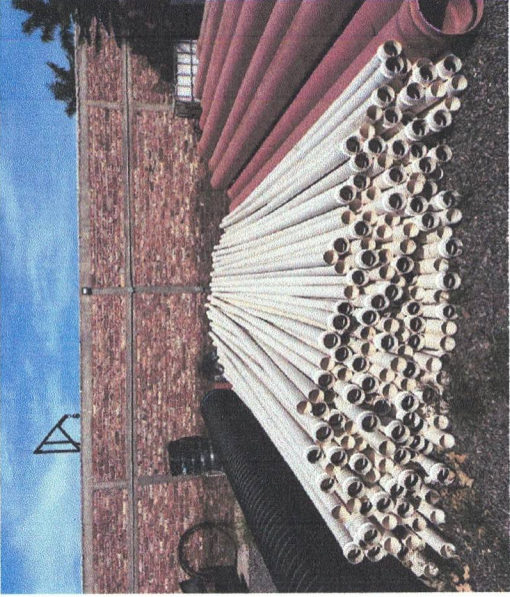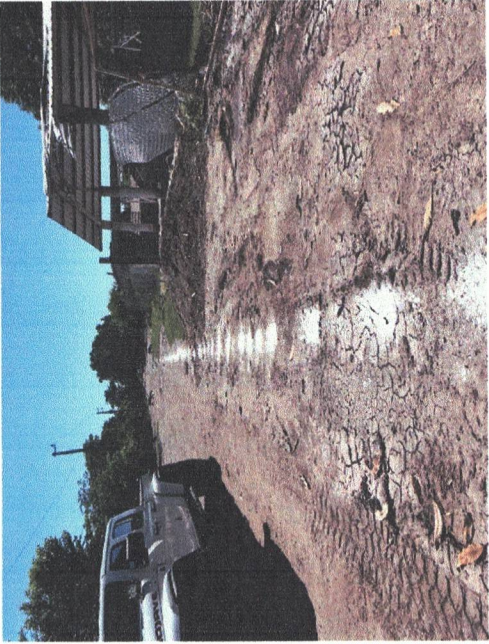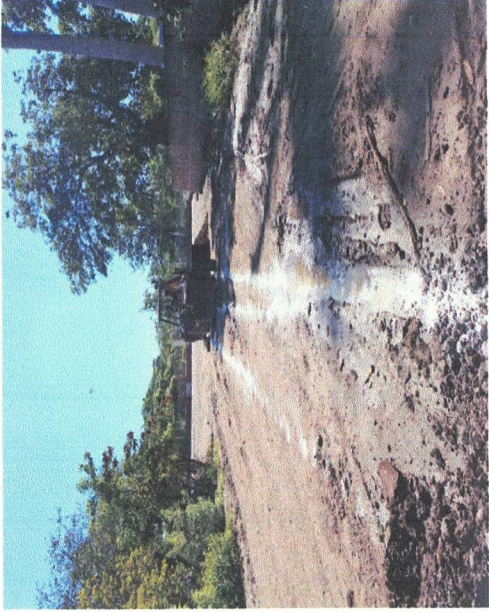

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISSE LEYVA GERVANTES

ELABORO:
FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS PEREZ PEREZ

FOTOS



OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
UBICACIÓN: BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.
CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO
IMPORTE DE CONTRATO: \$1, 198,524.71 CON I.V.A.
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/03/2025



ESTIMACION NO: 1 (UNO)
PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	

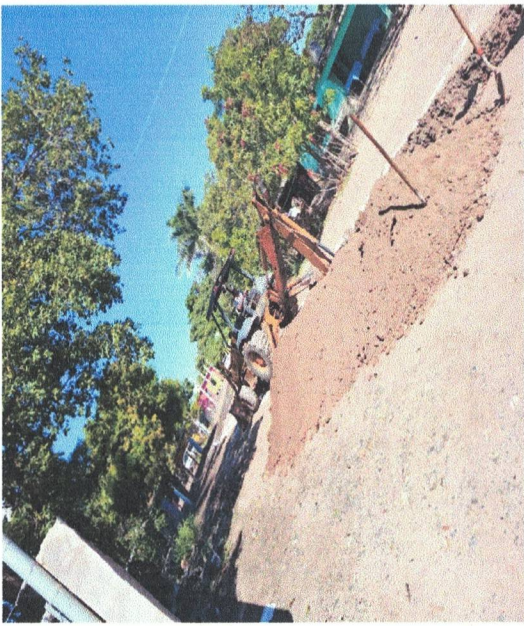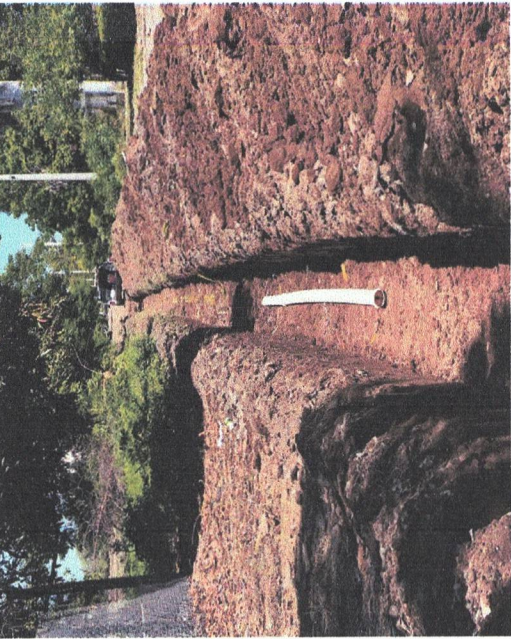

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES

ELABORO:
FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

--	--



DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]


AUTORIZO: _____
ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES

ELABORO:
FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO

REVISOR: _____
ING. JOSE D. _____

<p align="center">ANEXOS</p> <p>OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUEN RETIRO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.</p> <p>UBICACIÓN: BUEN RETIRO, GUASAVE, SINALOA.</p> <p>CONTRATISTA: FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO</p> <p>IMPORTE DE CONTRATO: \$1, 198,524.71 CON IVA.</p> <p>PROGRAMA: RAMO 33</p> <p>CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/03/2025</p>																		
<p>ESTIMACION NO: 1 (UNO)</p> <p>PERIODO DE ESTIMACION:</p> <p>DEL 25 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DE 2025</p>										<p>CANTIDAD</p> <p>PARCIAL TOTAL</p>		<p>OBSERVACION</p>						
CLAVE	CONCEPTO								UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
																PARCIAL	TOTAL	

ANEXOS

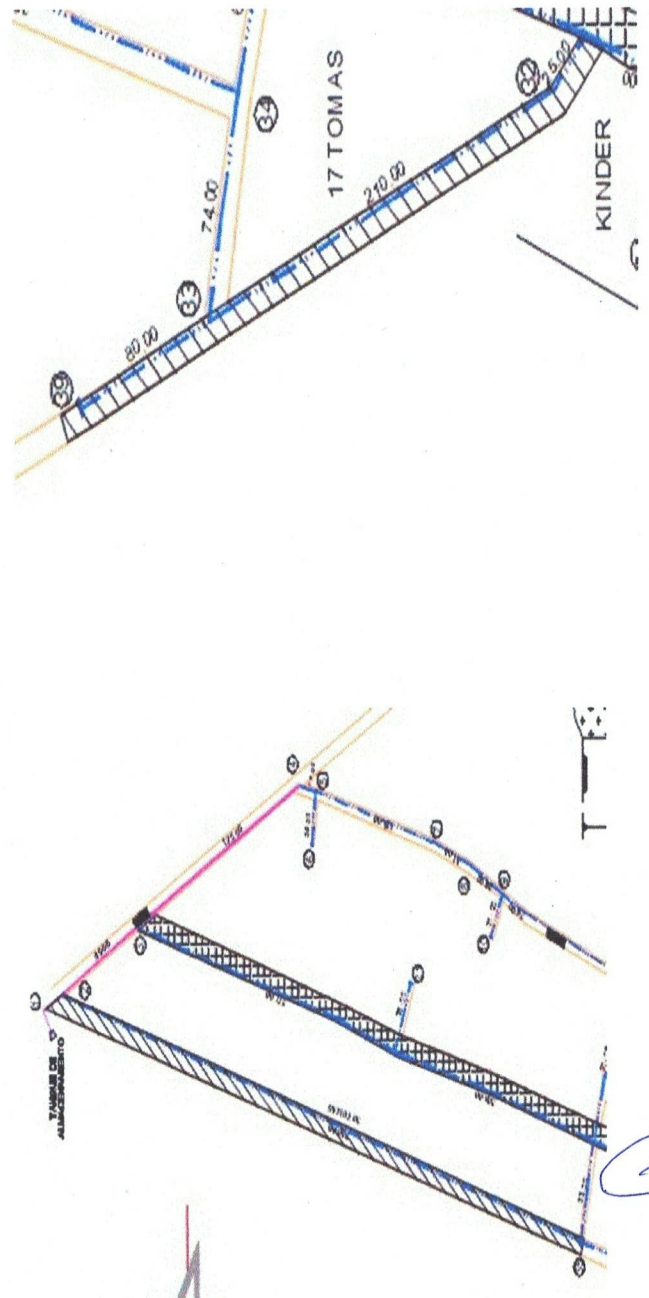

<p>AUTORIZO:</p> <p>ING. VIANEY DENISSE LEIVA CERVANTES</p> <p>SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG</p>		<p>ELABORO:</p> <p>FERNANDO SERVIN DE LA MORA DAGNINO</p> <p>CONTRATISTA</p>		<p>REVISO:</p> <p>ING. JOSE DE JESUS GARCIA</p> <p>JEFE DE SUPERVISION DE OBRA</p>	
--	--	--	--	--	--
