

BITACORA DE OBRA

FECHA

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1506-2022

NOTA NO. 1 24 JUN/2022.

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1506-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN AV. CORONEL JOSE MENTEMO, ENTRE CAL. JESUS GARCIA MONALES Y CAL. EULOGIO PARRA, UBICADA EN LA COLONIA 21 MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN YUCALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 2'285,840.87


PHASE DE EJECUCION:
INICIO: 24/JUNIO/2022.

TERMINO: 24/SEPT/2022.

"LA SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARIO E. ASTORGA YANEZ, MEDIANTE OFICIO SUP-DIR-SUP-982-1-2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



"EL CONTRATISTA" ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, CON PODER AMPULO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



NOTA NO. 2 24/JUN/ 2022. CONT-1506-2022.

"LA SECRETARIA" PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE REALIZARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIB-SOP-DI-2022.

NOTA NO. 3 24/JUN/ 2022.

NOTIFICA "LA CONTRATISTA" QUE CON ESTA FECHA HAN DADO INICIO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 30/JUN/ 2022.

LONG. TRAMO: Km 0+000 AL Km 0+185.73

AVANCE DE OBRA: 185.73 ml.

EXCAVACIONES: 100% -


COMPACT. DEL T.N: 100% -

SUBSELENTE DE ZOCN. COMPLETADA AL 95% = 100%.

NOTA NO. 5 04/JULIO/2022. CONT-1506-2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADA AL 100% LA CAPA DE BASE HIDRULICA DE 20cm esp. CON MATERIAL PARCIALMENTE TRITURADO COMPACTADO AL 100%.



TENEMOS APLICADO EL RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60 A RAZON DE 1.50 LT/m², EJECUTADO AL 100%.



NOTA NO. 6 06/JULIO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION UNO-NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 24/JUNIO/2022 AL 04/JULIO/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$	522,321.13
AMORT. ANTICIPA	\$	203,812.40
DEDUC. CONTRATO	\$	15,060.03
Liquidado a pagar	\$	303,448.70

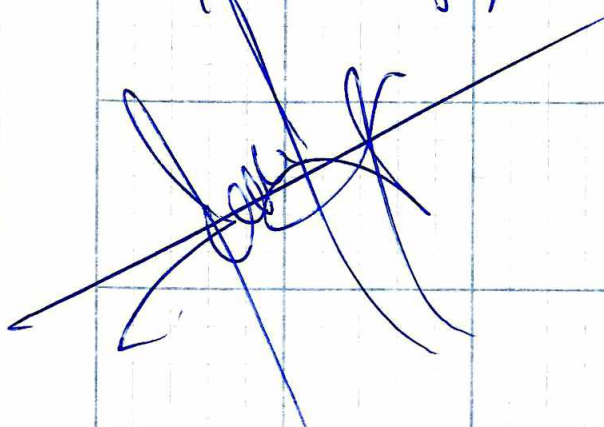

NOTA NO. 7 07/JULIO/2022.

A PARTIR DE ESTA FECHA TOMA POSESION COMO
RESIDENTE DE OBRA EL C. ING. ALEJANDRO SAINZ
SANCHEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SEP-DIR-SUP-1122-
2022. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Emilio Contreras Mendez
Contratista

18 Julio 2022
NOTA #8 En supervision de obra se muestra
el siguiente avance.

- Se inician los trabajos de instalaciones electricas colocacion de cable, Registros electricos de 40x40
- Se inician los trabajos de relleno y colado de banquetas de 10cm de espesor
- Se inician los trabajos de colado de guardaciones tipo "L".

Ing. Alejandro Sainz Sanchez

Ing. Emilio Contreras Mendez

NOTA #9 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continúan los trabajos de instalación Eléctrica Iluminarios.
- Se continúan los trabajos de colado de banquetas de 10cm. de espesor.
- Se terminan los trabajos de colado de guardiacien tipo "L"
- Se inician los trabajos colado de losas en losas de 15cm de espesor con una resistencia $f'_c = 300 \text{ kg/cm}^2$.


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P


Ing. Emilio Contreras Mendoza
Contratista

30 Julio 2022

NOTA #10 Con esta fecha se entrega la estimación número dos cobrandose las siguientes partidas.

- Pavimento concreto	- - -	\$ 1'204,896.87
- Alumbrado Publico	- - -	\$ 65,208.28
- Red Drenaje	- - -	\$ 20,637.60

Sub Total \$ 1'290,742.75

I.V.D 16 \$ 206,518.84

Total \$ 1,497,261.59

NOTA #11 Con esta fecha se entrega la estimación Numero Tres Adicional, cobrandose las siguientes partidas.

- Pavimentacion concreto hidraulico	\$ 53,596.47
Alumbrado Publico	\$ 2,658.00

Sub-Total	\$ 56,254.47
I.V.A 16%	\$ 9,000.72

Total. \$ 65,255.19

Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Supervision S.O.P.

Ing. Emilio Contreras Mendez
Contratista

Nota #12

6 Agosto 2022

En supervision de obra se observa el siguiente avance:


- Se terminan los trabajos de colado de losas de 15 cm de espesor, colandose tambien las guardaciones Tipo "L"
- Se continuan los trabajos de colado de banquetes de 10 cm espesor presentando un avance de 95% aproximado
- Se terminan los trabajos de instalacion electricas iluminarias y cableado.

NOTA #13 Con esta fecha se finalizan los trabajos de Pavimentación Av. coronel Jose Renteria en la colonia 21 Marzo, concluyendo los trabajos al 100%.

- Se entrega la estimación Nomero Cuatro Fingidos cobrandose las siguientes partidas

- Conceptos Extraordinarios	\$ 192,629.69
Sub Total	\$ 192,629.69
IVA 16%	\$ 30,820.75
Total	\$ 223,450.44

- Quedando un saldo contrato \$ 4,353.33 c/IVA.


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P


Ing. Emilio Contreras Mendez
Contratista

- Anotado lo anterior se declara Cerrado este bitacora

