


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V.** LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMENEZ ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$987,763.73 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$221,669.88 (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CLE-070416-CP6
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE TURMALINA 3 No.1489, COLONIA STASE, CULIACSN, SINALOA, C.P. 80020
- **No. DE FACTURA:** # 1123, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.




ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA
Alexis
18 JUL 2025
10:54 AM
RECIBIDO

C.C.P. ARCHIVO.



CONSTRUCCIONES LEKAYRO

CLE070416CP6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
TURMALINA 3, 1489, STASE, 80020, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 0673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214

USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 1123

FOLIO FISCAL (UUID)

3FF042A0-718E-4025-94F0-69944578FAEC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711752511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516241453

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-07-17T19:48:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-07-17T18:27:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80020

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BLVD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.", CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025	\$ 199,013.02	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 199,013.02

CONTRATADO
IMPORTE: \$851,520.46
IVA: \$136,243.27
TOTAL: \$987,763.73

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$306,173.88
MAS IVA 16%: \$48,987.82
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA: \$355,161.70

DEDUCCIONES
AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$107,160.86
MAS IVA 16%: \$17,145.74
TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$124,306.60

MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$199,013.02
IVA A FACTURAR (16%): \$31,842.08
TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$230,855.10

RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.): \$9,185.22

TOTAL DE DEDUCCIONES: \$133,491.82

MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$221,669.88

Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - 199013.0172 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31,842.08

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 10/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 199,013.02

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 31,842.08

TOTAL

\$ 230,855.10

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tlKWVM7+TQ/006Zk5ME8beL7bmCFZLIBkpQULZ3ilXSUDGn8LbbLeZfGgBZJ71s8BKtfsjwinORcO72rZyGCurzzaDMc6C5A12gAtu7whsVvAKyWQ+bhtzJyTRYg4tH
Hpn4L3r6kuozt165erXk/u1+T+Gnw55dRm8H0pP5GQIBnBrFifrlf0tQmjq1ERxt7IM7dm/dHb6Y9LHZR5gaFO0uloK3tqd55jKecKTVpYEN8JMN+ZwiGmdSiluEhoe
Y3N1Kng5LsUDoOZm4jYtm5pyNV1W65SFOGgqOAFax12R8+ccx5iGbAkF1D+u0+hj7pC2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JXMGfRCBFIUfVxkup04IDoJXKjS1uaG+xAEd8ALA0nc0i4OyBG6p8vX1qqcGj8UWJDgRzUUKK+rf04cOBiqZbcpvZRRJVNksmv5wDqkw8Lp59Qy8BF4tUnW99YKg
SO0WmjCGBdFd+Dk3AUPv2MHUwbChjEw+Z05hnaFAwdLWKQMYBDy+VhpVwXUob41w7MKfz6j3h5Mk9XR377sexuZsSCSomBhAQdl4DkoofPiH23A4ENu2H1uV
9xrocaU0h97Owry98QgBHjSEPPjYxfCIMPavCY0+EyoNyEQVmevnr+Snc4dndwO9e5j0WypKz44W/8BMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]3FF042A0-718E-4025-94F0-69944578FAEC/2025-07-17T19:48:14[STA0903206B9]tlKWVM7+TQ/006Zk5ME8beL7bmCFZLIBkpQULZ3ilXSUDGn8LbbLeZfGgBZJ71s8BKtfsjwinORcO72rZyGCurzzaDMc6C5A12gAtu7w
hVvAKyWQ+bhtzJyTRYg4tHpn4L3r6kuozt165erXk/u1+T+Gnw55dRm8H0pP5GQIBnBrFifrlf0tQmjq1ERxt7IM7dm/dHb6Y9LHZR5gaFO0uloK3tqd55jKecKTVp
YEN8JMN+ZwiGmdSiluEhoeY3N1Kng5LsUDoOZm4jYtm5pyNV1W65SFOGgqOAFax12R8+ccx5iGbAkF1D+u0+hj7pC2Q==[00001000000711752511]



Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="1123" Fecha="2025-07-17T18:27:51" Sello="TLKMMW+T0F006ZtK5ME8SL7bmcFZLlBkPQULZ3iLSUDn8LbLzLcgBZJ7J1s8BKtfsjwIn0Rc072cZyGcUurzzzadMc6SAl2gAtU7WmSVyAKyQc+bhtzJyTRyg4/CHhpndL3r6kuozt165erXk/ul+T+6mw55dRmf18h0LP5GQlbnBrfIftrfL0fITQmFormaPago="99" NoCertificado="00001000000516241453" Certificado="MISGCCCA/CgAmIBAGtUMdWMDmDADmTYVND0NTmD0YK0zIhCMAQELBQAmGGESAMhQYDyGQDDbABVVRPUKLEQUQ090SVEIGSUNBRE9SOTEUMCwGA1UECgWJl0wSVKJDSUGREUGUNMSUSJUIRSQUNJ104gVfJ1Q1VUQVJ1Q1EaWBgGA1Subtotal="199013.02" Moneda="MXN" Total="230855.10" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80020">
  <cfdi:Emisor Rfc="MBA50101224" Nombre="MUNICIPIO DE BADIAGAUA" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" Usocfdi="I01"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA50101224" Nombre="MUNICIPIO DE BADIAGAUA" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" Usocfdi="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripción="PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RECURRIMIENTOS DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BLVD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIAGAUA, SIMALOA.".- CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025 CONTRATADO IMPORTE: $851,520.46 IVA: $136,243.27 TOTAL: $987,763.73 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $306,173.88 MAS IVA 16% : $48,987.82 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $355,161.70 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $107,160.86 MAS IVA 16%: $17,145.74 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $124,306.60 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $199,013.02 IVA A FACTURAR (16%): $31,842.08 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $230,855.10 RETENCION 3%( S.V.I.-F.V.C.): : $9,185.22 TOTAL DE DEDUCCIONES: $133,491.82 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $221,669.88" ValorUnitario="199013.0172" Importe="199013.0172" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="199013.0172" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="31842.082752"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31842.08">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="199013.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="31842.08"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCentif="STAO903206B9" UUID="3FF042A0-718E-4025-94F0-69944578FAEC" FechaTimbrado="2025-07-17T18:48:14" SelloCFD="TLKMMW+T0F006ZtK5ME8SL7bmcFZLlBkPQULZ3iLSUDn8LbLzLcgBZJ7J1s8BKtfsjwIn0Rc072cZyGcUurzzzadMc6SAl2gAtU7WmSVyAKyQc+bhtzJyTRyg4/CHhpndL3r6kuozt165erXk/ul+T+6mw55dRmf18h0LP5GQlbnBrfIftrfL0fITQmNoCertificadoSAT="00001000000711762511" SelloSAT="JMK6JfBCfJ1VfXkUp04ID0jXrfjfsUagc+AEIC8ALAOncf0L40YB6Gp8vX1qcgJ8tJWJDPfRZUUK++f04cOBiZDcPvZRRJVMksmw5dQkwlP590y8Bfj4tUm99YKGS00hmJcG8dF+d+DK3AUPv2MhUwCci1jEu+z05hnaFAwLdLKKQmYBDy+Whpr xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/timbreFiscalDigital/1/timbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

Fecha: 16 de julio de 2024

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL	
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	18-jun-24
66777963151	66777963151	AL	15-jul-24
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
CLE-070416-CP6		17-jun-24	
DEPENDENCIA:			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	INICIO: 18-jun-24
			TERMINACIÓN: 16-ago-24
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CONTRATO No:			
MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$851,520.46	\$987,763.73	\$345,717.31	\$987,763.73
			BUENO POR: \$ 221,669.88
RECIBI:			
\$ 221,669.88 (SON DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 107,160.86	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 306,173.88
MAS I.V.A.:	\$ 17,145.74	MAS I.V.A 16 %	\$ 48,987.82
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 124,306.60	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 355,161.70
3 % SVIFYC:	\$ 9,185.22	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 133,491.82
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 133,491.82	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 230,855.10
		SALDO A PAGAR: \$ 221,669.88	

ELABORÓ:

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

Dependencia :

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones**CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V**

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				Fecha:		Estimacion:		
				16 de julio de 2024		01 NORMAL		
Periodo de la estimación:		18/06/2024	15/07/2024	Localidad:		No. De contrato:		
Periodo de Ejecución:		18/06/2024	16/08/2024	BADIRAGUATO		MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025		
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A		% de Avance
\$ 987,763.73		\$ 851,520.46		\$ 345,717.31		\$ 298,032.16		36%
								% Avance Total
								36%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 306,173.88	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 48,987.82	
\$ 124,306.60	Sub- Total A (=)	\$ 355,161.70	\$ 355,161.70
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ 107,160.86	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ 17,145.74	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ 124,306.60	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR	\$ 199,013.02	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 31,842.08	TOTAL ACUMULADO.
\$ 124,306.60	Total (=)	\$ 230,855.10	\$ 355,161.70
	3 % SVIFYC:	\$ 9,185.22	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 133,491.82	CONTRATADO
\$ 345,717.31	Importe T O T A L	\$ 221,669.88	\$ 987,763.73
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$ 221,669.88	SALDO
\$221,410.71	Son:		\$ 632,602.03
	(SON DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.)		

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



16 de julio de 2024

ESTADO DE CUENTA

ELABORO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

 AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

FECHA 16 de julio de 2024

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V	DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA		
R.F.C.	CLE-070416-CP6		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 851,520.46
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 345,717.31
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 987,763.73

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 306,173.88
2	ESTRUCTURA	\$ -
3	OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 306,173.88

SUB TOTAL=	\$ 306,173.88
I.V.A AL 16 %	\$ 48,987.82
TOTAL =	\$ 355,161.70

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

FECHA

martes, 16 de julio de 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

1 de 2

DEPENDENCIA:

TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.

CLE-070416-CP6

DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$851,520.46	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$345,717.31	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$987,763.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT.	P.U.					
GP01	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	622.47	\$ 15.58	\$ 9,698.08	0.00	0.00	622.47	\$ 9,698.08
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	323.69	\$ 133.09	\$ 43,079.90	0.00	0.00	323.69	\$ 43,079.90
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	588.54	\$ 37.61	\$ 22,134.99	0.00	0.00	588.54	\$ 22,134.99
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	588.54	\$ 157.55	\$ 92,724.48	0.00	0.00	588.54	\$ 92,724.48
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	588.54	\$ 196.07	\$ 115,395.04	0.00	0.00	588.54	\$ 115,395.04
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	588.54	\$ 38.32	\$ 23,141.39	0.00	0.00	588.54	\$ 23,141.39

ELABORÓ:

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSMOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
cp. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	FECHA: martes, 16 de julio de 2024
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		R.F.C. CLE-070416-CP6	

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL								
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA											
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$851,520.46	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$345,717.31	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$987,763.73								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN SUB-TOTAL \$	IMPORTE
											306,173.88
										IVA \$	48,987.82
										MONTO TOTAL \$	355,161.70

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE ROSARIO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA:				DEPENDENCIA:					
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V				DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA					
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V							
R.F.C.		CLE-070416-CP6							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA							
ESTIMACION		01 NORMAL							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2							
	CADENAMIENTO								VER CROQUIS
	0+000.00 0+010.00			10.0000	14.00			140.00	
	0+010.00 0+020.00			10.0000	9.90			99.00	
	0+020.00 0+030.00			10.0000	9.28			92.80	
	0+030.00 0+040.00			10.0000	6.79			87.90	
	0+040.00 0+050.00			10.0000	6.39			83.90	
	0+050.00 0+060.00			10.0000	7.22			72.20	
	0+060.00 0+070.00			10.0000	6.32			63.20	
	0+070.00 0+080.00			10.0000	5.53			55.90	
	0+080.00 0+081.50			1.5000	6.11			9.17	
							TOTAL EJECUTADO	663.47	
							TOTAL CONTRATADO	622.47	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON	M3							
	CADENAMIENTO			LONG	ANCHO	ESPESOR			VER CROQUIS
	0+000.00 0+010.00			10.0000	14.00	0.58		77.00	
	0+010.00 0+020.00			10.0000	9.50	0.55		52.25	
	0+020.00 0+030.00			10.0000	8.88	0.55		48.54	
	0+030.00 0+040.00			10.0000	6.39	0.55		35.15	
	0+040.00 0+050.00			10.0000	5.99	0.55		32.95	
	0+050.00 0+060.00			10.0000	6.82	0.55		37.61	
	0+060.00 0+070.00			10.0000	5.12	0.55		28.16	
	0+070.00 0+080.00			10.0000	5.71	0.55		31.41	
	0+080.00 0+081.50			1.5000	6.29	0.55		5.19	
							TOTAL EJECUTADO	348.46	
							TOTAL CONTRATADO	323.89	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M3							
	CADENAMIENTO			LONG	ANCHO				VER CROQUIS
	0+000.00 0+010.00			10.0000	14.00			140.00	
	0+010.00 0+020.00			10.0000	9.50			95.00	
	0+020.00 0+030.00			10.0000	8.88			88.80	
	0+030.00 0+040.00			10.0000	6.39			63.90	
	0+040.00 0+050.00			10.0000	5.99			59.90	
	0+050.00 0+060.00			10.0000	6.82			68.20	
	0+060.00 0+070.00			10.0000	5.12			51.20	
	0+070.00 0+080.00			10.0000	5.71			57.10	
	0+080.00 0+081.50			1.5000	6.29			9.44	
							TOTAL EJECUTADO	633.54	
							TOTAL CONTRATADO	598.54	
GP08	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD..	M2							
	CADENAMIENTO			LONG	ANCHO				VER CROQUIS
	0+000.00 0+010.00			10.0000	14.00			140.00	
	0+010.00 0+020.00			10.0000	9.50			95.00	
	0+020.00 0+030.00			10.0000	8.88			88.80	
	0+030.00 0+040.00			10.0000	6.39			63.90	
	0+040.00 0+050.00			10.0000	5.99			59.90	
	0+050.00 0+060.00			10.0000	6.82			68.20	
	0+060.00 0+070.00			10.0000	5.12			51.20	
	0+070.00 0+080.00			10.0000	5.71			57.10	
	0+080.00 0+081.50			1.5000	6.29			9.44	
							TOTAL EJECUTADO	633.54	
							TOTAL CONTRATADO	598.54	

ELABORO-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489, col. STASEI
cp. 80030 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:			DEPENDENCIA:		
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V			DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V			
R.F.C.		CLE-070416-CP6			
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			
ESTIMACION		01 NORMAL			
GENERADORES DE ESTIMACION					
GP06	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO	M2			
		CADENAMIENTO		LONG	ANCHO
		0+000.00	0+010.00	10.0000	14.00
		0+010.00	0+020.00	10.0000	9.50
		0+020.00	0+030.00	10.0000	8.88
		0+030.00	0+040.00	10.0000	6.39
		0+040.00	0+050.00	10.0000	5.99
		0+050.00	0+060.00	10.0000	6.82
		0+060.00	0+070.00	10.0000	5.12
		0+070.00	0+080.00	10.0000	5.71
		0+080.00	0+081.50	1.5000	6.29
					TOTAL EJECUTADO
					633.84
					TOTAL CONTRATADO
					588.54
GP109	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECH-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO.	M2			
		CADENAMIENTO		LONG	ANCHO
		0+000.00	0+010.00	10.0000	14.00
		0+010.00	0+020.00	10.0000	9.50
		0+020.00	0+030.00	10.0000	8.88
		0+030.00	0+040.00	10.0000	6.39
		0+040.00	0+050.00	10.0000	5.99
		0+050.00	0+060.00	10.0000	6.82
		0+060.00	0+070.00	10.0000	5.12
		0+070.00	0+080.00	10.0000	5.71
		0+080.00	0+081.50	1.5000	6.29
					TOTAL EJECUTADO
					633.84
					TOTAL CONTRATADO
					588.54

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Br sd
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
cp. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C. CLE-070416-CP6

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA
CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR
ALVARADO DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE BADERGUATO SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:**CROQUIS ESTIMACION:**

CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FLIA, CON
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO.
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN,
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,

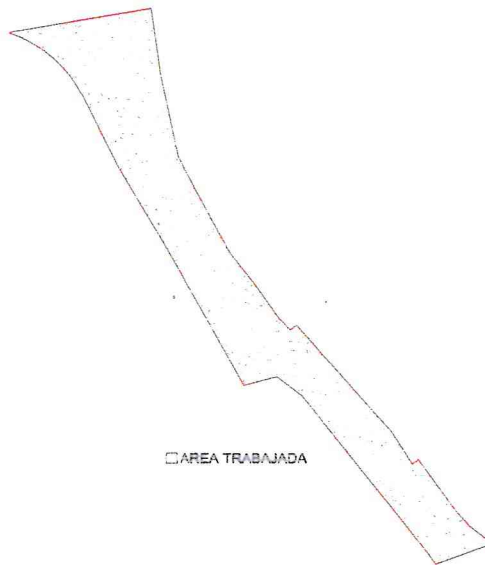

□ AREA TRABAJADA

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRIGIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBEN RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa
R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.
OBRA:

CLE-070416-CP6

CONSTRUCCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA
CALLE DANIEL DIAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR
ALVARADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PADILLAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

E

CONCEPTO

PRELIMINARES

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%; INCLUYE MANO DE
GP25	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACION, PRUEBA DE
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,



ELABORO:-

REVISO:-

AUTORIZO:-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta

19/07/2025 5:36:47 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00798320

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NORM AD 003

Importe de la operación: 221,669.88 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 021730040417112845

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: LEKAYRO SA DE CV

Nombre banco destino: HSBC

Fecha valor: 21/07/2025

Fecha de creación: 19/07/2025

Fecha de aplicación: 19/07/2025

Concepto de pago: EST 01 NORM AD 003

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 17:36:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000130338

Clave de rastreo: 002601002507210000130338

Folio de firma: 0081424162

Folio único: I401202507191736440081424168

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/07/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/07/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
