



Badiraguato

GENRANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/431/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 28 de Julio de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V.** LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMENEZ ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$987,763.73 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$344,070.01 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS 01/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** CLE-070416-CP6
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE TURMALINA 3 No.1489, COLONIA STASE, CULIACSN, SINALOA, C.P. 80020
- **No. DE FACTURA:** # 1124, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE



ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**
TESORERÍA

11:21
28 JUL 2025
Marlon RZ
RECIBIDO

C.C.P. ARCHIVO.



CONSTRUCCIONES LEKAYRO

CLE070416CP6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
TURMALINA 3, 1489, STASE, 80020, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214
USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 1124

FOLIO FISCAL (UUID)
3F2C32FF-D0D7-4E52-AFA7-19EAD3EED503
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516241453
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-07-26T16:02:19
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-07-26T14:46:11
LUGAR DE EXPEDICIÓN
80020

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BLVD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.", CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025 CONTRATADO IMPORTE: \$851,520.46 IVA: \$136,243.27 TOTAL: \$987,763.73 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$475,234.81 MAS IVA 16% : \$76,037.57 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$551,272.38 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$166,332.18 MAS IVA 16%: \$26,613.15 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$192,945.33 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$308,902.63 IVA A FACTURAR (16%): \$49,424.42 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$358,327.05 RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.): \$14,257.04 TOTAL DE DEDUCCIONES: \$207,202.37 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$344,070.01 Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - 308902.629 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 49,424.42	\$ 308,902.63	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 308,902.63

IMPORTE CON LETRA

TRISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTISIETE PESOS, 05/100 MXN

SUBTOTAL \$ 308,902.63
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 49,424.42
TOTAL \$ 358,327.05

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YBE+7Q5vxeO6480d2DrgkOwhhYpejGbyUruL9T6hNckELt+J8ImUVXjpNd+xt7OFQAIStkc/S+xTrijRY5A1eEZWJj2FdVn9V6SiBE+UndIEcj7EU/Q52Wa4ovNw+btVnWUwvyDIH0p87jGndwbQpd8Q3Yx+YsAFaQ4LOva0ErtRaaC8mLjV7im0Oo3CfNeZem4tQ3ZTUS7+QAxMgzvNkue1oT+u2UNs0Pft1v4MR+2yVnKXAuR1IG38ulxkdIHYNACqk2WXL/P5AdW599ej9yWIRBwY6eQOcdFSJrSF7L+3Vqkqjedbe+OFYJAoUn0WNYhtQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OY8irbn6xvbrLIW5+VGFJzHrLLIYM2kgkKG06k8cUabQkcm1lIryalc3R2mOa/c1CVH7Gv8cfHLXsZH5KBpRNZOezD.JxEbBAgs47w8ic4jhRMW7bqxjVTFZyo2WP736chTmZ3GDObYxZBwLWYNLU4REbWHIYNouOpANHfrijZjKGCNDVtkjo1YtuhvzkzTNT4LSs5/oZgijUWKgCDU42yTz4ie2SHNLRhUk2VUNT2Ea8Ucx01R5i4odOKRYi6ick suo7W0nIFLQPWPPNbx2VifqKyb95S9GGj3ScF2/sCVW17+a+m6dM6GQmwYAhspr6uWAJaTuderFv+uew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F2C32FF-D0D7-4E52-AFA7-19EAD3EED503|2025-07-26T16:02:19|STA0903206B9|YBE+7Q5vxeO6480d2DrgkOwhhYpejGbyUruL9T6hNckELt+J8ImUVXjpNd+xt7OFQAIStkc/S+xTrijRY5A1eEZWJj2FdVn9V6SiBE+UndIEcj7EU/Q52Wa4ovNw+btVnWUwvyDIH0p87jGndwbQpd8Q3Yx+YsAFaQ4LOva0ErtRaaC8mLjV7im0Oo3CfNeZem4tQ3ZTUS7+QAxMgzvNkue1oT+u2UNs0Pft1v4MR+2yVnKXAuR1IG38ulxkdIHYNACqk2WXL/P5AdW599ej9yWIRBwY6eQOcdFSJrSF7L+3Vqkqjedbe+OFYJAoUn0WNYhtQ==|00001000000711762511||

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="1124" Fecha="2025-07-
26T14:46:11"
Sello="YBE+7Q5vxeO6480d2DrGkOwhhYpejGbyUruL9T6hNckELt+J8lmUVXjpNd+xt70FQA1STkc/S+xTrijRY5A1eEZWji2FdVn9V6SIBE+UndlEcj7EU/Q52Wa4ovNw+btVnWUwvyDiH0p87jGnd
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000516241453"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYyNDE0NTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQ0D8dBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="308902.63" Moneda="MXN" Total="358327.05" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80020">
<cfdi:Emisor Rfc="CLE070416CP6" Nombre="CONSTRUCCIONES LEKAYRO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA050101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BLVD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR
ALVARADO, DE LA CARECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.",. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025 CONTRATADO IMPORTE: $851,520.46 IVA:
$136,243.27 TOTAL: $987,763.73 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $475,234.81 MAS IVA 16% : $76,037.57 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA :
$551,272.38 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $166,332.18 MAS IVA 16%: $26,613.15 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $192,945.33 MONTO A FACTURAR DE
LA ESTIMACION EN BRUTO: $308,902.63 IVA A FACTURAR (16%): $49,424.42 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $358,327.05 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.) :
$14,257.04 TOTAL DE DEDUCCIONES: $207,202.37 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $344,070.01" ValorUnitario="308902.629" Importe="308902.629" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="308902.629" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="49424.420640"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49424.42">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="308902.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="49424.42"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="3F2C32FF-D0D7-4E52-
AFA7-19EAD3EED503" FechaTimbrado="2025-07-26T16:02:19"
SelloCFD="YBE+7Q5vxeO6480d2DrGkOwhhYpejGbyUruL9T6hNckELt+J8lmUVXjpNd+xt70FQA1STkc/S+xTrijRY5A1eEZWji2FdVn9V6SIBE+UndlEcj7EU/Q52Wa4ovNw+btVnWUwvyDiH0
NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
SelloSAT="OY8irbn6xvbrLlws+VGFjzHrLLIYM2kgkKGt06k6cUabQkcm1ItRyaIc3R2m0a/c1CVH7Gv6cfHLXsZH5K6pRNZOezDjXebbAGs47w8ic4jhrMMW7bqxjVTFZyo2WP736chTmZ3GDOb
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
 cp. 80020 Culiacán, Sinaloa.
 R.F.C. CLE-070416-CP6

Fecha: 25 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		ESTIMACIÓN No: 02 NORMAL	
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 66777963151	CEL: 66777963151	DEL	16-jul-25
R.F.C. CLE-070416-CP6		AL	24-jul-25
DEPENDENCIA:-		FECHA DE CONTRATO: 17-jun-25	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	INICIO: 18-jun-25
			TERMINACIÓN: 16-ago-25
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CONTRATO No: MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$851,520.46	\$987,763.73	\$345,717.31	\$987,763.73
			BUENO POR: \$ 344,070.01
RECIBI: \$ 344,070.01 (SON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS 01/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 NORMAL			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 166,332.18	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 475,234.81
MAS I.V.A.:	\$ 26,613.15	MAS I.V.A 16 %	\$ 76,037.57
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 192,945.33	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 551,272.38
3 % SVIFYC:	\$ 14,257.04	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 207,202.37
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 207,202.37	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 358,327.05
			SALDO A PAGAR: \$ 344,070.01

ELABORO.

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.

C. ING. RUBIEL RINCON RAMC
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 1/2 1489, col. STASE I
 cp. 80020 Culiacán, Sinaloa.
 R.F.C. CLE-070416-CP6

Dependencia :

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

Control de Estimaciones**CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V**

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			Fecha:	Estimacion:
			25 de julio de 2025	02 NORMAL
Periodo de la estimacion:	16/07/2025	24/07/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	16/07/2025	16/08/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 987,763.73	\$ 851,520.46	\$ 345,717.31	\$ 298,032.16	56%
				% Avance Total
				92%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 475,234.81	ESTA ESTIMACION
\$ 192,945.33	16 % I.V.A (+) \$ 76,037.57	\$ 551,272.38
	Sub- Total A (=) \$ 551,272.38	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 166,332.18	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 26,613.15	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 124,306.60	Total (=) \$ 192,945.33	\$ 355,161.70
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 308,902.63	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 49,424.42	TOTAL ACUMULADO.
\$ 317,251.93	Total (=) \$ 358,327.05	\$ 906,434.08
	3 % SVIFYC: \$ 14,257.04	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 207,202.37	CONTRATADO
\$ 345,717.31	Importe T O T A L \$ 344,070.01	\$ 987,763.73
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 344,070.01	SALDO
\$28,465.38	Son:	\$ 81,329.65
	(SON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS 01/100 M.N.)	

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



25 de julio de 2025

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$851,520.46	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$345,717.31	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$987,763.73	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:	AL
		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$987,763.73

ELABORO:-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:		FECHA:	25 de julio de 2025
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	CLE-070416-CP6		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 851,520.46
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 345,717.31
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 987,763.73

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 475,234.81
3	OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 475,234.81

SUB TOTAL=	\$ 475,234.81
I.V.A AL 16 %	\$ 76,037.57
TOTAL =	\$ 551,272.38

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacan, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa. R.F.C. CLE-070416-CP6				FECHA		viernes, 25 de julio de 2025				
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
DOMICILIO:		TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		R.F.C.		CLE-070416-CP6				
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN										
		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:				
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA								
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$851,520.46		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$345,717.31				
				IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$987,763.73				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
1	PRELIMINARES									
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	81.50	\$ 719.19	\$ 58,613.99	0.00	0.00	0.00	81.50	\$ 58,613.99
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN	ML	81.50	\$ 624.05	\$ 50,860.07	0.00	0.00	0.00	80.52	\$ 50,248.51
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	450.82	\$ 839.01	\$ 378,242.49	0.00	0.00	0.00	427.74	\$ 358,878.14
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	229.39	\$ 32.67	\$ 7,494.17	0.00	0.00	0.00	229.39	\$ 7,494.17
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	81.50	\$ 77.12	\$ 6,285.28	0.00	0.00	0.00	81.50	\$ 6,285.28
									SUB-TOTAL	\$ 481,520.09
									IVA	\$ 77,043.21
									MONTO TOTAL	\$ 558,563.30

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1400, col. STASE I
c.p. 80030 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:				DEPENDENCIA:					
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V							
R.F.C.		CLE-070416-CP6							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA							
ESTIMACION		02 NORMAL							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS	ML							VER CROQUIS
	CADENAMIENTO				LONG	LADO			
		0+000.00	0+081.50		25.50	IZQUIERDA		25.50	
		0+000.00	0+081.50		61.93	DERECHA		61.93	
						TOTAL EJECUTADO		87.43	
						TOTAL CONTRATADO		81.50	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO	ML							VER CROQUIS
	CADENAMIENTO				LONG	LADO			
		0+000.00	0+081.50		55.45	IZQUIERDA		55.45	
		0+000.00	0+081.50		25.07	DERECHA		25.07	
						TOTAL EJECUTADO		80.52	
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							VER CROQUIS
	CADENAMIENTO				LONG	ANCHO			
		0+000.00	0+010.00		10.0000	8.00		80.00	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	7.66		76.60	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	5.18		51.80	
		0+030.00	0+040.00		10.0000	4.78		47.80	
		0+040.00	0+050.00		10.0000	5.66		56.60	
		0+050.00	0+060.00		10.0000	4.44		44.40	
		0+060.00	0+070.00		10.0000	3.93		39.30	
		0+070.00	0+080.00		10.0000	4.39		43.90	
		0+080.00	0+081.50		1.5000	4.68		7.02	
						TOTAL EJECUTADO		427.74	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML							VER CROQUIS
	CADENAMIENTO			CANTIDAD	LONG	ANCHO			
		0+000.00	0+010.00	6.00	10.0000	8.34		50.04	
		0+010.00	0+020.00	6.00	10.0000	7.66		45.96	
		0+020.00	0+030.00	6.00	10.0000	5.18		31.08	
		0+030.00	0+040.00	6.00	10.0000	4.78		28.68	
		0+040.00	0+050.00	6.00	10.0000	5.66		33.96	
		0+050.00	0+060.00	6.00	10.0000	4.44		26.64	
		0+060.00	0+070.00	6.00	10.0000	3.93		23.58	
		0+070.00	0+080.00	6.00	10.0000	4.39		26.34	
		0+080.00	0+081.50	1.75	1.5000	4.68		8.19	
						TOTAL EJECUTADO		274.47	
						TOTAL CONTRATADO		228.39	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML							VER CROQUIS
	CADENAMIENTO				LONG	ANCHO			
		0+010.00	0+020.00			7.66		7.66	
		0+040.00	0+050.00			5.66		5.66	
		0+000.00	0+068.18		68.18			68.18	
						TOTAL EJECUTADO		81.50	

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-




ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

ENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

	CONCEPTO
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP10	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y

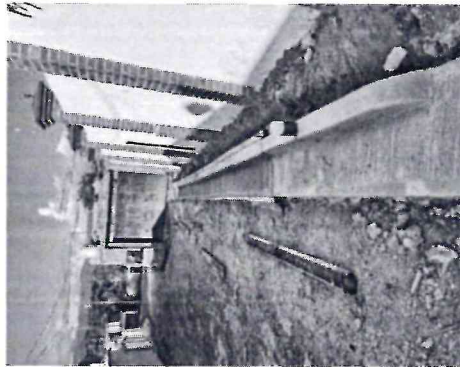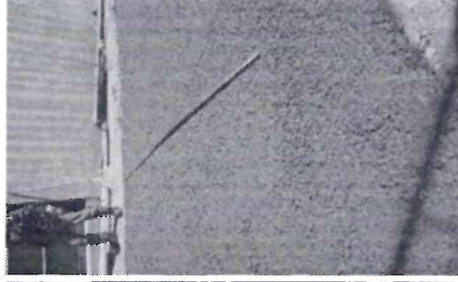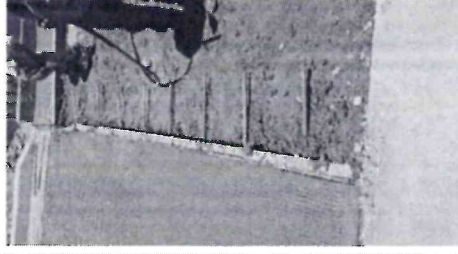

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.


CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

 Turmalina 3 #1489, col. STASE I
 c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
 R.F.C. CLE-070416-CP6


CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V
DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C. CLE-070416-CP6

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:
CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15x30x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
GP088	PATIN DE 15x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM". INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

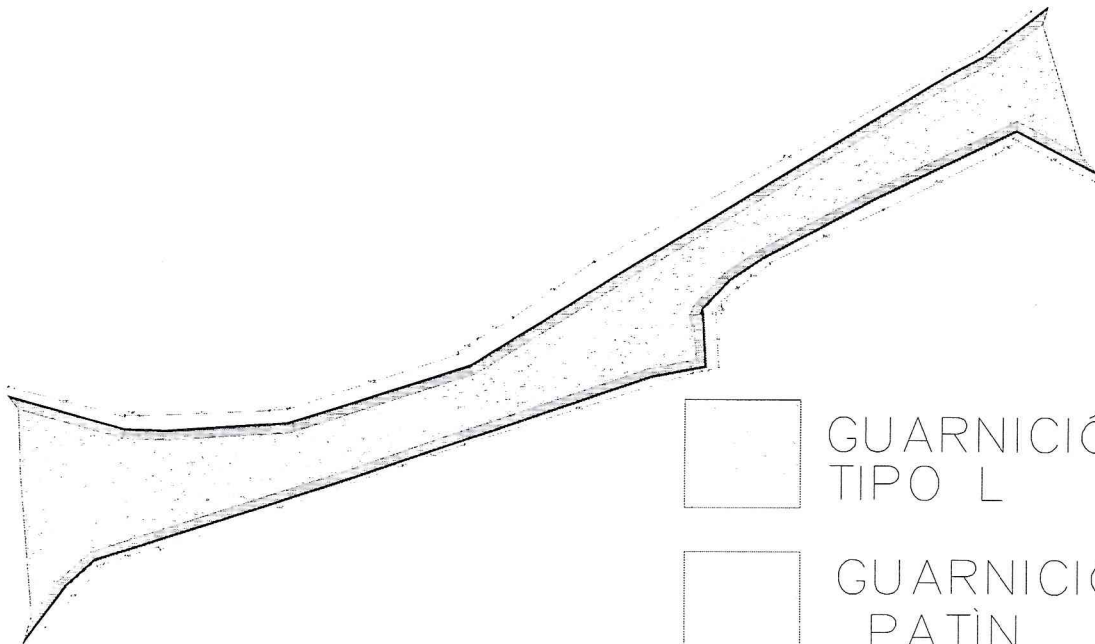
 GUARNICIÓN
TIPO L

 GUARNICIÓN
PATIN


LOSA

ELABORO.-

 C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

 ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta31/07/2025 3:34:05 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario	
Descripción: EST 02 NOR AD003	Importe de la operación: 344,070.01 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836	Cuenta de depósito: 021730040417112845
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO	Titular de la cuenta: LEKAYRO SA DE CV
Nombre banco destino: HSBC	
Fecha de creación: 31/07/2025	Fecha de aplicación: 31/07/2025
Concepto de pago: EST 02 NOR AD003	Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382	Hora de captura en el canal: 15:34:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000169322

Clave de rastreo:002601002507310000169322

Folio de firma:0080589041

Folio único:I401202507311534030080589047

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	31/07/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/07/2025
