

OFICIO No. OPDUyE/524/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 23 de Septiembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 03 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V. LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMENEZ ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$987,763.73 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$25,773.46 (VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V.
- R.F.C. CLE-070416-CP6
- DOMICILIO FISCAL: CALLE TURMALINA 3 No.1489, COLONIA STASE, CULIACSN, SINALOA, C.P. 80020
- No. DE FACTURA: # 1130, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.


AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA





CONSTRUCCIONES LEKAYRO

CLE070416CP6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
TURMALINA 3, 1489, STASE, 80020, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214

USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 1130

FOLIO FISCAL (UUID)

C1A5C182-86E3-484C-9503-0F848278D275

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516241453

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-09-13T18:04:26

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-09-13T16:53:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80020

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BLVD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.", CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025	\$ 23,139.16	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 23,139.16
CONTRATADO					
IMPORTE: \$851,520.46					
IVA: \$136,243.27					
TOTAL: \$987,763.73					
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$35,598.70					
MAS IVA 16%: \$5,695.79					
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA: \$41,294.49					
DEDUCCIONES					
AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$12,459.54					
MAS IVA 16%: \$1,993.53					
TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$14,453.07					
MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$23,139.16					
IVA A FACTURAR (16%): \$3,702.27					
TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$26,841.43					
RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.): \$1,067.96					
TOTAL DE DEDUCCIONES: \$15,521.03					
MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$25,773.46					
Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 23139.1637 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,702.27					

IMPORTE CON LETRA

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS,
43/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 23,139.16

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 3,702.27

TOTAL

\$ 26,841.43



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hCmfy9ARowFmM6eSr+FoWaUqJr7VD2DrDopYI7pFXZMc4nBycPhbC+5V10YcOeVF4YOzayMOCEmJCwIP37LCVXOd2G13ZlpdptUkk4wtlgG7etHJVM8y6vt3eE2b
V7vEZgPQRXgsQ5VicsDigtS0i8AK+4EtwK5PkNuHVDAvp0EzPpwwa59kkKANDFi8y635heQ01Rg1yLF65ntL5YYIEIYMUUqRJLD9:WJh3uC/PHIIN9FxQAb6Qz/sM2uQ
5ji+o1cDSiG6V4gUj805i7CjXszkA66/dZfkmwe8hAA3m2cX4L7js+B21hC6eTqZF4e8EMCKxY9opD8bLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3qZWIL62FG7+ik9/+vBsS/6raHkWulZaHit7yCF7d8g4RRs7AKafk2TXXRmgCEZj/HmxV2ZetOXwquu5EizOyukI7ruNpI5Lrk32aLEPA+hVrZnabGV8Np2Qf+k1W6IObed
aJTKPbdHsCzLLZQL/qXsaV4EZINvmV/IHEETGStvB07pLuRh4G0HqyWrr204nmImme4/oZBITVNmNmihFUGA0z5VXPWEHIZLEEbC3yrTqWB4JsDRrQbkl0oMx739D
e0o7XKkzGYhi0VWljGc114owpMuLDVTZ0G1PLiwoiaXyX7EwV88kek/wJDNe4T+Lmai8pU3Fp+ntxqMCYCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C1A5C182-86E3-484C-9503-0F848278D275|2025-09-13T18:04:26|STA0903206B9|hCmfy9ARowFmM6eSr+FoWaUqJr7VD2DrDopYI7pFXZMc4nBycPhbC+5V10YcOeVF4YOzayMOCEmJCwIP37LCVXOd2G13ZlpdptUkk4wtlgG7etHJVM8y6vt3eE2bV7vEZgPQRXgsQ5VicsDigtS0i8AK+4EtwK5PkNuHVDAvp0EzPpwwa59kkKANDFi8y635heQ01Rg1yLF65ntL5YYIEIYMUUqRJLD9:WJh3uC/PHIIN9FxQAb6Qz/sM2uQ5ji+o1cDSiG6V4gUj805i7CjXszkA66/dZfkmwe8hAA3m2cX4L7js+B21hC6eTqZF4e8EMCKxY9opD8bLw==|00001000000711762511||

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="1130" Fecha="2025-09-
13T16:53:44"
Sello="hCmfy9ARcwFmM6aSr+FoWaiUqJr7VD2DrDopYI7pPXZcMc4nBcPhbC+5V19VcOcvF41Y0zayMOCEmJCwIP37LCVX0d2G13ZIpdpUkk4WltgG7eHJVM8y6vt3eE2bV7vEZgPQrXgsQ5VicsDI
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000516241453"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYyNDU0NTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEwAgEwYDQVQQ0DBDdBVVRPUk1EQUQgQ09VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCAwGA1UECgw1U09VSklk
SubTotal="23139.16" Moneda="MXN" Total="26841.43" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80020">
<cfdi:Emisor Rfc="CLE070416CP6" Nombre="CONSTRUCCIONES LEKAYRO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA050101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTOS DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BLVD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR
ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.",. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025 CONTRATADO IMPORTE: $851,520.46 IVA:
$136,243.27 TOTAL: $987,763.73 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $35,598.70 MAS IVA 16% : $5,695.79 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA :
$41,294.49 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $12,459.54 MAS IVA 16%: $1,993.53 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $14,453.07 MONTO A FACTURAR DE LA
ESTIMACION EN BRUTO: $23,139.16 IVA A FACTURAR (16%): $3,702.27 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $26,841.43 RETENCIÓN 3%( S.V.I.F.Y.C.) : $1,067.96
TOTAL DE DEDUCCIONES: $15,521.03 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $25,773.46" ValorUnitario="23139.1637" Importe="23139.1637" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="23139.1637" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3702.266192"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3702.27">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="23139.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3702.27"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA090320689" UUID="C1A5C182-86E3-484C-
9503-0F848278D275" FechaTimbrado="2025-09-13T18:04:26"
SelloCFD="hCmfy9ARcwFmM6aSr+FoWaiUqJr7VD2DrDopYI7pPXZcMc4nBcPhbC+5V19VcOcvF41Y0zayMOCEmJCwIP37LCVX0d2G13ZIpdpUkk4WltgG7eHJVM8y6vt3eE2bV7vEZgPQrXgsQ
NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
SelloSAT="3qfZWFL62FG7+ik9/+vBsS/GraHkMuzZaH17yCF7d8g4RRs7A/Kafk2TXKmgCEZj/HmxV2ZeKXwquu5EizOyKt7ruNpISLdk32aLEPA+hVrZnabGV8Np2Qf+k1W6IO8edaJTKPbd
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

Dependencia :

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

Control de Estimaciones**CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V**

CONSTRUCCIÓN DE RECURRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				Fecha:	Estimacion:
				18 de agosto de 2025	03 NORMAL
Periodo de la estimacion:	25/07/2025	16/08/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	25/07/2025	16/08/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025	
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance	
\$ 987,763.73	\$ 851,520.46	\$ 345,717.31	\$ 298,032.16	4%	
				% Avance Total	
				96%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 35,598.70	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+) \$ 5,695.79	
\$ 14,453.07	Sub- Total A (=) \$ 41,294.49	\$ 41,294.49
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 12,459.54	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 1,993.53	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 317,251.93	Total (=) \$ 14,453.07	\$ 906,434.08
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 23,139.16	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 3,702.27	TOTAL ACUMULADO.
\$ 331,705.00	Total (=) \$ 26,841.43	\$ 947,728.57
	3 % SVIFYC: \$ 1,067.96	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 15,521.03	CONTRATADO
\$ 345,717.31	Importe T O T A L \$ 25,773.46	\$ 987,763.73
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 25,773.46	SALDO
\$14,012.31	Son: (SON VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)	\$ 40,035.16

ELABORO:

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

Fecha: 18 de agosto de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		ESTIMACIÓN No: 03 NORMAL	
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 66777963151	CEL: 66777963151	DEL	25-jul-25
R.F.C. CLE-070416-CP6		AL	16-ago-25
DEPENDENCIA:-		FECHA DE CONTRATO:	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		17-jun-25	
		LOCALIDAD:	MUNICIPIO:
		BADIRAGUATO	BADIRAGUATO
		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
		INICIO:	18-jun-25
		TERMINACIÓN:	16-ago-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CONTRATO No:			
MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$851,520.46	\$987,763.73	\$345,717.31	\$987,763.73
RECIBI:			BUENO POR:
\$ 25,773.46			\$ 25,773.46
(SON VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		03 NORMAL	
DEDUCCIONES:			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
\$	12,459.54	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 35,598.70
MAS I.V.A.:	\$ 1,993.53	MAS I.V.A 16 %	\$ 5,695.79
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 14,453.07	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 41,294.49
3 % SVIFYC:	\$ 1,067.96	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 15,521.03
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 15,521.03	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 26,841.42
SALDO A PAGAR:			\$ 25,773.46

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E



18 de agosto de 2025

R.F.C. CLE-070416-CP6

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

03 NORMAL

FECHA INICIO CONTRATO:	18-jun-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	16-ago-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025	FECHA CONTRATO:	17-jun-25
------------------------	-----------	-----------------------------	-----------	-----------	---------------------------	-----------------	-----------

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$987,763.73	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:
----------------------------	--------------	-----------------------------

DATA:	VALOR:	CONTABILIZADO:
01/01/2014	\$ 947,728.57	\$ 10,005.40
31/12/2014	\$ 817,007.39	\$ 10,005.40

.....

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE C.P.D.U. Y E.

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
 c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
 R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:		FECHA:	18 de agosto de 2025
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA		
R.F.C.	CLE-070416-CP6		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 851,520.46
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 345,717.31
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 987,763.73

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 25,000.86
3	OTROS	\$ 10,597.84
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 35,598.70

SUB TOTAL=	\$ 35,598.70
I.V.A AL 16 %	\$ 5,695.79
TOTAL =	\$ 41,294.49

ELABORO.

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESIGLOSE

FECHA	lunes, 18 de agosto de 2025
-------	-----------------------------

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V

TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD:	BADRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 NORMAL
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMÉNEZ ENTRE: EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADRAGUATO, SINALOA				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$851,520.46	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$345,777.31	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$197,763.73
--------------------------	--------------	------------------------------	--------------	----------------------------	--------------

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA EST.A ESTIM.	HASTA ESTIM.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT.	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
2	ESTRUCTURA									
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	81.50 \$	81.99 \$	6,674.04	81.50	0.00	0.00	81.50 \$	6,674.04
GP'26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACABADOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y	M3	8.15 \$	160.09 \$	1,304.73	8.15	0.00	0.00	3.15 \$	1,304.73
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	40.75 \$	417.72 \$	17,022.09	40.75	0.00	0.00	40.75 \$	17,022.09
3	OTROS									
GBR671	LETrero INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO. INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00 \$	4,771.52 \$	4,771.52	1.00	0.00	0.00	1.00 \$	4,771.52
GP131	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	622.47 \$	9.36 \$	5,826.32	622.47	0.00	0.00	622.47 \$	5,826.32
									SUB-TOTAL \$	35,598.70
									IVA \$	5,685.79
									MONTO TOTAL \$	41,284.49

ELABORO:-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE/EGAI

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

REVISED

AUTORIZO

CCING. RUBIEL RINCON RAMOS



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3-91400, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa
R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:				DEPENDENCIA:					
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V							
R.F.C.		CLE-070416-CP6							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SADIAGUATO, SINALOA							
ESTIMACION		03 NORMAL							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARTIAL	TOTAL	
2	ESTRUCTURA								
GP11	PINTURA EN CUARNICIÓN DE 20 X 15 CM, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,	ML							VER CROQUIS
		CADENAMIENTO			LONG	LADO			
			0+000.00	0+081.64	25.50	IZQUIERDA		25.50	
			0+000.00	0+081.64	61.93	DERECHA		61.93	
							TOTAL EJECUTADO	87.43	
							TOTAL CONTRATADO	81.50	
							ADICIONAL	5.93	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 90% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA	M3							VER CROQUIS
				LADO IZQUIERDO		0.20	32.30	6.46	
				LADO DERECHO		0.20	31.30	6.26	
							TOTAL EJECUTADO	12.72	
							TOTAL CONTRATADO	8.15	
							ADICIONAL	4.57	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE, TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE	M2							VER CROQUIS
				LADO IZQUIERDO			32.30		
				LADO DERECHO			31.30		
							TOTAL EJECUTADO	63.60	
							TOTAL CONTRATADO	40.75	
							ADICIONAL	22.85	
3	OTROS								
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE	FZA							VER CROQUIS
		CADENAMIENTO							
			0+000.00	0+081.50				1.00	
							TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							VER CROQUIS
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO			
			0+000.00	0+010.00	10.0000	16.56		165.60	
			0+010.00	0+020.00	10.0000	9.18		91.80	
			0+020.00	0+030.00	10.0000	7.07		70.70	
			0+030.00	0+040.00	10.0000	6.48		64.80	
			0+040.00	0+050.00	10.0000	7.34		73.40	
			0+050.00	0+060.00	10.0000	8.44		84.40	
			0+060.00	0+070.00	10.0000	6.41		64.10	
			0+070.00	0+077.52	7.5200	5.70		42.86	
			0+077.52	0+080.00	10.0000	7.15		71.50	
			0+080.00	0+081.64	1.6400	9.63		15.79	
							TOTAL EJECUTADO	744.95	
							TOTAL CONTRATADO	922.47	

ELABORO.-

G. LEBRON ROSARIO BANCHEZ DEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ARG. DÍGIDA GFC NIELAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBEN RAMOS RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.


CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

 Turmalina 3 #1489, col. STASE 1
 c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
 R.F.C. CLE-070416-CP6


CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V
DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C. CLE-070416-CP6

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:
CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
2	ESTRUCTURA
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS,
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y
GBR671	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

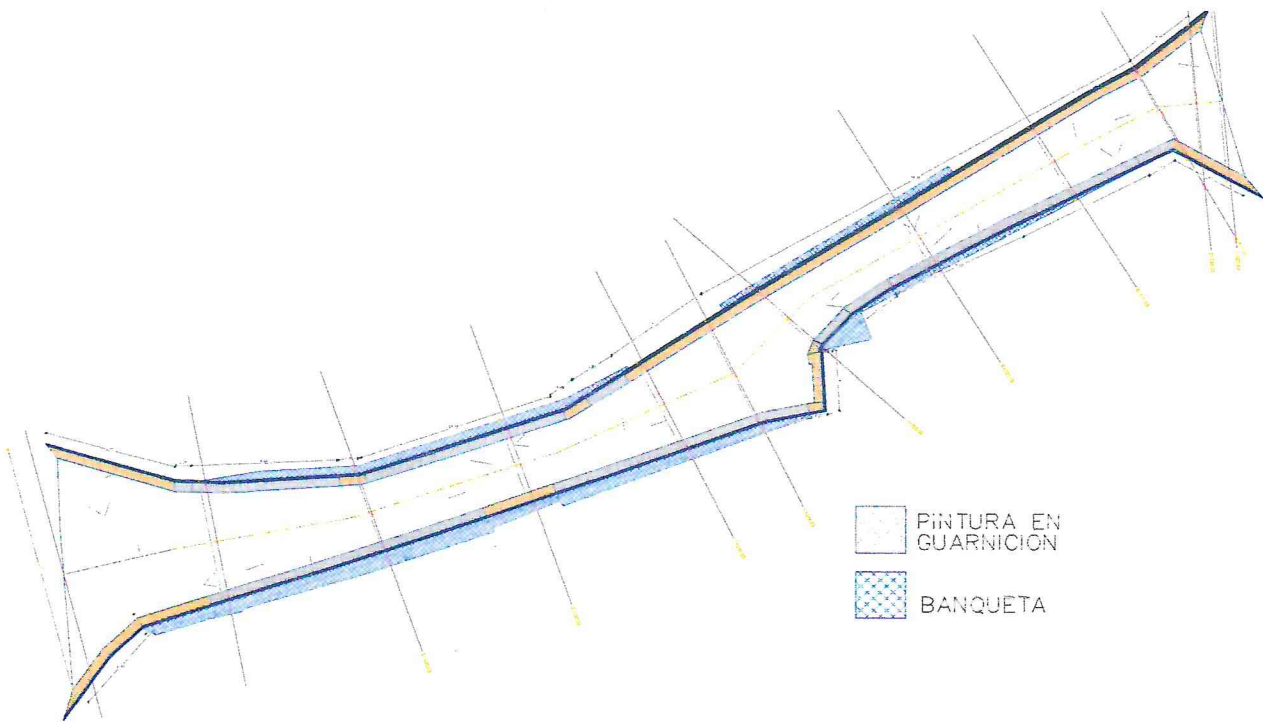

ELABORO.-

 C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

 ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
cp. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO:

TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.

[CLE-070416-CP6]

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CONCEPTO

ESTRUCTURA

2	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE:
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y
GBR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP10	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO.-

[Signature]

**C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL**

REVISO.-

[Signature]

**ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA**

AUTORIZO.-

[Signature]

**C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS**



Fecha y hora de consulta29/09/2025 8:48:18 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario	
Descripción: EST 03 NORM AD 003	Importe de la operación: 25,773.46 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836	Cuenta de depósito: 021730040417112845
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO	Titular de la cuenta: LEKAYRO SA DE CV
Nombre banco destino: HSBC	Fecha valor: 30/09/2025
Fecha de creación: 29/09/2025	Fecha de aplicación: 29/09/2025
Concepto de pago: EST 03 NORM AD 003	Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382	Hora de captura en el canal: 20:48:15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000833267	Ciave de rastreo: 002601002509300000833267
Folio de firma: 0087402097	Folio único: I401202509292048150087402103

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%	Estado: Operado
--------------------------	-----------------

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	29/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/09/2025
