


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V. LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMENEZ ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$987,763.73 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$24,987.46 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: CONSTRUCCIONES LEKAYRO, S.A. DE C.V.
- R.F.C. CLE-070416-CP6
- DOMICILIO FISCAL: CALLE TURMALINA 3 No.1489, COLONIA STASE, CULIACSN, SINALOA, C.P. 80020
- No. DE FACTURA: # 1137, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
C.C. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.


ATENTAMENTE



C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA
Alexis
29 SEP 2025
6:35 AM
RECIBIDO



CONSTRUCCIONES LEKAYRO

CLE070416CP6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
TURMALINA 3, 1489, STASE, 80020, Culiacán, Sinaloa, México
Tel. 6673363111

CLIENTE

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214
USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 80500
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
80500, Badiraguato, Sinaloa, México

Factura 1137

FOLIO FISCAL (UUID)
B5BFF22B-754F-4429-AEB4-2D9A0ACECA39
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516241453
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-09-29T14:57:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-09-29T13:45:28
LUGAR DE EXPEDICIÓN
80020

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - LOTE	PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BLVD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.", CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025 CONTRATADO IMPORTE: \$851,520.46 IVA: \$136,243.27 TOTAL: \$987,763.73 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$34,513.07 MAS IVA 16% : \$5,522.09 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$40,035.16 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$12,079.58 MAS IVA 16%: \$1,932.73 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$14,012.31 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$22,433.48 IVA A FACTURAR (16%): \$3,589.36 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$26,022.85 RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : \$1,035.39 TOTAL DE DEDUCCIONES: \$15,047.70 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$24,987.46 Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construcción Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 22433.4828 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,589.36	\$ 22,433.48	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 22,433.48

IMPORTE CON LETRA

VEINTISEIS MIL VEINTIDOS PESOS, 84/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 22,433.48
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,589.36
TOTAL \$ 26,022.84



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Xs8VzpgipN7Dlup194HPtoOEQMWZgB82AmF15wHG22eN1x0X+hjKBGlajLDNnELbxXimO9/DLpvc3SvSUoA3xixwqTbODa4BbJBjN2BBJiv8WQifseyXviXpo1Q7fzf5A
6c4QnFT4uGFFZUJEIZy/35zMYuBYoNW89us9K2oPzveh7qR4u033k24Rd3SWVig968UFTwLRTUc1hRl0OkeV2yFVJ6sJgXvgT+AZJgFzWJDEq2N7PhmDSPKP1
r4SIGO4uc00yDq83ph6eZ6iqFMjIZ0KyhODpuez9CaRsEXTytAnaxm2QkyjCm2HtrjBjZIO+p/mx8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cu3j8/I1+Wz9LeMen+942CnKk9SdzZiA+1u4oUwOwA1ooanf6ky5QcOnZZy6M71v2yhMOyHw6HYsA9KlbqJab5ZgHEjArG2+qAZbarZjVxd+VNuEOWZvN92zyLLYycm
W+hYd12YQ3TTO8OVQjSQEa4JwFjOqxtuRDYq5vMtp2vMkYtZkN9cLQSNEXJaeZ16SFu4dhkxepicYXWY9qjO7aZbhKsdtbvtvsg15BwDDZx/MSLMKcIVVXDhwkb
qhWE0XnRQTOjON+hiqf92f+o8u8EUCYrYEpl2YeCgsdC+viKEgEBUSGV0v8Mni3FzNd8mi9mLr+kZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B5BFF22B-754F-4429-AEB4-2D9A0ACECA39|2025-09-29T14:57:47|STA0903206B9|Ks8VzpgipN7Dlup194HPtoOEQMWZgB82AmF15wHG22eN1x0X+hjKBGlajLDNnELbxXimO9/DLpvc3SvSUoA3xixwqTbODa4BbJBjN2BBJiv8WQifseyXviXpo1Q7fzf5A6c4QnFT4uGFFZUJEIZy/35zMYuBYoNW89us9K2oPzveh7qR4u033k24Rd3SWVig968UFTwLRTUc1hRl0OkeV2yFVJ6sJgXvgT+AZJgFzWJDEq2N7PhmDSPKP1r4SIGO4uc00yDq83ph6eZ6iqFMjIZ0KyhODpuez9CaRsEXTytAnaxm2QkyjCm2HtrjBjZIO+p/mx8A==|00001000000711762511|

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="1137" Fecha="2025-09-
29T13:45:28"
Sello="Xs6VzpgipN7Diup194HptgOEQMWzG882AmFI5wHG22eNix0X+hjKBGIajLDNnELlxrXIm09/DLpvz3SvjSuoA3xixwqTb0Da4BbJB3N2BBJiV8WQIfseyXviXpo1Q7fzf5A6c4QnFT4uGFFZU
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000516241453"
Certificado="MIIGCCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDExMDAwMDA1MNTYyNDExMDAwMDQyQ3QZIHVcNAQELBQwggGEMSAwHgYDVQOGBDQVRPUKlEQVQgQGVSVelGSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1U0VSvk1D
SubTotal="22433.48" Moneda="MXN" Total="26022.84" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80020">
<cfdi:Emisor Rfc="CLE070416CP6" Nombre="CONSTRUCCIONES LEKAYRO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="LOTE" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO DE LA
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BLVD JUAN S MILLAN Y CALLE
SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.", CONTRATO No. MBGR-AD-FAISMUN-003/2025 CONTRATADO IMPORTE: $851,520.46 IVA:
$136,243.27 TOTAL: $987,763.73 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $34,513.07 MAS IVA 16% : $5,522.09 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA :
$40,035.16 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: $12,079.58 MAS IVA 16%: $1,932.73 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $14,012.31 MONTO A FACTURAR DE LA
ESTIMACION EN BRUTO: $22,433.49 IVA A FACTURAR (16%): $3,589.36 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $26,022.85 RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : $1,035.39
TOTAL DE DEDUCCIONES: $15,047.70 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : $24,987.46" ValorUnitario="22433.4828" Importe="22433.4828" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="22433.4828" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="3589.357248"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3589.36">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="22433.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000" Importe="3589.36"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="85BFF22B-754F-4429-
AEB4-2D9A0ACECA35" FechaTimbrado="2025-09-29T14:57:47"
SelloCFD="Xs6VzpgipN7Diup194HptgOEQMWzG882AmFI5wHG22eNix0X+hjKBGIajLDNnELlxrXIm09/DLpvz3SvjSuoA3xixwqTb0Da4BbJB3N2BBJiV8WQIfseyXviXpo1Q7fzf5A6c4QnFT
NoCertificadoSAT="00001000000711762511"
SelloSAT="Cu3j0r/1l+HzSLeEn+942CnK95chZtA+1u4oUoWAl0oanf6kyi5QcOnZzy6M/1v2yhMoyhW6HYsA9KlBqJab5ZgHEjAg2+qAZbarZjVxd+vNuEOWzVn92zyLLYcmw+hyd12YQ3
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416 CP6

Fecha: 18 de agosto de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V	ESTIMACIÓN No:	01 ADICIONAL FINIQUITO
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	25-jul-25
66777963151	66777963151	AL	16-ago-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
CLE-070416-CP6			17-jun-25
DEPENDENCIA:-			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:
		18-jun-25
		TERMINACIÓN:
		16-ago-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$851,520.46	\$987,763.73	\$345,717.31	\$987,763.73
		BUENO POR:	\$ 24,987.46

RECIBI:

\$ 24,987.46 (SON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL FINIQUITO

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 12,079.58	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 34,513.07
MAS I.V.A.:	\$ 1,932.73	MAS I.V.A 16 %	\$ 5,522.09
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 14,012.31	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 40,035.16
3 % SVIFYC:	\$ 1,035.39	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 15,047.70
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 15,047.70	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 26,022.84

SALDO A PAGAR: \$ 24,987.46

ELABORO:

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:

C. ING. ROBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
 cp. 80020 Culiacán, Sinaloa.
 R.F.C. CLE-070416-CP6

Dependencia:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA		Fecha:	18 de agosto de 2025	Estimación:	01 ADICIONAL FINQUITO
Periodo de la estimación:	25/07/2025 16/08/2025	Localidad:	BADIRAGUATO	No. De contrato:	MBGBR-AD-FAISMUN-003/2025
Periodo de Ejecución:	25/07/2025 16/08/2025				
Importe del contrato con I.V.A:	\$ 987,763.73	Imp. Contratado sin I.V.A	\$ 851,520.46	Anticipo	\$ 345,717.31
				Importe Anticipo sin I.V.A	\$ 298,032.16
				% de Avance	4%
				% Avance Total	100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 34,513.07	ESTA ESTIMACION
\$ 14,012.31	16 % I.V.A (+) \$ 5,522.09	
	Sub- Total A (=) \$ 40,035.16	\$ 40,035.16
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 12,079.58	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 1,932.73	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 331,705.00	Total (=) \$ 14,012.31	\$ 947,728.57
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 22,433.49	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 3,589.35	TOTAL ACUMULADO.
\$ 345,717.31	Total (=) \$ 26,022.84	\$ 987,763.73
	3 % SVIFYC: \$ 1,035.39	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 15,047.70	CONTRATADO
\$ 345,717.31	Importe T O T A L \$ 24,987.46	\$ 987,763.73
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 24,987.46	SALDO
\$0.00	Son:	\$ -
	(SON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.)	

ELABORO:

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

ELABORO-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: ~~ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ~~
~~COSTO Y PRESUPUESTOS.~~

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

**CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.**

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
 cp. 80020 Culiacán, Sinaloa.
 R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:	
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V	
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.
R.F.C.	CLE-070416-CP6

DEPENDENCIA:	FECHA	18 de agosto de 2025
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		

RESUMEN DE ESTIMACION

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 851,520.46
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 345,717.31
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 987,763.73

DESTAJÓ		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 23,310.17
2	ESTRUCTURA	\$ 16,499.68
3	OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 39,809.85
POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:		\$ 34,513.07

SUB TOTAL=	\$ 34,513.07
I.V.A AL 16 %	\$ 5,522.09
TOTAL =	\$ 40,035.16

ELABORO.-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

DESGLOSE

CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		FECHA		lunes, 18 de agosto de 2025	
DOMICILIO:		TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		R.F.C.		CLE-070416-CP6					
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 ADICIONAL FINIQUITO			
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA											
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$851,520.46		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$345,717.31		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$987,763.73	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
			CANT	P.U.	TOTAL						
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	622.47	\$ 15.58	\$ 9,698.08	663.47	622.47	0.00	41.00	\$ 633.78	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EXCEPTO ROCA FLUA, CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL	M3	323.69	\$ 133.09	\$ 43,076.90	348.46	323.69	0.00	24.77	\$ 3,296.64	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL	M2	588.54	\$ 37.61	\$ 22,134.99	633.54	588.54	0.00	45.00	\$ 1,692.45	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACION AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD. PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	588.54	\$ 157.55	\$ 92,724.48	633.54	588.54	0.00	45.00	\$ 7,083.75	
GP25	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM2. INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	588.54	\$ 156.07	\$ 115,395.04	633.54	588.54	0.00	45.00	\$ 8,823.15	
GP06	ESTRUCTURA	M2	588.54	\$ 39.32	\$ 23,141.39	633.54	588.54	0.00	45.00	\$ 1,763.40	
2	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESMIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	81.50	\$ 719.19	\$ 58,613.99	87.43	81.50	0.00	5.93	\$ 4,261.80	
GP08	PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	229.39	\$ 32.67	\$ 7,494.17	274.47	229.39	0.00	45.08	\$ 1,472.76	
GP133											

ELABORÓ:

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE ROGELIO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. JRG. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489, col. STASE I
c.p. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

DESGLöse

CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA		lunes, 13 de agosto de 2025	
DOMICILIO:		TURMALINA 3 #1489, COL STASE I C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.		R.F.C.		CLE-070416-CP6					
DESGLöse DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		BADRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 ADICIONAL FINIQUITO			
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADRAGUATO, SINALOA											
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$851,520.46		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$345,717.31		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$987,763.73	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
GP11	PINTURA EN GUARNIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	81.50	\$	81.89	\$	6,674.04	0.00	5.93	\$	483.61
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIERATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	M3	8.15	\$	160.09	\$	1,304.73	0.00	4.57	\$	731.61
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR, PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	40.75	\$	417.72	\$	17,022.09	0.00	22.85	\$	9,544.90
3	OTROS										
SUB-TOTAL \$										39,809.85	
IVA \$										6,363.58	
MONTO TOTAL \$										46,179.43	
POR CIERRE DE ESTIMACIÓN \$										40,035.16	

ELABORÓ:


C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



ELABORO.-

REVISOR

ARQ. BRIGIDEA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



ELABORO -

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

~~SECRET~~

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Terminal 3 #1489, col. STASE I
cp. 80020 Culiacán, Sinaloa
R.E.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V		
R.F.C.	CLE-070416-CP6		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA		
ESTIMACION	01 ADICIONAL FINQUITO		
GENERADORES DE ESTIMACION			
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	ML	VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	
		0+000.00	0+081.64
		0+000.00	0+081.64
		LONG	LADO
		25.50	IZQUIERDA
		61.53	DERECHA
		TOTAL EJECUTADO	
		COBRADO EN ESTIMACION ANTERIOR	
		ESTIMACION ADICIONAL	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA	M3	VER CROQUIS
		LADO IZQUIERDO	0.20
		LADO DERECHO	0.20
		TOTAL EJECUTADO	
		COBRADO EN ESTIMACION ANTERIOR	
		ESTIMACION ADICIONAL	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE	M2	VER CROQUIS
		LADO IZQUIERDO	32.30
		LADO DERECHO	31.30
		TOTAL EJECUTADO	
		COBRADO EN ESTIMACION ANTERIOR	
		ESTIMACION ADICIONAL	

ELABORO.-

G. LEONARDO ROMERO SANCHEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. DRISCEIDA GFC NICOLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBEN RAMON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.


CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

 Turmalina 3 #1489, col. STASE I
 cp. 80020 Culiacán, Sinaloa.
 R.F.C. CLE-070416-CP6


CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V
DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO: TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C. CLE-070416-CP6

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:
CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
2	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%. INCLUYE
GP08	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO.
GP08	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN,
GP109	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM2. INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS,
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". ACABADO ESCORILLADO, INCLUYE: TRAZO Y

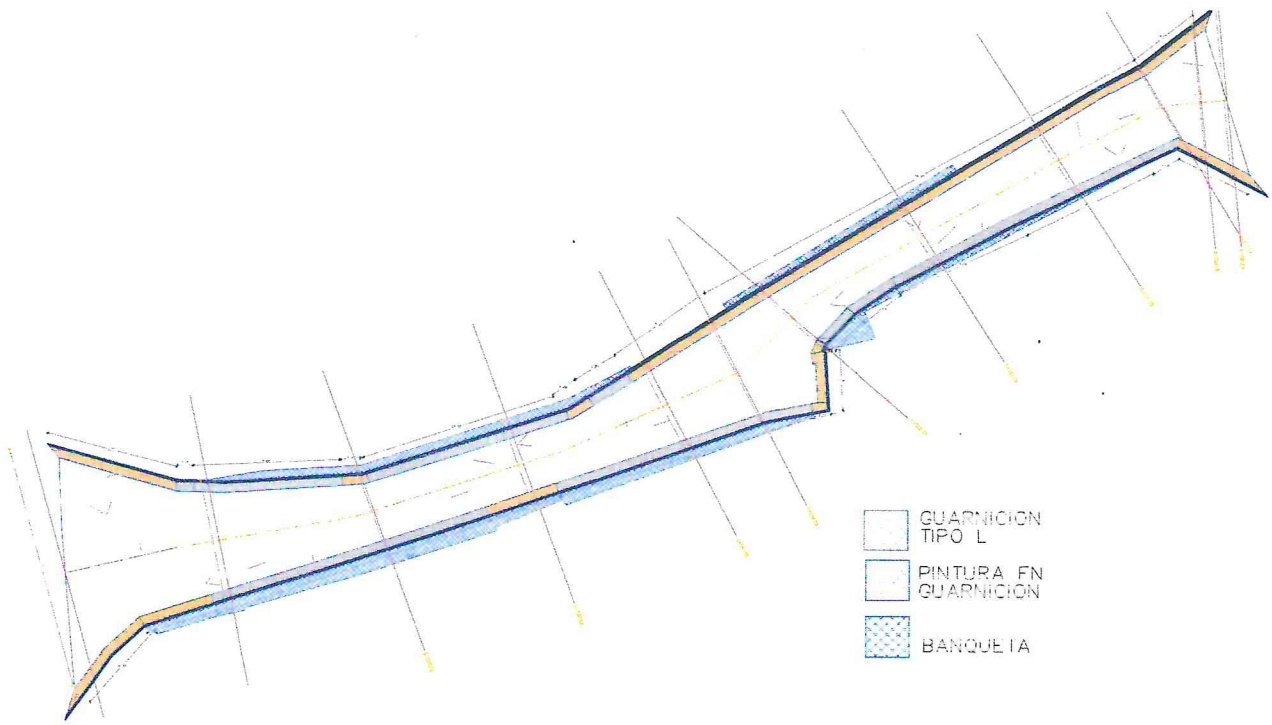

ELABORO.-

 C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

 ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONSTRUCCIONES LEIKAYRO S.A. DE C.V.
Turmalina 3 #1489, col. STASE I
C.P. 80020 Culiacán, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CT6

CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:
CONSTRUCCIONES LEIKAYROS S.A DE C.V		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO:	TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.	
R.F.C.	CLIE-070416-CP6	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA	

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:	
	CONCEPTO
101	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE
GP08	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL
GP08	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE
GP10	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,



ELABORO-

C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ

AUTORIZO.-

C.INQ. RUBIEL RINCON RAMOS



CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

Turmalina 3 #1489 col. STASE1
c.p. 80020 Culiacan, Sinaloa.
R.F.C. CLE-070416-CP6

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES LEKAYROS S.A DE C.V

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO:

TURMALINA 3 #1489, COL STASE 1 C.P 80020 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.

CLE-070416-CP6

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLÁN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CONCEPTO

ESTRUCTURA

2	
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE:
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y



ELABORO.-

[Signature]

**C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL**

REVISO.-

[Signature]

**ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA**

AUTORIZO.-

[Signature]

**C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS**



Fecha y hora de consulta29/09/2025 8:50:20 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago interbancario

Descripción:EST 01 AD FIN AD003

Importe de la operación:24,987.46 MXP

Cuenta de retiro:0124174836

Cuenta de depósito:021730040417112845

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta:LEKAYRO SA DE CV

Nombre banco destino: HSBC

Fecha valor:30/09/2025

Fecha de creación:29/09/2025

Fecha de aplicación:29/09/2025

Concepto de pago:EST 01 AD FIN AD003

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:ASD 6551749382

Hora de captura en el canal:20:50:18

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000833298

Clave de rastreo:002601002509300000833298

Folio de firma:0087402114

Folio único:I401202509292050180087402120

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	29/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/09/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
