



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

FECHA: 09 DE ENE DEL 2025

IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025


CALCULO: ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES

RM
CONSTRUCTORES

RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
RM CONSTRUCTORES
RFC: AAFR860128J39
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
BAMOA PUEBLO
CP: 81140
EMAIL: rm.constructores@gmail.com
CEL: 6876903744

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
I	TRABAJOS PRELIMINARES											
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA	M2							629.6	629.60		
										TOTAL	629.60	
1.2	DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2							8.64	8.64		
										TOTAL	8.64	

POR LA CONTRATISTA:


C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL


Vo.Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO


ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

FECHA: 09 DE ENE DEL 2025

IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025


CALCULO: ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES

RM
CONSTRUCTORES

RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
RM CONSTRUCTORES
RFC: AAFR860128J39
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
BAMOA PUEBLO
CP: 81140
EMAIL: rm.constructores@gmail.com
CEL: 6876903744

GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1.3	REPOSICION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M3							7.68	7.68		
										TOTAL	7.68	
1.4	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M2							20.16	20.16		
										TOTAL	20.16	


POR LA CONTRATISTA:



C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

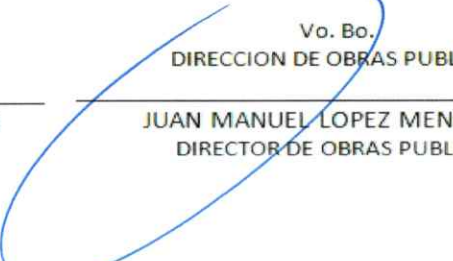

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR:

DEPARTAMENTO TECNICO



ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA												
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.												
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009		IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.										
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		PERIODO CONTRATO: 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025										
FECHA: 09 DE ENE DEL 2025		CALCULO: ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES										
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1.5	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2							20.16	20.16		
										TOTAL	20.16	
II	CIMENTACION											
2.1	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20 M DE 35 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" A C 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2-3/4", INCLUYE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	PZA						14.00		14.00		
										TOTAL	14.00	

POR LA CONTRATISTA:



 C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

 JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

 ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
 RESIDENTE DE SUPERVISION


<div><div>MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA</div><div></div></div>												
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.						<div><div>RM CONSTRUCTORES</div><div>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES RM CONSTRUCTORES RFC: AAFR660125J39 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BAMOA PUEBLO CP: 81140 EMAIL: rm.constructores@gmail.com CEL: 6876903744</div></div>						
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009			IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.									
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)			PERIODO CONTRATO: 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025									
FECHA: 09 DE ENE DEL 2025			CALCULO: ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES									
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
2.2	ANCLAS PARA FIJAR COLUMNA CON DADO ARMADA CON ANCLAS DE VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" 85 CM. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CM. INCLUYE ESTRIBOS DE 1/4" Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4"	JGO						14.00		14.00		
										TOTAL	14.00	
III	ESTRUCTURA											
3.1	COLUMNA DE 4.00 M FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAJONADO CON PLACA BASE DE 14" X 12" X 1/2" DE ESPESOR Y PLACA EN LA PARTE SUPERIOR DE 14"X12" DE 1/2" DE ESPESOR CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.	PZA						14.00		14.00		
										TOTAL	14.00	

POR LA CONTRATISTA:


C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


REVISOR:

DEPARTAMENTO TECNICO


ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION

<div><div>MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA</div><div></div></div>												
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.						<div><div>RM CONSTRUCTORES</div></div> <div>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES RM CONSTRUCTORES RFC: AAFR860128J39 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BAMOA PUEBLO CP: 81140 EMAIL: rm.constructores@gmail.com CEL: 6876903744</div>						
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009			IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.									
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)			PERIODO CONTRATO: 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025									
FECHA: 09 DE ENE DEL 2025			CALCULO: ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES									
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
3.2	TRABE DE MARCO FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 14 ENCAJONADA CON CLIPS DE ANGULAR DE 3" X 3/16", INCLUYE PLACA DE ACERO DE 14" X 12" X 1/2" PARA CONEXIÓN EN LA PARTE CENTRAL,Y EN LAS PARTES EXTREMAS PLACAS DE 14" X 12" X 1/2", SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.	PZA						7.00		7.00		
										TOTAL	7.00	


POR LA CONTRATISTA:



C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR

DEPARTAMENTO TECNICO



ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			<div>RM CONSTRUCTORES</div> <div>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES RFC: AAFPMG12029 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARBA FUEBLO C.P. 81140 EMAIL: rmconstructores@gmail.com CEL: 587603748</div>		
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009	IMPORTE \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.		PERIODO CONTRATO:			09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 09 DE ENE DEL 2025		FECHA: 09/ENE/2025			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
I	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA	M2	629.60	629.60	0.00	0.00	629.60	15.46	9,733.62
1.2	DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	8.64	8.64	0.00	0.00	8.64	1,049.94	9,071.48
1.3	REPOSICION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M3	7.68	7.68	0.00	0.00	7.68	864.41	6,638.67

POR LA CONTRATISTA:

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.				
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009	IMPORTE \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 09 DE ENE DEL 2025		FECHA: 09/ENE/2025		



RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
RM CONSTRUCTORES
RFC: AAFR860128L73
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
BARRA PUEBLO
CP: 81140
EMAIL: rm.constructores@gmail.com
CEL: 6679603744

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
1.4	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M2	20.16	20.16	0.00	0.00	20.16	431.06	8,690.17
1.5	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	20.16	20.16	0.00	0.00	20.16	287.36	5,793.18
								TOTAL PRELIMINARES	39,927.12
II	CIMENTACION								

POR LA CONTRATISTA:

Ramon Enrique AF

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			<div>RM CONSTRUCTORES</div> <div>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES RFC: SAPR000126J39 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BAMACA FLORES O CP: 81140 EMAIL: rm.constructores@gmail.com CEL: 6676502744</div>		
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009	IMPORTE \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO:	09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025			
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 09 DE ENE DEL 2025		FECHA: 09/ENE/2025			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
2.1	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20 M DE 35 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" A C 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2-3/4", INCLUYE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2	PZA	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	5,857.98	82,011.72
2.2	ANCLAS PARA FIJAR COLUMNA CON DADO ARMADA CON ANCLAS DE VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" 85 CM. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CM. INCLUYE ESTRIBOS DE 1/4" Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4"	JGO	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	2,459.01	34,426.14
TOTAL CIMENTACION									116,437.86
III	ESTRUCTURA								

POR LA CONTRATISTA:

Ramon Enrique A.F.

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			<div>RM CONSTRUCTORES</div> <div>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES RM CONSTRUCTORES RFC: SATF800128339 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SANCAR PUEBLO CP: 81140 EMAIL: rm.constructores@gmail.com CEL: 6676602744</div>	
CONTRATO:	IPR-DOP-SIN-2024-009	IMPORTE \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO:		09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO)	PERIODO:	DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 09 DE ENE DEL 2025		FECHA: 09/ENE/2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
3.1	COLUMNA DE 4.00 M FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAJONADO CON PLACA BASE DE 14" X 12" X 1/2" DE ESPESOR Y PLACA EN LA PARTE SUPERIOR DE 14"X12" DE 1/2" DE ESPESOR CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.	PZA	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	9,510.45	133,146.30
3.2	TRABE DE MARCO FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 14 ENCAJONADA CON CLIPS DE ANGULAR DE 3" X 3/16", INCLUYE PLACA DE ACERO DE 14" X 12" X 1/2" PARA CONEXIÓN EN LA PARTE CENTRAL Y EN LAS PARTES EXTREMAS PLACAS DE 14" X 12" X 1/2", SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE.	PZA	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	54,436.08	381,052.56
TOTAL ESTRUCTURA:									514,198.86

IMPORTE SIN I.V.A.	670,563.84
IVA (16%)	107,290.21
Total:	777,854.05

POR LA CONTRATISTA:

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			 RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES RM CONSTRUCTORES RFC: AAFR660126239 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BAROJA PUEBLO CP: 81140 EMAIL: rm-constructores@gmail.com CEL: 6676903744
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009	IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 09 DE ENE DEL 2025	FECHA: 09 DE ENE DEL 2025	
			HOJA: 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TRABAJOS PRELIMINARES \$39,927.12
TOTAL CIMENTACION \$116,437.86
ESTRUCTURA \$514,198.86

SUB-TOTAL DE OBRA: \$670,563.84
I.V.A. (16%): \$107,290.21
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$777,854.05

DEDUCCIONES:

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$20,116.92

Suma de deducciones \$20,116.92

Neto a pagar de esta estimacion: **\$757,737.13**

(Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA:

Ramon Enrique AT-

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.			 RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES RM CONSTRUCTORES RFC: AAFR660126J35 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BARRA PUEBLO C.P.R. 41160 EMAIL: rm.constructores@gmail.com CEL: 4876963744	
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009	IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)	PERIODO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 09 DE ENE DEL 2025	FECHA: 09 DE ENE DEL 2025	HOJA: 1 DE 1	

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. \$670,563.84

SUB-TOTAL DE OBRA: \$670,563.84
I.V.A. (16%): \$107,290.21
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$777,854.05

DEDUCCIONES:


INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$20,116.92

Suma de deducciones \$20,116.92

Neto a pagar de esta estimacion: **\$757,737.13**

(Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA:


C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO OBRA: DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.					 RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES RM CONSTRUCTORES RFC: AAFR860128J39 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BANCA PUEBLO CP. 81140 EMAIL: rm.constructores@gmail.com CEL. 6876903744	
CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009		PERIODO CONTRATO: 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025				
IMPORTE CONTRATO: \$1,868,931.46		CON I.V.A.	IMPORTE ANTICIPO: \$0.00			CON I.V.A.
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)		PERIODO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 09 DE ENE DEL 2025		FECHA: 09 DE ENE DEL 2025		HOJA: 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA									
ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 %				AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%)	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 09 DE ENE DEL 2025	\$777,854.05	\$20,116.92				\$0.00	\$20,116.92	\$757,737.13
TOTALES		\$777,854.05	\$20,116.92				\$0.00	\$20,116.92	\$757,737.13
SALDO DEL CONTRATO:		\$1,091,077.41	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO				\$0.00		

POR LA CONTRATISTA:

Ramon Enrique AP

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN
RESIDENTE DE SUPERVISION
