



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/457/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO

ESTIMACION 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 18 de Agosto de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **SAÚL GILBERTO DELGADO SANTILLANES**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-LP-FAISMUN-005/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$ 2,256,160.78 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 78/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 0 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$775,615.74 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
- **R.F.C.** DESS020903L84
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE ARARAT #2024-A, COLONIA INFONAVIT, SOLIDARIDAD, C.P. 80058, CULIACÁN, SINALOA.
- **No. DE FACTURA:** # 47, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**

TESORERÍA


Alexis

18 AGO 2025

1:18 PM

RECIBIDO

C.C.P. ARCHIVO.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 47

Fecha: 18/Ago/2025 10:19:58

Lugar de expedición (C.P.) 80058

Emisor

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

RFC: DESS020903L84

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: ARARAT A-2024 INFONAVIT Solidaridad Culiacán Sinaloa México 80058

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	1.00	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL REFERENTE AL CONTRATO No: MBGBR-LP-FAISMUN-005/2025 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. MONTO DEL CONTRATO: \$ 2,256,160.78 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 1,071,292.46 MAS I.V.A 16 % \$ 171,406.79 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,242,699.25 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 374,952.36 MAS I.V.A.: \$ 59,992.38 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 434,944.74 IMPORTE TOTAL A FACTURAR \$ 696,340.10 MAS I.V.A \$ 111,414.41 MONTO NETO A FACTURAR \$ 807,754.51 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 32,138.77 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 467,083.51 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 775,615.74	\$696,340.10	IVA, - Importe: 111414.41	\$696,340.10

Total con letra:
ochocientos siete mil setecientos cincuenta y cuatro Pesos 51/100 M.N.



Subtotal: \$696,340.10
IVA 16 %: \$111,414.41
Total: \$807,754.51

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830667
Folio Fiscal: D8E42159-4DE8-42EF-B432-3896D38CDECF
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-08-18T11:20:04

Sello digital del CFDI

PIRjGPxSQi5BmRdYeSZSWzNYOBbonwIX/Sy++7Orv7xtGnhuvGTL6pu0qI4I6nIHxiiP0gkz4OVgqRGLbPUEYvTLyy07IGTQOkzxuu4HMS2WI+rvE6I4WXZjGURnOhPm58jYa7q5qwGR0R8d2zdNrmIteQ4mbu5zom59Mxwm3JEYVQy6odypOf6uiuj4TBLEInOIZ+F/FcRYFslDc5d3jkSSGzG6RXTN10HJQiuYr9KLx+79cr79FVDITmjPohouLQaTmIRguVQP4hSC5EYWRV88JpQUqJl+BZ3TV/SiBB8oGGi4kpeqIgtRhgidIHS/b2j8fvpbeVvnKEjqHKA==

Sello del SAT

D9+WT0Og5nCF38JJOpvHhPOA8IErL+wH3v7RkmBQchCNSEm1mQj1ACAA910kokETQJvZ3XZZbOmgsALr+MsyzBiSwGti8+M+7ohKVsfqwZO68FdOsTeo+GYlgK2INqqSugwPmKCHJuTVJblIY/IfiOmIMCCUPUGDxFdqymOxNhQrz4A8mzpAFI3f9Y7lskyEX6hQGa08AaqMdC50SIE0JwLBNciizhnJkgyZgaqbO2IDPOMGAnl2nn+xrnhMRHTxS1y8jGh8V3DoB5b9rXFPmq34MwdugswcTirUVjTsp0TmD0LCUCfXhJlywcnThPtUraQk+QjdKIfcUQ+q88ZKTYA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D8E42159-4DE8-42EF-B432-3896D38CDECF|2025-08-18T11:20:04|MAS0810247C0|PIRjGPxSQi5BmRdYeSZSWzNYOBbonwIX/Sy++7Orv7xtGnhuvGTL6pu0qI4I6nIHxiiP0gkz4OVgqRGLbPUEYvTLyy07IGTQOkzxuu4HMS2WI+rvE6I4WXZjGURnOhPm58jYa7q5qwGR0R8d2zdNrmIteQ4mbu5zom59Mxwm3JEYVQy6odypOf6uiuj4TBLEInOIZ+F/FcRYFslDc5d3jkSSGzG6RXTN10HJQiuYr9KLx+79cr79FVDITmjPohouLQaTmIRguVQP4hSC5EYWRV88JpQUqJl+BZ3TV/SiBB8oGGi4kpeqIgtRhgidIHS/b2j8fvpbeVvnKEjqHKA==|00001000000709182898||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGKDCB8CgAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4MzA2NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVoQDDCxBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUgQUJNSU5JU1RSQUJ0T04gVFJ0Q1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-08-18T10:19:58" Folio="47" FormaPago="03" LugarExpedicion="80058" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711830667"
Sello="PIRJGP5x5Qi5BmRdyESZSWzNY08bonw1X/Sy++70rv7x1GnhuvGTL6pu0qI416ntHNxiIP0gkz40VgqRGLbPUEYvTLyy07fGTQ0kzxuu4HMS2WI+rvE6I4WXZjGURnOhPm58jYa7q5qwGR0R8
SubTotal="696340.10" TipoDeComprobante="I" Total="807754.51" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES" RegimenFiscal="612" Rfc="DESS020903L84"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72121406" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE ESCUELAS PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL REFERENTE AL CONTRATO No: MB6BR-LP-FAISMUN-005/2025 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, MONTO DEL CONTRATO: $ 2,256,160.78 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,071,292.46 MAS I.V.A 16 % $
171,406.79 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,242,699.25 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 374,952.36 MAS I.V.A.: $ 59,992.38 TOTAL AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPO: $ 434,944.74 IMPORTE TOTAL A FACTURAR $ 696,340.10 MAS I.V.A $ 111,414.41 MONTO NETO A FACTURAR $ 807,754.51 RETENCIÓN 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $
32,138.77 TOTAL DEDUCCIONES: $ 467,083.51 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 775,615.74 Importe="696340.10" NoIdentificacion="SER02" ObjetoImp="02"
ValorUnitario="696340.10">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="696340.10" Importe="111414.41" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="111414.41">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="696340.10" Importe="111414.41" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D8E42159-4DE8-42EF-B432-3896D38CDECF"
FechaTimbrado="2025-08-18T11:20:04" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="PIRJGP5x5Qi5BmRdyESZSWzNY08bonw1X/Sy++70rv7x1GnhuvGTL6pu0qI416ntHNxiIP0gkz40VgqRGLbPUEYvTLyy07fGTQ0kzxuu4HMS2WI+rvE6I4WXZjGURnOhPm58jYa7q5
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="D9+WT00g5nCf38J00pvHhP0A8IErL+wH3v7RkmbQchCNSEm1mQj1ACAA910kckETQjvZ3xZZbOmgsALn+MszvBiSwGtI8+M+7ohKVsfqwZ068Fd0sTec+GylgK2INnqSugwPmKCHJut
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DESS020903L84	SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8E42159-4DE8-42EF-B432-3896D38CDECF	2025-08-18T10:19:58	2025-08-18T11:20:04	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$807,754.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 6 de agosto de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES			ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL	
DOMICILIO:	Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa			PERIODO DE ESTIMACIÓN:		
TELÉFONO:	CEL:			DEL	23-jul-25	
				AL	05-ago-25	
R.F.C.	0			FECHA DE CONTRATO:		
DEPENDENCIA.-				19-jul-25		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA						
			LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
			BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:	23-jul-25
					TERMINACIÓN:	19-nov-25
DESCRIPCIÓN:						
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA						
CONTRATO No:						
MBGBR-LP-FAISMUN-005/2025						
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA		IMPORTE CON IVA DE LA OBRA		35% ANTICIPO DE LA OBRA		
\$1,944,966.19		\$2,256,160.78		\$789,656.27		
				IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		
				\$2,256,160.78		
				BUENO POR:	\$ 775,615.74	
RECIBI :						
\$ 775,615.74		(SON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M.N.)				
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		01 NORMAL				
DEDUCCIONES:						
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%		\$ 374,952.36	CALCULO DE ESTIMACIÓN			
MAS I.V.A.:		\$ 59,992.38	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA			
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 434,944.74	MAS I.V.A 16 %			
3 % SVIFYC:		\$ 32,138.77	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA			
TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 467,083.51	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:			
			MONTO A FACTURAR MAS IVA			
			\$ 807,754.51			
				SALDO A PAGAR:		
				\$ 775,615.74		

ELABORÓ:-


C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZ

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y



SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			Fecha:		Estimacion:		
			6 de agosto de 2025		01 NORMAL		
Periodo de la estimacion:		23/07/2025	05/08/2025	Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:		23/07/2025	19/11/2025	BADIRAGUATO		MBGBR-LP-FAISMUN-005/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 2,256,160.78		\$ 1,944,966.19		\$ 789,656.27		\$ 680,738.16	55%
							% Avance Total
							55%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 1,071,292.46	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 171,406.79	
\$ 434,944.74	Sub- Total A (=)	\$ 1,242,699.25	\$ 1,242,699.25
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ 374,952.36	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ 59,992.38	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ 434,944.74	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR	\$ 696,340.10	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 111,414.41	TOTAL ACUMULADO.
\$ 434,944.74	Total (=)	\$ 807,754.51	\$ 1,242,699.25
	3 % SVIFYC:	\$ 32,138.77	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 467,083.51	CONTRATADO
\$ 789,656.27	Importe T O T A L	\$ 775,615.74	\$ 2,256,160.78
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$ 775,615.74	SALDO
\$354,711.53	Son:		\$ 1,013,461.53
	(SON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 74/100 M.N.)		

ELABORO.-

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

C.ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.


ELABORO:-

REVISO:-

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DOMICILIO:

Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

0

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

FECHA

6 de agosto de 2025

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:

BADIRAGUATO

ESTIMACIÓN:

01 NORMAL

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:

\$ 1,944,966.19

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$ 789,656.27

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$ 2,256,160.78

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 106,714.95
2	CIMENTACION	\$ 167,496.41
3	ESTRUCTURA	\$ 797,081.10
4	ALBAÑILERIA	\$ -
5	ACABADOS	\$ -
6	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ -
7	TRABAJOS FINALES	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 1,071,292.46

SUB TOTAL=

\$ 1,071,292.46

I.V.A AL 16 %

\$ 171,406.79

TOTAL =

\$ 1,242,699.25

ELABORO:


C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.




DESGLOSE

CONTRATISTA:		SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA	miércoles, 6 de agosto de 2025	
DOMICILIO:		Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.		0		1 de 2		
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN										
		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL		
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA								
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,944,966.19		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$789,656.27		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		
								\$2,256,160.78		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	254.39	\$ 14.54	\$ 3,698.83	254.39	0.00	254.39	\$	3,698.83
GBR39	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	292.21	\$ 129.81	\$ 37,931.78	292.21	0.00	292.21	\$	37,931.78
GP1077	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	16.34	\$ 814.36	\$ 13,306.64	16.34	0.00	16.34	\$	13,306.64
GP153	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA Y/O LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	141.90	\$ 84.36	\$ 11,970.68	141.90	0.00	141.90	\$	11,970.68
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	50.63	\$ 482.20	\$ 24,413.79	50.63	0.00	50.63	\$	24,413.79
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.	M3	39.89	\$ 330.03	\$ 13,164.90	39.89	0.00	39.89	\$	13,164.90
GP03	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$ 59.60	\$ 59.60	1.00	0.00	1.00	\$	59.60
2	CIMENTACION									
GP2448	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA Y	M2	33.75	\$ 317.35	\$ 10,710.56	33.75	0.00	33.75	\$	10,710.56
GP206	ZAPATA AISLADA DE 1.5X1.5X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES EN 2 LECHOS , COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00	\$ 7,554.29	\$ 113,314.35	15.00	0.00	15.00	\$	113,314.35
GP209	DADO DE 35X35 CM DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	15.00	\$ 2,898.10	\$ 43,471.50	15.00	0.00	15.00	\$	43,471.50

ELABORÓ: C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: C.ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO: C. ING. RUBIEL-RINCON RAMOS DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

FECHA		miércoles, 6 de agosto de 2025	
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO:		Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa	
R.F.C.		0	
ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
LOCALIDAD:		BADIRAGUATO	
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,944,966.19	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$789,656.27	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$2,256,160.78	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.				
3	ESTRUCTURA							
GBR93	TRABE DE 0.20X0.40 M, ARMADA CON 6 VARS # 1/2" Y EST # 1/4 @ 20 CM. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, TRASLAPES MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	49.86	\$ 1,349.53	\$ 67,287.57	0.00	49.86	\$ 67,287.57
GBR94	TRABE DE 0.25X0.50 M, ARMADA CON 6 VARS 5/8" Y EST #3 @ 2.0CM. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, TRASLAPES MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	24.93	\$ 1,696.00	\$ 42,281.28	0.00	24.93	\$ 42,281.28
GBR95	LOSA MACIZA A DOS AGUAS ESPESOR DE 0.10M, CON BASTONES DE # 3 @ 40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y @ 40CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: CONCRETO, BOMBEEABLE, CON RESISTENCIA	M2	285.50	\$ 2,589.50	\$ 687,512.25	0.00	285.50	\$ 687,512.25
4	ALBANILERIA							
5	ACABADOS							
6	INSTALACIONES ESPECIALES							
7	TRABAJO FINALES							
					SUB-TOTAL			1,071,292.46
					IVA			171,406.79
					MONTO TOTAL			1,242,699.25

AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

REVISADO
C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

ELABORADO
C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
01 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2	24.94	10.20			254.39	
								TOTAL	254.39	
GBR39	DESMANTELAMIENTOS DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2						
				LOSA	24.94	10.20			254.39	
				VENTANAS POSTERIORES	3.88	1.34		3.00	15.60	
				HERRERIA POSTERIOR	3.94	2.36			9.30	
				VENTANAS FACHADAS	2.87	1.36			3.90	
				PUERTAS	0.96	2.35		4.00	9.02	
								TOTAL	292.21	
GP1077	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.			M3						
			ZAPATA	15.00	1.50	1.5000	0.10	3.38		
			MUROS	15.00	2.88	2.0000	0.15	12.96		
								TOTAL	16.34	
GP153	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA Y/O LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			ML					141.90	
			ZAPATA	15.00	4.00				60.00	
			MUROS	15.00	2.73	2.00			81.90	
								TOTAL	141.90	
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.			M3	1.50	1.50	1.50	15.00	50.63	
								TOTAL	50.63	
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			M3						
				AREA DE EXCAVACION					50.63	
				AREA DE ZAPATA	1.50	-0.25	1.50	15.00	-8.44	
				AREA DE DADO	1.25	-0.35	0.35	15.00	-2.30	
								TOTAL	39.89	
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO.									
				AREA DE ZAPATA	1.50	0.25	1.50	15.00	8.44	
		RELLENO		AREA DE DADO	1.25	0.35	0.35	15.00	2.30	
								TOTAL	10.74	
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2	1.50	1.50		15.00	33.75	
								TOTAL	33.75	

ELABORO.-
C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
C. ARQ. BRICEIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
01 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
2	CIMENTACION									
GP2448	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO. REGLEADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2	1.50	1.50		15.00	33.75	
								TOTAL	33.75	
GP206	ZAPATA AISLADA DE 1.5X1.5X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES EN 2 LECHOS , COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA				15.00	15.00	
								TOTAL	15.00	
GP209	DADO DE 35X35 CM DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.			PZA				15.00	15.00	
								TOTAL	15.00	
3	ESTRUCTURA									
GBR93	TRABE DE 0.20X0.40 M, ARMADA CON 6 VARS # 1/2" Y EST # 1/4 @ 20 CM. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, TRASLAPES MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			ML	24.93				24.93	
				ML	24.93				24.93	
								TOTAL	49.86	
GBR94	TRABE DE 0.25X0.50 M, ARMADA CON 6 VARS 5/8" Y EST #3 @ 2 0CM. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, TRASLAPES MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			ML	24.93				24.93	
								TOTAL	24.93	
GBR95	LOSA MACIZA A DOS AGUAS ESPESOR DE 0.10M, CON BASTONES DE # 3 @ 40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y @ 40CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL . INCLUYE: CONCRETO BOMBEABLE CON RESISTENCIA RAPIDA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO			M2	24.93		10.65		265.50	
								TOTAL	265.50	

ELABORO.-
C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-
C. ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa

R.F.C. 0


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:


CROQUIS ESTIMACION:	
CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA,
	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A
	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA Y/O LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.
	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA,
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.
	AFINE DE FONDOS Y TALÚDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



FACHADA FRONTAL



FACHADA POSTERIOR



FACHADA LATERAL

ELABORO:


C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa

R.F.C. 0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA



CROQUIS ESTIMACION:

CIMENTACION

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4",

ZAPATA AISLADA DE 1.5X1.5X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES EN 2 LECHOS, COLADA CON

DADO DE 35X35 CM DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON

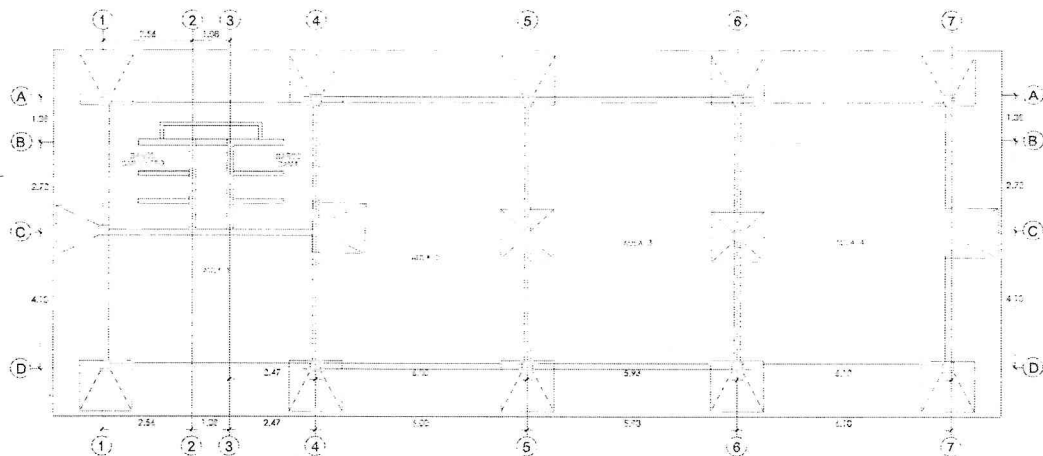

ZAPATA AISLADA DE 1.5X1.5X0.30
MTS DE ESPESOR ARMADA CON
VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN
AMBAS DIRECCIONES EN 2
LECHOS, COLADA CON CONCRETO
F'C=100 kg/cm²
DADO DE 35X35 DE 80CMS DE
ALTURA

ELABORO:


C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL CRINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa



R.F.C. 0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

ESTRUCTURA

TRABE DE 0.20x0.40 M, ARMADA CON 6 VARS # 1/2" Y EST # 1/4 @ 20 CM. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, TRASLAPES MATERIAL, MANO DE OBRA,
TRABE DE 0.25x0.50 M, ARMADA CON 6 VARS 5/8" Y EST #3 @ 2.0CM. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, TRASLAPES MATERIAL, MANO DE OBRA,
LOSA MACIZA A DOS AGUAS ESPESOR DE 0.10M. CON BASTONES DE # 3 @40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y @40CMS EN SENTIDO

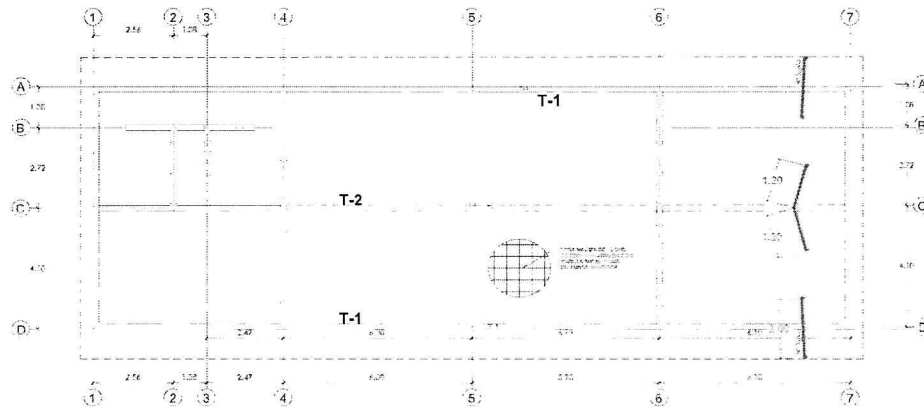

ELABORO.-


SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DOMICILIO:

Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

0

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA





DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
	PRELIMINARES
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA,
	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE CON DISCO, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.
	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN BANQUETA Y/O LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.
	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA,
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.
	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

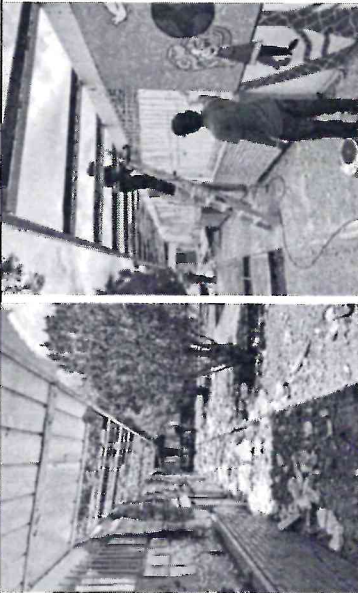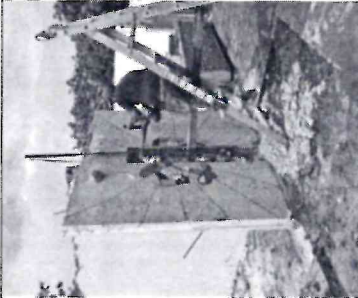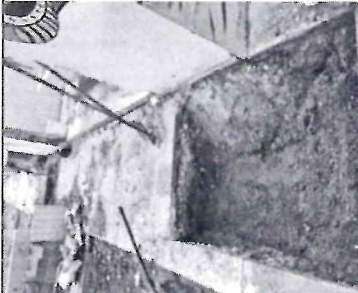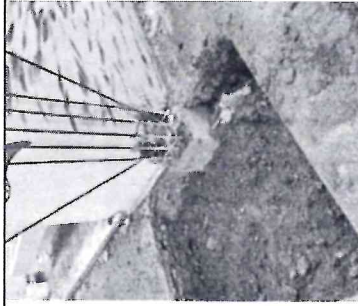

ELABORO:-


REVISO:-

AUTORIZO:-

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa


R.F.C.: 0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
	CIMENTACION
	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE :
	ZAPATA AISLADA DE 1.5X1.5X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES EN 2 LECHOS , COLADA CON
	DADO DE 35X35 CM DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN

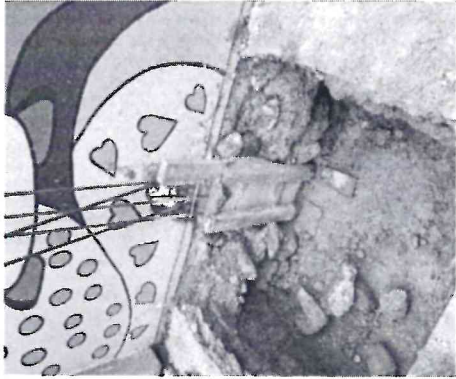

ELABORO:-



C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-

ARO. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:
R.F.C.
OBRA:

Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa




0

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
	ESTRUCTURA
	TRABE DE 0.20X0.40 M, ARMADA CON 6 VARS # 1/2" Y EST # 1/4 @ 20 CM. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, TRASLAPES MATERIAL, MANO DE OBRA,
	TRABE DE 0.25X0.50 M, ARMADA CON 6 VARS 5/8" Y EST #3 @ 2 0CM. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, TRASLAPES MATERIAL, MANO DE OBRA,
	LOSA MACIZA A DOS AGUAS ESPESOR DE 0.10M, CON BASTONES DE # 3 @40 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y @40CMS EN SENTIDO LONGITUDINAL .

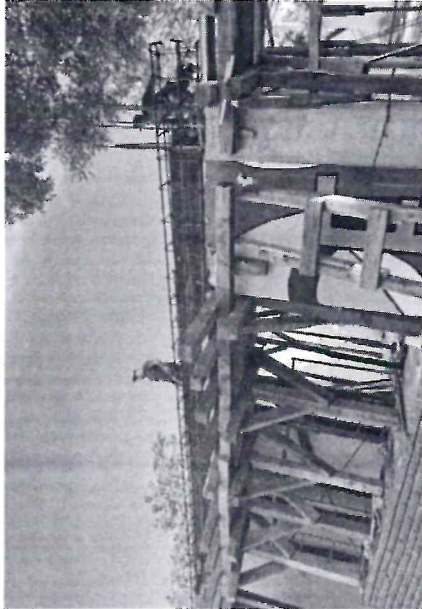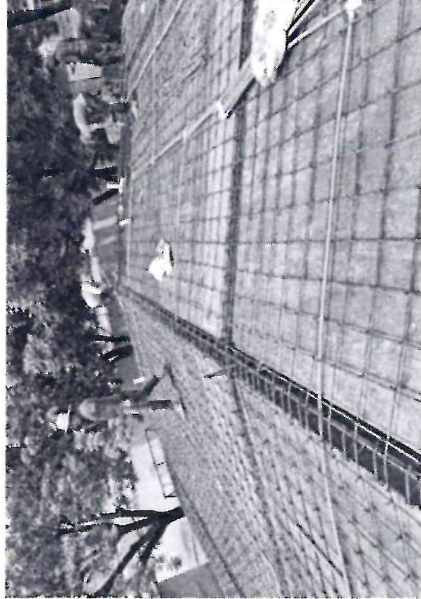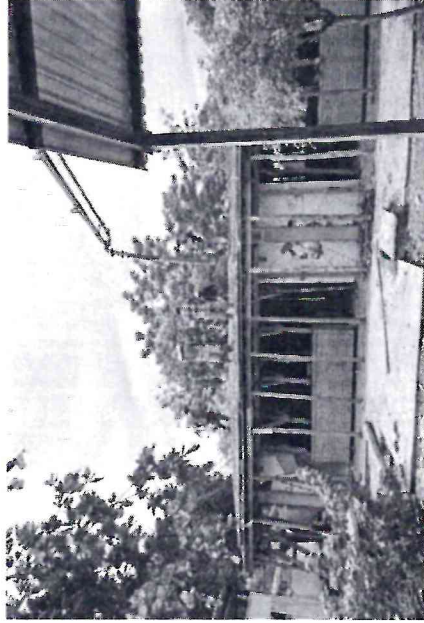

ELABORO:-

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta

21/08/2025 9:23:11 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NORM LP 005

Importe de la operación: 775,615.74 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012783467405

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 22/08/2025

Fecha de creación: 21/08/2025

Fecha de aplicación: 21/08/2025

Concepto de pago: EST 01 NORM LP 005

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 21:22:57

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000916152

Clave de rastreo: 002601002508220000916152

Folio de firma: 0006839080

Folio único: I401202508212122570006839086

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/08/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/08/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
