

OFICIO No. OPDUyE/544/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO
ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 03 de Octubre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SAÚL GILBERTO DELGADO SANTILLANES, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-005/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 2,256,160.78 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 78/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$632,539.79 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
- R.F.C. DESS020903L84
- DOMICILIO FISCAL: CALLE ARARAT #2024-A, COLONIA INFONAVIT, SOLIDARIDAD, C.P. 80058, CULIACÁN, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # 64, DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE


ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
C.C.P. ARCHIVO
BADIRAGUATO, SINALOA.



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

1.413 Pm
06 OCT 2025

Yedony
RECIBIDO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 64

Fecha: 02/Oct/2025 17:17:26

Lugar de expedición (C.P.) 80058

Emisor
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
RFC: DESS020903L84
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio: ARARAT A-2024 INFONAVIT Solidaridad Culiacán Sinaloa México 80058

Receptor
Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
RFC: MBA850101214
Uso CFDI: I01 - Construcciones
Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 80500
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Información de cancelación
Motivo de cancelación:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de
Tipo de cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	1.00	<p>PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MRGBR-LP-FAISMUN-005/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 2,256,160.78</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 873,673.73 MAS I.V.A 16 % \$ 139,787.80 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,013,461.53</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 305,785.80 MAS I.V.A.: \$ 48,925.73 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 354,711.53</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 567,887.93 MAS I.V.A \$ 90,862.06 MONTO NETO A FACTURAR \$ 658,750.00</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y.C.) : \$ 26,210.21 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 380,921.74</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 632,539.79</p>	\$567,887.93	IVA, - Importe: 90862.07	\$567,887.93

Total con letra:

seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$567,887.93**IVA 16 %:** \$90,862.07**Total:** \$658,750.00**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Serie del Certificado del emisor:** 00001000000711830667**Folio Fiscal:** BE8297EC-707A-42FE-9AFC-74EB3471792E**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000709182898**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T18:17:31**Sello digital del CFDI**

X2/VAUP0FLhYuByMsYd4czb14ndyOBoXDro8Vnfd/HdpNliKvAInVw6ZTNMQpWf9JGYmRwWN8W2kL5/Sedf2o2JP9gTzC/g3HyAikDW/WLj775CNy8EGfvl8baFAVfK9ncjDKnUAmMBh/bMq9UJBqTcxLvtTvaJG11bgeLxZpRaiS46Jl0pRA1DSzfdeH0hZqRi5F0mDG32lthGr73QIPDj07oG3JlLAIfpO/DAfGNxLZKK0Ja4e1znRcQeeKs6dZjRRYqdbKd3lNXFOkRbmqtH85BhW6lWnr16mbtNhpPBbF6Q2hyN8y7q/VHEovyZHI4NOBGGVJ5laF7Q==

Sello del SAT

bd4niJcgo204Y/QCE8k01ueIM7SdHwzS4jElyTWfosRPn40N0cAGEBCshd7DR/4LJKyPnHw9Lzs0KV9WJmnH6P7/Az3lIKYS/P4QIDR7N2ghK1Mz51nyD38KK/2XZ8G7AE5091y10VqWYvc85m2RSwX8d8CNjvJICNymGWMNX6AOSwUE1VFRmzyyK1d0e6Xu9o10m5WNTqZ0fnkAigzICzkoJqfInENb9MaGt+bWnk744W/Jh7WuyWKGfRip8KDZMV4Ya66iZR+1BIVqbog56HJTaiZwe8okczPAPmPgm2adD/7IjYzG3db9kwx2UEI9DfYD17wqddmzT5pw4CA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|BE8297EC-707A-42FE-9AFC-74EB3471792E|2025-10-02T18:17:31|MAS0810247C0pX2/VAUP0FLhYuByMsYd4czb14ndyOBoXDro8Vnfd/HdpNliKvAInVw6ZTNMQpWf9JGYmRwWN8W2kL5/Sedf2o2JP9gTzC/g3HyAikDW/WLj775CNy8EGfvl8baFAVfK9ncjDKnUAmMBh/bMq9UJBqTcxLvtTvaJG11bgeLxZpRaiS46Jl0pRA1DSzfdeH0hZqRi5F0mDG32lthGr73QIPDj07oG3JlLAIfpO/DAfGNxLZKK0Ja4e1znRcQeeKs6dZjRRYqdbKd3lNXFOkRbmqtH85BhW6lWnr16mbtNhpPBbF6Q2hyN8y7q/VHEovyZHI4NOBGGVJ5laF7Q==|000010000007091828


This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGKCCBBGAWI0AGIUMDAWMDAwMDA3MTE4MzA2NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwGUGU0VSVK1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-10-02T17:17:26" Folio="64" FormaPago="03" LugarExpedicion="80053" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711830667"
Sello="X2jVAUP0FLhYuByMsYd4czb14ndy08oXDro8Vnfd/HdpNliKvAtNVw8ZTNMQpWfd9JGymRWwN8W2kL5/Sedf2o2jP9gTzC/g3HyAIKDW/WLj775CNy8EGffvL6baFAVfK9ncjDKnUAmMBh/bmq
SubTotal="567887.93" TipoDeComprobante="I" Total="658750.00" Version="4.0"
<cfdi:Emisor Nombre="SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES" RegimenFiscal="612" Rfc="DESS020903L84"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA050101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72121406" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE ESCUELAS PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGDR-LP-FAISMUN-005/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 2,256,160.78 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 873,673.73 MAS
I.V.A 16 % $ 139,787.80 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,013,461.53 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 305,785.80 MAS I.V.A.: $ 48,925.73 TOTAL
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 354,711.53 IMPORTE TOTAL A FACTURAR $ 567,887.93 MAS I.V.A $ 90,862.06 MONTO NETO A FACTURAR $ 658,750.00 RETENCIÓN 3% (
S.V.I.F.Y.C.) : $ 26,210.21 TOTAL DEDUCCIONES: $ 380,921.74 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 632,539.79" Importe="567887.93" NoIdentificacion="SER02"
ObjetoImp="02" ValorUnitario="567887.93">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="567887.93" Importe="90862.07" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="90862.07">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="567887.93" Importe="90862.07" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="BE8297EC-707A-42FE-9AFC-74EB3471792E"
FechaTimbrado="2025-10-02T18:17:31" RfcProvCertif="MAS0010247C0"
SelloCFD="X2jVAUP0FLhYuByMsYd4czb14ndy08oXDro8Vnfd/HdpNliKvAtNVw8ZTNMQpWfd9JGymRWwN8W2kL5/Sedf2o2jP9gTzC/g3HyAIKDW/WLj775CNy8EGffvL6baFAVfK9ncjDKnUAM
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="bd4niJcgo294Y/QCE8k0iue1M7SdhwzS4jElyTwfosRpn40W0cAGEBCshd7DR/4LJKyPnHw9LzstXV19WJmH6P7jAz3tIKYsJP4QIDR7N2ghK1Mz51/nyD38KK/2XZ8Gj7AE5691yf
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DESS020903L84	SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE8297EC-707A-42FE-9AFC-74EB3471792E	2025-10-02T17:17:26	2025-10-02T18:17:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$658,750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 64

Fecha: 02/Oct/2025 17:17:26

Lugar de expedición (C.P.) 80058

Emisor

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

RFC: DESS020903L84

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio:

ARARAT A-2024 INFONAVIT Solidaridad Culiacán Sinaloa México 80058

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	1.00	<p>PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MRGBR-I-P-FAISMUN-005/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 2,256,160.78</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 873,673.73 MAS I.V.A 16 % \$ 139,787.80 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,013,461.53</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 305,785.80 MAS I.V.A.: \$ 48,925.73 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 354,711.53</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 567,887.93 MAS I.V.A \$ 90,862.06 MONTO NETO A FACTURAR \$ 658,750.00</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 26,210.21 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 380,921.74</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 632,539.79</p>	\$567,887.93	IVA, - Importe: 90862.07	\$567,887.93

Total con letra:
seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$567,887.93

IVA 16 %: \$90,862.07

Total: \$658,750.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830667
Folio Fiscal: BE8297EC-707A-42FE-9AFC-74EB3471792E
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T18:17:31

Sello digital del CFDI

X2jVAUP0FLHyuByMsYd4czb14ndyOB0xDro8Vnfd/HdpNIIKvAtNVw8ZTNMQpWfd9JGYmRwWN8W2kL5/Sedf2o2jP9gTzC/g3HyAIKDW/WLj775CNy8EGffvL6baFAV/K9ncjDKnUAmMBh/bMq9uBqTcxLvieTvaJG11bgeLxZpRaiS46Ji0pRA1DSzJdE18hZqRi5F6mDG32tuhGr73QIPDj07oG3JlAlfPpO/DAdNkLZKk0Ja4e1znRcQeeKs6dZdRRYqdbKd38NXFOkRbmqtH5Bhnm6lwNr18mbtNhPBuF6Q2hyN8y7q/VHEovyzHi4NOBGGVJ5laF7Q==

Sello del SAT

bd4niJcgo204Y/QCE8k01uelM7SdHwzS4jElyTWfseRPh40N0cAGEBCshd7DR/4LJKyPnHw9LzaUXV9WJmnH6P7/Az3dKYS/P4QIDR7N2ghK1MzS1/nyD38KK/2XZ8Gj7AE5001yIOVqWjyc65m2RSwX6d8CNJvJICFvmGWMNX6AOSwUE1V/RmzyyK1d0e0Xu0e10m5WNTqZ6fnkAiqz/CzkoJqfFInENbMaGt+bWNk744W/Jh7WuyWkrRlp0KDZMV4Ya66iZR+1BIVqboq58HJTaIZwe0okczPAPmPgm2adD/7IjYzG3db9kwx2UEI9DIYD17wqqdmzT5pw4CA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|BE8297EC-707A-42FE-9AFC-74EB3471792E|2025-10-02T18:17:31|MAS0810247C0pX2jVAUP0FLHyuByMsYd4czb14ndyOB0xDro8Vnfd/HdpNIIKvAtNVw8ZTNMQpWfd9JGYmRwWN8W2kL5/Sedf2o2jP9gTzC/g3HyAIKDW/WLj775CNy8EGffvL6baFAV/K9ncjDKnUAmMBh/bMq9uBqTcxLvieTvaJG11bgeLxZpRaiS46Ji0pRA1DSzJdE18hZqRi5F6mDG32tuhGr73QIPDj07oG3JlAlfPpO/DAdNkLZKk0Ja4e1znRcQeeKs6dZdRRYqdbKd38NXFOkRbmqtH5Bhnm6lwNr18mbtNhPBuF6Q2hyN8y7q/VHEovyzHi4NOBGGVJ5laF7Q==|000010000007091828

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGKDCBBBgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4MzA2NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwYDVQQDDCY8QyBERUwgu0VSVk1DSU8gREUgQUJRNUSUJ1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-10-02T17:17:26" Folio="64" FormaPago="03" LugarExpedicion="80058" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711830667"
Sello="X2jVAUP0FLhYuByMsYd4czb14ndy0BoXDro8Vnfd/HdpNliKvAtNVw8ZTNMQpWfd9JGYmRwMN8W2kL5/Sedf2o2jP9gTzC/g3HyAIKDW/WLj775CNy8EGffvL6baFAVfK9ncjDKnUAmMBh/bMq
SubTotal="567887.93" TipoDeComprobante="I" Total="650750.00" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES" RegimenFiscal="612" Rfc="DESS020903184"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA050101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72121406" ClaveUnidad="E48" Descripción="SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE ESCUELAS PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-005/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 2,256,160.78 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 873,673.73 MAS
I.V.A 16 % $ 139,787.80 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,013,461.53 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 305,785.80 MAS I.V.A.: $ 48,925.73 TOTAL
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 354,711.53 IMPORTE TOTAL A FACTURAR $ 567,887.93 MAS I.V.A $ 90,862.06 MONTO NETO A FACTURAR $ 658,750.00 RETENCIÓN 3% (
S.V.I.F.Y.C.) : $ 26,210.21 TOTAL DEDUCCIONES: $ 300,921.74 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 632,539.79" Importe="567887.93" NoIdentificacion="SER02"
ObjetoImp="02" ValorUnitario="567887.93">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="567887.93" Importe="90862.07" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="90862.07">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="567887.93" Importe="90862.07" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="BE8297EC-707A-42FE-9AFC-74E83471792E"
FechaTimbrado="2025-10-02T18:17:31" RfcProvCertif="MAS0010247C0"
SelloCFD="X2jVAUP0FLhYuByMsYd4czb14ndy0BoXDro8Vnfd/HdpNliKvAtNVw8ZTNMQpWfd9JGYmRwMN8W2kL5/Sedf2o2jP9gTzC/g3HyAIKDW/WLj775CNy8EGffvL6baFAVfK9ncjDKnUAm
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="bd4niJcgo294Y/QCE8k01ue1M7SdHwzS4jElyTWfosRPn40N0cAGEBCshd7DR/4LJKyPnHw9LzstXV19WJmnH6P7jAz3tIKYSjP4QIDR7N2ghK1Mz51/nyD38KK/2XZ8Gj7AE5691yf
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DESS020903L84	SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE8297EC-707A-42FE-9AFC-74EB3471792E	2025-10-02T17:17:26	2025-10-02T18:17:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$658,750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Fecha: 6 de octubre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES			ESTIMACIÓN No:	02 NORMAL FINIQUITO
DOMICILIO:	Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa			PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:			DEL	06-ago-25
				AL	28-sep-25
R.F.C.	0			FECHA DE CONTRATO:	
DEPENDENCIA -	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			19-jul-25	
			LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
			BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO: 23-jul-25
					TERMINACIÓN: 19-nov-25
DESCRIPCIÓN:					
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA					
CONTRATO No:					
MBGBR-LP-FAISMUN-005/2025					
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA		IMPORTE CON IVA DE LA OBRA		35% ANTICIPO DE LA OBRA	
\$1,944,966.19		\$2,256,160.78		\$789,656.27	
				IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
				\$2,256,160.78	
				BUENO POR.	\$ 632,539.79
RECIBI:					
\$ 632,539.79		(SON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:		02 NORMAL FINIQUITO			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%		\$ 305,785.80	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA		\$ 873,673.73
MAS I.V.A.:		\$ 48,925.73	MAS I.V.A 16 %		\$ 139,787.80
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 354,711.53	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA		\$ 1,013,461.53
3 % SVIFYC:		\$ 26,210.21	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 380,921.74
TOTAL DEDUCCIONES:		\$ 380,921.74	MONTO A FACTURAR MAS IVA		\$ 658,750.00
				SALDO A PAGAR:	
				\$ 632,539.79	

ELABORO:


C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMO
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y



SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

Dependencia :
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			Fecha:	Estimacion:
			6 de octubre de 2025	02 NORMAL FINIQUITO
Periodo de la estimacion:	06/08/2025	28/09/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	06/08/2025	19/11/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-LP-FAISMUN-005/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 2,256,160.78	\$ 1,944,966.19	\$ 789,656.27	\$ 680,738.16	45%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	ESTA ESTIMACION
\$ 354,711.53	16 % I.V.A (+)	
	Sub- Total A (=)	\$ 1,013,461.53
	Amortizacion Anticipo 35%	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 434,944.74	Total (=)	\$ 1,242,699.25
	Importe TOTAL A FACTURAR	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	TOTAL ACUMULADO.
\$ 789,656.27	Total (=)	\$ 2,256,160.78
	3 % SVIFYC:	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	CONTRATADO
\$ 789,656.27	Importe T O T A L	\$ 2,256,160.78
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 632,539.79	SALDO
\$0.00	Son:	\$ -
	(SON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.)	

ELABORÓ.-

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

C.ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

REVISÓ.-
C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

ELABORO: 
C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

		FECHA		6 de octubre de 2025																															
CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:																																	
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA																																	
DOMICILIO:		Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa																																	
R.F.C.		0																																	
RESÚMEN DE ESTIMACIÓN																																			
		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINQUITO																														
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA																																	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA.		\$ 1,944,966.19																																	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$ 789,656.27																																	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$ 2,256,160.78																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DESTAJO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PRELIMINARES</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CIMENTACION</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESTRUCTURA</td> <td>\$ 60,404.76</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ALBAÑILERIA</td> <td>\$ 79,497.84</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ACABADOS</td> <td>\$ 509,207.79</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>INSTALACIONES ESPECIALES</td> <td>\$ 217,033.11</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TRABAJO FINALES</td> <td>\$ 7,530.20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</td> <td>\$ 873,673.76</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:</td> <td>\$ 873,673.73</td> </tr> </tbody> </table>						DESTAJO		IMPORTE	1	PRELIMINARES	\$ -	2	CIMENTACION	\$ -	3	ESTRUCTURA	\$ 60,404.76	4	ALBAÑILERIA	\$ 79,497.84	5	ACABADOS	\$ 509,207.79	6	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 217,033.11	7	TRABAJO FINALES	\$ 7,530.20	SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 873,673.76	POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:		\$ 873,673.73
DESTAJO		IMPORTE																																	
1	PRELIMINARES	\$ -																																	
2	CIMENTACION	\$ -																																	
3	ESTRUCTURA	\$ 60,404.76																																	
4	ALBAÑILERIA	\$ 79,497.84																																	
5	ACABADOS	\$ 509,207.79																																	
6	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 217,033.11																																	
7	TRABAJO FINALES	\$ 7,530.20																																	
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 873,673.76																																	
POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:		\$ 873,673.73																																	
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SUB TOTAL =</td> <td>\$ 873,673.73</td> </tr> <tr> <td>I.V.A AL 16 %</td> <td>\$ 139,787.80</td> </tr> <tr> <td>TOTAL =</td> <td>\$ 1,013,461.53</td> </tr> </tbody> </table>				SUB TOTAL =	\$ 873,673.73	I.V.A AL 16 %	\$ 139,787.80	TOTAL =	\$ 1,013,461.53																								
SUB TOTAL =	\$ 873,673.73																																		
I.V.A AL 16 %	\$ 139,787.80																																		
TOTAL =	\$ 1,013,461.53																																		

ELABORO:


C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.




DESGLOSE

CONTRATISTA:		SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA						FECHA		lunes, 6 de octubre de 2025	
DOMICILIO:		Calle Ararat #2024-A, Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.		0		1 de 4							
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN															
LOCALIDAD:				BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL FINIQUITO							
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA															
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:				\$1,944,966.19		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$789,656.27		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:				\$2,256,160.78	
CLAVE	CONCEPTO			UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTIMACIÓN		HASTA ESTIMACIÓN		EXC-EDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN		IMPORTE	
					CANT	P.U.	TOTAL								
1	PRELIMINARES														
2	CIMENTACION														
3	ESTRUCTURA														
GBR30	COLUMNA DE 30X30 CM, ARMADO CON 8 VARS #4, EST.3 @20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, DESMOLDANTES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			ML	36.00	\$	1,421.24	\$	51,164.64	36.00	0.00	0.00	36.00	\$	51,164.64
GP2E15	FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACION Y COMPACTACION.			M2	14.05	\$	657.66	\$	9,240.12	14.05	0.00	0.00	14.05	\$	9,240.12
4	ALBANILERIA														
GPP23	BASE PARA AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT), DE CONCRETO SIMPLE DE 1.00X0.40X0.10 M. DE ESPESOR, CONCRETO FC=150 KG/CM2,I.M.A. 3/4": INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA	7.00	\$	1,095.95	\$	7,671.65	7.00	0.00	0.00	7.00	\$	7,671.65
GPP24	BASE PARA TANQUE DE GAS DE CONCRETO SIMPLE CON CONCRETO FC=150 KG/CM2,I.M.A. 3/4": INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA	1.00	\$	1,503.27	\$	1,503.27	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	1,503.27
GP828	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE.			M2	256.44	\$	251.23	\$	64,425.42	256.44	0.00	0.00	256.44	\$	64,425.42
GP2E32	GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DE 0.60 A 3.00 M. DE ALTURA.			ML	50.00	\$	117.95	\$	5,897.50	50.00	0.00	0.00	50.00	\$	5,897.50
5	ACABADOS														
GP357	APLICACIÓN DE REDIMIX EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2	271.21	\$	114.72	\$	31,113.21	271.21	0.00	0.00	271.21	\$	31,113.21

ELABORÓ:
C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
DEPENDIENTE LOCAL

REVISÓ:
C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
CONSTRUYE Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO:
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.




DESGLOSE

FECHA		lunas, 6 de octubre de 2025								
CONTRATISTA:		SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				
DOMICILIO:		Calle Ararat #2024-A, Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.		0		2 de 4		
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN										
LOCALIDAD:				BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL FINQUITO		
DESCRIPCIÓN:				CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA						
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,944,966.19		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$789,656.27		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		
								\$2,256,160.78		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SE GUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA EST. A ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GP196	APANADO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	346.97	\$ 214.77	\$ 74,518.75	346.97	0.00	0.00	346.97 \$	74,518.75
GP200	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	625.85	\$ 95.91	\$ 60,025.27	625.85	0.00	0.00	625.85 \$	60,025.27
GP2598	PISO CERAMICO ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON EMBOQUILLADOR, INCLUYE: RECORTES Y LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	178.29	\$ 841.79	\$ 150,082.74	178.29	0.00	0.00	178.29 \$	150,082.74
GP2599	ZOCLO DE 8 CM DE ALTO A BASE DE PISO CERAMICO, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON EMBOQUILLADOR, INCLUYE: RECORTES Y LIMPIEZA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	97.62	\$ 481.22	\$ 46,976.70	97.62	0.00	0.00	97.62 \$	46,976.70
GP2578	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.58	\$ 3,651.42	\$ 129,954.04	35.59	0.00	0.00	35.59 \$	129,954.04
GP2577	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE LAMINADA DE 2.00 X 1.00 M INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 4,134.27	\$ 16,537.08	4.00	0.00	0.00	4.00 \$	16,537.08
6	INSTALACIONES ESPECIALES									
GP232	SALIDA PARA CONTACTOS, CON POLIFLEX DE 1/2" CABLE CAL 12, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	11.00	\$ 1,719.63	\$ 18,915.93	11.00	0.00	0.00	11.00 \$	18,915.93

ELABORADO: C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

REVISADO: C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

AUTORIZADO: C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DESGLOSE

CONTRATISTA: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA: lunes, 6 de octubre de 2025						
DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A, Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa		R.F.C. 0		3 de 4						
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN										
LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 02 NORMAL FINIQUITO								
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA										
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,944,966.19		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$789,656.27		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$2,256,160.78						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA EST. ESTIM	HASTA ESTIM	EXC. EXDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GP233	SALIDA PARA APAGADOR, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	6.00	\$ 1,628.25	\$ 9,769.50	6.00		0.00	6.00	9,769.50
GP230	SALIDA PARA ALUMBRADO Y/O ABANICOS DE TECHO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	29.00	\$ 1,492.66	\$ 43,287.14	29.00		0.00	29.00	43,287.14
GP134	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMPOTRAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	22.00	\$ 580.86	\$ 12,778.92	22.00		0.00	22.00	12,778.92
GP234	INSTALACIÓN DE WC, TINACO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	\$ 1,153.71	\$ 5,768.55	5.00		0.00	5.00	5,768.55
GP231	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN DE MINISPLIT CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.10; INCLUYE: MATERIALES, SOPORTES, ABRAZADERAS, CORTES, CONECTORES Y CONTRAS, FIJACIÓN, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	7.00	\$ 1,599.78	\$ 11,198.46	7.00		0.00	7.00	11,198.46
GP269	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 20 CIRCUITOS INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 13,106.28	\$ 13,106.28	1.00		0.00	1.00	13,106.28
GP268	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x20, INC. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	\$ 583.72	\$ 3,502.32	6.00		0.00	6.00	3,502.32
GP2670	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20, INC. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$ 748.69	\$ 5,240.83	7.00		0.00	7.00	5,240.83
GP227	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MINISPLIT MIRAGE C SIMILAR DE 1 TON INVERTER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 13,127.17	\$ 13,127.17	1.00		0.00	1.00	13,127.17
GP228	COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MINISPLIT MIRAGE C SIMILAR DE 1 TON INCLUYE: DESINSTALACION E INSTALACION, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, GAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$ 4,212.12	\$ 29,484.84	7.00		0.00	7.00	29,484.84

ELABORÓ:
C: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
PROFESIONISTA LOCAL

REVISÓ:
C. ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZÓ:
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

EXCMO. SR. D. C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

C.ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

 AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS Y

CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

CONTRATISTA:

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

ESTIMACION

02 NORMAL FINIQUITO

[illegible]

ELABORO:-

C SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
C.ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES				CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA						ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO	
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	PARCIAL	RESULTADO	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO								
GP828	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE.			M2	24.61		10.42	1.00	256.44		VER CROQUIS
									TOTAL	256.44	
GP2532	GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.			ML							VER CROQUIS
					25.00				25.00		FRENTE
					25.00				25.00		ATRAS
									TOTAL	50.00	
5	ACABADOS										
GP357	APLICACIÓN DE REDIMIX EN PLAFON. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2	24.61	10.42		1.00	256.44		LOSA
					24.61	0.20		-2.00	-9.84		MENOS T-1
					24.61	0.50		2.00	24.61		LADOS T2
									TOTAL	271.21	
GP196	APLANADO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2							VER CROQUIS
					3.70	2.80		4.00	41.44		MUROS EXTERIOR LADO CORTO (PARTE CUADRADA)
					3.70	0.30		4.00	4.44		MUROS EXTERIOR LADO CORTO (PARTE TRIANGULAR)
					3.70	2.80		16.00	165.76		MUROS INTERIORES LADO CORTO (PARTE CUADRADA)
					3.70	0.30		16.00	17.76		MUROS INTERIORES LADO CORTO (PARTE TRIANGULAR)
					2.90		0.90	4.00	10.44		MURO BAJO VENTANA
					3.90		0.90	3.00	10.50		MURO BAJO VENTANA
						0.80	2.90	32.00	64.00		MOCHETAS
					5.80	3.00		1.00	17.40		DIRECCION
ELABORADO				REVISADO							AUTORIZADO

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

C. ARQ. BRIGITIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

CONTRATISTA:

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

ESTIMACION

02 NORMAL FINIQUITO

C.AVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	PARCIAL	RESULTADO	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO								
GP2598	PISO CERAMICO DE 44X44 CM., ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON EMBOQUILLADOR, INCLUYE: RECORTES Y LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			M2	5.83	3.83		1.00	22.33		DIRECCION
					7.85	5.83		1.00	45.77		COCINA
					7.85	5.84		1.00	45.84		AULA 1
					7.85	5.85		1.00	45.92		AULA 2
					2.62	2.50		1.00	6.55		BAÑOS CABALLEROS
					2.62	2.50		1.00	6.55		BAÑOS DAMAS
					5.83	1.16		1.00	6.76		ENTRADA BAÑOS
					2.85	0.50		-1.00	-1.43		MENOS LAVAMANOS
									TOTAL	178.29	
GP2599	ZÓCLO DE 8 CM DE ALTO A BASE DE PISO CERAMICO DE 44X44 CM., ASENTADO CON ADHESIVO PARA PIS, CON EMBOQUILLADOR, INCLUYE: RECORTES Y LIMPIEZA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.			ML	5.83			2.00	11.66		DIRECCION
					7.85	3.83		2.00	7.66		
								2.00	15.70		COCINA
					7.85	5.83		2.00	11.66		
								2.00	15.70		AULA 1
					7.85	5.84		2.00	11.66		
								2.00	15.70		AULA 2
					0.56	5.85		2.00	11.70		
								-4.00	-3.84		MENOS 4 PUERTAS
									TOTAL	97.62	
GP2578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACION HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2	2.93		1.52	4.00	17.81		VER CROQUIS
					3.00		1.52	3.00	17.78		
									TOTAL	35.59	
GP2577	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE LAMINADA DE 2.00 X 1.00 M INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA				4.00	4.00		VER CROQUIS
									TOTAL	4.00	

REVISOR

REVISOR: 
C.ARQ.BRICEIDA GREÑIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA: SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES				CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							ESTIMACION 02: NORMAL FINIQUITO	
C_AVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	PARCIAL	RESULTADO	OBSERVACIONES	
		EJE	TRAMO									
6	INSTALACIONES ESPECIALES											
GP232	SALIDA PARA CONTACTOS, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL 12; INCLUYE: MATERIALES, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.			SAL				11.00	11.00		VER CROQUIS	
									TOTAL	11.00		
GP233	SALIDA PARA APAGADOR, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL 12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.			SAL				6.00	6.00		VER CROQUIS	
									TOTAL	6.00		
GP230	SALIDA PARA ALUMBRADO Y/O ABANICOS DE TECHO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL 12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO.			SAL				29.00	29.00		VER CROQUIS	
									TOTAL	29.00		
GP134	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMPOTRAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA				22.00	22.00		VER CROQUIS	
									TOTAL	22.00		
GP234	INSTALACION DE WC, TINACOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.			PZA							VER CROQUIS	
					WC			4.00	4.00			
					TINACO			1.00	1.00			
									TOTAL	5.00		
GP231	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN DE MINISPLIT CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL 10; INCLUYE: MATERIALES, SOPORTES, ABRAZADERAS, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, FIJACIÓN, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.			SAL				7.00	7.00		VER CROQUIS	
									TOTAL	7.00		
ELABORO:-				REVISO:-					TOTAL	7.00	AUTORIZO:-	

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

C. ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C. ING. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.




VOLUMENES GENERADORES

CONTRATISTA:				CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							ESTIMACION
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES											02 NORMAL FINIQUITO
C.AVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	PARCIAL	RESULTADO	OBSERVACIONES	
GP2569	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 20 CIRCUITOS INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	EJE	TRAAMO				PZA				

REVISOR:
C.A.R.Q.BRICEIDA GARCIA NEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO:
C.ING.RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

ELABORO:
C.SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa



R.F.C. 0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADERAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
3	ESTRUCTURA
GBR80	COLUMNA DE 30X30 CM, ARMADO CON 8 VARS #4, EST.3 @20 CMS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, DESMOLDANTES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA
GP2515	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR NCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
4	ALBAÑILERIA
GPP23	BASE PARA AIRE ACONDICIONADO (MINISPLIT), DE CONCRETO SIMPLE DE 1.00X0.40X0.10 M. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2,T.M.A. 3/4"
GPP24	BASE PARA TANQUE DE GAS DE CONCRETO SIMPLE CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2,T.M.A. 3/4": INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
GP828	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR
GP2832	GÓTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DE 0.00 A 3.00 M. DE

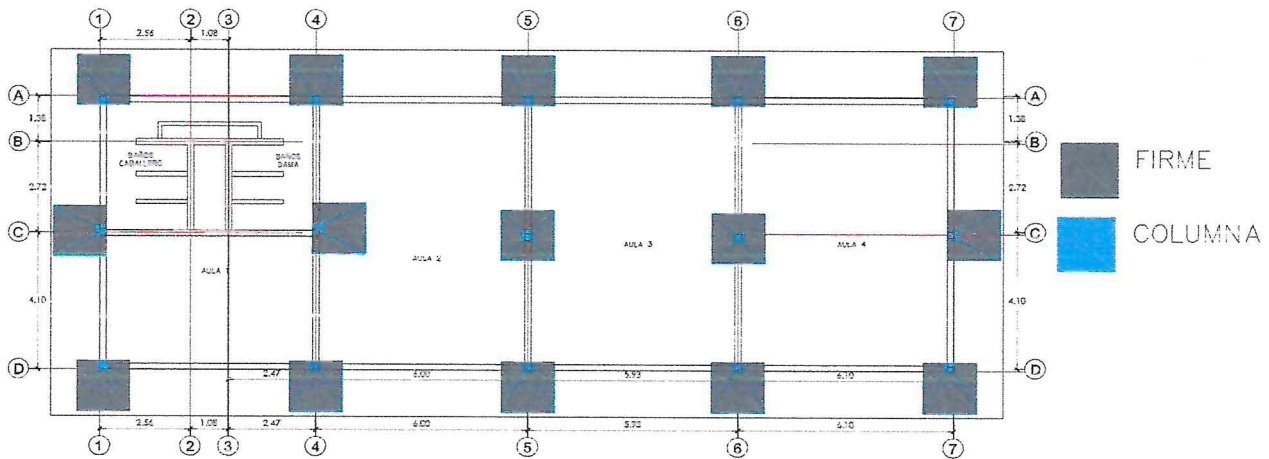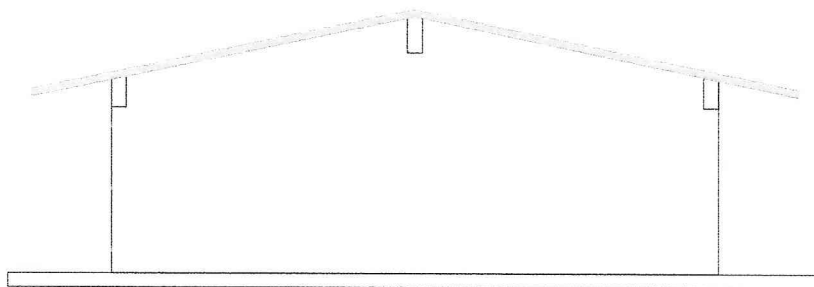

IMPERMEABILIZANTE

ELABORO.-


C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.: 0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

5	ACABADOS
GP357	APLICACIÓN DE REDIMIX EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP196	APLANADO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP200	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR,
GP2598	PISO CERAMICO ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON EMBOQUILLADOR, INCLUYE: RECORTES Y LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA,
GP2599	ZOCLO DE 8 CM DE ALTO A BASE DE PISO CERAMICO, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PIS, CON EMBOQUILLADOR, INCLUYE: RECORTES Y
GP2575	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN
GP2577	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE LAMINADA DE 2.00 X 1.00 M INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

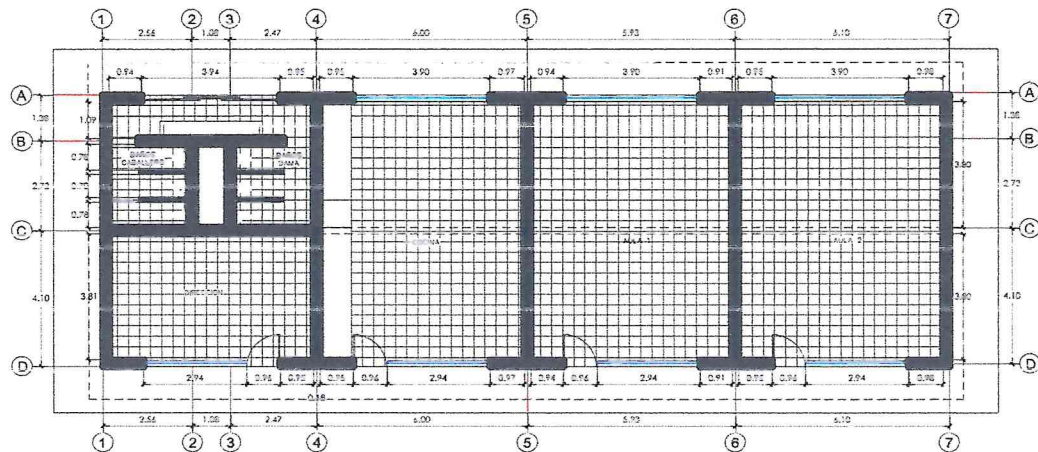

 PISO CERAMICO

ELABORO.-


SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GONZALEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBEN RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES


DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa

R.F.C. 0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

6	INSTALACIONES ESPECIALES
GP232	SALIDA PARA CONTACTOS, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS.
GP233	SALIDA PARA APAGADOR, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA,
GP230	SALIDA PARA ALUMBRADO Y/O ABANICOS DE TECHO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS,
GP134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMPOTRAR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
GP234	INSTALACIÓN DE WC, TINACO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y
GP231	SALIDA PARA ALIMENTACIÓN DE MINISPLIT CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.10; INCLUYE: MATERIALES, SOPORTES, ABRAZADERAS, CORTES,
GP2569	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 20 CIRCUITOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP2568	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, INC; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP2570	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20, INC; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP227	SUMINISTRO DE EQUIPO DE MINISPLIT MIRAGE O SIMILAR DE 1 TON INVERTER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP228	COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MINISPLIT MIRAGE O SIMILAR DE 1 TON INCLUYE: DESINSTALACION E INSTALACION, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS,
GP229	INSTALACION DE PROTECCIÓN DE HERRERIAS INCLUYE: PINTURA, MATERIALES, CORTES, FIJACIÓN CON SOLDADURAS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
GP57	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
GP239	SALIDA PARA DESAGUE DE MINISPLIT CON TUBERÍA DE 2" PVC CED 40 HASTA LUGAR CONVENIENTE, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES,
GP889	INTERCONEXIÓN A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

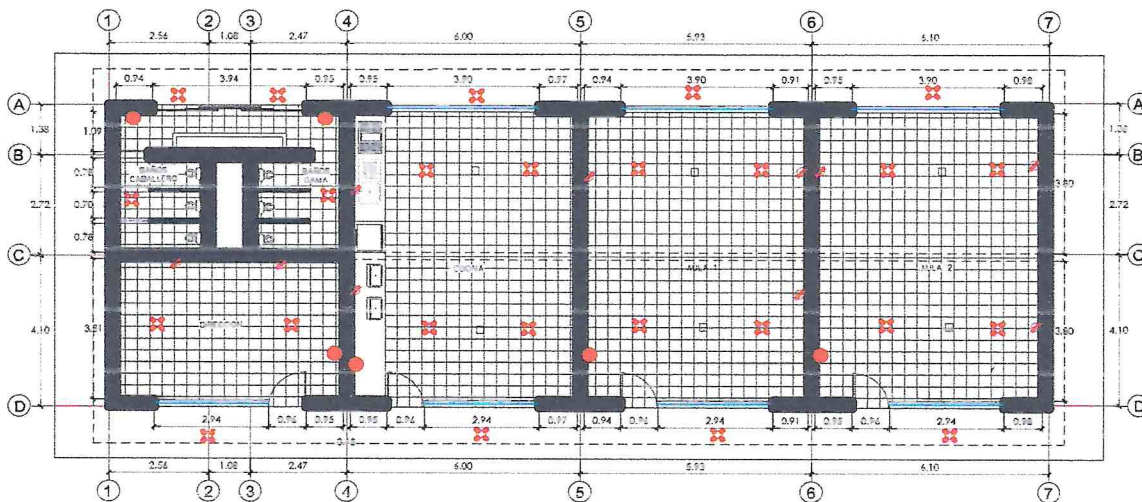

○ CONTACTO
 □ ALUMBRADO
 ● APAGADOR
 □ SAL ABANICO

ELABORO-


S. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO-

ARQ. BRIGIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y.E.



CONTRATISTA:
SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A. Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa

R.F.C. 0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:


7	TRABAJOS FINALES
GP67	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, INCLUYE: INFORMACIÓN IMPRESA ADOSADA A LAMINA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

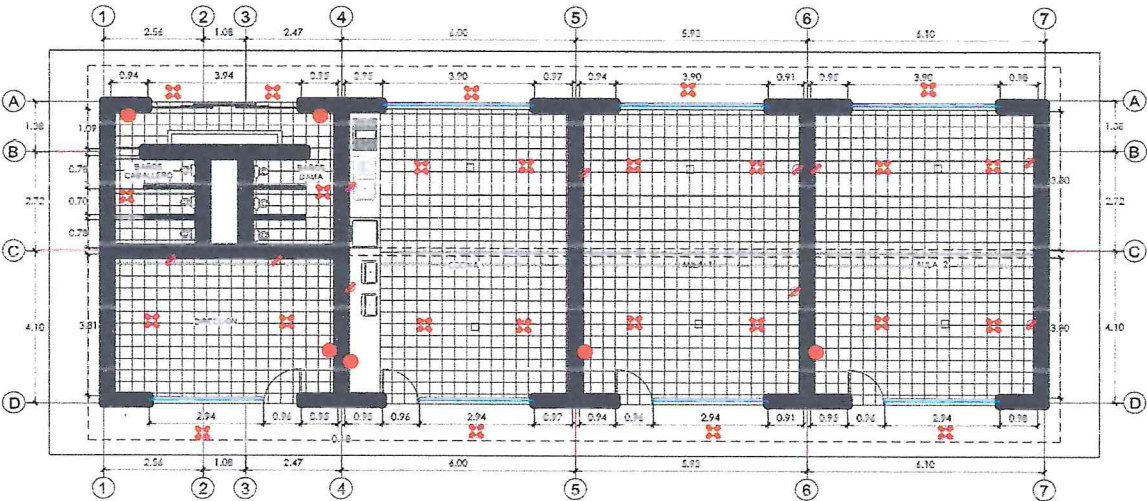

ELABORÓ:
C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

Calle Ararat #2024-A, Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

0


OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE AJULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
5	ACABADOS
GP35	APLICACIÓN DE REDIMIX EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP19	APLANADO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP20	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP25	PISO CERAMICO ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON EMBOQUILLADOR, INCLUYE: RECORTES Y LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP25	ZOCLO DE 8 CM DE ALTO A BASE DE PISO CERAMICO, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, CON EMBOQUILLADOR, INCLUYE: RECORTES Y LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN
GP25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE LAMINADA DE 2.00 X 1.00 M INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

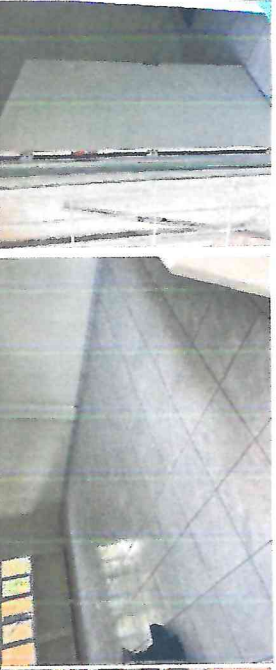

ELABORÓ:-


C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

REVISÓ:-

ARQ. BRICEIDA SPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ:-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Saul Gilberto
Delgado Santillanes

CONTRATISTA:

SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO: Calle Ararat #2024-A, Colonia: Infonavit solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, Sinaloa


R.F.C. 0

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA COTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
7	TRABAJOS FINALES
GP67	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, INCLUYE: INFORMACION IMPRESA ADOSADA A LAMINA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP10	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO.- 

C. SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.- 

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.- 

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta17/10/2025 2:01:31 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción:EST 02 NOR FIN LP005

Importe de la operación:632,539.79 MXP

Cuenta de retiro:0124174836

Cuenta de depósito:072730012783467405

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta:SAUL GILBERTO DELGADO SANTILLANES

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación:17/10/2025

Fecha de aplicación:17/10/2025

Concepto de pago:EST 02 NOR FIN LP005

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:ASD 6551749382

Hora de captura en el canal:14:01:29

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000652121

Clave de rastreo:002601002510170000652121

Folio de firma:0012088164

Folio único:1401202510171401290012088170

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	17/10/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/10/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
