

NOTA NO. 1 01/FEB/2023. CNT-2401-2023

CON ESTA FECHA SE APUERTA ESTE LIBRO DE BOTA
PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL
SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPO-EST-LP-PEST-VIAL-2401-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
PAVIMENTACION EN AV. CERRO ALYMONA ENTRE AV.
MEXICO 68 Y CALLE CONSTITUYENTE NICEFORO ZAPARRINO,
UBICADO EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA.

CONTRATISTA: E. EMILIO CONTRERAS MENDOZA


MONTO DEL CONTRATO: \$ 3'009,699.37

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 01/FEB/2023

TERMINO: 01/JUNIO/2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE
ASTORGA PÁÑEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SUP-DIR-SUP-0133-
2023, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE
REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
AL C. ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, CON PODER AMPLO
Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE
CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 01/FEB/2023

CONT-2401-2023

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SUP-DIR-SUP-DI-0133-2023.

NOTA NO. 3 01/FEB/2023.

NOTIFICA LA CONTRATISTA, QUE CON ESTA FECHA DIERON INICIO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 17/FEBRERO/2023

PARA ESTA FECHA TENEMOS UN AVANCE DEL 80% EN LA SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE INCLUYENDO DESGASTOS CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS. POR OTRA PARTE TENEMOS UN AVANCE DEL 40% EN LA SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA.

NOTA NO. 5 28/FEB/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100%
DEL PROYECTO EN LO REFERENTE A LA RED SA-
NITARIA Y A LA RED HIDRAULICA, DE ACUERDO
AL PROYECTO EJECUTADO. TENEMOS UN ALCANCE
DEL 15% EN APERTURA DE CAJAS.


NOTA NO. 6 02/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOMEN-
CLADO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION
DEL 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023, LA
CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

(Importe total)	\$ 419,977.65
Adiant. anticipo	\$ 157,492.18
DEDUCC CONTRATO	\$ 11,637.35
Liquidado a pagar	\$ 280,848.12.


NOTA NO. 7 20/MARZO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100%
DE LA EXCAVACION, LA CAPA DE SUBRASANTE DE
20 CMS AL 100%. LA CAPA DE BASE HIDRULICA
CON AGREGADO PARCIALMENTE TRITURADO AL 50%
DE AVANCE.



NOTA NO. 8 31/MARZO/2023.


PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO LOS TRABAJOS
HASTA NIVEL DE BASE INCLUYENDO RIEGO DE
IMPREGNACION Y ARENEO.

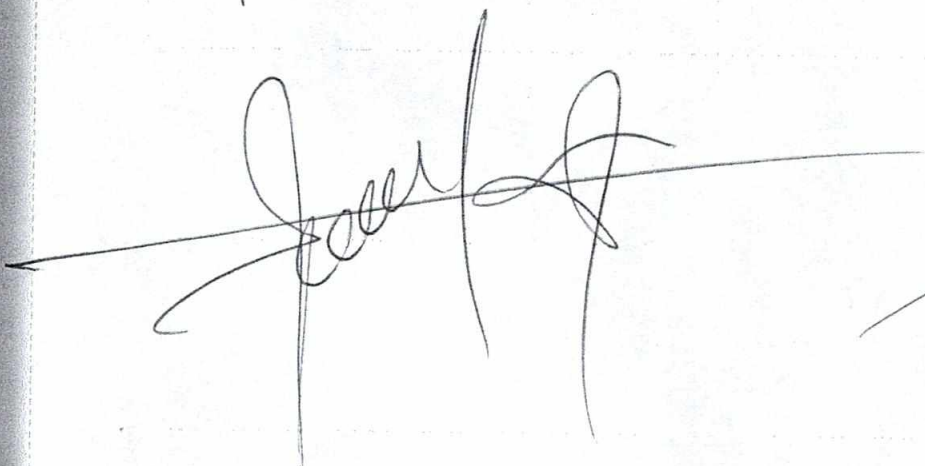

NOTA NO. 9 03/ABRIL/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO DOS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/MARZO/2023 AL 31/MARZO/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe TOTAL	\$	553,443.93
AMONT. ANTICIPO	\$	193,705.37
DEDUCC. CONTRATO	\$	14,313.21
Liquidado A PAGAR	\$	345,425.35



NOTA NO. 10 04/ABRIL/2023.

CONT-2401-2023.



CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA SOLICITAR PRECIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, RECONOCIDOS A LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASI COMO A DERRIBO Y RETIRO DE ARBOLES.

NOTA NO. 11 12/ABRIL/2023.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN COLADAS EL 100% DE LAS COMUNICACIONES TIPO 'L' COLADAS Y SE HA INICIADO LOS TRABAJOS DE RELLENO EN BANQUETAS.


NOTA NO. 12 18/ABRIL/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADA EL
100% DE BANQUETAS Y CN 20% DE LOSA
DE PAVIMENTO DE 15 CMS. ESPESOR CONCRETO
 $\rho_c = 300 \text{ kg/cm}^2$.

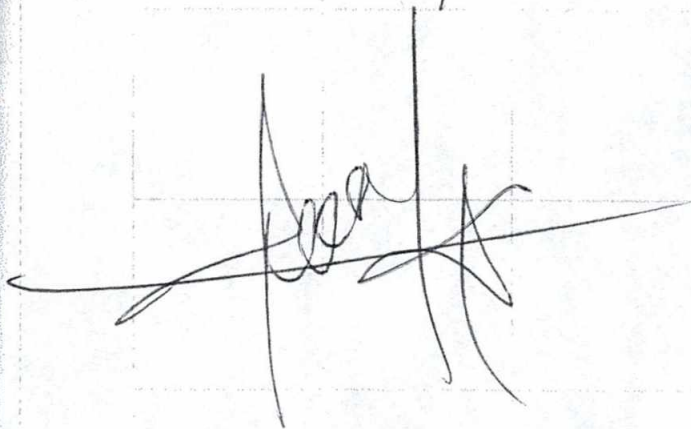

NOTA NO. 13 01/MAYO/2023.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADO EL 100%
DE LOSA DE PAVIMENTO Y COLOCADOS LOS 7 REC-
TANGULOS DE ALUMBRADO PUBLICO.

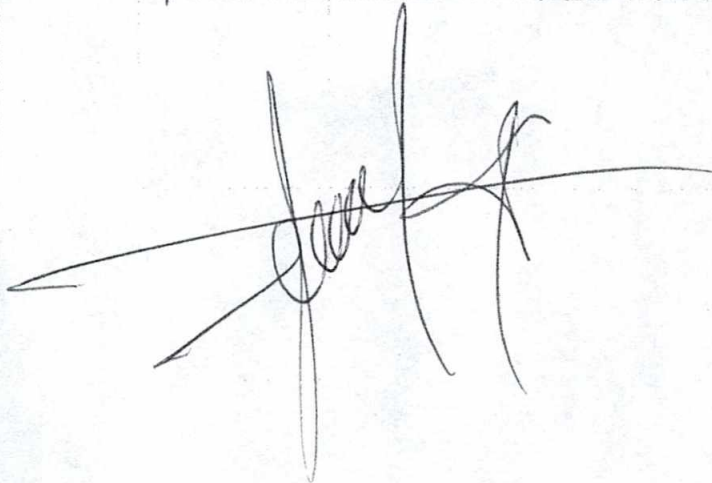

NOTA NO. 14 02/MAYO/2023

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 1'672,605.81
IMPORT. ANTICIPO	\$ 585,412.04
IMPORTE DEDUCC CONT	\$ 43,257.05
LICUPO A PAGAR	\$ 1'043,936.72.

NOTA NO. 15 03/MAYO/2023.

PARA ESTA RECTA TENEMOS EJECUTADO EL TOTAL DE CANTIDADES ADICIONALES, POR LO QUE SE PRECISE DEJA A EUROBOX Y AUTORIZAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

NOTA NO. 16 03/MAYO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOMENCLADURA ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 01/MAYO/2023 AL 15/MAYO/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:


IMPORTE TOTAL	\$ 199,848.84
AMORT. ANTICIPO	\$ 69,947.10
DEDUCC. CONTRATO	\$ 5,168.50
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 124,733.24

[Signature]

[Signature]

NOTA NO. 17 01 JUNIO 2023


PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADOS LOS
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, POR LO QUE TENEMOS
UN AVANCE DEL 100% EN LA OBRA FÍSICA.




NOTA NO. 18 05/JUNIO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO
MENOS CINCO EXTRAORDINARIOS FINIQUITO, CON UN
PERIODO DE EJECUCION DEL 16 MAYO 2023 AL
01 JUNIO 2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE
DESGLASE:

Importe TOTAL	₡ 121,618.14
Amont. anticipo	₡ 116,838.09
DEDUCCIONES	₡ 3,145.30
Líquido a PAGAR	₡ 21,634.73.

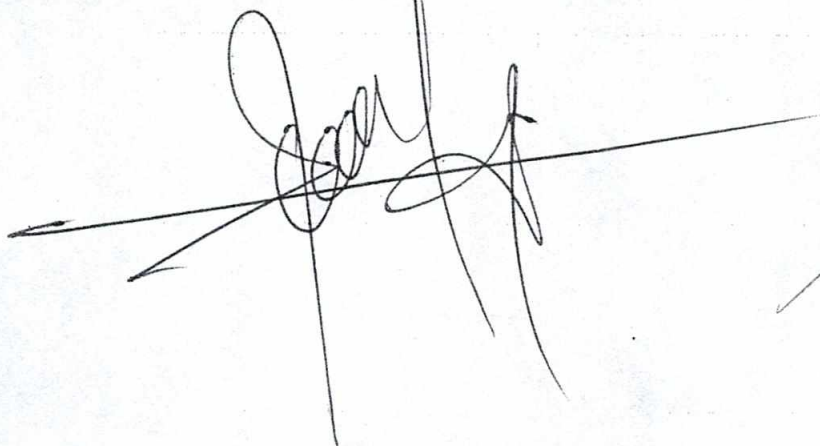


NOTA NO. 19 05/JUNIO/2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTA BANCORA
EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS
DE PROYECTO Y DE CONTRATO. POR OTRO LADO
SE CUMPLIO CON LAS ACTAS DE FINIQUITO Y
LAS ACTAS DE ENTREGA.

