


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO DE OBRA N° OPPU-EST-LP-FISS-APDA-1906C-2023 DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CEBERAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.I. JOSÉ LUIS ~~PLAZA~~ ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. REPRESENTADAS POR EL C. JUAN CARLOS OLVERA TERRAZAS Y EL C. JESUS ARMANDO ORDUÑO MONDACA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ LA "CONTRATISTA", ESTE CONTRATO AMPARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS - TERCERA Y ÚLTIMA ETAPA - EN EL MUNICIPIO DE AHUACHIC, ESTADO DE SINALOA Y ES POR UN MONTO TOTAL CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (16%) DE \$12'612,723.17; SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 17/100 M.N., CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON ESTA FECHA TAMBIEN PRESENTA LA CONTRATISTA EL OFICIO DE INICIO DE OBRA Y EL OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE SIENDO EL ING. JESUS ARMANDO ORDUÑO MONDACA CON CEBULA PROFESIONAL N° 1108522 Y POR LA SOP COMO SUPERVISOR ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARDUJO, QUIENES FIRMAREMOS EN ESTE LIBRO DE OBRA TODO LO QUE SE LLEVE A CABO EN ANOTACIONES DEL PROCESO DE LA OBRA, CAMBIOS SI SON NECESARIOS, ESPECIFICACIONES Y ACUERDOS Y FIRMAN

POR LA CONTRATISTA

POR SOP


ING. JESUS ARMANDO ORDUÑO M.
SUPERINTENDENTE
ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA A.
SUPERVISOR


NOTA N° ① CON ESTA FECHA TAMBIEN SE LLEVA A CABO LA VISITA AL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO EL EJIDO OHUIRA, MUNICIPIO DE AHOME, POR LA CONTRATISTA EL ARQUITECTO JUAN CARLOS OLIVERA TERRAZAS REPRESENTANTE LEGAL Y EL ING. JEUS ARMANDO ORDUÑO MONDACA COMO SUPERINTENDENTE Y ESTA SUPERVISION, SE LLEVA A CABO UN RECORRIDO POR EL LUGAR Y SE QUEDA UNA CUADRIULA DE TOPOGRAFIA LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA CHECAR LOS NIVELES EXISTENTES CON LOS QUE TRAE EL PROYECTO, DANDO CON ESTO POR INICIADOS ESTOS TRABAJOS DE ESTE LUGAR.



[Signature]

06/07/2023


NOTA N° ② CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO ESTA VISITA A LA OBRA PUDIENDO OBSERVAR QUE HAY DIFERENCIA EN CUANTO A LOS NIVELES DE ARRASTRE EN EL AREA DE LA ZONA SUR ESTE, CHELANDOSE CON PERSONAL DE JAPAMA PARA DECIDIR QUE OPCION TOMAR YA QUE SE ENCONTRO UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE ALREDEDOR DE 1.20 MTS.



[Signature]

NOTA N° (3) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APRECIÓ COMO YA SE TIENE SUMINISTRADA TUBERÍA DE PVC SANITARIA PARA ALCANTARILLADO DE 6", DE 8", DE 10" Y DE 12", SILLETAS Y CODOES DE 45" PARA LAS DESCARGAS.

TAMBIÉN SE ESTÁ TRABAJANDO EN EXCAVACIONES CON RETROEXCAVADORA EN EL ÁREA NORESTE DEL LADO NORTE DE LA CALLE INDEPENDENCIA, DONDE YA SE TRAZO Y SE TIENE SEÑALIZACIÓN CON CINTA PREVENTIVA POR LA CALLE 5 DE MAYO HASTA LA DIAGONAL QUE DA A LA PARCELA



[Signature]
★

21/07/2023


NOTA N° (4) SE ESTE DÍA SE VISITA ESTA OBRA DONDE PODEMOS VER COMO YA SE TIENE EN LA OBRA BROCALES DE CONCRETO PARA LOS POZOS DE VISITA QUE SE ESTÁN HACIENDO EN CALLES 5 DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO PARA TERMINAR LAS LÍNEAS HACIA LA LÍNEA QUE VIENE POR LA DIAGONAL TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA HERRAJE DE DESCARGAS Y REGISTROS DE BANQUETA, SE TIENE SEÑALIZADA LA OBRA CON POSTES PREVENTIVOS Y CINTA AMARILLA.

SE BOMBEA AGUA DE LAS EXCAVACIONES CON BOMBA DE ACHIQUE DE AGUAS NEGROS TRAGA SÓLIDOS DE 6" Ø




[Signature]
★

NOTA N° ⑤ ESTA SUPERVISION LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APRECIÓ COMO SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA DESCARGA DE MÁS TUBERÍA DE DIÁMETROS DE 10", DE 8" Y DE 6" DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-111-1995 SCFI, SE TRABAJA EN LOS REFUEZOS COMPACTANDO CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINO DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PARA COMPACTAR AL 90% P.V.S.M., SE LE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA IR LIMPIANDO LAS AREAS DONDE YA SE VA RELLENANDO, SE CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DE 8% EN LO QUE VA DE LA OBRA.




04/08/2023

NOTA N° ⑥ DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE OBSERVA COMO SE TIENE YA TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL AREA NOR ORIENTE EN LO QUE ES PORQUE VISITA YA CON SUS BROCALES COLOCADOS, ASI COMO SU TAPA DE CONCRETO, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE HERRERA DE REGISTROS DE BANDUETA Y SE PUEDE VER COMO TAMBIEN SE HA LLEVADO A CABO LA LIMPIEZA RETIRANDO EL MATERIAL SOBANTE DEL PRODUCTO DE EXCAVACION, YA SE TIENE ARENOS TIRADO POR LA CALLE INDEPENDENCIA.




NOTA N° ⑦ CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACIÓN N° ① NORMAL PARA REVISIÓN Y FIRMA POR LA CANTIDAD DE \$1'285,320.²²; SON UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 22/100 M.N., LIQUIDO A PAGAR, YA CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, REVISADA, SE FIRMA LA OBRERA PRESENTA UN AVANCE APROXIMADO DEL 10%



NOTA N° ⑧ SE ELABORA LA PRESENTE NOTA PARA
SUSTITUIR LA ANTERIOR N° ⑦ YA QUE SE PRESENTO
UNA DIFERENCIA EN EL MONTO A PAGAR DE LA ESTIMA-
CION N° ④ POR LA CUAL LLEVARA EL TOTAL DE
\$ 1'235,320.22; SON: UN MILLON DOCUENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 24/100 M.N.,
DEBIENDO SER \$ 1'234,476.50; SON: UN MILLON DOS-
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SE-
TENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. YA CON TODOS LOS
DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS

[Firma]

NOTA N° (9) CON ESTO FECHO SE LLEVA A CABO LA VENTA A ESTA OBRA DONDE SE ABREIA COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON REPROEXCAVACION PARA LA INTRODUCCION DE TUBERIO DE 8" (200MM) PARA ATORNAS Y TUBERIO DE 6" (150MM) PARA DESCARGAS SANITARIAS, TAMBIEN SE ESTAN HACIENDO POCOS DE VISITA Y EN LOS QUE SE VAN RECONSTRUYENDO SE LES PONE BRICOL Y TIPO DE CONCRETO TAMBEN SE LE ESTAN HACIENDO LOS ENCAJONES Y SE HAN ENCAJONES.

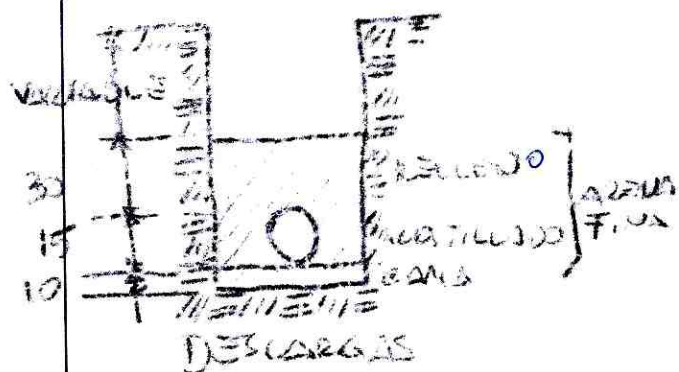

[Signature]
 S.A.

18/03/2023

NOTA N° (10) HOY SE LLEVA A CABO LA VENTA A OBRA Y SE HAN ENCAJONES COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA ATORNAS, DESCARGAS Y REJISTROS TAMBIEN SE VIENE RECONSTRUYENDO CON BRICOL DESPUES DE COLOCAR LA CUBA DE ARENA, AUSTILLADO Y RECONSTRUYENDO EXTERNA, DONDE LE EL ALZADO DE REJISTRO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM CON BOLSA PARA APLICAR HUMEDAD PARA LLEVAR AL 90% P.V.S.M. RECONSTRUYENDO LA OBRA PRESENTA UN AVANCE APROXIMADO DEL 20%.

[Signature]
 S.A.

NOTA N° (1) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA LA ESTIMACION N° (2) NORMA. POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR DE \$ 976,918.51. SON: NOVECIENTOS ESPANTO Y TRECE MIL NUEVECENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M. U. CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS.

LA OBRAS PRESENTAN AVANCE DE OBRAS DEL 25%



[Handwritten signature]

NOTA N° (12) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO YA SE TIENE UN BUEN AVANCE APROXIMADO DEL 30% Y SE CONTINUA CON LA INTRODUCCIÓN DE TUBERÍAS DUTTERAS DE 3" PARA ATORJES Y DE 6" PARA DESCARGAS SANITARIAS, COMO TAMBIÉN EL PASEO DE EXCAVACIONES, COLADON DE TUBERÍAS, RELLENOS, CON COMA, ACOSTILLADO Y REBOLADO DE ARENA EN LA SECCION DE LAS TUBERÍAS Y SE TERMINA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, CON BALCONA Y ADELANDO AGUA PARA LOGRAR EL 90% P.V.S.M. TAMBIÉN SE CONTINUA CON LA HERRERIA DE PILES DE VISITA Y REMISTOS SANITARIOS DE EMBUDO DE 40X60 CMS, CON TUBERÍAS LOJO REBOLADO, ENJALADO POR DENTRO CON HERRERIA DE MOVIA SANA, MARCO Y CONTRA MARCO EN TAPA COLADA, TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA CAYLA Y RETIENDE MATERIAL SUBYACENTE DEL PRODUCTO DE EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.


[Firma]
 18

31/03/2023

NOTA N° (13) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA POR ESTE SEPTIMO DIA APROXIMADO COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LA ZONA SUR PONIENTE DEL CIPRO APROXIMADO COMO SE LLEVA BIEN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES YA COMIENZO Y CON LOS REBOLADOS Y COMPACTACIONES DE ZONAS TERMINADAS SE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 40%.

[Firma]
 18

NOTA N° (14) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE OBSERVAR COMO SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN DE LA PARED DEL CANTONAMIENTO Y SE ESTÁ HACIENDO TABIQUE PARA QUE SE ESTÉN TRABAJANDO ALGUNAS PARTES DE LA VIGILANCIA.

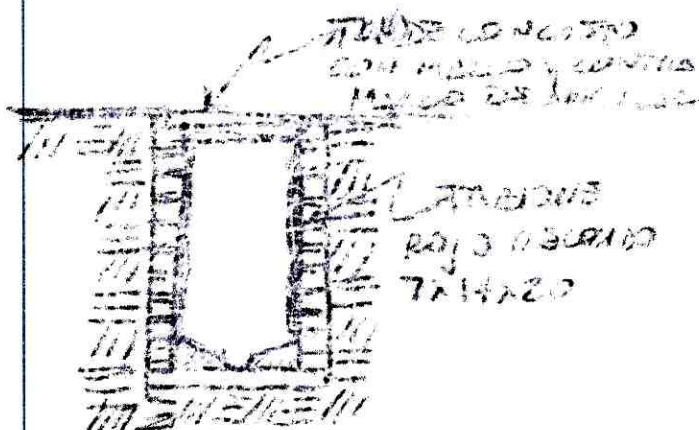

RELISTRO SANITARIO
 DE 40 x 60 CM
 DE CLARO CON AGU-
 NAD INTERIOR Y MEDIO
 CANTO EN ANALISIS


[Handwritten signature]
 J. A.

08/09/2023

NOTA N° (15) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACIÓN N° 13 NORMAL PARA REVISIÓN Y FIRMA, QUE CORRESPONDE POR UN TOTAL NETO LIQUIDO A PAGAR POR \$870,896.80; SON: OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (16%) YA INCLUIDO Y TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS.

[Handwritten signature]
 J. A.

NOTA N° (16) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APRICIA COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINA PARA LA INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE 8" RELENOS DE ARENA EN CAMA, ACOSTILLADO Y RELENADO DE 30 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO Y CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS, APISONADO CON BAILAMINA, APLICANDO AGUA PARA HUMEDECER Y LOGRAR LA COMPACTACION REQUERIDA, TAMBIEN SE TRABAJA EN LA EXCAVACION, COLOCACION DE TUBERIA DE 6" MINIMA, RELLENO Y COMPACTACION PARA DESCARGA, HERRERA DE POZOS DE VISITA Y REGISTROS SANITARIOS DE BANQUETA, LOS POZOS TERMINADOS SE VAN TAPANDO CON TAPAS DE CONCRETO EL BRICAL Y TAPA, ASI COMO TAMBIEN SE ESTAN COLANDO LAS TAPAS DE LOS REGISTROS SANITARIOS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANCLAR A ESTA FORMA SE CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 48%.



[Handwritten signature]


22/09/2023

NOTA N° (17) AL LLEVAR A CABO LA VISITA SE PUEDE VER COMO SE CONTINUA TRABAJANDO EN TODOS LOS TRABAJOS COMO SON EXCAVACIONES, COLOCACION DE TUBERIAS, HERRERA DE POZOS DE VISITA, REGISTROS SANITARIOS, RELLENOS Y RETIROS DE MATERIAL SOBANTE DEL PRODUCTO DE EXCAVACION SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA SEÑALIZAR TODAS LAS AREAS QUE REPRESENTAN PELIGRO PARA VEHICULOS Y PEATONES



[Handwritten signature]

NOTA N° (18) CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA DONDE SE APREHA COMO SE CONTINUA TRABAJANDO EN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, CONTINUAN SALIENDO VIALIDADES CON NECESIDADES DE HERMURA DE DESCARGAS, NO INCLUIDAS EN PROYECTO, POR LO QUE SE TENDRAN QUE HACER LOS AJUSTES NECESARIOS EN EL COMPARATIVO CON LOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A ESTA FECHA SE CUENTA CON UN AVANCE APROX. DE 60%





02/10/2023

NOTA N° (19) ESTE DIA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° (4) NORMAL POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$ 1'760,046.63; SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y SEIS PESOS Y 63/100 M.N. CON EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO 16% INCLUIDO Y CON TODAS SUS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES YA APLICADOS, POR UN PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023




NOTA N° (20) Hoy se lleva a cabo la visita a esta obra donde se aprecia como se continua trabajando en todos los con ceptos, como son: TRAZO, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PVC SANITARIO. EN ATARJEAS y DE 6" PVC SANITARIO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, REJUNES CON CAMA, ACERTILLADO Y RELLENO SOBRE EL LOMO DEL TUBO 30 CMS CON ARENA FINA Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS, APLICANDO AGUA Y COMPACTANDO CON BAILARINA HASTA EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, TAMBIEN SE CONTINUA CON LA HECURA DE POZOS DE VISITA, REJUNES SANITARIOS DE BANQUETA Y CON EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SOBRIANTE EN CAMIONES FUERA DE LA OBRA, SE CUENTA CON UN AVANCE APROX DE 65%




[Signature]

16 (DIECISEIS)
09/10/2023


NOTA N° (21)

DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA ^{SE VE} COMO SE CONTINUA CON TODOS LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA NOTA ANTERIOR, TODO ESTO EN EL SECTOR SUR PONENTE DEL EJIDO, POR LAS CALLES JOSÉ MARINO SUAREZ, GABRIEL LEYVA Y SIN ROMANES DE ORIENTACION NORTE SUR Y EN EL SENTIDO ORIENTE PONENTE ES LA CALLE PEGADA A LA PAREDA, LA GRP. VICTORIA Y LA RESENDO BUITIMEN, ESTA SUPERVISION SE RECUERDA A LA CONTRATISTA QUE NO HAY QUE DESCUIDAR LA LIMPIEZA DE LA OBRA.



[Signature]


NOTA N° (22) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA POR ESTA SUPERVISION SE PUEDE VER COMO SE ESTA TRABAJANDO EN LOS RELLENOS DE ZANJAS PARA IR DANDO EL NIVEL DE CALLES PARA LLEVAR A CABO EL PASO CON MOTOCON FORMADORA PARA DEJAR LAS CALLES YA LIMPIAS Y LO MAS ANCHAS POSIBLES PARA EL PASO DE LOS VEHICULOS, LOS POZOS DE VISITA YA ESTAN SIENDO TAPADOS CON SUS BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO Y TAMBIEN SE TRABAJA EN EL COLADO DE TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, SE CUENTA CON AVANCE APROX DEL 70%



[Handwritten signature]

30/10/2023

NOTA N° (23) HOY SE LLEVA A CABO OTRA VISITA A LA OBRA POR ESTA SUPERVISION Y SE VE COMO ESTAN TRABAJANDO YA CON SOLO LOS ACABADOS DE POZOS DE VISITA Y REGISTROS DE BANQUETA EN ESTA SECCION DEL EJIDO



[Handwritten signature]

02/11/2023

NOTA N° (24) CON ESTA FECHA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° 5, NORMAL, POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE \$1'301,855.73 SON: UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 73/100 M.P. YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO (IVA) 16% Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS.

[Handwritten signature]

NOTA N° (25) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO SE CONTINUA CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SON LA EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA PARA LA COLOCACION DE TUBERIAS DE 8" Ø PARA ATARIJES Y DE 6" Ø PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, LA COLOCACION DE LAS TUBERIAS, RELENOS Y HECURA DE POZOS Y REGISTROS SANITARIOS DE BAQUETA Y TAMBIEN EN LOS RELENOS Y COMPACTACION DE LOS MISMOS Y LA CARGA EN CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LAS EXCAVACIONES, TODO ESTO SE HACE EN LA PARTE SUR DEL EJIDO



[Handwritten signature]


16/11/2023

NOTA N° (26) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE YA SE APRECIA MUY BUEN AVANCE DONDE YA SE ESTA LLEVANDO A CABO LOS RELENOS Y COMPACTACIONES DE LAS ZONAS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y SE ESTA LEVANTANDO EL MATERIAL SOBRANTE PRODUCIDO DE EXCAVACION PARA LIMPIAR LAS CALLES DEL PUEBLO BUENAVISTA, GPO. VICTORIA, JOSEMA PINO SUAREZ Y GABRIEL LEYVA, SE CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 82%



[Handwritten signature]

NOTA N° (27) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE PUEDE VER COMO YA SE TIENE TERMINADO TODO EL TRAMO DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" Ø Y TODAS LAS DESCARGAS EN EL SECTOR SUR ESTE Y SOLAMENTE ESTA TRABAJANDO EN EL COLADO DE TAPAS PARA REGISTROS Y COLOCACION DE PROCALES Y TAPAS DE CONCRETO EN POZOS

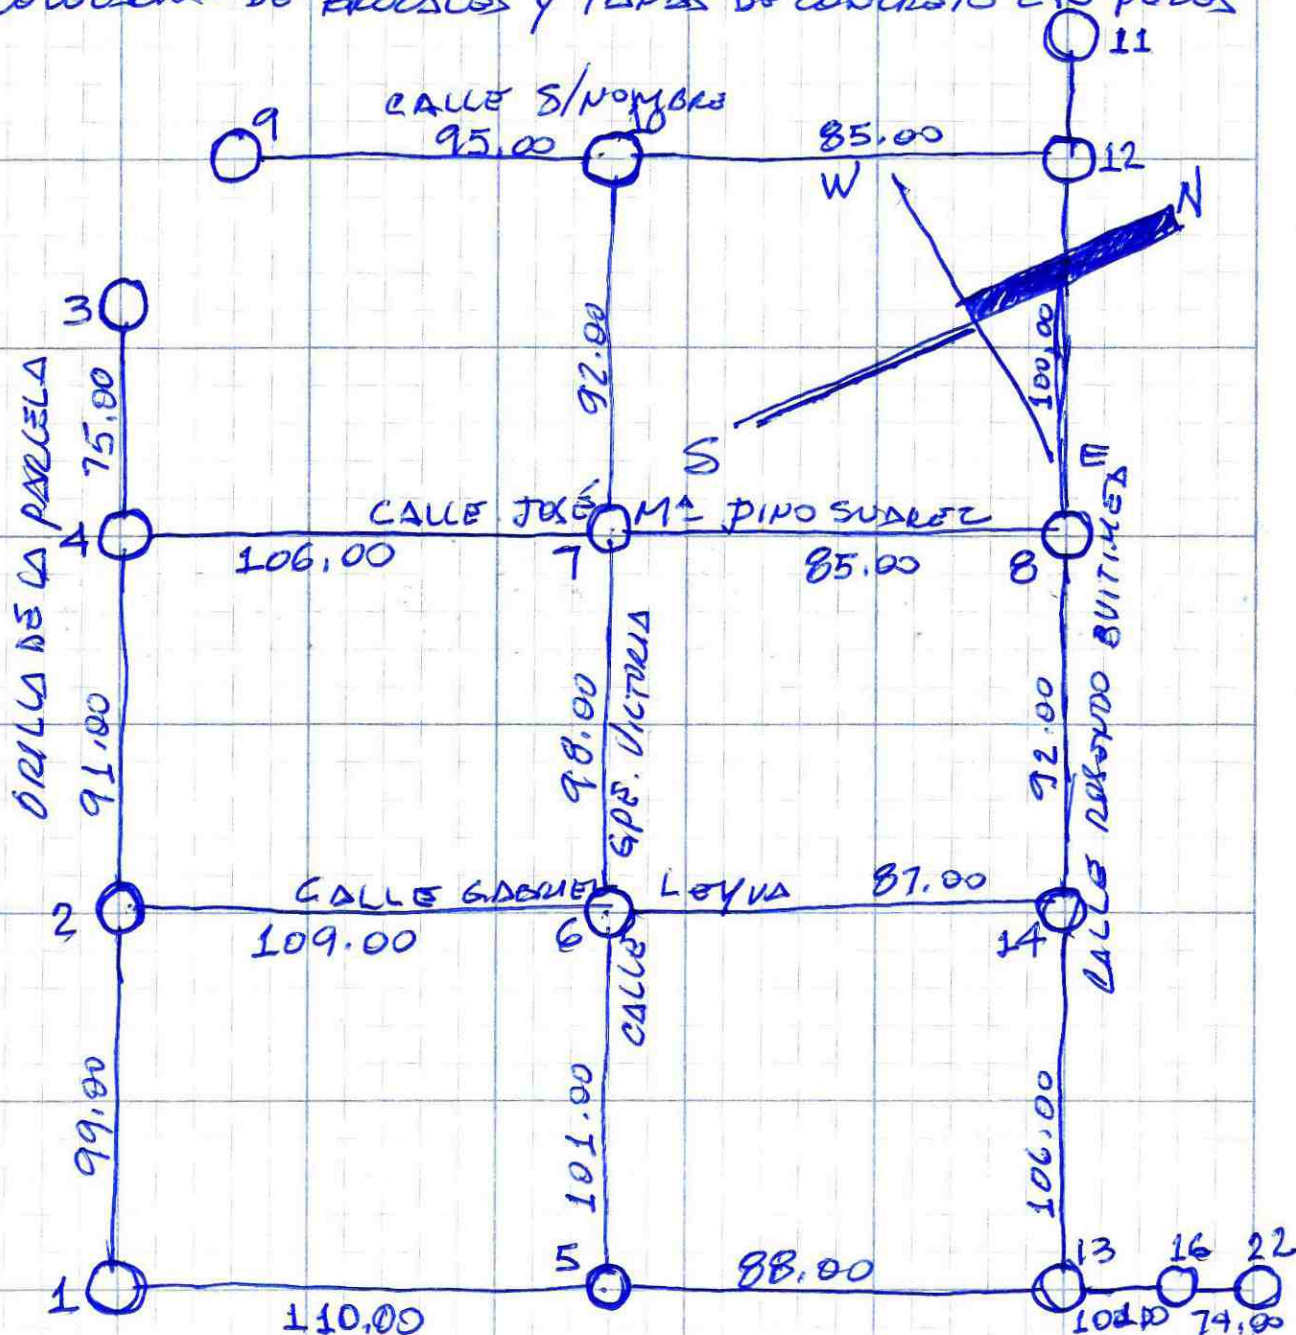

DREN
SE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 88%




[Signature]

NOTA N° (28) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA DE ESTA SUPERVISION A ESTA OBRA DONDE SE CONTINUA CON LA CARGA Y ARREJO PUEROS DE LA OBRA EN CAMION DEL MATERIAL SOBANTE DEL PRODUCTO DE EXCAVACION Y LOS ES- COMBROS DE LA DEMOLICION DE LOS POZOS DEBUTIS VIGOR, TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN EL TRAMO FALTANTE DE INTRODUCCION DE ATORJERS PARA LA HECHURA DE DESCAR- GAS QUE NO EXISTIAN





NOTA N° (29) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° (6) NORMAL POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR DE \$ 1.147.492,61; SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N., YA CON EL VALOR DEL IMPUESTO DEL 16% INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, POR UN PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y SE CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 92%




NOTA N° (30) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APRUEBA COMO YA SE TIENE CARI TERMINADAS TODAS LAS DESCARRAS QUE FALTABAN EN EL AREA DE LA ZONA SUR DEL EJIDO DE LOS TRABAJOS QUE QUEDABAN PENDIENTES POR LA CALLE HILANO BICAM Y LA CALLE LONGINO HUIQUI, QUEDANDO CON ESTO PENDIENTES SOLAMENTE UNOS POCOS DE REGISTROS SANITARIOS Y EL RELEVO Y DESPALME DE ESTAS CALLES PARA CONFORMAR LOS ARROYOS DE LAS MISMAS PARA QUE QUEDEN EN BUEN ESTADO PARA LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS. SE CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DE 95%.


A ESTA FECHA ME LLEGA COPIA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE N° CONV-01-2023-MI-C1906C-2023 DE ESTE CONTRATO PARA INCLUIR LOS CONCEPTOS ADICIONALES QUE HAN VENIDO SALIENDO EN EL PROCESO DE ESTA OBRA ES POR UN MONTO TOTAL DE \$ 789,095.00; SON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M. N. DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023.

[Firma] ★



20/12/2023

NOTA N° (31) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE YA SE TIENE TODAS LAS ZANJAS CERRADAS (RELLENAS Y COMPACTADAS), SE ESTA LLEVANDO A CABO LA LIMPIEZA FINAL Y SOLO FALTA TERMINAR ALGUNOS REGISTROS EN ACABADOS (ENJABOS INTERIORES) Y TAMBIEN SE ESTAN COLANDO TAPAS DE LOS MISMO.



[Firma] ★

NOTA N° 32 AL LLEVAR A CABO ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO YA HAN QUEDADO TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACION DEL ACANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTROS EN SU TERCERA Y ULTIMA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ABOGUE, QUEDANDO ASI TERMINADOS AL 100%, RESTANDO SOLAMENTE ENTREGAR ESTOS TRABAJOS AL ORGANISMO OPERADOR, PARA QUE QUEDEN A SU CARGO.



[Handwritten signature]

02/01/2024

NOTA N° 33 CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LAS ESTIMACIONES N° 7 NORMAL POR UN IMPORTE NETO Y LIQUIDO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$90,161.42; SON: NOVENA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 42/100 M.N. YA CON EL 16% (IVA) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA ESTIMACIÓN N° 8 ADICIONAL FINIQUITO POR UN IMPORTE NETO LIQUIDO A PAGAR DE \$1'076,767.04 SON: UN MILLON SETENTA Y SEISMIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 04/100 M.N.; CON EL 16% (IVA) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO YA INCLUIDO Y TOTAL SUS DEDUCCIONES APLICADAS, QUEDANDO UN SALDO POR CANCELAR DE \$156,396.20; SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 20/100 M.N. QUEDANDO CON ESTO CERRADA LA OBRA Y ESTA BITACORA TAMBIEN



[Handwritten signature]
