

NOTA NO. 1 25/JULIO/ 2022. CONT-APDA-2007A-2022.

CON ESTA FECHA SE APERIURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2007A-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO DE LOS RECHIN, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORRERO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. EDGAR OMAR FERNANDEZ QUINTERO

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 25 JULIO 2022.
TERMINO: 07 SEPTIEMBRE 2022.

"LA SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARCO ENRIQUE ASTORGA GILVEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-1272-A-2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

"LA CONTRATISTA" ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. EDGAR OMAR FERNANDEZ QUINTERO, CON CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA SUFICIENTE, PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

Edgar Omar Fernandez Q.

NOTA NO. 2 25/JULIO/2022.

CONT-2007A-2022.

"LA SECRETARIA" PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, SOBRE EL CUAL SE DEJARAN A CARGO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1272-DI-2022.

NOTA NO. 3 25/JULIO/2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA, QUE HOY DIERON INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUMPLIMIENTO DE LA CLASULA TERCERA DEL MISMO.

NOTA NO. 4 01/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HA REUNIFICADO EL EQUIPO DE PERFORACION, INCLUYENDO LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTE E INSTALACION DEL EQUIPO EN EL SITIO DE LA PERFORACION.

NOTA NO. 5 08/ AGOSTO/ 2022. CONT - 2007 A - 2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE EN LAS PERFORACIONES EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y TIPOS DE MATERIAL ?


PERFORACION 8" ϕ DIAM. MAT. TIPO I $\rightarrow$ 20.0 ML

AMPL. PERFORACION 8" A 10" ϕ DIAM. MAT. TIPO I $\rightarrow$ 60 ML

PERFORACION 8" ϕ DIAM. MAT. TIPO II $\rightarrow$ 20.0 ML

PERFORACION 8" ϕ DIAM MAT. TIPO III $\rightarrow$ 60.0 ML

POR OTRA PARTE SE HA COLOCADO TUBERIA PVC LISA PARA ADENTE PAZO DE 8" Y 6" ϕ DIAM. ASI COMO TUBERIA DE PVC TRANQUILA PARA ADENTE DE POZO PROFUNDO DE 8" ϕ DIAM.

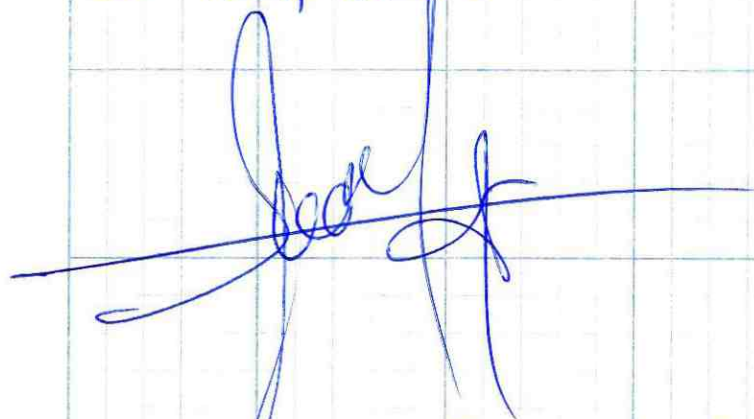


Elaborado por: [Signature]

NOTA NO. 16 (SEIS) 19/ AGOSTO/ 2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ?


CEMENTACION DE TUBERIA PARA CONTRADENTE, LIMPIEZA DE POZO CON PISTONES PARA DESATOLUE, PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA, LIGA DE CONCRETO ARMADO 10 CMS. CONCRETO f.c = 200 kg/cm².



Elaborado por: [Signature]

NOTA NO. 7 22/AGO/2022.

EN VIRTUD DE LAS NECESIDADES ACTUALES Y QUE NO SE CONTEMPLARON EN EL PROYECTO, SE AUTORIZA CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES. DETALLANDOSE LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE MONOFASICO 220 VOLTS. INCLUYENDO VALVULA CHECK FO.FO. 3" Ø DIAM. MAS CONCEPTOS Y CANTIDADES COMPLEMENTARIAS

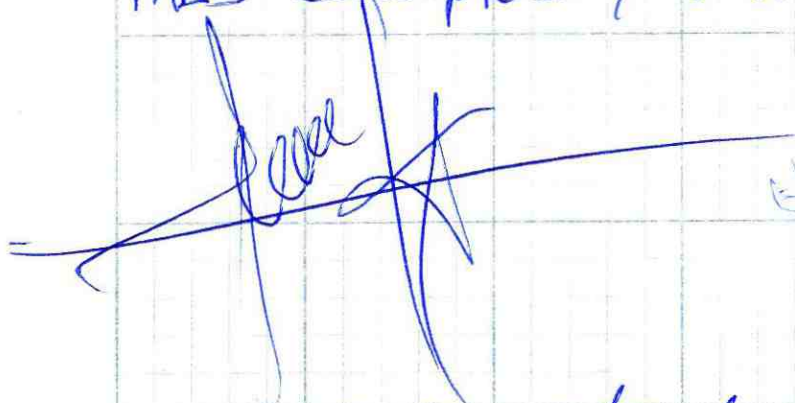 Edgar Fernandez

NOTA NO. 8 22/AGO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOM. UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 25/07/22 AL 11/08/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe Total	\$ 669,089.48
Amort. Anticipo	\$ 304,121.31
DEDUC. CONTRATO	\$ 22,476.45
Líquido a pagar	\$ 542,431.72

 Edgar Fernandez

NOTA NO. 9 23/AGO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE ALLOCADO EL FABRICADO DE CONTROL, SUBESTACION MONOFASICA, INST. BAJA TENSION, LOSA, CASITA DE OPERACION, PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS ETC.

Edgar Fernandez Q

NOTA NO. 10 26/AGO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOBLE DEL DGS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE L 12/08/2022 AL 26/08/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 526,218.42
Amort. anticipo	\$ 184,176.45
DEDUCC. CONTRATO	\$ 13,609.10
Líquido a pagar	\$ 328,432.87

Edgar Fernandez Q

NOTA NO. 11 31/AGO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HAN EJECUTADO LAS CANTIDADES ADICIONALES QUE SE VERAN REFLECTADAS EN LA ESTIMACION NUMERO TRES ADICIONAL. EL SOPORTE FINANCIERO SE FORMALIZO CON UN CONVENIO DE PRESUPUESTO MODIFICADO QUE INCLUYE UNA AMPLIACION DE MONTO POR \$ 217,830.20.




Eduardo Fernandez (S).

NOTA NO. 12 01/SEPT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 27/AGO/2022 AL 31/AGO/2022. LA CUAL TIENE EL SIGUIENTE DESGLOSE:


Importe total	\$ 200,105.49
AMORT. ANTICIPO	\$ 55,542.95
DEDUCC. CONTRATO	\$ 5,175.14
Liquidado a pagar	139,387.40

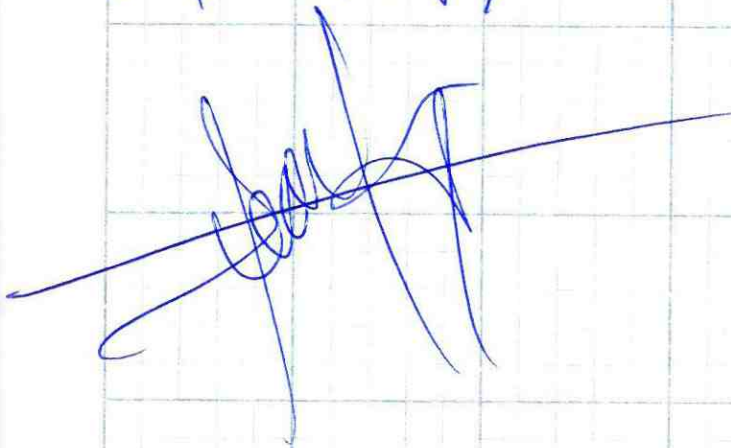

Eduardo Fernandez (S)

NOTA NO. 13 07/SEPT/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE INSTALADO EL EQUIPO DE BOMBEO Y VALVULA CHECK TO GO. DE 3" ϕ . LOS CUALES SON CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS.



Eduardo Fernandez Q.

NOTA NO. 14 08/SEPT/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CUATRO EXTRAORDINARIA FINIQUITO LA CUAL TIENE UN PERIODO DE EJECUCION DEL 07/SEPT/2022 AL 07/SEPT/2022. A CONTINUACION SE ANOTA SU DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 176,419.42

AMORT. ANTICIPA \$ 0.00

DEDUCC. CONTRATO \$ 4,562.57.

LIQUIDO A PAGAR \$ 171,856.85

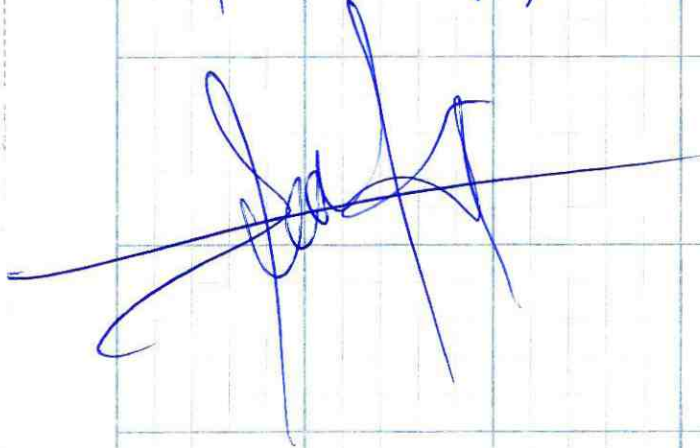

Eduardo Fernandez Q.

NOTA NO. 15 08/sept/ 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE
BITACORA EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO
LAS METAS DEL CONTRATO.



Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 16 08/sept/ 2022.

CON ESTA NOTA SE CORRIGE LA NOTA NO. 14
DE FECHA 08/sept/ 2022, DONDE SE AÑADE
QUE LA ESTIMACION NUMERO CINCO NO ES
ESTIMACION DE FINIBULTO, POR LO QUE DICHA
NOTA QUEDA CANCELADA.


POR OTRO LADO SE CANCELA LA NOTA NUMERO
15 DE FECHA 08/sept/ 2022.



Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 17 08/sept/ 2022.

SE CANCELA LA NOTA NO. 12 DE FECHA —
01/sept/ 2022



Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 17 08/SEPT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 27/AGO/2022 AL 07/SEPT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$	158,675.19
Asont. anticipo	\$	44,048.24
DEDUCC. CONTRATO	\$	4,103.67
Liquido a pagar	\$	110,523.28

Edgar Fernandez O.

NOTA NO. 18 08/SEPT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CUATRO ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 27/AGO/2022 AL 07/SEPT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$	41,430.29
Asont. anticipo	\$	11,494.71
DEDUCC. CONTRATO	\$	1,071.47
Liquido a pagar	\$	28,864.11

Edgar Fernandez O.

NOTA NO. 19 08/SEPT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CINCO EXTRAORDINARIA FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 24/AGO/22 AL 07/SEPT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:


IMPORTE TOTAL \$	176,419.42
AMORT. ANTICIPO \$	0.00
DEDUCC. CONTRATO \$	4,562.57.
LÍQUIDO A PAGAR \$	171,856.85



Edgar Fernandez O.

NOTA NO. 20 08/SEPT/2022.


CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA EN VIRTUD DE HABER COMPLEIDO CON LAS METAS DEL CONTRATO, QUE INCLUYO UN AUMENTO DE MONTO DE \$ 217,830.50 MENOS UN CONVENIO.



Edgar Fernandez O.

NOTA NO. 21 08/SEPT/2022.


CON ESTA FECHA SE CANCELA LA NOTA NO. 19
DE FECHA 08/SEPT/2022.




Edgardo Fernandez Q.

NOTA NO. 22 08/SEPT/2022

CON ESTA FECHA SE CANCELA LA NOTA NO. 20
DE FECHA 08/SEPT/2022.



Edgardo Fernandez Q.

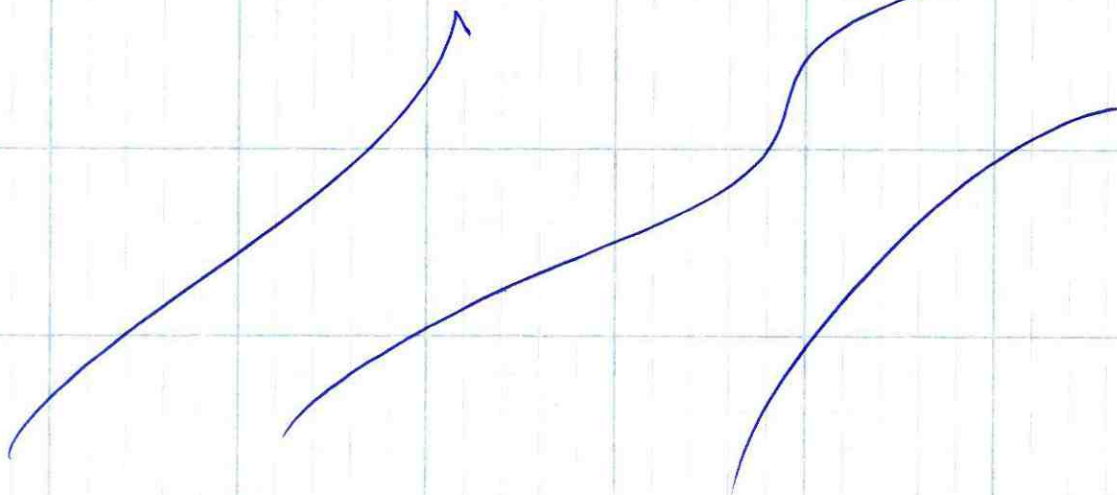

NOTA NO. 23 06/sept/2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. CINCO ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 27/AGO/22 AL 07/SEPT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 4,199.86
AMORT. ANTICIPO	\$ 0.00
DEDUCE. CONTRATO	\$ 108.62
Líquido a pagar	\$ 4,091.18.

 Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 24 06/sept/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. SEIS EXTRAORDINARIA FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 27/AGO/2022 AL 07/SEPT/2022,


LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 172,719.62
AMORT. ANTICIPO	\$ 0.00
DEDUCE. CONTRATO	\$ 4,453.96
Líquido a pagar	\$ 167,765.66

 Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 25 08/SEPT/ 2027.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITA
CORA EN VIRTUD DE HABERSE CUMPLIDO CON LAS
METAS DE CONTRATO Y DE PROYECTO.

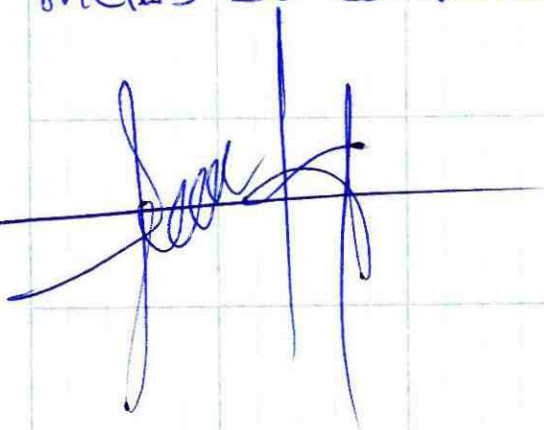

Edgar Fernando Q
