

CONT - OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 1011 - 2022

NOTA NO. 1 14 / NOV. / 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU - EST - LP - PEST - APDA - 1011 - 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE DUCTO DOBLE EN EL KM 5000 DEL E.C. MEXICO - LAS TABLAS, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. FERNANDO ZARUETA FELIX


MONTO DEL CONTRATO: \$ 2'386,236.06

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 14 / NOVIEMBRE / 2022

TERMINACION: 31 / DICIEMBRE / 2022.


LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ, MEDIANTE OFICIO SOP-DIR-SOP-1863-A-2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. ESTEBAN ELADIO BELTRAN ZAMBADA, CON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:


NOTA NO. 2 14/NOV/2022.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-DI-1863-2022.



NOTA NO. 3 14/NOV/2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, AUN Y CUANDO EL ANTICIPO NO HA SIDO PAGADO.



NOTA NO. 4 28/NOV/2022.

POR ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADAS LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS. POR OTRA PARTE SE ESTA TRABAJANDO EN EL HABILITADO DE ACEROS DE REFUERZO.



3
CONT - 1077 - 2022

NOTA NO. 5 10/DIC/2022.


PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADA TODA LA ESTRUCTURA DEL DUCTO DOBLE DE SECCION 1.20m X 5.00m, Y LONGITUD TOTAL 10.90 ml. LA CUAL INCLUYE SEGUN PROYECTO, DENTELLONES, LOSA DE DESPLANTE, MUROS DE CARGA, LOSA SUPERIOR, ALCANOS.

NOTA NO. 6 12/DIC/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION MONTE NO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 14/NOV/2022 AL 10/DIC/2022, LA CUAL PRESENTA LA EV SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$	1'261,850.54
AMORT. ANTICIPO	\$	441,647.69
DEDUCE CONTRATO	\$	32,634.07
LIQUIDO A PAGAR	\$	787,568.78

NOTA NO. 7 28/NOV/2022. (CORRECCION FECHA)
CON ESTA FECHA 28/NOV/2022 SE CORRIGE LA
FECHA DE LA NOTA NO. 5, (CINCO), LA CUAL
DEBE SER 10/NOVIEMBRE/2022.




NOTA NO. 8 28/NOV/2022 (CORRECCION FECHA)
CON ESTA FECHA 28/NOV/2022 SE CORRIGE LA
FECHA DE LA NOTA NO. 6 (SEIS), LA CUAL
DEBE SER 12/NOVIEMBRE/2022. Y EL
PERIODO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO NOR
MAL ES DEL 14/NOV/2022 AL 10/NOV/2022
LOS CONCEPTOS Y MONTOS DE LA ESTIMACION
SON COMO SE INDICAN EN LA NOTA NO. SEIS.




NOTA NO. 9 ~~22/NOV~~ 23/DIC/2022.

MEDIANTE ESTA NOTA QUEDAN SIN EFECTO
LAS NOTAS NO. 7 Y NOTA NO. 8 DE FECHA
02/NOV/2022.



NOTA NO. 10 23/DIC/2022.


PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADA
LA ESTRUCTURA DE DEL DUCTO DOBLE SEGUN
PROYECTO, LOS APERTES DE ENTRADA Y SALI
DA, ASI COMO EL SERRAMIENTO HORIZONTAL.

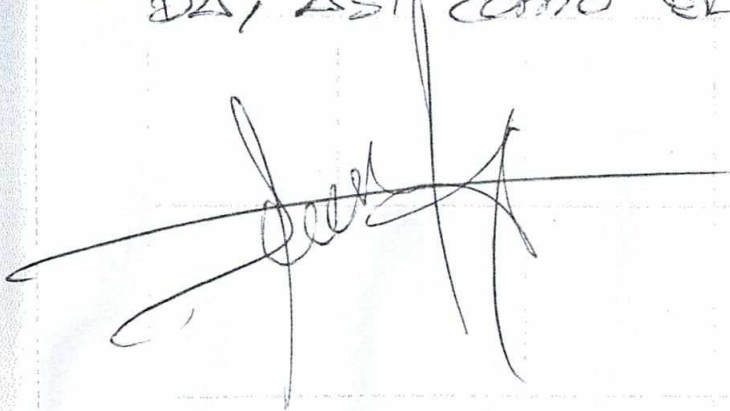

NOTA NO. 11 26/DIC/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMEROS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 11/DIC/2022 AL 23/DIC/2022. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	≠	1'004,920.59
AMORT. ANTICIPO \$		351,722.21
DEDUCC. CONTRATO \$		25,989.33
LÍQUIDO A PAGAR \$		627,209.05



NOTA NO. 12 31/DIC/2022.

CON ESTA FECHA SE TERMINAN DE EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y NORMALES DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA.

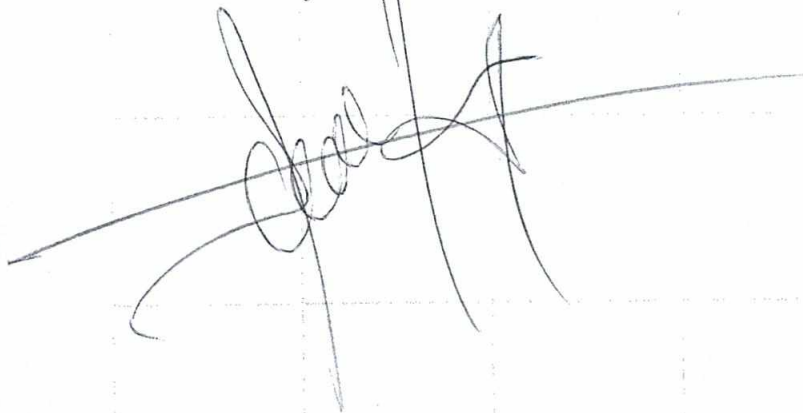

NOTA NO. 13 31/DIC/2022.
CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NUMERO TRES FINALIZADO, CON UN PERIODO
DE EJECUCION DEL 24/DIC/2022 AL 31/DIC
/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE RES
GLOSO ?

Importe total \$	114,992.75
ASORT. ANTICIPA \$	0.00
DEDUCC. CONTRATO \$	2,973.95
LICITADO A PAGAR \$	70,206.08.
SALDO A CANCELAR \$	4,472.17.

NOTA NO. 14 31/DIC/2022.

CON ESTA FECHA SE CERRA LA PRESENTE
BITACORA DE OBRAS EN VIRTUD DE HABER
COMPLIDO CON LAS METAS DE CONTRATO.
