



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/801/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

ESTIMACION 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 22 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-027/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,719,542.67 (UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$691,310.68 (SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 68/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: JESÚS AMADO CAMACHO OSUNA
- R.F.C. CAOJ810630ST4
- DOMICILIO FISCAL: CALLE SIN NOMBRE, COLONIA: LOC. LOS NARANJOS, C.P. 80080, CULIACAN, SINALOA
- No. DE FACTURA: # D421, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2025.


SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.


22 DIC 2025
RECIBIDO
2:50



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
C.C.P. ARCHIVO@BADIRAGUATO, SINALOA.



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 128
Fecha: 20/Dic/2025 08:22:17
Lugar de expedición (C.P.) 80080

Emisor

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

RFC: CAOJ810630ST4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: LOS NARANJOS Culiacán Sinaloa México 80080

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Servi cio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121101 - Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-027/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,719,542.67 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 954,849.02 MAS I.V.A 16 % \$ 152,775.84 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,107,624.86 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 334,197.16 MAS I.V.A.: \$ 53,471.55 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 387,668.71 Importe TOTAL A FACTURAR \$ 620,651.86 MAS I.V.A \$ 99,304.30 MONTO NETO A FACTURAR \$ 719,956.16 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 28,645.47 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 416,314.18 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 691,310.68	\$620,651.86	IVA, - Importe: 99304.30	\$620,651.86

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

setecientos diecinueve mil novecientos cincuenta y seis Pesos 16/100 M.N.

Subtotal: \$620,651.86

IVA 16 %: \$99,304.30

Total: \$719,956.16



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711830284

Folio Fiscal: 4E29EC62-82FC-495E-BA87-1E7F0129D421

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-12-22T09:17:25

Sello digital del CFDI

GCTHROyVvVppDVvIauWH5Yf6OCDC+eLPRxqV0/P4Af1cw7/prLn4DPRaGz8qDREq35OSXpzXEFNDnwR0gcVghenOnEeSmhJuyiXsyeg4JMWsJyOu68L08+3cPIM/gCER2DGEA3fpfGggTwwSvWDM7eolKmxKHP6XvwH+vfj3PgN9DQkARFsX/3GPqJ/bQ0AfsR17QjZ3KqE/tcFD/Sr6ITmXsv9kYkueCyTT3oKXskmz31M0RXpGLCnQT716gCM5GPwRqZenjBwnZ227diA/Y7L3/2pEj0Vlu2mJmq+xDxqbUJGaf7y+yoJmkjLY/z+hHZTHQUCuqTBrqw==

Sello del SAT

I0K0Q/2OrOpXvXEyLW6fKGe6NZYFwWIMNE/Lx8b7QxgqnN0AyivibnrLgk9v/E7u8QYxz+amxda0XDyRQbWDR02qwaiXm8/4yC+74bm5ORiRohRQ/Fg5sWd1oupHoiWczwySNjeeYqJpW3v9w3YHSHc0%KzIAQRvdVFTZ0lvDvH0c+cszwvUPE2z3JFLxllbyoCZLgG85OvG4yZxvH1gh9nMU1nDr0sSRU9X8uHBIGVe4zOqAMwK0KzzWzCgLuJ2x6pMYDF8cXIXZf67OU8oF85F66Ad+2wmb7JX7qr/oryWCP4x+qoZKzLRMUPILVUOLCalapnoBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|4E29EC62-82FC-495E-BA87-1E7F0129D421|2025-12-22T09:17:25|MAS0810247C0|GCTHROyVvVppDVvIauWH5Yf6OCDC+eLPRxqV0/P4Af1cw7/prLn4DPRaGz8qDREq35OSXpzXEFNDnwR0gcVghenOnEeSmhJuyiXsyeg4JMWsJyOu68L08+3cPIM/gCER2DGEA3fpfGggTwwSvWDM7eolKmxKHP6XvwH+vfj3PgN9DQkARFsX/3GPqJ/bQ0AfsR17QjZ3KqE/tcFD/Sr6ITmXsv9kYkueCyTT3oKXskmz31M0RXpGLCnQT716gCM5GPwRqZenjBwnZ227diA/Y7L3/2pEj0Vlu2mJmq+xDxqbUJGaf7y+yoJmkjLY/z+hHZTHQUCuqTBrqw==|00001000000709182898|]

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4MzAyODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQ0DCx8QyBERUwguU0VSVk1DSU8gREUgQUJRNUSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-12-20T08:22:17" Folio="128" FormaPago="03" LugarExpedicion="80000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711830284"
Sello="GCTHROYtVvVppDVvIauIWH5Yf60CDc+eLPRxqV0/P4Af1cvv7/prLn4DPRaGz8qDREq350SxpZXEFDnwR0gcVIghenOnEeSmhJuyiXsyeq4JMWsJy0u8BL00+3cPiM/gCER2DGEA3fpfGggTw
SubTotal="620651.86" TipoDeComprobante="I" Total="719956.16" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="JESUS AMADO CAMACHO OSUNA" RegimenFiscal="612" Rfc="CA0381063054"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA050101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72121101" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE CONSTRUCCIONPAGO DE ESTIMACION 01 NORMALDE LA
    OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-
    027/2025MONTO DEL CONTRATO: $ 1,719,542.67IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 954,849.02MAS I.V.A 16 % $ 152,775.84TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON
    IVA $ 1,107,624.86AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 334,197.16MAS I.V.A.: $ 53,471.55TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 387,668.71Importe TOTAL A FACTURAR $
    620,651.86MAS I.V.A $ 99,304.30MONTO NETO A FACTURAR $ 719,956.16RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C. ) : $ 28,645.47TOTAL DEDUCCIONES: $ 416,314.18MONTO
    LIQUIDO A RECIBIR: $ 691,310.68" Importe="620651.86" NoIdentificacion="SFR07" ObjetoImp="02" ValorUnitario="620651.86">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="620651.86" Importe="99304.30" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="99304.30">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="620651.86" Importe="99304.30" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4E29EC62-82FC-495E-BA07-1E7F0129D421"
    FechaTimbrado="2025-12-22T09:17:25" RfcProvCertif="MAS0010247C0"
    SelloCFD="GCTHROYtVvVppDVvIauIWH5Yf60CDc+eLPRxqV0/P4Af1cvv7/prLn4DPRaGz8qDREq350SxpZXEFDnwR0gcVIghenOnEeSmhJuyiXsyeq4JMWsJy0u8BL00+3cPiM/gCER2DGEA3f
    NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
    SelloSAT="I0KXix20rOpXvxEyLW6fKGS6NZYFWlMNE/Lx6b7QxgqnN04yivibnrLgk9v/rE7u8QYxz+amxda0tXdyRQbWDR92qwaiXm8/4yC+74bm50R1rohR0/Fg5lsWd1oupHc/iWczwy5Nj
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

CAOJ810630ST4	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
---------------	---------------------------	--------------	--------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

4E29EC62-82FC-495E-BA87-1E7F0129D421	2025-12-20T08:22:17	2025-12-22T09:17:25	MAS0810247C0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$719,956.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
--------------	---------	---------	---------------------------



Fecha: 8 de diciembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	JESUS AMADO CAMACHO OSUNA	ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL
DOMICILIO:	Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa	PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	17-nov-25
		AL	07-dic-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
CAOJ810630ST4.			15-jul-25
DEPENDENCIA:-			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO: 17-nov-25
		TERMINACIÓN: 26-dic-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-027/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,482,364.37	\$1,719,542.67	\$601,839.93	\$1,719,542.67

RECIBI:	BUENO POR:	\$ 691,310.68
---------	------------	---------------

\$ 691,310.68 (SON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 68/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL

DEDUCCIONES:

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 334,197.16	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 954,849.02
MAS I.V.A.:	\$ 53,471.55	MAS I.V.A 16 %	\$ 152,775.84
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 387,668.71	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 1,107,624.86
3 % SVIFYC:	\$ 28,645.47	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 416,314.18
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 416,314.18	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 719,956.15

SALDO A PAGAR:	\$ 691,310.68
----------------	---------------

ELABORO.-

Jesus Amado
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZA

C. ING. RUBIEL RINCON RAMC
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y



JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Dependencia:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		Fecha:	Estimacion:	
		8 de diciembre de 2025	01 NORMAL	
Periodo de la estimación:	17/11/2025 07/12/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	17/11/2025 26/12/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-027/2025	
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,719,542.67	\$ 1,482,364.37	\$ 601,839.93	\$ 518,827.53	64%
				% Avance Total
				64%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 954,849.02	ESTA ESTIMACION
\$ 387,668.70	16 % I.V.A (+) \$ 152,775.84	\$ 1,107,624.86
	Sub- Total A (=) \$ 1,107,624.86	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 334,197.16	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 53,471.55	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ 387,668.71	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 620,651.86	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 99,304.30	TOTAL ACUMULADO.
\$ 387,668.70	Total (=) \$ 719,956.16	\$ 1,107,624.86
	3 % SVIFYC: \$ 28,645.47	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 416,314.18	CONTRATADO
\$ 601,839.93	Importe TOTAL \$ 691,310.68	\$ 1,719,542.67
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 691,310.68	SALDO
\$214,171.23	Son:	\$ 611,917.81
	(SON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 68/100 M.N.)	

ELABORO.-

Jesús Amado Camacho Osuna
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

ELABORO.-

REVISO.-
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA:	
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		8 de diciembre de 2025	
DOMICILIO:		DEPENDENCIA:	
Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	CAQJ810630ST4		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,482,364.37
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 601,839.93
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,719,542.67

DESTAJO	IMPORTE
PRELIMINARES	\$ 32,488.88
ESTRUCTURA	\$ 922,360.14
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 954,849.02

SUB TOTAL=	\$ 954,849.02
I.V.A AL 16 %	\$ 152,775.84
TOTAL =	\$ 1,107,624.86

ELABORO.-

Jesús Amado
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLÓSE

CONTRATISTA:		JESUS AMADO CAMACHO OSUNA		DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA		lunes, 8 de diciembre de 2025	
DOMICILIO:		Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa		R.F.C.		CAOJ810630ST4.		1 de 1			
DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL			
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.											
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,482,364.37		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$601,839.93		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,719,542.67	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	225.00	\$	13.74	\$ 3,091.50	225.00	0.00	0.00	225.00	\$ 3,091.50
GP02	CORTE DE CAJA DE MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	112.50	\$	70.96	\$ 7,983.00	112.50	0.00	0.00	112.50	\$ 7,983.00
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO. 1ER KIÓMETRO.	M3	112.50	\$	127.35	\$ 14,326.88	112.50	0.00	0.00	112.50	\$ 14,326.88
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	225.00	\$	31.50	\$ 7,087.50	225.00	0.00	0.00	225.00	\$ 7,087.50
GBR121	ESTRUCTURA LOSA DE CIMENTACION DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM. ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES.EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	275.20	\$	1,160.70	\$ 319,424.64	0.00	0.00	0.00	275.20	\$ 319,424.64
GBR124	MURO TRAPEZOIDAL DE 30 A 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM. ARMADO CON VARILLA DE 3/4" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES.EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	150.00	\$	3,292.80	\$ 493,920.00	0.00	0.00	0.00	150.00	\$ 493,920.00
GBR125	MURO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM. ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES.EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	50.00	\$	2,180.31	\$ 109,015.50	0.00	0.00	0.00	50.00	\$ 109,015.50
							SUB-TOTAL		\$		954,849.02
							IVA		\$		152,775.84
							MONTO TOTAL		\$		1,107,624.86

ELABORO-

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGALREVISÓ
ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.U. Y E



ELABORO: 
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



ELABORO: 
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: 
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.

CONTRATISTA:
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa


R.F.C. CAOJ810630ST4.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
PRELIMINARES	
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	CORTE DE CAJA DE MATERIAL TIPO B DE 0.50 A 2.00 MTS.
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILOMETRO.
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
ESTRUCTURA	
GBR121	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS
GBR124	MURO TRAPEZOIDAL DE 30 A 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 3/4" @ 20 CMS EN AMBOS
GBR125	MURO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:

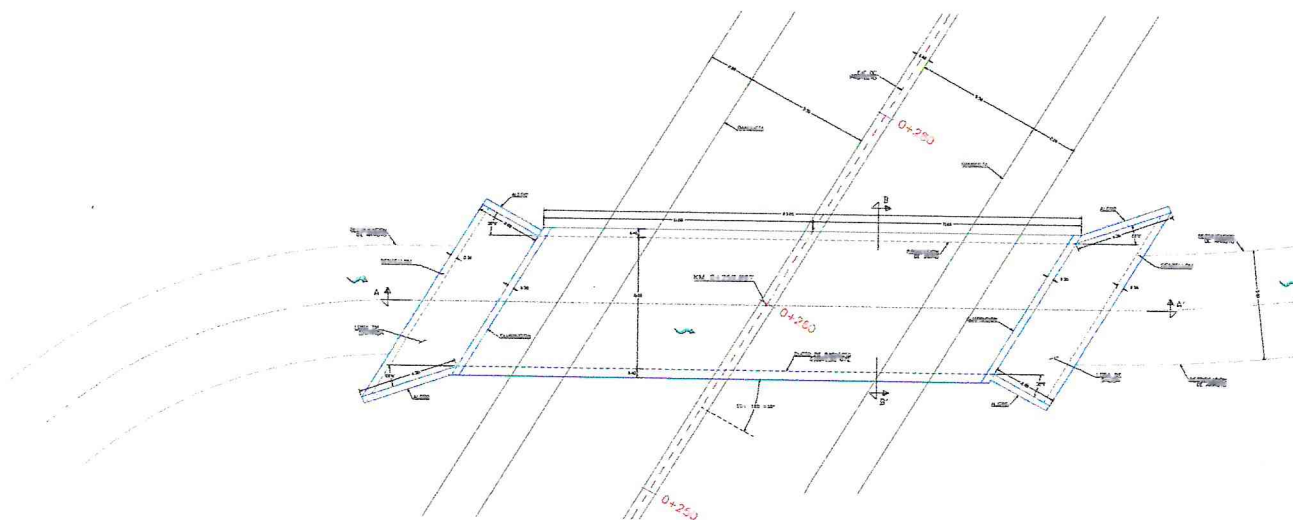

ELABORÓ:
JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ:-
C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

CAOJ810630ST4.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
-----	----------

PRELIMINARES

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	CORTE DE CAJA DE MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS.
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO.
GP03	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ELABORO.-

C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO:

Calle sin nombre s/n. Colonia: Loc. Los Naranjos, C.P. 80080, Culiacán, Sinaloa

R.F.C.

CAOJ810630ST4.


OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
	ESTRUCTURA
GBR1	LOSA DE CIMENTACION DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS,
GBR1	MURO TRAPEZOIDAL DE 30 A 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 3/4" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS,
GBR1	MURO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA,

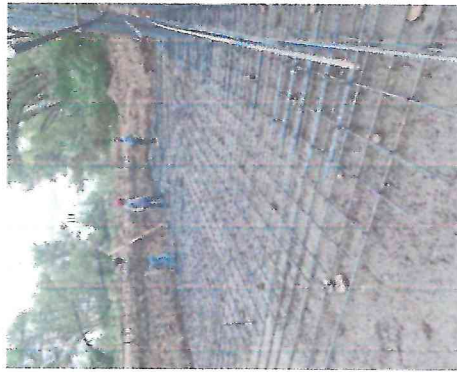

ELABORO.-

Jesús Amado Camacho Osuna
C. JESUS AMADO CAMACHO OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Rubiel Rincón Ramos
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

Rubiel Rincón Ramos
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O P D U Y E



Fecha y hora de consulta24/12/2025 6:29:42 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción:EST 01 NORM AD 027

Importe de la operación:691,310.68 MXP

Cuenta de retiro:0124174836

Cuenta de depósito:072730012781361749

Divisa de la cuenta:MXP

Divisa de la cuenta:MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta:JESUS AMADO CAMACHO OSUNA

Nombre banco destino:BANORTE

Fecha valor:26/12/2025

Fecha de creación:24/12/2025

Fecha de aplicación:24/12/2025

Concepto de pago:EST 01 NORM AD 027

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:ASD 6551749382

Hora de captura en el canal:18:29:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000718737

Clave de rastreo:002601002512260000718737

Folio de firma:0052887026

Folio único:I401202512241829390052887032

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	24/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/12/2025
