



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
7708

FECHA DE EXPEDICION
31/07/2026

CTA. CARGO

2113/1/000910/009847/000000/00
0000

CTA. CARGO: 000000 - CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN SA DE CV

CONT-SOPUE-DOP-003-26-2 / INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ALA "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	1	PAGO DE ESTIMACIÓN 4 (ÚLTIMA)	32,493.70	32,493.70

2026-8-0910-221-10-10-21-61-614910-123540009100004120 Obra Publica Directa- CONSTRUCCIONES- OBRA PUBLICA DIRECTA
000000000000

Proyecto: 61 OBRA PUBLICA DIRECTA - OBRA PUBLICA DIRECTA

COG: 614910 Obra Publica Directa



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: CONT-SOPUE-DOP-003-26
PAGO DE ESTIMACIÓN 4 (ÚLTIMA)

Cargo: INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ALA "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SUB- TOTAL: 32,493.70

DESCUENTO:

I VA: 0.00

RETENCIONES: 1,292.85

TOTAL: 31,200.85

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

Recibí bien el servicio a satisfacción

ELABORÓ

MELISSA YOLANDA ROMERO GONZALEZ



AUTORIZO

OLIVER GABRIEL LEAL AYALA



Oficio: No. SOP/1235-26

Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 31 de julio del 2026.

C. ROBERTO MORALES LEYVA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

AT'N: ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ
DIRECTOR DE EGRESOS

Anexo al presente envío para su revisión y pago de **estimación no. 4 (última)**: autorización presupuestal, factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento a contraloría, oficio de transferencia para verificar fecha, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, acta de entrega de recepción, acta de extinción de derechos y obligaciones, invitación a contraloría, de la siguiente obra la cual cumple con lo establecido en el *artículo 11 fracc. I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa*:

Importe contratado:	\$ 887,765.98
Importe contratado de la obra:	\$ 49,990.32
Importe total estimado:	\$ 49,990.32
Importe total a pagar:	\$ 31,200.85

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
CONT-SOPUE-DOP-003-26	Instalaciones eléctricas para (DGSPM) Dirección General de Seguridad Pública Municipal ala "A" y ala "B", alumbrado y contactos, ubicado en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa.	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"AHOME, LA CASA DE TODOS"

DR. OLIVER GABRIEL LEAL AYALA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
C.c.p. Anselmo Acosta Bojórquez. -Director de Egresos.
OGLA/MYRG



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN

CCE220215159

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

MUNICIPIO DE AHOME

MAH1701013C0

Domicilio fiscal: 81280 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

b807f5d2-c5ac-4749-8b1e-8ac7f58f64a1

Número de serie del CSD

00001000000700944622

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 80050

07/07/2026 09:59:23 AM

Serie y folio sinube

A - 160

Exportación

01

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de Impuesto
72151500	72151500	1	E48	E48	EST 4 (ULTIMA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CONT- SOPUE-DOP-003-26, POR LA REALIZACION DE LA OBRA: -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; IMPORTE ESTIMACION NETA: \$ 49,990.32 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%: \$ 17,496.62 RET. VERIF. INSPECCION FISC. CONTROL 2% A.S.E: \$ 861.90 RET. VERIF. INSPECCION FISC. CONTROL 1% O.I.C.: \$ 430.95 TOTAL DEDUCCIONES: \$18,789.47 IMPORTE A PAGAR: \$ 31,200.85	\$28,011.81	\$28,011.81	02

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$28,011.81	\$4,481.89

Importe con letra:

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.

CONTADO | 99 - Por definir | PPD - Pago en parcialidades o diferido



Subtotal	\$28,011.81
Descuento	\$0.00
IVA 16.0%	\$4,481.89
TOTAL	\$32,493.70

Sello digital del CFDI:

Jw9N3vryF0eZzCDQBejF7FLgYidZPmN9sQ47Y5SlmTZD9Asc/n2Gp1EhFfNhwUtiB+U6C2j11515nb6Dp7/P7ZWSz3aO5vgff9CgSN5Imvbiynw1DbaJ2+seDGhRjELU8zIN+BPye5WeisnLvZOVJoaPZitY544QX+MX9y9N9FgXW/6vxdMDdQOOOrd7K9ZoxCWKYs0AwPYIpf/eW9CdD44jFVmhjv29QABde2MKKRJO5N2Mv0xqzTRZyC4+Uyxb13xhh8N2REES7+e1xN/rqQa7exB009MCiVUOC5Obw7dZesqjWlRmYu+4kiTS2ixQnALe9athigLio8r4HWbCW==

Sello del SAT:

Zq+ROWnwKkCPzZK61jYQavEdu00bdc+baT6Kn/jmm+NyBYHansMU8t1DMrhqph1KibhQgccXqydUdM64Mom4Kui8Y0cxlz7FuPShyV1MVCulkdT09t5A89ODdp78L+NDT3oscECNPx1F0DTQlJmVIEEmEadtD/+QfIR2m9Ta0/zXpGDo7DM/YaV5Vdss7MNL7CrBf4WovI2nnpG86CUZzD5pk/P/mPwpvnnN++p9tgmIngEMI/fqKG1oKe8znY0E4e18xLqVvdxPmTIE+fbPSQoh2Kt4f3+MSL1y8lqIaOPu5dDmnjaC77X7JV5Z8EBMplgTp9U1hnywm8WeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b807f5d2-c5ac-4749-8b1e-8ac7f58f64a1|2026-07-07T11:00:24|LSO1306189R5|Jw9N3vryF0eZzCDQBejF7FLgYidZPmN9sQ47Y5SlmTZD9Asc/n2Gp1EhFfNhwUtiB+U6C2j11515nb6Dp7/P7ZWSz3aO5vgff9CgSN5Imvbiynw1DbaJ2+seDGhRjELU8zIN+BPye5WeisnLvZOVJoaPZitY544QX+MX9y9N9FgXW/6vxdMDdQOOOrd7K9ZoxCWKYs0AwPYIpf/eW9CdD44jFVmhjv2

C. Daniela Acosta L.




Versión 4.5.1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCE220215159	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B807F5D2-C5AC-4749-8B1E-8AC7F58F64A1	2026-07-07T09:59:23	2026-07-07T11:00:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$32,493.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Daniel Aros




9QABde2MKKRJO5N2Mv0xsTRzYc4+Uyxbl3xhh8N2REES7+e1xN/rqQa7exB0O9MCiVUOC5Obw7dZesqjiWRmYu+4kiTS2ixQnAL
e9athigLlo8r4HWbCw==|00001000000719545303|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000719545303


Fecha y hora de certificación:

07/07/2026 11:00:24 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Daniela Acosta L.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



H. Ayuntamiento de Ahome
Tesorería Municipal
Despacho del Tesorero

Los Mochis, Sinaloa., a 05 de marzo del 2026

LIC. ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ALA "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por **\$50,293.60 (Son: Cincuenta Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 60/100 M.N.)** con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
023-A/2026	GASTO DIRECTO	61	614910	1235-4-910-412

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal



C.c.p. ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO. - Secretario de Obras, Urbanismo y Ecología.
C.c.p. Archivo
RML/RSL*





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
4 (ULTIMA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
	DOMICILIO	Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.		
	CIUDAD:	CULIACAN	ESTADO:	SINALOA
		TELÉFONO:		(667) 243 96 76

DATOS DEL CONTRATO	No. de Contrato:		FECHA DE CONTRATO	30 DE MARZO DE 2026.	IMPORTE DEL CONTRATO
	CONT-SOPUE-DOP-003-26				\$887,765.98
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN				IMPORTE DE LA OBRA
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD				
	PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS				
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				\$49,990.32	
				AÑO 2026.	

BUENO POR: \$31,200.85

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE: \$31,200.85

(Son: Treinta y Un Mil Doscientos Pesos con 85/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 20 DE ABRIL DE 2026 AL 03 DE JUNIO DE 2026
DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$28,011.81		\$43,095.10
I.V.A. 16%:	\$4,481.89		\$6,895.22
SUMA:	\$32,493.70		\$49,990.32
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35%:			\$17,496.62
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.			\$861.90
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.			\$430.95
TOTAL DE DEDUCCIONES:			\$18,789.47
IMPORTE A PAGAR:			\$31,200.85
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 03 DE JUNIO DE 2026			

RECIBI

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A.
DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



IMPORTE A FACTURAR:	\$32,493.70
IMPORTE A PAGAR:	\$31,200.85

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

OBRA:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-003-26	
					CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	
		PERIODO DEL :	20 DE ABRIL DE 2026	AL	03 DE JUNIO DE 2026	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2026
NO.	PARTIDA		DE ESTIMACIONES ANTERIORES		DE ESTA ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES
1(UNO) 03-SOPUE-003-2026	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		\$153,921.65				
2(DOS) 01-SOPUE-003-2026	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		\$506,123.45				
3(TRES) 04-SOPUE-003-2026	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANCITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACION, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		\$62,175.30				
4 (ULTIMA) 02-SOPUE-003-2026	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		\$43,095.10				
ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA			CLAVE				
MONTO DE LA OBRA			02-SOPUE-003-2026	\$49,990.32			
MONTO ESTIMADO			02-SOPUE-003-2026	\$49,990.32			
MONTO POR CANCELAR			02-SOPUE-003-2026	\$0.00			
MONTO DEL ANTICIPO			02-SOPUE-003-2026	\$17,496.62			
MONTO AMORTIZADO			02-SOPUE-003-2026	\$17,496.62			
MONTO POR AMORTIZAR			02-SOPUE-003-2026	\$0.00			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:			\$310,718.10	SUBTOTAL	\$722,220.40	\$43,095.10	
ESTIMACION			1 (UNO)	03-SOPUE-003-2026	\$62,492.19	I.V.A.	\$115,555.26
ESTIMACION			2 (DOS)	01-SOPUE-003-2026	\$205,486.11	TOTAL	\$837,775.66
ESTIMACION			3 (TRES)	04-SOPUE-003-2026	\$25,243.18		
ESTIMACION			4 (ULTIMA)	02-SOPUE-003-2026	\$17,496.62		
TOTAL AMORTIZADO DE ANTICIPO:			\$310,718.10				
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:			\$49,990.32 Son: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa Pesos con 32/100 M.N.)				
ESTADO CONTABLE			CONTRATO		ANTICIPO		CONTRATO
IMPORTE DEL CONTRATO			\$887,765.98		ANTICIPO OTORGADO		\$310,718.10
ESTIMADO A LA FECHA			\$887,765.98		AMORTIZADO A LA FECHA		\$310,718.10
SALDO POR ESTIMAR:			\$0.00		SALDO A AMORTIZAR		\$0.00
CONFORME			REVISAR		AUTORIZAR		
DANIELA ACOSTA L.			ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT		ARQ. JESUS ERNESTO TARIA CASTRO		
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.			RESIDENTE DE OBRA		DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
CONTRATISTA							

ESTIMACIÓN NO.	4 (ÚLTIMA)
HOJA	1
DE	1

ARQ JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME											GENERADORES			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA											HOJA	1		
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS											DE	1		
											ESTIMACION No. #	4 (ULTIMA)		
OBRA:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO:		CONT-SOPUE-DOP-003-26	
											CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	
											FECHA:	03 DE JUNIO DE 2026		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES		
1	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL													
01	ALA "A" Y ALA "B" ALUMBRADO Y CONTACTOS													
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONDULET LB DE 1", CONDULET C 1", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS, TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", SILICON SELLADOR, RIEL UNI CANAL LISO DE 2 X 4", ABRAZADERA UNICANAL DE 1", COPLER GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", TUBO PVC 1/2" PESADO, REGISTRO (TIPO CHALUPA) 2X4 REFORZADO 1/2", REGISTRO GALV. 3X3 REFORZADO 1/2", RO SETA PLASTICO, FOCO LED DE 30 W, PLACA CIAPAGADOR SENCILLO 3 MOD LUCEK, CONTACTO DOBLE 20 AMPS. CITAPACONECTOR PVC 1/2" PESADO, CODO PVC 1/2" PESADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 AMP., INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 AMP, PEGAMENTO PVC LATA DE 500 GRS., CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE CO BRE THW CAL. 8 BLANCO, CABLE DE COBRE THW CAL. 8 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 BLANCO, CABLE DE CO BRE THW CAL. 12 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 ROJO, VARILLA PARA TIERRA 5/8"1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1/2", CONECTOR GALV. 1/2", ABRAZADERA CLIP 1/2", ABRAZADERA UÑA 1/2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE									1	1		

Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



[Signature]
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	03 DE JUNIO DE 2026	ESTIMACIÓN NO.	4 (ULTIMA)

001

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONDULET LB DE 1", CONDULET C 1", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS, TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", SILICON SELLADOR, RIEL UNI CANAL LISO DE 2 X 4", ABRAZADERA UNICANAL DE 1", COPLE GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", TUBO PVC 1/2" PESADO, REGISTRO (TIPO CHALUPA) 2X4 REFORZADO 1/2, REGISTRO GALV. 3X3 REFORZADO 1/2, RO SETA PLASTICO, FOCO LED DE 30 W, PLACA C/APAGADOR SENCILLO 3 MOD LUCEK, CONTACTO DOBLE 20 AMPS. C/TAPACONECTOR PVC 1/2" PESADO, CODO PVC 1/2" PESADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 AMP., INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 AMP, PEGAMENTO PVC LATA DE 500 GRS., CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE CO BRE THW CAL. 8 BLANCO, CABLE DE COBRE THW CAL. 8 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 BLANCO, CABLE DE CO BRE THW CAL. 12 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 ROJO, VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1/2", CONECTOR GALV. 1/2", ABRAZADERA CLIP 1/2", ABRAZADERA UÑA 1/2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

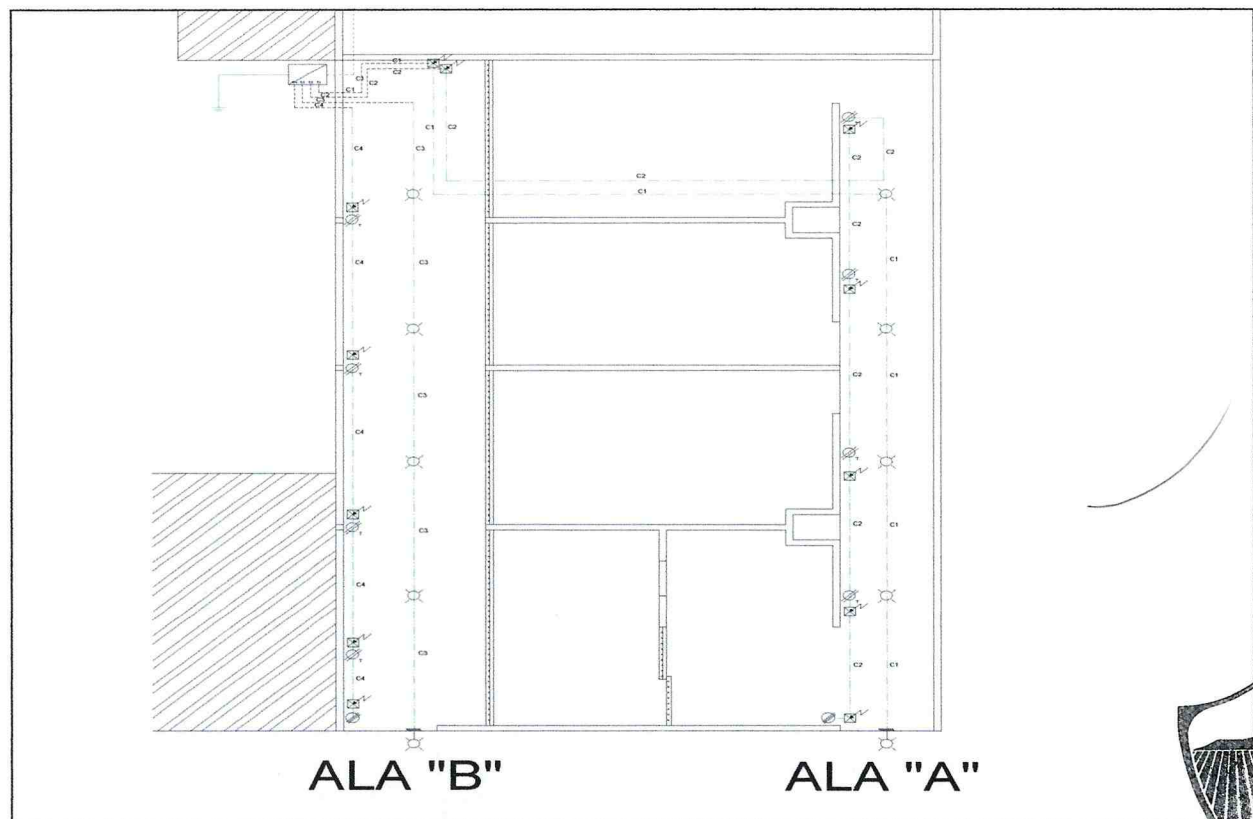

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	03 DE JUNIO DE 2026	ESTIMACIÓN NO.	4 (ULTIMA)

001

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONDULET LB DE 1", CONDULET C 1", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS, TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", SILICON SELLADOR, RIEL UNI CANAL LISO DE 2 X 4", ABRAZADERA UNICANAL DE 1", COPLE GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", TUBO PVC 1/2" PESADO, REGISTRO (TIPO CHALUPA) 2X4 REFORZADO 1/2, REGISTRO GALV. 3X3 REFORZADO 1/2, RO SETA PLASTICO, FOCO LED DE 30 W, PLACA C/APAGADOR SENCILLO 3 MOD LUCEK, CONTACTO DOBLE 20 AMPS. C/TAPACONECTOR PVC 1/2" PESADO, CODO PVC 1/2" PESADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 AMP., INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 AMP, PEGAMENTO PVC LATA DE 500 GRS., CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE CO BRE THW CAL. 8 BLANCO, CABLE DE COBRE THW CAL. 8 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 BLANCO, CABLE DE CO BRE THW CAL. 12 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 ROJO, VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1/2", CONECTOR GALV. 1/2", ABRAZADERA CLIP 1/2", ABRAZADERA UÑA 1/2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.




Daniela Acosta

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La Casa de Todos

FINIQUITO

HOJA 1

DE 1

OBRA:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

PERIODO DEL :

20 DE ABRIL DE 2026

AL

03 DE JUNIO DE 2026

FECHA:

03 DE JUNIO DE 2026

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E4	E5	TOTALES			
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								
1	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL								
01	ALA "A" Y ALA "B" ALUMBRADO Y CONTACTOS								
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONDULET LB DE 1", CONDULET C 1", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS, TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", SILICON SELLADOR, RIEL UNI CANAL LISO DE 2 X 4", ABRAZADERA UNICANAL DE 1", COPLE GALVANIZADO S/R 1" , CONECTOR GALVANIZADO DE 1", TUBO PVC 1/2" PESADO, REGISTRO (TIPO CHALUPA) 2X4 REFORZADO 1/2, REGISTRO GALV. 3X3 REFORZADO 1/2, RO SETA PLASTICO, FOCO LED DE 30 W, PLACA C/APAGADOR SENCILLO 3 MOD LUCEK, CONTACTO DOBLE 20 AMPS. C/TAPACONECTOR PVC 1/2" PESADO, CODO PVC 1/2" PESADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 AMP., INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 AMP, PEGAMENTO PVC LATA DE 500 GRS., CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE CO BRE THW CAL. 8 BLANCO, CABLE DE COBRE THW CAL. 8 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 BLANCO, CABLE DE CO BRE THW CAL. 12 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 ROJO, VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1/2", CONECTOR GALV. 1/2", ABRAZADERA CLIP 1/2", ABRAZADERA UÑA 1/2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1	1.00	0	1.00	0.00	\$43,095.10	\$0.00
<div><div>SUBTOTAL DE ALA "A" Y ALA "B" ALUMBRADO Y CONTACTOS</div><div>\$0.00</div></div> <div><div>SUBTOTAL:</div><div>\$0.00</div></div> <div><div>IVA:</div><div>\$0.00</div></div> <div><div>TOTAL</div><div>\$0.00</div></div> <div><div>INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA:</div><div>\$49,990.32</div></div> <div><div>INVERSIÓN EJERCIDA:</div><div>\$49,990.32</div></div> <div><div>ALBO NO EJERCIDO:</div><div>\$0.00</div></div>									

CONFORME

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

REVISA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME





MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	03 DE JUNIO DE 2026	ESTIMACIÓN NO.	4 (ULTIMA)
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO 5/R 1", CONDULET LB DE 1", CONDULET C 1", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS, TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", SILICON SELLADOR, RIEL UNI CANAL LISO DE 2 X 4", ABRAZADERA UNICANAL DE 1", COPLE GALVANIZADO 5/R 1" , CONECTOR GALVANIZADO DE 1", TUBO PVC 1/2" PESADO, REGISTRO (TIPO CHALUPA) 2X4 REFORZADO 1/2, REGISTRO GALV. 3X3 REFORZADO 1/2, RO SETA PLASTICO, FOCO LED DE 30 W, PLACA C/APAGADOR SENCILLO 3 MOD LUCEK, CONTACTO DOBLE 20 AMPS. C/TAPACONECTOR PVC 1/2" PESADO, CODO PVC 1/2" PESADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 AMP., INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 AMP, PEGAMENTO PVC LATA DE 500 GRS., CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE CO BRE THW CAL. 8 BLANCO, CABLE DE COBRE THW CAL. 8 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 BLANCO, CABLE DE CO BRE THW CAL. 12 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 ROJO, VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1/2", CONECTOR GALV. 1/2", ABRAZADERA CLIP 1/2", ABRAZADERA UÑA 1/2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

ALA "A"

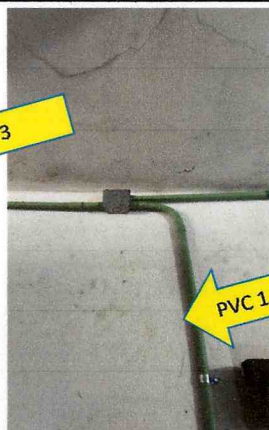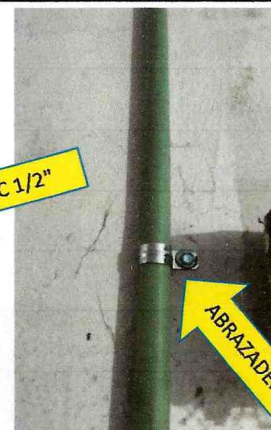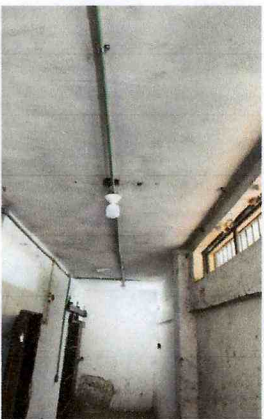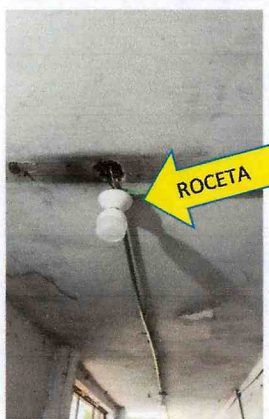

Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	03 DE JUNIO DE 2026	ESTIMACIÓN NO.	4 (ULTIMA)

ALA "A"



CONTACTO 20 AMP



CONTACTO 20 AMP



APAGADOR TRIPLE




FOCO LED

Daniela Acosta

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME


MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	03 DE JUNIO DE 2026	ESTIMACIÓN NO.	4 (ULTIMA)

ALA "B"

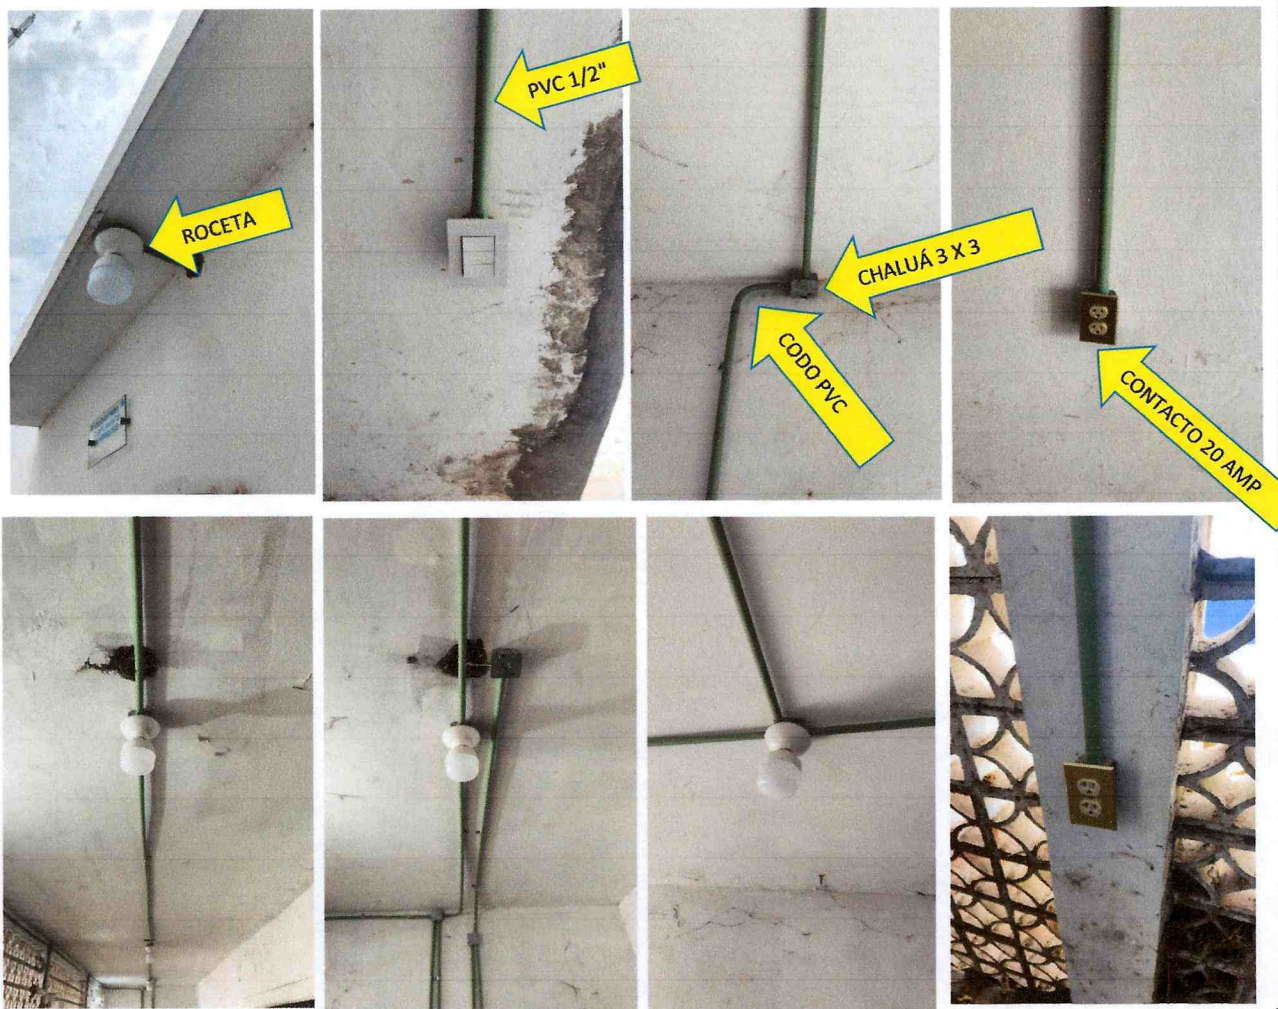


Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A.
DE C.V.
CONTRATISTA

[Signature]

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	03 DE JUNIO DE 2026	ESTIMACIÓN NO.	4 (ULTIMA)

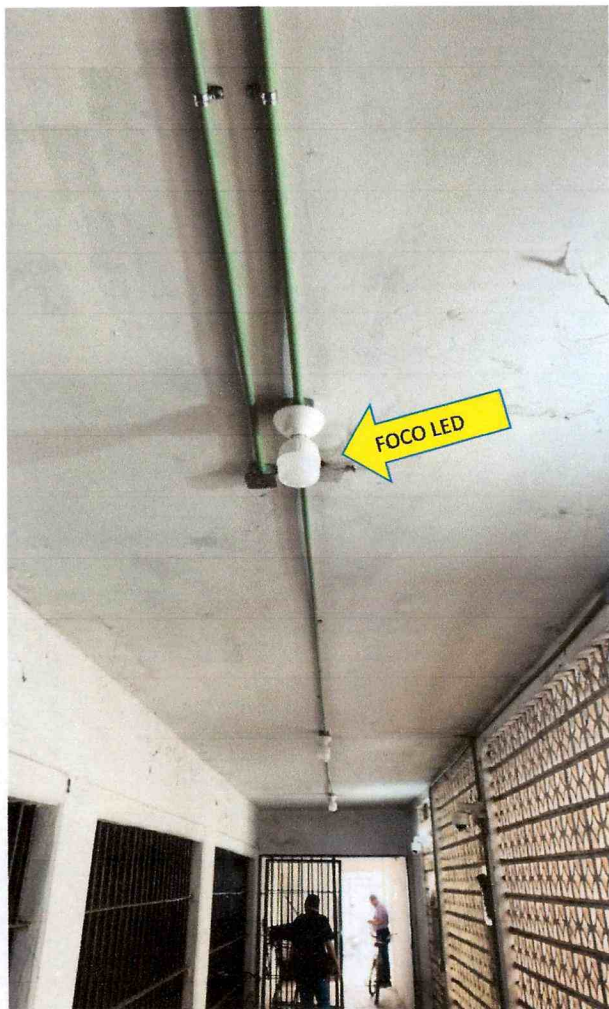

Daniela Acosta

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS






AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	03 DE JUNIO DE 2026	ESTIMACIÓN NO.	4 (ULTIMA)

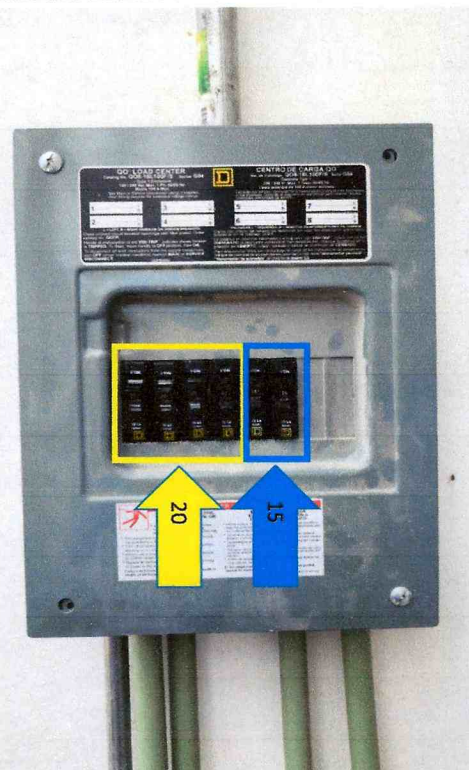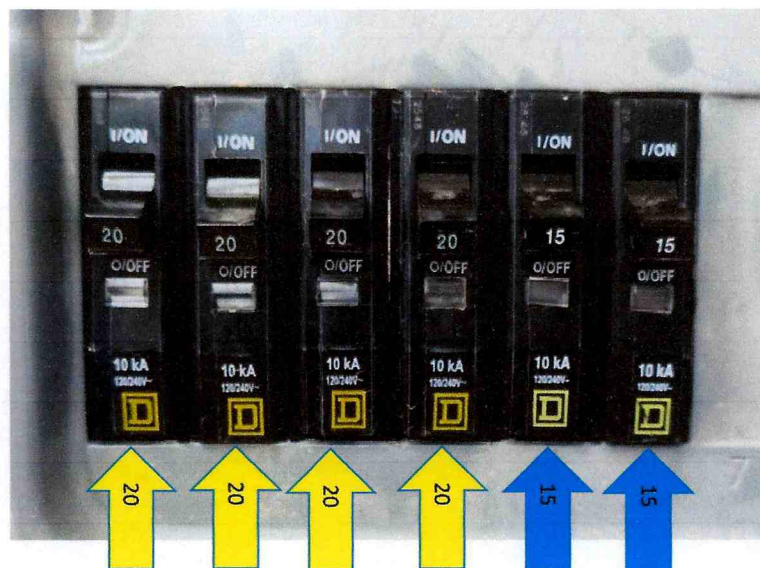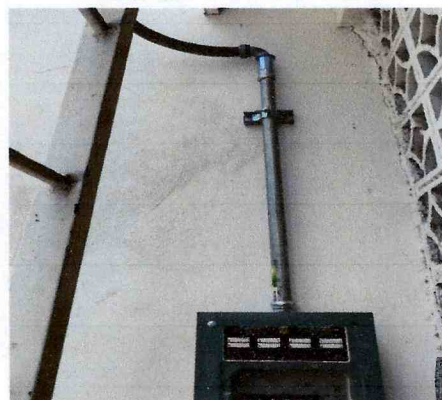

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	03 DE JUNIO DE 2026	ESTIMACIÓN NO.	4 (ULTIMA)



Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA			HOJA PORTADA	
NOMBRE:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			
UBICACIÓN:	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
No. CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-003-26		PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 887,765.98	IMPORTE TOTAL	RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2026, autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con número: 022-A/2026 y 023-A/2026 ambos de fecha 05 de marzo de 2026; y 026-A/2026 y 027-A/2026 ambos de fecha 19 de marzo de 2026. Obras que fueron aprobadas mediante oficios con número: 022/2026 y 023/2026 ambos de fecha 05 de marzo de 2026; y 026/2026 y 027/2026 ambos de fecha 19 de marzo de 2026. Obras incluidas en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública (POA) con números: O-072, O-073, O-074 y O-075.	
MONTO DE LA OBRA:	\$ 49,990.32		SUBPROGRAMA	
FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026.	REAL:	20 DE ABRIL DE 2026	
FECHA DE TERMINO:	20 DE MAYO DE 2026.	REAL:	03 DE JUNIO DE 2026	
DATOS DEL CONTRATISTA:				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO:	Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.			
TELÉFONOS:	(667) 243 96 76			
TIPO DE TRABAJO:	INS ELECTRICA			
REPRESENTANTE:	C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:				
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME		
1. <u>Daniela Acosta L</u> C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.		ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT		
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		RESIDENTE DE OBRA		
2. <u>Francisco Villegas Jesus M.</u> CONTRATISTA				
3. _____				
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:				





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

1

UBICACIÓN:

INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	20/04/2026 ABERTA	CON ESTA FECHA SE DECLARA ABERTA ESTA BITACORA DE LA OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL "A Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-003-26
-	28/04/2026 ALA "A"	COLOCACION DE TUBERIA PVC 1/2", CHALUPA DE 2x4, CAJAS GALV. 3x3, CONECTORES, COPLES, PERFORADO, FINADO, TAQUETEADO, COLOCACION DE CODO PVC 1/2,
	06/05/2026 ALA "B"	COLOCACION DE TUBERIA PVC 1/2, CHALUPA 2x4, CAJA GALV. 3x3, CONECTORES, COPLES, PER- FORADO, FINADO, TAQUETEADO Y COLOCACION DE CODO PVC 1/2".
Francisco Villegas Jesus M.		

Daniela Acosta L

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONTRANTOME
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

2

UBICACIÓN:

INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
1	15/05/2026 TRABAJO	COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DO-B, COLOCACION DE TIERRA FÍSICA,
2	TRABAJO	COLOCACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1" SIN ROSCA, COLOCACION DE UNICANAL, ABRASADERA, COPLES, CONECTORES, POR AZOSTA, AL CENTRO DE CARGA EXISTENTE. CONDUIT LB, CONDUIT CI, TAQUETERIA CD Y FINADO
1	29/05/2026 TRABAJO	CABLEADO DE ALA "A" Y ALA "B", CABLEADO DE CENTRO DE CARGA NUEVO A CENTRO DE CARGA EXISTENTE CON CABLEADO THW CAL. 8, CAL #12, CAL #14,
2	TRABAJO	COLOCACION DE PASTILLAS TERMICAS. 1X20 AMP (4 P2A), 1X15 AMP (2 P2A) COLOCACION DE ROSETAS, CONTACTOS DOBLE 20 AMP, APAGADORES,

Fraire Villegas Jesus H

Daniela Acosta L

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

3

UBICACIÓN:

**INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL.**

CONTRATISTA:

**CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.**

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

**No. DE
NOTA**

FECHA	TIPO DE NOTA
-------	--------------

NOTAS Y CROQUIS

1

01/04/07
TQADAJD

CONEXION DE CIRCUITOS AL CENTRO DE CARGA GENERAL.

CIRCUITO	1	ALA "A"	ALUMBRADO
CIRCUITO	2	ALA "A"	CONTACTOS
CIRCUITO	3	ALA "B"	ALUMBRADO
CIRCUITO	4	ALA "B"	CONTACTOS

Francisco Villagras Jesus M.

Daniela Acosta L.

**C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA**

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

4

UBICACIÓN:

**INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL.**

CONTRATISTA:

**CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.**

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

**No. DE
NOTA**

FECHA	TIPO DE NOTA
-------	--------------

NOTAS Y CROQUIS

03/05/2026

ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE PRESENTA ESTA ESTIMACION PARA SU REVISION Y TRAMITE DE PAGO, CON UNA CANTIDAD DE:

\$ 49,990.32

Сирот

CON ESTA FECHA SE DECLARA CERRADA
ESTA SITUAÇÃO DE LA OBRA

INSTALACION ELECTRICA PARA (DGSPM)
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
"A" Y ALA "B",

CONTRACTO: CONT-SOPVE-DEP-003-26.

Frank Villagers Jesus M

Danda Aosta L.

**C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA**

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
ECOLOGIA

DIRECCIÓN D
OBRAS PÚBLIC



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	03 DE JUNIO DE 2026	ESTIMACIÓN NO.	4 (ULTIMA)
UBICACIÓN		COORDENADAS	
INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		25.768255°, -108.991549°	



Daniela Acosta Lazcano

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ALA "B"

ALA "A"

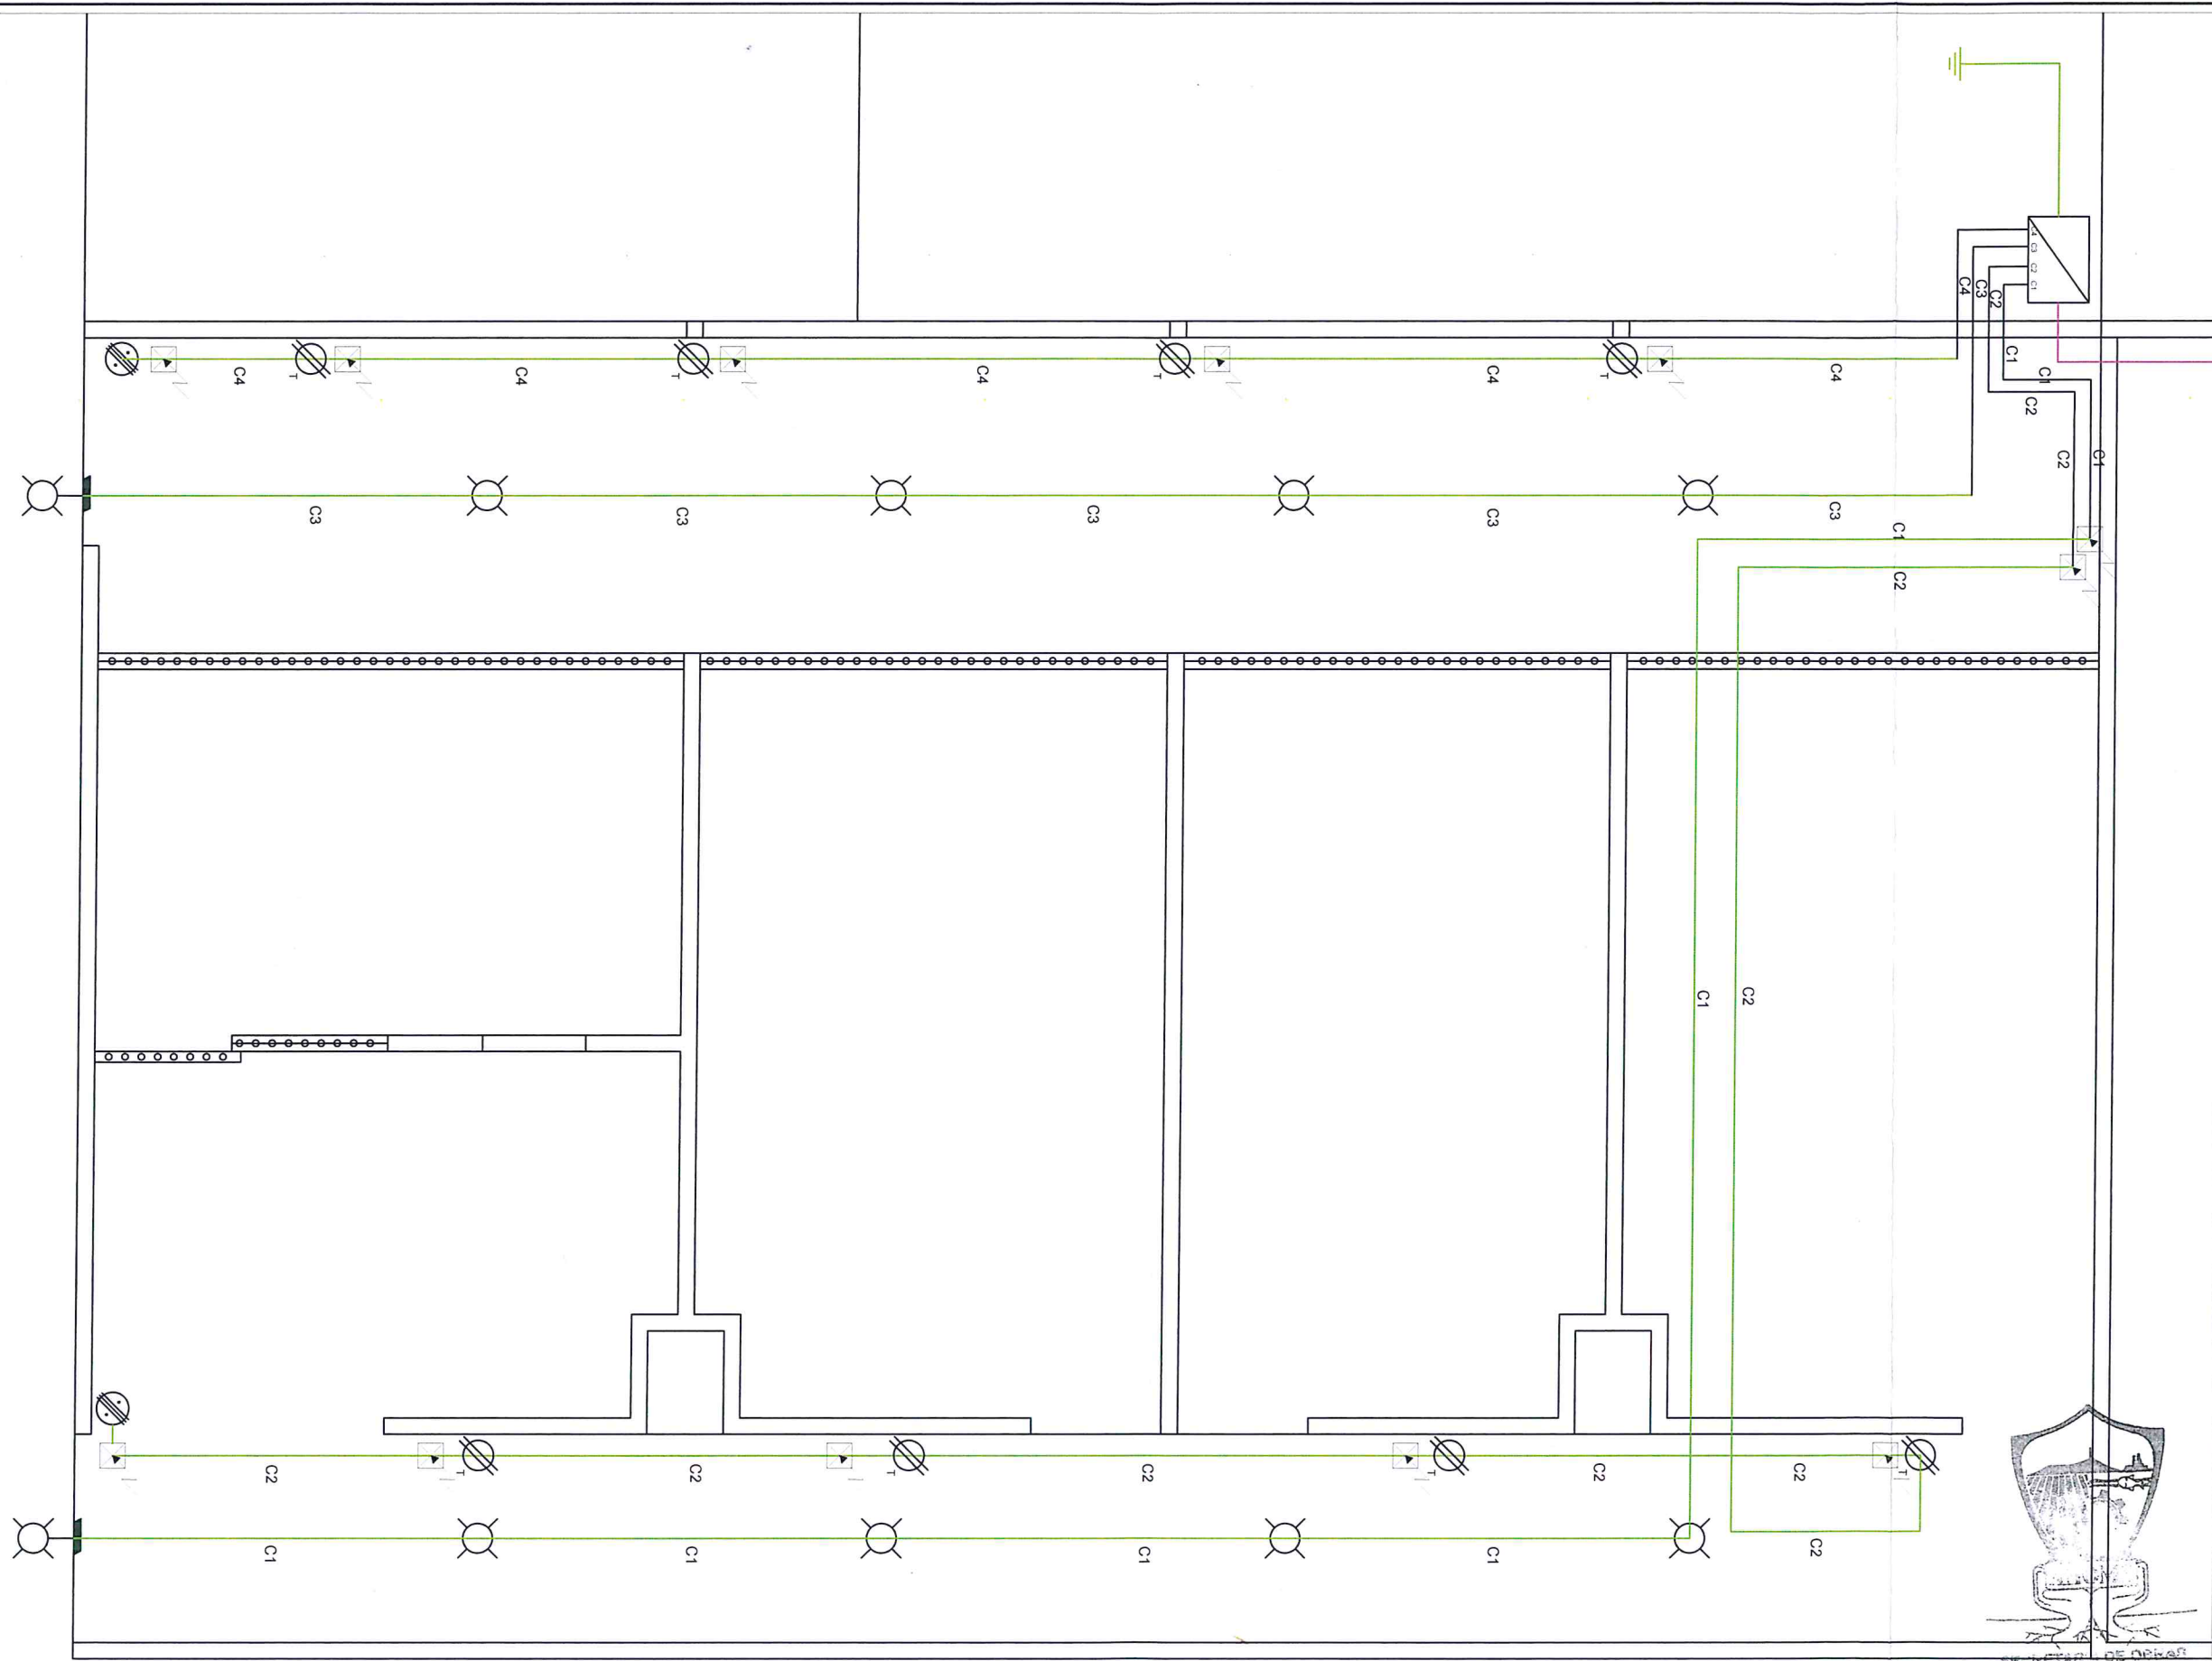

Constructora y Comercializadora
ERKAN, S.A. de C.V.

CONTRATO:
CONT-SOPUE-DOP-003-26

DATOS DEL PROYECTO
PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE AHOME
UBICACIÓN:
UBICADO INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOTAS GENERALES
- COTAS EN METROS.
- NIVELES EN METROS.
- NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
- LAS COTAS INDICADAS SON A PISO DE ALBANILERÍA.
- TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE EL PROPIO CONTRATISTA DE AL DISEÑO.

MODIFICACIONES		
NUM.	COMENTARIO	FECHA:

FIRMAS Y SELLOS


Daniela Acosta
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
ERKAN S.A DE C.V.

Alejandro Gonzalez
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RECIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
REVISÓ:

NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTENIDO DEL PLANO
- PLANO DE OBRA TERMINADA

FECHA:
JUNIO 2026

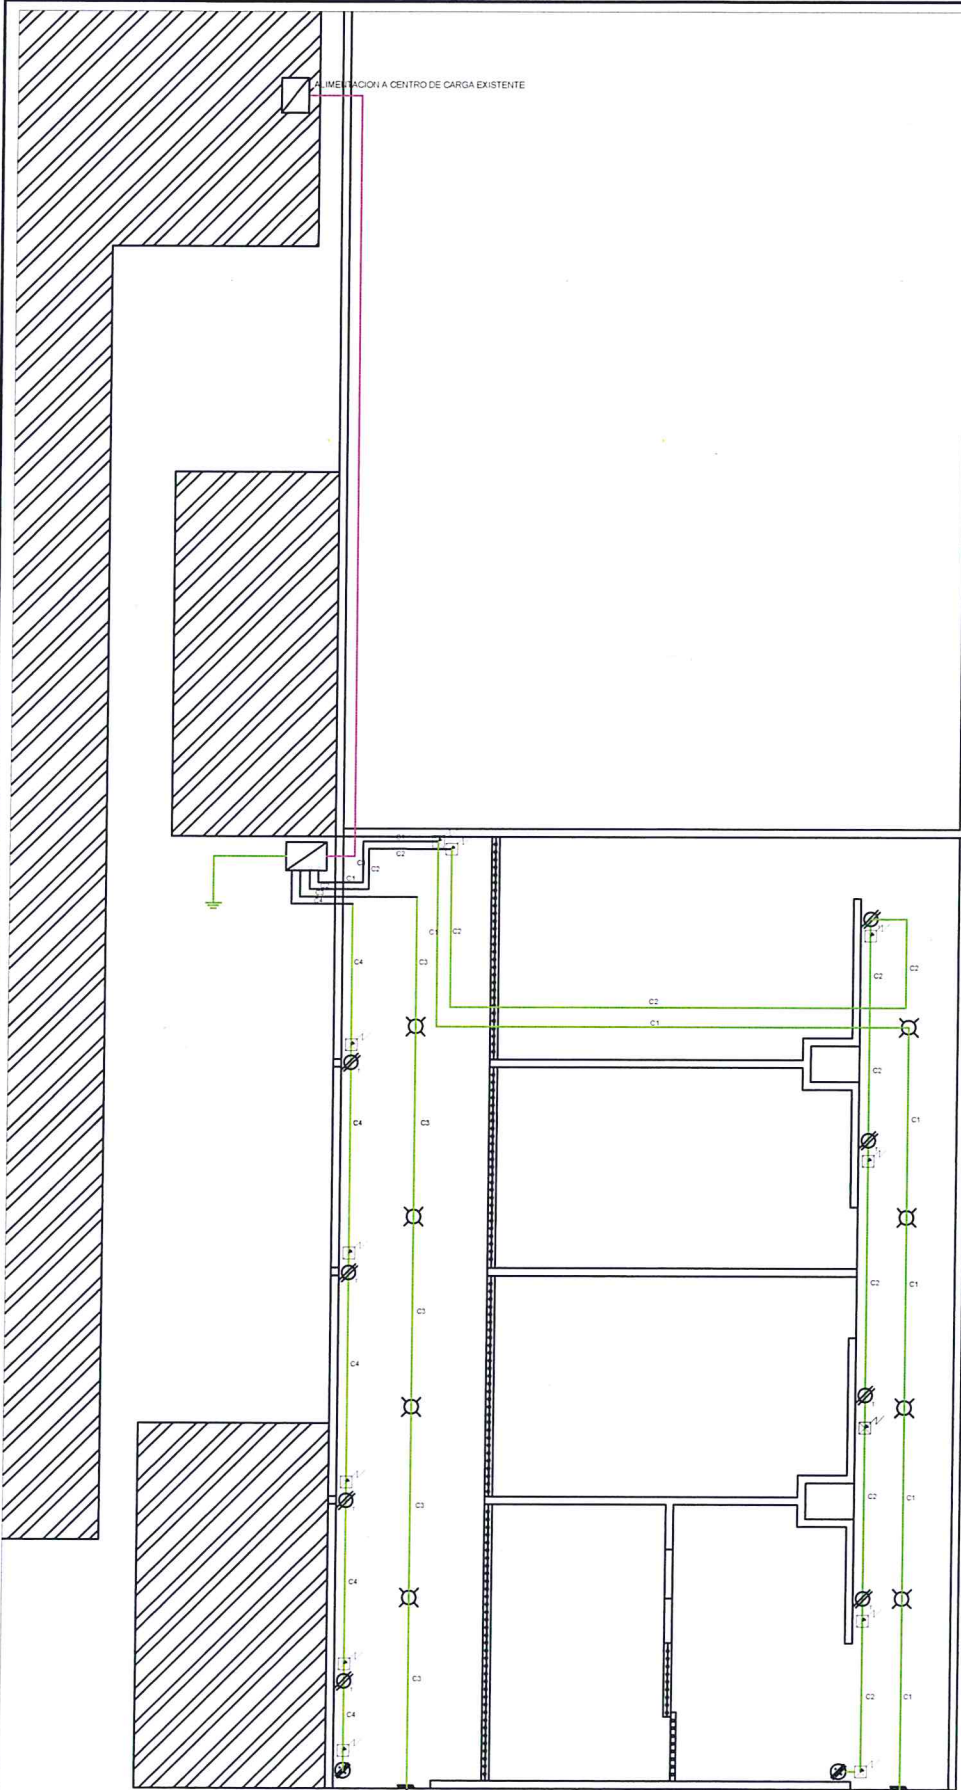

ALA "B"

ALA "A"

ESPECIFICACIONES INSTALACION ELECTRICA

SIMBOLO	DESCRIPCION
	CENTRO DE CARGA TIPO QO-8 CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
	SALIDA DE CENTRO CON BLOCK SOQUET FOCO LED DE 30W A 120 VOLTS
	APAGADOR DOBLE
	APAGADRO TRIPLE
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 20 a/120v Con polo a TIERRA
	CONTACTO SENSILLO POLARIZADO 20 a/220v CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO
	Tuberia Sube
	Tuberia Baja
	REGISTRO TI'P CAHALUPA DE 3 X 3
	TUBO INST. ELECTRICA EXISTENTE
	TUBERIA INST. ELECTRICA PVC 1/2" POR MURO
	TUBERIA INST. ELECTRICA PVC 1/2" POR PLAFON
	TUBERIA INST. ELECTRICA GALVANIZADA DE 1" 1/4" POR LOZA
	CONECCION A TIERRA FISICA CON VARILLA DE Cu. 5/8" DE 1.5 MTS.
C1	ALA "A" ALUMBRADO
C2	ALA "A" CONTACTOS
C3	CIRCUITO ALA "B" ALUMBRADO
C4	CIRCUITO ALA "B" CONTACTOS

Constructora y Comercializadora
ERKAN, S.A. de C.V.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

DATOS DEL PROYECTO

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE AHOME
UBICACION:
UBICADO INSTALACIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

NOTAS GENERALES

- COTAS EN METROS
- NIVELES EN METROS
- NO SE TOMARAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
- LAS COTAS INDICADAS SON A PLANO DE ALBANILERIA
- TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL
CONTRATISTA
- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DEL
PROYECTO ASI COMO LA INTERPRETACION QUE EL PROPIO CONTRATISTA DE
AL DIBUJO

MODIFICACIONES

NUM.	COMENTARIO	FECHA

FIRMAS Y SELLOS

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
ERKAN S.A. DE C.V.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RECIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
REVISO:

NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA (DGSPM) DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA
"B", ALUMBRADO Y CONTACTOS,
UBICADO EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

CONTENIDO DEL PLANO

- PLANO DE OBRA TERMINADA



FECHA:
JUNIO 2026

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDAD: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRAS: 1)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; 2)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; 3)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; e 4)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-003-26

No. DE CONVENIO: (CONT-SOPUE-DOP-003-26)-1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$887,765.98 (I.V.A. INCLUIDO)

II.- ANTECEDENTES



CON FECHA 30 DE MARZO DE 2026, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y LA MORAL DENOMINADA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V., CELEBRARON "EL CONTRATO PRINCIPAL" IDENTIFICADO CON EL NUMERO: CONT-SOPUE-DOP-003-26, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2026, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO, "EL CONTRATISTA" INICIARÁ LOS TRABAJOS CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2026.

JUSTIFCONV.CONT-003-26

Daniel Acosta L.

[Signature]



Hoja 1
SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NÚMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.


LOS MOCHIS, SIN. 17 DE ABRIL DE 2026



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

ELABORÓ Y REVISÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (CONT-SOPUE-DOP-003-26)-1

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto jurídico por el ciudadano CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO, en su carácter de DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"; y por otra parte la moral denominada CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V., representada por la ciudadana DANIELA ACOSTA LAZCANO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA"; manifestando "LAS PARTES" que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 30 de marzo de 2026, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y "EL CONTRATISTA", celebraron el contrato público número CONT-SOPUE-DOP-003-26, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar para la entidad las obras: 1)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; 2)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; 3)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; e 4)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATO PRINCIPAL".

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en "EL CONTRATO PRINCIPAL", aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que "EL CONTRATO PRINCIPAL" está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio "LAS PARTES" acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula TERCERA de "EL CONTRATO PRINCIPAL", el cual dice de la siguiente manera:

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales, iniciando los trabajos el día 06 de abril de 2026 y a las 08:00 horas.

Daniela Acosta L.

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (CONT-SOPUE-DOP-003-26)-1

terminarlos a más tardar el día 20 de mayo de 2026, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL:	\$765,315.50	(SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N.)
I.V.A. (16%):	\$122,450.48	(SON: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.)
TOTAL:	\$887,765.98	(SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)

I.6.- Se otorgo el anticipo a "EL CONTRATISTA" al que por Ley tiene derecho, con fecha 17 de abril de 2026.

I.7.- Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Diferimiento, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de los trabajos.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de la obra que se encuentra en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de los trabajos, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de los trabajos.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de la obra contratada, quedando de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(45 DÍAS NATURALES)		(45 DÍAS NATURALES)	
		06 de abril de 2026	20 de mayo de 2026	20 de abril de 2026	03 de junio de 2026
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(45 DÍAS NATURALES)		(45 DÍAS NATURALES)	
		06 de abril de 2026	20 de mayo de 2026	20 de abril de 2026	03 de junio de 2026
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(45 DÍAS NATURALES)		(45 DÍAS NATURALES)	
		06 de abril de 2026	20 de mayo de 2026	20 de abril de 2026	03 de junio de 2026
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(45 DÍAS NATURALES)		(45 DÍAS NATURALES)	
		06 de abril de 2026	20 de mayo de 2026	20 de abril de 2026	03 de junio de 2026

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (CONT-SOPUE-DOP-003-26)-1

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente Convenio de Diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este Convenio de Diferimiento, continuaran vigentes todas las estipulaciones de "EL CONTRATO PRINCIPAL".

QUINTA. - El presente Convenio de Diferimiento comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por "LAS PARTES" que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de tres testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día 17 de abril de 2026.

Por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"

Por "EL CONTRATISTA"

C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL


Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MORAL
DENOMINADA CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

TESTIGOS:

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. MARÍA LUISA GÓMEZ LIZARRAGA
SÍNDICA PROCURADORA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran por una parte; el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte la moral denominada CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V., representada por la ciudadana DANIELA ACOSTA LAZCANO, celebrado con fecha 17 de abril de 2026.

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

20 DE ABRIL DE 2026

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO A USTED Y MANDARLE UN CORDIAL SALUDO REFERENTE A EL CONTRATO:

Nº. CONT-SOPUE-DOP-003-26

CON EL NOMBRE DE:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ESTOY SOLICITANDO UN DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2026.

FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES.

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRAZO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO: 20 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TERMINO: 03 DE JUNIO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.


ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

DIRECTOR GENERAL



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/583-26

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento por pago de anticipo..

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 22 de abril de 2026.

C. JUAN CARLOS VILLAREAL CASTRO

ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato número: **CONT-SOPUE-DOP-003-26**, mismas que se detallan a continuación: 1) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., 2) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 3) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 4) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Cuyas obras le fueron adjudicadas al contratista de nombre: **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.**

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo con fecha del **17 de abril del 2026**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

CONT-SOPUE-DOP-003-26	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	06/04/2026	20/04/2026
Fecha de termino:	20/05/2026	03/06/2026
Plazo de ejecución:	45 Días naturales.	


Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. Archivo
JETC/AARF

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx



23/ABRIL/2026

D. de la Cruz

LOS MOCHIS, SINALOA, A 17 DE ABRIL DE 2026.

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE SE RECIBIO EL 35% DE ANTICIPO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME FUE EN LA FECHA DEL 17 DE ABRIL DE 2026, DE LAS OBRAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-003-26

Hola. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN:

Se recibió una transferencia interbancaria SPEI del Banco BANORTE, de la cuenta *****4150, a la cuenta CLABE *****2856.

Clave de Rastreo:	8846APR1202604175203063256
Hora y Fecha:	15:14:30 17 ABR 2026
Numero de Referencia:	170426
Banco Origen:	BANORTE
Ordenante:	MUNICIPIO DE AHOME
Concepto del Pago:	PAGO OBRA PUBLICA DIRECTA
Nombre del Beneficiario:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN
Banco Destino:	BANCO VE POR MAS, SA
Importe:	310718.10

Si tienes alguna duda, llama a Línea B++ al 01800-8376-7627, en donde uno de nuestros ejecutivos con gusto te atenderá

SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA SALUDARLO.

ATENTAMENTE:



C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL

Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 17/ABRIL/2026.

DURACION: 45 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 20/ABRIL/2026.
FECHA DE TERMINACION: 03/JUNIO/2026.

OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ALA "A" Y ALA "B" ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramacion de Obra de Montos										
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	2026 Abr	May	Jun
	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ALA "A" Y ALA "B" ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.									
	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL									
	ALA "A" Y ALA "B" ALUMBRADO Y CONTACTOS									
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONDULET LB DE 1", CONDULET C 1", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS, TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", SILICON SELLADOR, RIEL UNI CANAL LISO DE 2 X 4", ABRAZADERA UNICANAL DE 1", COPLE GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", TUBO PVC 1/2" PESADO, REGISTRO (TIPO CHALUPA) 2X4	LOTE	1.00	20/Abr/2026	45c	03/Jun/2026	\$43,095.10	\$11,373.31	\$28,130.63	\$3,591.16

ATENTAMENTE

Daniela Acosta
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

BLVD. CONQUISTADORES #2213 FRACC. CONQUISTA DEL REY, C.P. 80058 CULIACAN, SINALOA.
RFC: CCE220215159, TEL 667 243 9676 COREO: constructycomercerkan@gmail.com

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 17/ABRIL/2026.
DURACION: 45 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 20/ABRIL/2026.
FECHA DE TERMINACION: 03/JUNIO/2026.

OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ALA "A" Y ALA "B" ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

Reprogramacion de Obra de Montos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	2026 Abr	May	Jun
	REFORZADO ½, REGISTRO GALV. 3X3 REFORZADO ½, RO SETA PLASTICO, FOCO LED DE 30 W, PLACA C/APAGADOR SENCILLO 3 MOD LUCEK, CONTAC TO DOBLE 20 AMPS. C/TAPACONECTOR PVC 1/2" PESADO, CODO PVC 1/2" PESADO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 AMP., INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 AMP, PEGAMENTO PVC LATA DE 500 GRS., CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE CO BRE THW CAL. 8 BLANCO, CABLE DE COBRE THW CAL. 8 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 BLANCO, CABLE DE CO BRE THW CAL. 12 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 VERDE, CABLE DE COBRE THW CAL. 14 ROJO, VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1/2", CONECTOR GALV. 1/2", ABRAZADERA CLIP 1/2", ABRAZADERA UÑA 1/2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									

TOTAL PARCIAL:

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL

\$43,095.10


\$11,373.31

\$28,130.63

\$3,591.16

2

BLVD. CONQUISTADORES #2213 FRACC. CONQUISTA DEL REY, C.P. 80058 CULIACAN, SINALOA.
RFC: CCE220215159, TEL 667 243 9676 COREO: contructycomercerkn@gmail.com



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 17/ABRIL/2026.
DURACION: 45 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 20/ABRIL/2026.
FECHA DE TERMINACION: 03/JUNIO/2026.

OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ALA "A" Y ALA "B" ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

Reprogramacion de Obra de Montos										
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	2026 Abr	May	Jun
TOTAL ACUMULADO:								\$11,373.31	\$39,503.94	\$43,095.10
% PARCIAL:								26.39%	65.28%	8.33%
% ACUMULADO:								26.39%	91.67%	100.00%

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL

BLVD. CONQUISTADORES #2213 FRACC. CONQUISTA DEL REY, C.P. 80058 CULIACAN, SINALOA.
RFC: CCE220215159, TEL 667 243 9676 COREO: contructycomercerkan@gmail.com



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A 30 DE MARZO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE ES EL ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

N° DE CONSTRATO: CONT-SOPUE-DOP-003-26

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA.

CEDULA PROFESIONAL:
No. 6768269

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Fraire Villegas Jesus M.

ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS
SUPERINTENDENTE

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL





Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058,
localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.



Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058,
localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 30 de marzo del 2026.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de las siguientes:

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


Número de contrato: CONT-SOPUE-DOP-003-26.

Fecha: 30 de marzo de 2026.

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

30/03/2026
Daniela Acosta L

30/MAR/2026

C.c.p.- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V./Contratista
C.c.p.- Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

20 DE ABRIL DE 2026

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

OFICIO DE INICIO DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL INICIO DE LA OBRA EMPEIZA REALIZARSE EN LA FECHA DEL 20 DE ABRIL DE 2026
EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y
CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058,
localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/582-26
Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 22 de abril de 2026.




C. JUAN CARLOS VILLAREAL CASTRO
ENCARGADO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato número: CONT-SOPUE-DOP-003-26., consistentes específicamente en: 1) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., 2) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 3) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 4) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., cuyas obras le fueron adjudicadas a "EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V., con un importe total de hasta: \$ 887,765.98.

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en el plazo de ejecución de los trabajos relativos a las obras antes señaladas, quedaron establecidos como a continuación se indica:

CONT-SOPUE-DOP-003-26	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
20/04/2026	03/06/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.



ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TARRASCO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p.- María Luisa Gómez Lizárraga/ Síndica Procuradora
c.c.p.- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V./Contratista
c.c.p.- Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
c.c.p. Archivo
JETC/AARF

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

22/ABRIL/2026
Dante Agosto L.

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

03 DE JUNIO DE 2026

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

FINAL DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL **FINAL** DE LA OBRA EMPEZ'A REALIZARSE EN LA FECHA DEL **03 DE JUNIO DE 2026**
EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

**INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y
CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

CONTRATO N°:
CONT-SOPUE-DOP-003-26

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058,
localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.

Notas

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026.

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Cadena Original

||CCE220215159|22ND8223947|01-07-2026|P||0000108888800000031||

Sello Digital

vjBKSBJYMcgwnhLLrEKnsR9nkvVgkBHIVNmwdHZwmUXfNSCEXUYH4FiJ3hi5lehgaiPvATlaKYtJ5K5PKI+6c64T5
bKBXgWtNf3xYykZwhTzpwTS1lqgP3gA8rfzJu4D4E1cSfJp3HvvLDrZvLwcnIHIPThGqEu/Kk4HKygiQ=



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2026-006855

Los Mochis, Sinaloa, 7 de julio de 2026

C. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.

Obligación	Detalles	Al corriente
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RAMÓN VILLA HURTADO
DIRECTOR DE INGRESOS



TESORERÍA MUNICIPAL




SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Cadena de Seguridad
OpA08wG9bIRna8baGLGUH6WW3ls=





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1026-26

Asunto: El que se indica

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 01 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FELIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: **INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Que tiene el número de contrato: **CONT-SOPUE-DOP-003-26.**

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 03 de junio de 2026, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día viernes 03 de julio de 2026 a las **09:00 a.m.** horas.

Se anexa croquis de localización.



ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

Daniela Acosta L.
07/07/26

C.C.P.- Archivo
C.C.P.- María Luisa Gómez Lizárraga/ Síndica Procuradora
C.C.P.- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V./Contratista
C.C.P.- ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT/Residente De Obra
JETC/AARF

**UBICACIÓN: INSTALACIONES DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**



CONT-SOPUE-DOP-003-26.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

COORDENADAS: 25°46'06.8"N, 108°59'29.1"W.





MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra : **INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Localidad	LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA.
Municipio	AHOME
Num. De contrato	CONT-SOPUE-DOP-003-26
Contratista	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
Importe de la obra	\$49,990.32
Anticipo entregado	\$17,496.62
Fianza de anticipo	26A14213, DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Fianza de cumplimiento	26A14231, DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Inicio de los trabajos	20 DE ABRIL DE 2026
Termino de los trabajos	03 DE JUNIO DE 2026
Plazo de dias de ejecución de la obra	45 DIAS

En Los Mochis Sinaloa siendo las: **09:00** horas del dia **03** de **JULIO** del 2026

Se reunieron para la entrega-recepción de la obra antes mencionada las siguientes personas:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

Residente de Obra

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACIÓN NO. 4 (ULTIMA) INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURIDAD PÚBLICA	20/04/2026	03/06/2026	\$49,990.32	\$49,990.32	\$31,200.85	\$31,200.85
Saldo a cancelar			\$0.00			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leida la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ENTREGO EL CONTRATISTA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

Daniela Acosta L.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DANIELA ACOSTA LAZCANO

[Signature]
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
Residente de Obra





ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Datos generales de la Obra:

Obras:

1) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., 2) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 3) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 4) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. de contrato: **CONT-SOPUE-DOP-003-26**
Fecha de contrato: **30 de marzo de 2026**
Inversión contratada: **\$ 887,765.98**
Inversión ejercida: **\$ 887,765.98**
Fecha de inicio: **20 de abril de 2026**
Fecha de término: **03 de junio de 2026**

Siendo las **12:00** hrs. del día **03 de julio** del año **2026**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, ubicadas en Palacio Municipal, cita en Degollado y Cuauhtémoc, Los Mochis, Sinaloa; las siguientes personas:

Nombre

Cargo


Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro

Director de Obras Públicas

C. Daniela Acosta Lazcano
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. de C.V.

Contratista

Daniela Acosta L.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Declaraciones

I.-El H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que encomendó a CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V., "El Contratista" la realización de las obras: 1) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., 2) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN



GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.3) - INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 4) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Observando para ello todo lo establecido en el contrato, proyecto, especificaciones técnicas, presupuesto y programa de obra respectivos.

II.-El H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que "El Contratista" cumplió con dicha encomienda acatando para ello, lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el contrato, de acuerdo al presupuesto, proyecto, especificaciones técnicas y programa de ejecución respectivo. Se ha levantado el acta correspondiente a la entrega-recepción de la obra con fecha 03 de julio de 2026, y se elaboró el finiquito con fecha 03 de junio de 2026.

III.-Ambas partes, EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME y "El Contratista" declaran que a la fecha no existen adeudos por lo que se dan por terminadas las obligaciones establecidas en el contrato respectivo, sin derecho a posterior reclamación, reservándose EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME el derecho de hacer reclamaciones a "El Contratista" en lo que resulte por daños derivados de vicios ocultos, en los términos señalados en el contrato y fianza respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 12:15 horas del día 03 del mismo mes y año arriba señalado.

Por "El Contratante"

Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro
Director de Obras Públicas

Por "El Contratista"

C. Daniela Acosta Lazcano
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. de C.V.

