

OFICIO No. OPDUyE/477/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACIÓN
01 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 29 de Agosto de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-007/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,408,778.08 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$879,271.83 (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 83/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO
- R.F.C. PASS971118IRO
- DOMICILIO FISCAL: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180
- No. DE FACTURA: # 52, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

29 AGO 2025
RECIBIDO
17:50 PM



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 52

Fecha: 27/Ago/2025 14:31:35

Lugar de expedición (C.P.) 80180

Emisor
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

RFC: PASS971118IR0

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: ENRIQUE COLUNGA 1962 Gustavo Díaz Ordaz Culiacán Sinaloa México 80180

Receptor
Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	<p>PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-007/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,408,778.08</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 1,214,463.86 MAS I.V.A 16 % \$ 194,314.22 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,408,778.08</p> <p>Importe BRUTO A FACTURAR \$ 1,214,463.86 16 % I.V.A (+) \$ 194,314.22 IMPORTE TOTAL A FACTURAR \$ 1,408,778.08</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 425,062.35 MAS I.V.A.: \$ 68,009.98 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 493,072.33</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 36,433.92 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 529,506.25</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 879,271.83 (SON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)</p>	\$789,401.51	IVA, - Importe: 126304.24	\$789,401.51

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

novecientos quince mil setecientos cinco Pesos 75/100 M.N.

Subtotal: \$789,401.51

I.V.A.: \$126,304.24



Total: \$915,705.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711829771

Folio Fiscal: 773E260E-5297-4882-8365-165342FA8356

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-08-27T15:31:41

Sello digital del CFDI

DSSagXCXlow4yVPbjLLG7FfHh63tbtM/Z2SMfOggTbJm1XGeWOgrp5EmhWrsD3xuyMnlEs1bBURDZB3fr4nXJFEJFKTxuzVhJgJB0wb9lwxjzRm9afC1i3P7osms7OjkUn6i0qA111
P6gmXe3Mkjs+pmTImoh33x6H+rmj+MKXR0XGoy/EbSnsk9pBhNRPIvn7wgR9M96vBzQ+CMnZuwVtTg7Y8ABm0sBzpi3fyJDObB5Lwo1abCmhAyncPFImh8X/MblEyt+bmc4bBTfPzSjJfHb
TfghzoaLnwWxxZZj42yv8fPVHkyldtFPNRCsgRly5e4aMMbRTJTwSAuGGw==

Sello del SAT

gIIZP2u0Dqr/f69F6vDSUdKDuqYewLL8qyNd5ED0tF4MV82UxqTBl3z1VMP0sbW7iJ96UKb9IXOTLLPsddepTcTwwGNrRaiPoe6WA8Y19euH9aSM9DNh5FkRj3AFEKytVgxo9hKgFuRM
4rcQkUULXwdl3R6ay+o68utVof07PHp5l/aVGzaWW6xuGPmNK3eqsXBVJHgess4BfyldDkD3i8p6kldDys0VDyV/2dT1xhzv7Gybp8kkGgF0qItVJsb7rUZ8Hmni4FqYFE3f5DXtmJ/o
1ynNQ01mzGXGuz6U0GWDtlo6RPhigMyz4m32hTmcVPw2Tcx3EIVqyoPQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|773E260E-5297-4882-8365-165342FA8356|2025-08-27T15:31:41|MAS0810247C0|DSSagXCXlow4yVPbjLLG7FfHh63tbtM/Z2SMfOggTbJm1XGeWOgrp5EmhWrsD3xuyMn
luEs1bBURDZB3fr4nXJFEJFKTxuzVhJgJB0wb9lwxjzRm9afC1i3P7osms7OjkUn6i0qA111P6gmXe3Mkjs+pmTImoh33x6H+rmj+MKXR0XGoy/EbSnsk9pBhNRPIvn7wgR9M96vBzQ+CMnZ
uwVtTg7Y8ABm0sBzpi3fyJDObB5Lwo1abCmhAyncPFImh8X/MblEyt+bmc4bBTfPzSjJfHbTfghzoaLnwWxxZZj42yv8fPVHkyldtFPNRCsgRly5e4aMMbRTJTwSAuGGw==|00001000000709182898|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAWIBAGIUMDAWMDAWMDA3MTE4Mjk3NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDQ0DDCxBQYBERUwG0U0VSVk1DSU8gREUgQUJNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-08-27T14:31:35" Folio="52" FormaPago="03" LugarExpedicion="80180" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711829771"
Sello="DSSagXCxIow4yVPbjLLG7FfHh63tbgTM/Z2SMfOqgTbIJm1XGeW0grp5EmhWrsD3xuyMnIuEs1bBURDZB3fr4nXJFEJFKTxuzVhJgJ8wb9IwxfjzRm9afC1i3P7osms70jkUn6I0qA111P6gm
SubTotal="789401.51" TipoDeComprobante="I" Total="915705.75" Version="4.0"
<cfdi:Emisor Nombre="SERGIO JOEL PADILLA SOTO" RegimenFiscal="612" Rfc="PASS971118IR0"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72151500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Servicios de sistemas eléctricos PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA,
RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-007/2025 MONTO DEL
CONTRATO: $ 1,408,778.08 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,214,463.86 MAS I.V.A 16 % $ 194,314.22 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $
1,408,778.08 Importe BRUTO A FACTURAR $ 1,214,463.86 16 % I.V.A (+) $ 194,314.22 IMPORTE TOTAL A FACTURAR $ 1,408,778.08 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $
425,062.35 MAS I.V.A.: $ 68,009.98 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 493,072.33 RETENCION 3% ( S.V.I.F.V C.) : $ 36,433.92 TOTAL DEDUCCIONES: $
529,506.25 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 879,271.83 (SON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.) Importe="789401.51"
NoIdentificacion="SER01" ObjetoImp="02" ValorUnitario="789401.51">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="789401.51" Importe="126304.24" Impuestos="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="126304.24">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="789401.51" Importe="126304.24" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="773E260E-5297-4882-8365-165342FA8356"
FechaTimbrado="2025-08-27T15:31:41" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="DSSagXCxIow4yVPbjLLG7FfHh63tbgTM/Z2SMfOqgTbIJm1XGeW0grp5EmhWrsD3xuyMnIuEs1bBURDZB3fr4nXJFEJFKTxuzVhJgJ8wb9IwxfjzRm9afC1i3P7osms70jkUn6I0qA
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="gIIZP2u0Dqr/f63F6vDSudKDuqYewLL8qyNd5ED0ttf4MV82UxqTb1a3z1VMP0sbw7iIJ96UKb9IX0TLPLdpTcTwyGNRraIPoe6WA8Y19euH9aSM90NH5FKRj3AFEKyTvgxo9hKGF
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PASS971118IR0	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
773E260E-5297-4882-8365-165342FA8356	2025-08-27T14:31:35	2025-08-27T15:31:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$915,705.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 23 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL FINIQUITO	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	30-jun-25
667 581 8434	667 581 8434	AL	23-jul-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
PASS971118IR0		27-jun-25	
DEPENDENCIA.-			
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	INICIO: 30-jun-25
			TERMINACION: 23-jul-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CONTRATO No:			
MBGBR-AD-FAISMUN-007/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO.
\$1,214,463.86	\$1,408,778.08	\$493,072.33	\$1,408,778.08
			BUENO POR: \$ 879,271.83
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:			
\$ 879,271.83	(SON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)		
EN PAGO DE ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO		
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 425,062.35	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 1,214,463.86
MAS I.V.A.:	\$ 68,009.98	MAS I.V.A 16 %	\$ 194,314.22
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 493,072.33	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 1,408,778.08
3 % SVIFYC:	\$ 36,433.92	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 529,506.25
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 529,506.25		
		SALDO A PAGAR: \$ 879,271.83	

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMC
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE			Fecha:	Estimación:
			23 de julio de 2025	01 NORMAL FINIQUITO
Periodo de la estimación:	30/06/2025	23/07/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	30/06/2025	23/07/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-007/2025
Importe del contrato con I.V.A.	imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,408,778.08	\$ 1,214,463.86	\$ 559,866.49	\$ 482,643.53	100%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 1,214,463.86	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+) \$ 194,314.22	
\$ 493,072.33	Sub- Total A (=) \$ 1,408,778.08	\$ 1,408,778.08
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 425,062.35	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 68,009.98	ACUMULADO ANTERIOR
	Total (=) \$ 493,072.33	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 789,401.51	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 126,304.24	TOTAL ACUMULADO.
\$ 493,072.33	Total (=) \$ 915,705.75	\$ 1,408,778.08
	3 % SVIFYC: \$ 36,433.92	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 529,506.25	CONTRATADO
\$ 493,072.33	Importe T O T A L \$ 879,271.83	\$ 1,408,778.08
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 879,271.83	SALDO
\$0.00	Son: (SON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)	\$ -

ELABORO.-


Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

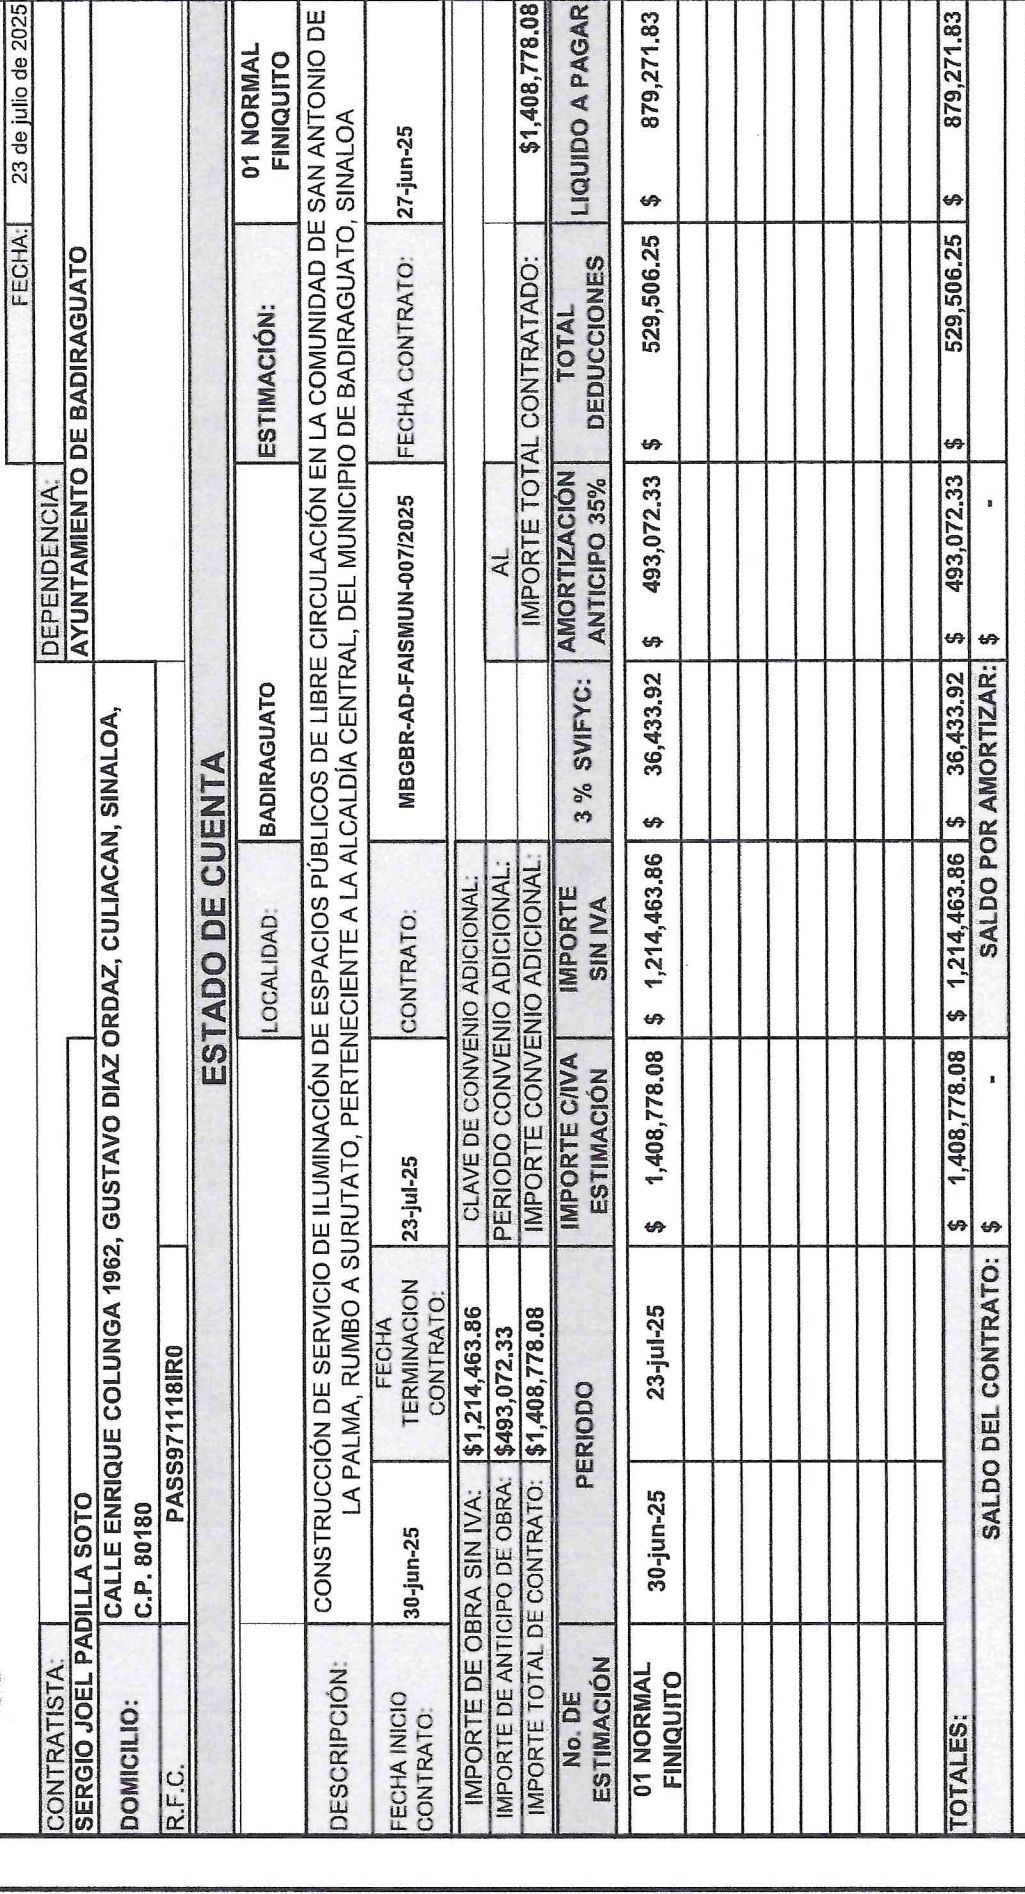

REVISÓ:-

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	FECHA
SERGIO JOEL PADILLA SOTO		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	23 de julio de 2025
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180		
R.F.C.	PASS971118IR0		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,214,463.86
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 493,072.33
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,408,778.08

DESTAJO		IMPORTE
1.00	PRELIMINARES	\$ 309,144.06
2.00	INSTALACIONES BÁSICAS	\$ 891,620.42
3.00	TRABAJOS FINALES	\$ 13,699.38
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 1,214,463.86

SUB TOTAL=	\$ 1,214,463.86
I.V.A 16 %	\$ 194,314.22
TOTAL =	\$ 1,408,778.08

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



DESGLOSE

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA: 23/07/2025			
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180				R.F.C. PASS971118IR0					
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN									
		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:			
		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				01 NORMAL FINIQUITO			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,214,463.86		IMPORTE DE ANTICIPO D/ \$493,072.33		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,408,778.08			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL				
1	PRELIMINARES								
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	904.77	\$ 187.42	\$ 169,571.99			904.77	\$ 169,571.99
GP02	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	918.27	\$ 149.43	\$ 137,217.09			918.27	\$ 137,217.09
GP05	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LMW, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 1,177.49	\$ 2,354.98			2.00	\$ 2,354.98
2	INSTALACIONES BÁSICAS								
GP255	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	27.00	\$25,842.09	\$ 697,736.43			27.00	\$ 697,736.43
GP25	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	27.00	\$ 3,038.20	\$ 82,031.40			27.00	\$ 82,031.40
GP06		PZA	1.00	\$ 2,377.98	\$ 2,377.98			1.00	\$ 2,377.98

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

[Firma]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



DESGLASE

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA: 23/07/2025						
CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P.		R.F.C. PASS971118IR0								
DOMICILIO: 80180										
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN										
LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 01 NORMAL		FINIQUITO						
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA										
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,214,463.86		IMPORTE DE ANTICIPO DI \$493,072.33		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,408,778.08						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
GP60	ALIMENTACIÓN PARA MURETE DE MEDICIÓN, INCLUYE: CABLE THWL-S CALIBRE 4, CABLE THW-LS CALIBRE 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 TUBO DE PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2", EXCAVACIÓN, CONCRETO F'C=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	25.00	\$ 460.60	\$ 11,515.00				25.00	\$ 11,515.00
GP31	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, OLESTA	PZA	1.00	\$14,125.46	\$ 14,125.46				1.00	\$ 14,125.46
GP601	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 33000V/7620/240/120 INCLUYE: ESTRUCTURA 1TR1A 33KV	PZA	1.00	\$83,834.15	\$ 83,834.15				1.00	\$ 83,834.15
TRABAJOS FINALES										
GP088	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	904.77	\$ 8.54	\$ 7,726.74				904.77	\$ 7,726.74
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, INCLUYE: IMPRESA EN LAMINA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	1.00	\$ 5,972.64	\$ 5,972.64				1.00	\$ 5,972.64
SUB-TOTAL \$ 1,214,463.86										
IVA \$ 194,314.22										
MONTO TOTAL \$ 1,408,778.08										

ELABORO:-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
DEDICENTE/ANTEFECAL

REVISÓ:-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO:-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.						
CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO								
R.F.C.: PASS971118IR0								
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA								
ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO								
GENERADORES DE ESTIMACION								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	ACUMULADO	OBSERVACIONES
							PARCIAL TOTAL	
1.00	PRELIMINARES							
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE. EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.							

UBICACION	LONGITUD
LAMPARA 1 LAMPARA 2	33.45
LAMPARA 2 LAMPARA 3	36.64
LAMPARA 3 LAMPARA 4	30.95
LAMPARA 4 LAMPARA 5	35.18
LAMPARA 5 LAMPARA 6	34.90
LAMPARA 6 LAMPARA 7	43.00
LAMPARA 7 LAMPARA 8	44.53
LAMPARA 8 LAMPARA 9	30.98
LAMPARA 9 LAMPARA 10	34.12
LAMPARA 10 LAMPARA 11	36.24
LAMPARA 11 LAMPARA 12	34.27
LAMPARA 12 LAMPARA 13	34.14
LAMPARA 13 LAMPARA 14	46.24
LAMPARA 14 LAMPARA 15	36.10
LAMPARA 15 LAMPARA 16	41.04
LAMPARA 16 LAMPARA 17	26.20
LAMPARA 17 LAMPARA 18	35.20
LAMPARA 18 LAMPARA 19	35.40
LAMPARA 19 LAMPARA 20	35.00
LAMPARA 20 LAMPARA 21	35.90
LAMPARA 21 LAMPARA 22	35.00
LAMPARA 22 LAMPARA 23	34.30
LAMPARA 23 LAMPARA 24	33.10
LAMPARA 24 LAMPARA 25	36.40
LAMPARA 25 LAMPARA 26	23.00
LAMPARA 26 LAMPARA 27	43.50

TOTAL EJECUTADO	924.78	ML
TOTAL CONTRATADO	904.77	ML

GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
------	---

UBICACION	LONGITUD
LAMPARA 1 LAMPARA 2	33.45
LAMPARA 2 LAMPARA 3	36.64
LAMPARA 3 LAMPARA 4	30.95
LAMPARA 4 LAMPARA 5	35.18
LAMPARA 5 LAMPARA 6	34.90
LAMPARA 6 LAMPARA 7	43.00
LAMPARA 7 LAMPARA 8	44.53
LAMPARA 8 LAMPARA 9	30.98
LAMPARA 9 LAMPARA 10	34.12
LAMPARA 10 LAMPARA 11	36.24
LAMPARA 11 LAMPARA 12	34.27
LAMPARA 12 LAMPARA 13	34.14
LAMPARA 13 LAMPARA 14	46.24
LAMPARA 14 LAMPARA 15	36.10
LAMPARA 15 LAMPARA 16	41.04
LAMPARA 16 LAMPARA 17	26.20
LAMPARA 17 LAMPARA 18	35.20
LAMPARA 18 LAMPARA 19	35.40

REVISO.-

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

	CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.
	CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		
	R.F.C.: PASS971118IR0		
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		
ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO			

GENERADORES DE ESTIMACION

LAMPARA 19	LAMPARA 20	35.00
LAMPARA 20	LAMPARA 21	35.90
LAMPARA 21	LAMPARA 22	35.00
LAMPARA 22	LAMPARA 23	34.30
LAMPARA 23	LAMPARA 24	33.10
LAMPARA 24	LAMPARA 25	36.40
LAMPARA 25	LAMPARA 26	23.00
LAMPARA 26	LAMPARA 27	43.50
COCAS EN REGISTROS	27.00 0.50	13.50

TOTAL EJECUTADO 938.26 ML

TOTAL CONTRATADO 918.27 ML

GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
------	--

TOTAL EJECUTADO 6.00 PZA

TOTAL CONTRATADO 2.00 PZA

2.00**INSTALACIONES BÁSICAS**

GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30x0.70x0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
-------	--

TOTAL 27.00 PZA

GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40x40x40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"x 1 1/4"x1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
------	---

TOTAL 27.00 PZA

GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
------	---

TOTAL 1.00 ML

GP60	ALIMENTACIÓN PARA MURETE DE MEDICIÓN, INCLUYE: CABLE THWL-LS CALIBRE 4, CABLE THW-LS CALIBRE 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 TUBO DE PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2", EXCAVACIÓN, CONCRETO F'C=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
------	--

TOTAL 25.00 ML

GP31	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.
------	---

TOTAL 1.00 PZA

GP601	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 33000V/77620/240/120 INCLUYE: ESTRUCTURA 1TR1A 33KV
-------	--

TOTAL 1.00 PZA

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Briceida
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.
	CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO	
	R.F.C.: PASS971118IR0	
	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	
	ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO	
GENERADORES DE ESTIMACION		
TRABAJOS FINALES		
3.00	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	
GP088		

TOTAL EJECUTADO	924.76	ML
TOTAL CONTRATADO	904.77	ML

GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, INCLUYE: IMPRESA EN LAMINA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PRESENTACION.
--------	---

TOTAL	1.00	PZA
-------	------	-----

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Brst
ARQ. BRICEIDA GPÉ NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DOMICILIO:

R.F.C.

OBRA:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180

PASS971118IR0




CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

FOTOS DE ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
PRELIMINARES	
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG. 600 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO. INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO. SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

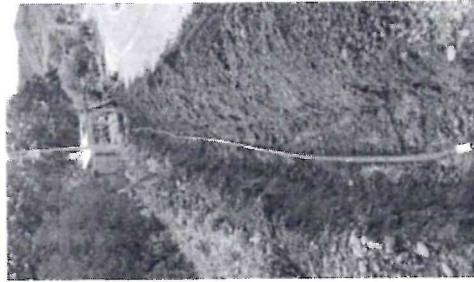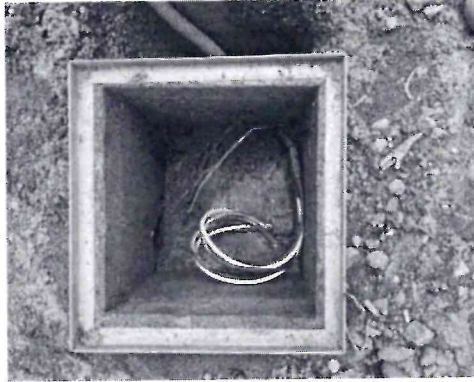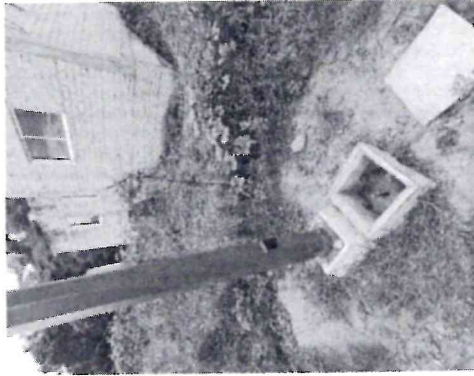

ELABORO:-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE FGAI

REVISO:-

Briceida
SUPERVISOR
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ

AUTORIZO:-

Rubiel Rincon Ramos

ING. RUBIEL-RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DOMICILIO:

R.F.C.

OBRA:

CALLE ENRIQUE COLLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180

PASS971118IR0

DEPENDENCIA:





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

INSTALACIONES BÁSICAS

GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"x1 1/4"x1/8", INCLUYE: SUMINISTRO,
GP06	INTERCONEXIÓN A RED ELÉCTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
GP60	ALIMENTACIÓN PARA MURETE DE MEDICIÓN, INCLUYE: CABLE THW-LS CALIBRE 4, CABLE THW-LS CALIBRE 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 TUBO DE PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2", EXCAVACIÓN, CONCRETO F'c=100 KG/CM2,
GP31	MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN 5-100 AMP, MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE
GP601	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 15 KVA 33000YT/7620/240/120 INCLUYE: ESTRUCTURA 1TR1A 33KV
GP088	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GBR671	LETrero INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, INCLUYE: IMPRESA EN LAMINA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PRESENTACIÓN.

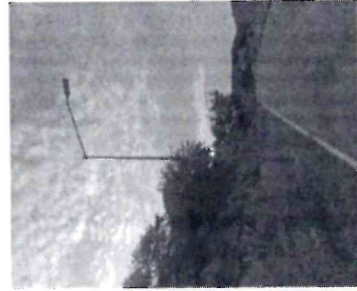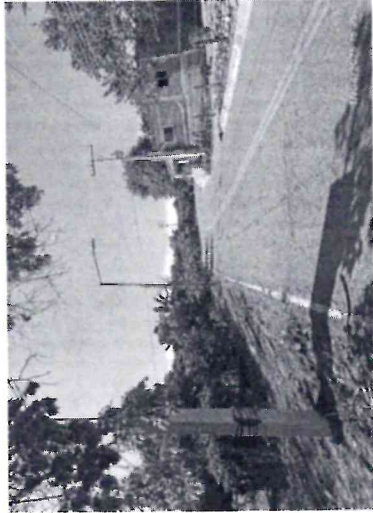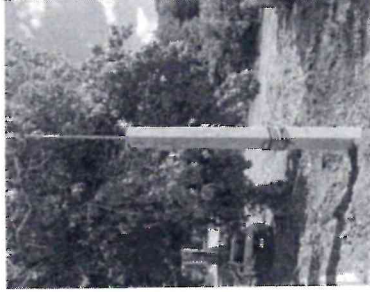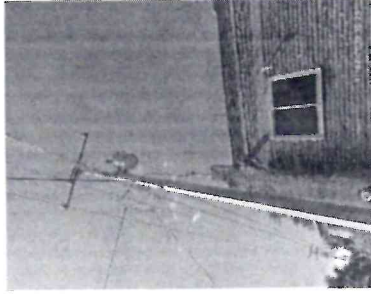

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
DEDICENTE 1 ECAI

REVISO.-


Bras
SUPERVISOR
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

	CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180		
R.F.C.	PASS971118IR0	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	
CROQUIS ESTIMACION:		
CLAVE	CONCEPTO	
PRELIMINARES		
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA	
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE	

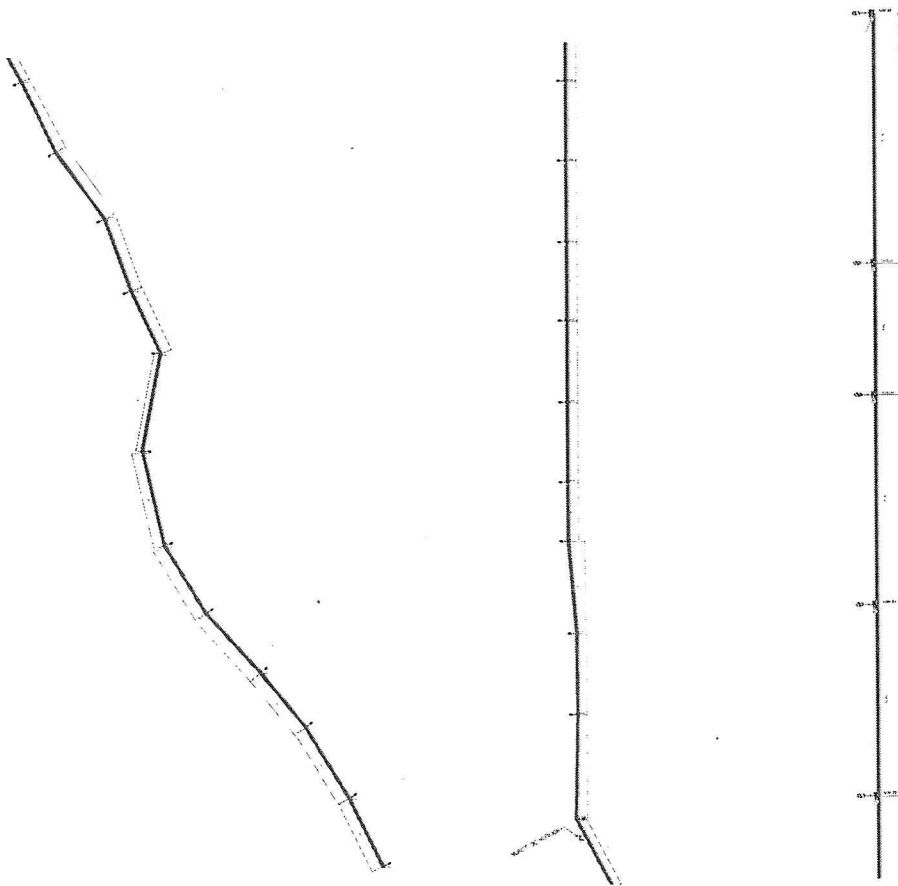

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


REVISO.-

Briceida
SUPERVISOR DE OBRA
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

	CONTRATISTA:	DEPENDENCIA:
	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180	
R.F.C.	PASS971118IR0	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PALMA, RUMBO A SURUTATO, PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	
CROQUIS ESTIMACION:		
INSTALACIONES BÁSICAS		
GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES	
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40x40x40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8"	
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	
GP60	ALIMENTACIÓN PARA MURETE DE MEDICIÓN, INCLUYE: CABLE THW-LS CALIBRE 4, CABLE THW-LS CALIBRE 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 TUBO DE PVC	
GP31	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0.5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP, MARCA SQUARE D, GABINETE, 2	
GP601	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA 33000Y17/7620/240/120 INCLUYE: ESTRUCTURA 1TR1A 33KV	
GP088	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, INCLUYE: IMPRESA EN LAMINA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y	

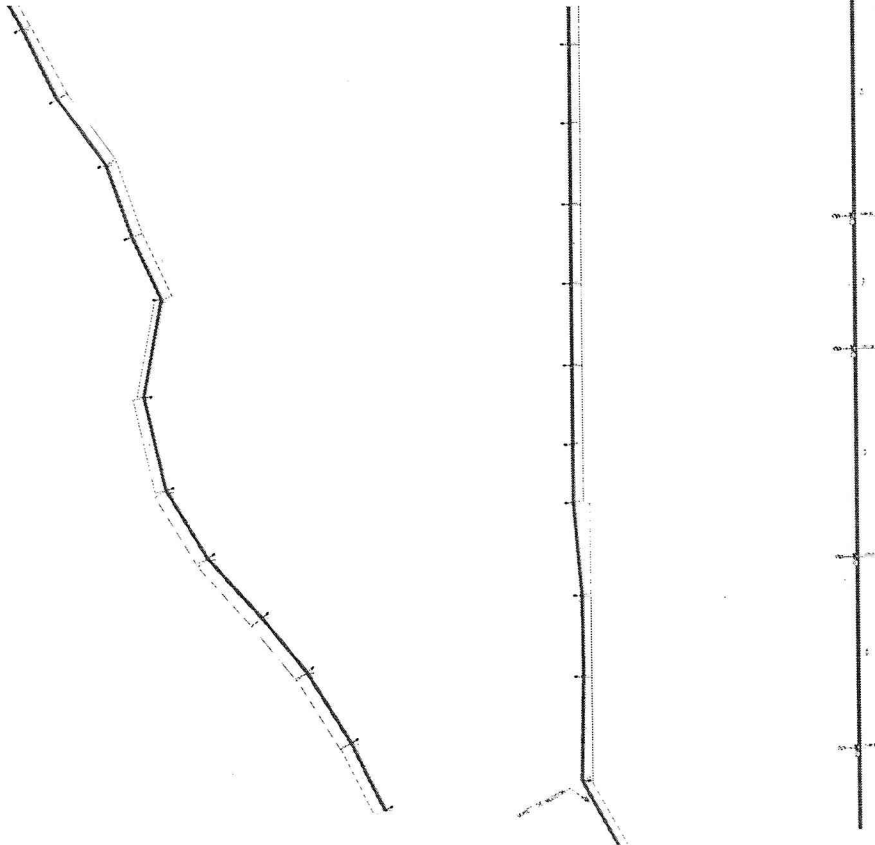

REVISO.-

ELABORO.-

Sergio J. Padilla
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

Bras
SUPERVISOR DE OBRA
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ

AUTORIZO.-
[Signature]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



Fecha y hora de consulta

07/09/2025 4:10:32 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NOR FIN AD007

Importe de la operación: 879,271.83 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012837223485

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

Titular de la cuenta: SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 08/09/2025

Fecha de creación: 07/09/2025

Fecha de aplicación: 07/09/2025

Concepto de pago: EST 01 NOR FIN AD007

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 16:10:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000997869

Clave de rastreo: 002601002509080000997869

Folio de firma: 0048613037

Folio único: I401202509071610300048613043

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/09/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/09/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
