

CONT. N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1608E-2023

BITACORA DE OBRA

FECHA 17/08/2023


1

CON ESTA FECHA SE ABRE EL PRESENTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA PARA DAR DE ALTA EL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1608E-2023 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE LA COMPANIA MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR MAGISTERIAL-TERCERA ETAPA- EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, CON UN MONTO DE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$642,931.18 YA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% INCLUIDO Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

CON ESTA FECHA TAMBIEN EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION EL OFICIO DE INICIO DE OBRA Y EL OFICIO DE ASIGNACION DEL SUPERINTENDENTE, QUE SERA ING. JAIR PACHECO SERRANO CON CEDULA PROFESIONAL N° 457379 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y QUE LO ACREDITA COMO LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL, QUIEN SERA AL IGUAL QUE ESTA SUPERVISION LOS QUE ESTAREMOS FACULTADOS PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS ANOTACIONES NECESARIAS Y CORRESPONDIENTES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE ESTA OBRA.

POR "LA CONTRATISTA"

POR LA SOP



ING. JAIR PACHECO SERRANO
SUPERINTENDENTE


ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VÁZQUEZ ARAUJO

NOTA N° ① CON ESTA FECHA TAMBIEN SE HACE LA ENTREGA A LA CONTRATISTA DEL AREA DONDE SE VAN A LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO QUE SON EL DESFOGE DEL RESERVOIRIO (LLEGADA DEL CANAL A UGO ABILETO SOBRE LA FALDA DEL CERRO DE LA MEMORIA, HACIA LA LINEA SUBTERRANEA CON TUBERIA PEAD CORRUGADA DE 36"Ø, HASTA CAJA DE CONCRETO ARMADO SOBRE EL ARROYO DE LA CALLE, BAJANDO DESDE EL RESERVOIRIO, CRUZANDO LA CICLOVIA Y CON DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA HACER LA EXCAVACION Y PASAR POR LA TUBERIA, CON ESTO LA CONTRATISTA DA POR INICIADOS LOS TRABAJOS ESTE DIA.




24/08/23

NOTA N° ② HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE ADECUA COMO YA SE TIENE CORTADO TODO EL TRAMO DE LA CICLOPISTA, LAS LOSAS DE PAVIMENTO Y SE ESTA EXCAVANDO PARA COLAR LA PLANTILLA CON MALLA DE 66X10.10 PARA ENCOFRAR LA TUBERIA DE 36"Ø



NOTA N° ③ DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO YA SE INSTALO' LA TUBERIA PERD CORRUGADO DE 36"Ø, DONDE SE HAN INSTALADO 2 CODOS EN SENTIDO VERTICAL SEGUN PROYECTO, TODO ESTO SOBRE LO QUE ES LA CICLOPISTA ENCOFRADO A BASE DE CONCRETO $F'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6X10-10

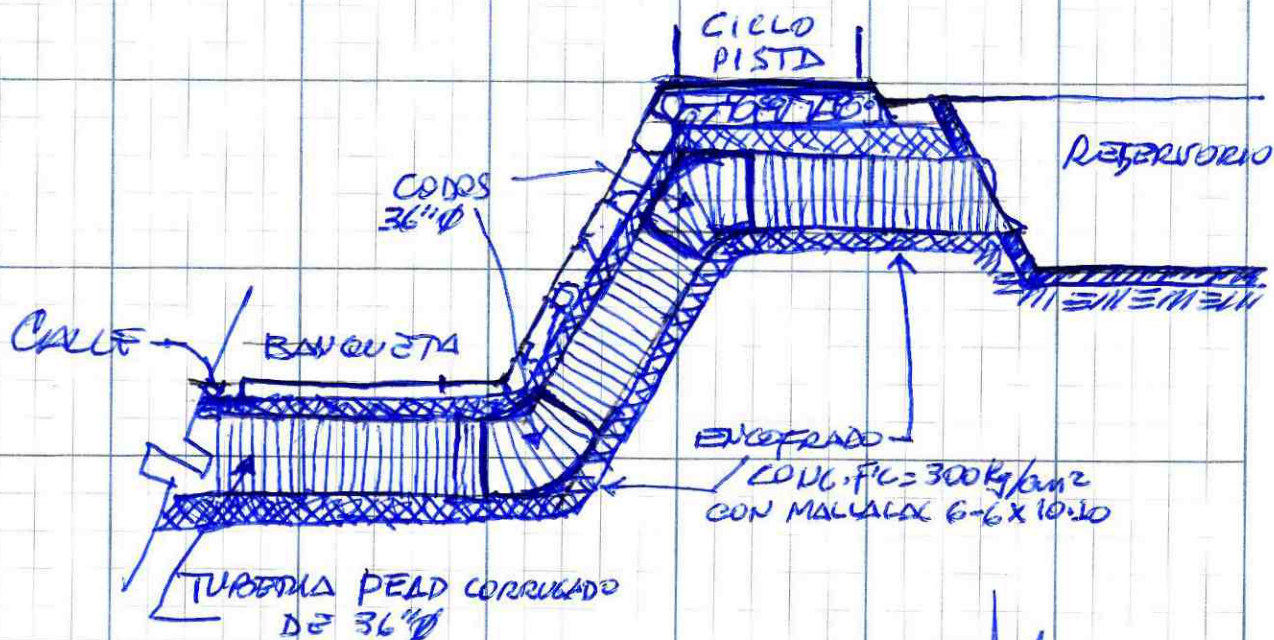

Lal

R. Alvarado


06/09/2023

NOTA N° ④ HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE YA SE TIENE TODO EL TRAMO DE TUBERIA INSTALADA Y EL ENCOFRADO SE ESTA TRABAJANDO Y TAMBIEN SE ESTA HABILITANDO ACCESO PARA EL ARRANQUE DE LO QUE SERA LA CAJA DE LLEGADA DE ESTA TUBERIA, DONDE SALDRA HACIA LA LINEA QUE LLEVARA HASTA EL DREN DE DRENAJE

Lal

R. Alvarado

NOTA N° ⑤ AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE APRECIÓ COMO HA QUEDADO TERMINADA CON TODA LA TUBERÍA ENCOFRADA CON ACABADO DE LOSA VEHICULAR EN ÁREA DE CIRCULACIÓN DE CALLE Y LA CAJA DE LLEGADA TAMBIÉN, YA CON SU TAPA DE ACERO ATORNILLADA

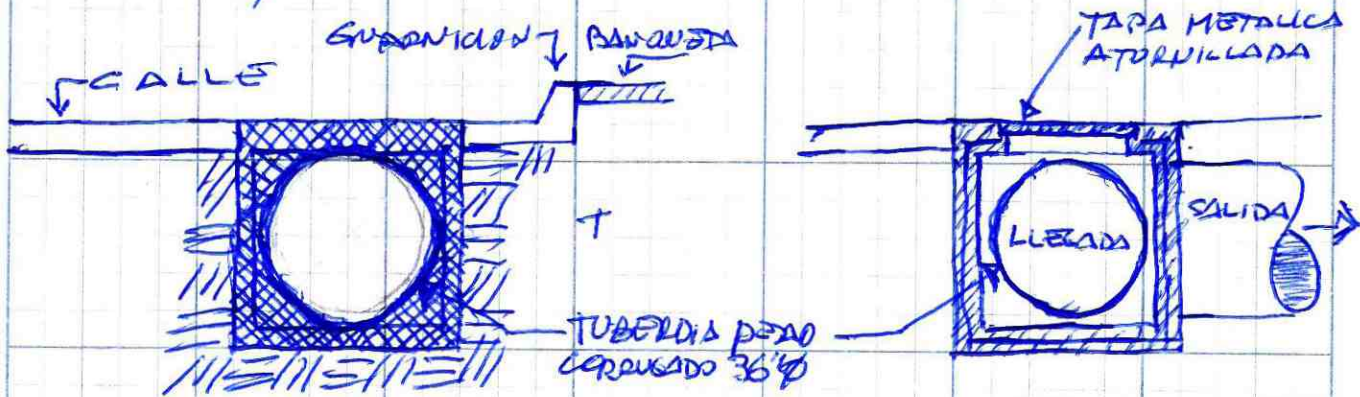

ENCOFRADO CON
CONC F/C = 300 Kg/cm²
ARMADO C/MALLA C-6-6 X 10-10

CAJA DE CONCRETO
ARMADO CON VAR.
Ø 1/2" @ 15 cm en
AMBOS SENTIDOS.
Y COLADO CON CONC.
F/C = 300 Kg/cm²

[Signature]

[Signature]

18 / 09 / 2023

NOTA N° ⑥ CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA LA ESTIMACION N° ① ÚNICA FINIQUITO POR UN MONTO NETO Y LIQUIDO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$626,303.00 SON: SEISCIENTOS VEINTISEISMIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON 65/100 M.N. CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% YA INCLUIDO Y TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, DANDO CON ESTO POR TERMINADA LA OBRA Y DE ESTA MANERA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA.

[Signature]

[Signature]
