



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/402/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 08 de Julio de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A. DE C.V.**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-001/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$1,892,229.13 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 13/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$409,694.12 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A. DE C.V.
- **R.F.C.** GCM210826620
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COLONIA ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80197
- **No. DE FACTURA:** # 232, DE FECHA 08 DE JULIO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

06:55 PM
08 JUL 2025
Marlen R.
RECIBIDO



GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 232

Fecha: 08/Jul/2025 18:21:23

Lugar de expedición (C.P.) 80197

Emisor

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

RFC: GCM210826620

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: México

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato, Culiacán Rosales Sinaloa México 80500

Culiacán Rosales

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGP-AD-FAISMUN-001/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,892,229.13 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 565,875.86 MAS I.V.A 16 % \$ 90,540.14 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 656,416.00 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 198,056.55 MAS I.V.A.: \$ 31,689.05 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 229,745.60 Importe TOTAL A FACTURAR \$ 367,819.31 MAS I.V.A \$ 58,851.09 MONTO NETO A FACTURAR \$ 426,670.40 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : \$ 16,976.28 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 246,721.88 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 409,694.12	\$367,819.31	IVA, - Importe: 58851.09	\$367,819.31

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
cuatrocientos veintiseis mil seiscientos setenta Pesos 40/100 M.N.

Subtotal: \$367,819.31

I.V.A.: \$58,851.09

Total: \$426,670.40



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509847998
Folio Fiscal: FD5B993D-1AD3-4E19-9C1A-EFD9FD51B240
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-07-08T19:21:27

Sello del SAT

INfpKrlBfWGVIEAAuWQRzPNKj7971p5rPVPusSGw34AKM87OQsaJR950299HLGduDWVBoqxHZ212TZvo0O9y/E2hnUmZvb7upcXC1JcYxnvHk9RlgMcoMIK13UZN/dUBbpCc0zjEnHa
xINizp3CTcQUQvLBs0lvZIKKXZ36aGhwXoNdDDa10EjC0z1BvqJEgGyL9F1fK6bl/ogfewJZcnxxG01dakaFcd+wf4Fu9UoWzXlwpw55/ewMJpk+LNH4rucGlaqvvhXDXG4SKnx/H
3smSS2P++hSp2eH2MjN4XY2bm4NiqIsWpH4LcOOHQEJK1stda9SGEWBw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FD5B993D-1AD3-4E19-9C1A-EFD9FD51B240|2025-07-08T19:21:27|MAS0810247C0|D4tAKwDFeaCgolytFWSDDJTc1IZb754mqQT0+gVPIKryKzVdcJw6nSR76Vb9IBxmt
ca6HFUvuX52z3hHXsrmC4okUHbDoYYOodYo8ZdYkiWRR/qNYTJdHu2g3NobMPIJCaRoUaKSW1nw9TF/9CmnaWUVVoCFz20ywd2+71AwK/z2Byi2/1ukxDQCsh+67zEErxKoMBFJQu83H
cc4knNfwzwwwN8ih0RiLuoAsk1gOI5cdN7PO3MwmNDd5R3f1Mgdw06sBcQgScK01tpqFQFQqdYz7+VHAyd6qVkv2/dPRdqDgdz+TBAfUZhUqr3LDia3DPsrgUznXKyPVBVJtw==|00001
00000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGSjCCBDKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk4NDc5OTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPuk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSVkld
Exportacion="01" Fecha="2025-07-08T18:21:23" Folio="232" FormaPago="03" LugarExpedicion="80197" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509847998"
Sello="D4tAKwLDFeaCgclYtFWSDDJTC1lZb754mqT0+gVPIKRYKzVdcJw6nSR76Vb9iBxmtca6HFUvuX52z3hHXsrnC4okUHbDoYY00dYo8ZdYkitWRR/qNYTJcHu2g3NobMPIJCaRoUaKSW1nw9TF/
SubTotal="367819.31" TipoDeComprobante="I" Total="426670.40" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA" RegimenFiscal="601" Rfc="GCM210826620"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72151500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA
HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGP-AD-FAISMUN-001/2025 MONTO DEL CONTRATO: $ 1,892,229.13 IMPORTE
DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 565,875.86 MAS I.V.A 16 % $ 90,540.14 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 656,416.00 AMORTIZACION ANTICIPO 35% $
198,056.55 MAS I.V.A.: $ 31,689.05 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 229,745.60 Importe TOTAL A FACTURAR $ 367,819.31 MAS I.V.A $ 58,851.09 MONTO
NETO A FACTURAR $ 426,670.40 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C. ) : $ 16,976.28 TOTAL DEDUCCIONES: $ 246,721.88 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 409,694.12"
Importe="367819.31" NoIdentificacion="SER02" ObjetoImp="02" ValorUnitario="367819.31">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="367819.31" Importe="58851.09" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58851.09">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="367819.31" Importe="58851.09" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="FD5B993D-1AD3-4E19-9C1A-EFD9FD51B240"
FechaTimbrado="2025-07-08T19:21:27" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="D4tAKwLDFeaCgclYtFWSDDJTC1lZb754mqT0+gVPIKRYKzVdcJw6nSR76Vb9iBxmtca6HFUvuX52z3hHXsrnC4okUHbDoYY00dYo8ZdYkitWRR/qNYTJcHu2g3NobMPIJCaRoUaKSW
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="INFqpKrBIfwGVIEAAuwQRzPNkj7971p5rPVPusSGqw34AKM870QseJR9S0299HLGduDWVBoqxHZ212Tzvo009y/E2hnUmZvbf7upcXC1JcYxnvHk9RlgMcoMLkt3UZn/dUBbpCc0zJE
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCM210826620	GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD5B993D-1AD3-4E19-9C1A-EFD9FD51B240	2025-07-08T18:21:23	2025-07-08T19:21:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$426,670.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 1 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN			
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V		ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL
DOMICILIO:	Calle Constituyente J. Natividad Macías No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197		PERIODO DE ESTIMACION:
TELÉFONO:	CEL:	DEL	12-jun-25
66 71 27 04 63	66 71 27 04 63	AL	27-jun-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:
GCM210826620.			10-jun-25
DEPENDENCIA.-	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.		
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
HORMIGUERO		BADIRAGUATO	INICIO: 12-jun-25
			TERMINACIÓN: 16-jul-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CONTRATO No:			
MBGBR-AD-FAISMUN-001/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,631,232.01	\$1,892,229.13	\$662,280.20	\$1,892,229.13
			BUENO POR: \$ 409,694.12
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:			
\$ 409,694.12	(SON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)		
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 198,056.55	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 565,875.86
MAS I.V.A.:	\$ 31,689.05	MAS I.V.A 16 %	\$ 90,540.14
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 229,745.60	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 656,416.00
3 % SVIFYC:	\$ 16,976.28	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 246,721.88
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 246,721.88		
		SALDO A PAGAR: \$ 409,694.12	

ELABORO.-

JSDm
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.



GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V

CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE			Fecha:	Estimacion:
			1 de julio de 2025	01 NORMAL
Periodo de la estimacion:	12/06/2025	27/06/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	12/06/2025	16/07/2025	HORMIGUERO	MBGBR-AD-FAISMUN-001/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,892,229.13	\$ 1,631,232.01	\$ 662,280.20	\$ 570,931.21	35%
				% Avance Total
				35%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	ESTA ESTIMACION
\$ 229,745.60	16 % I.V.A (+)	\$ 656,416.00
	Sub- Total A (=)	
	Amortizacion Anticipo 35%	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ -
	Importe TOTAL	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	TOTAL ACUMULADO.
\$ 229,745.60	Total (=)	\$ 656,416.00
	3 % SVIFYC:	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	CONTRATADO
\$ 662,280.20	Importe T O T A L	\$ 1,892,229.13
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 409,694.12	SALDO
\$432,534.60	Son:	\$ 1,235,813.13
	(SON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.)	

ELABORO-

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE D. O. P. D. U. Y E.



ESTADO DE CUENTA

007138

AUTORIZO.-

AUT

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

FECHA 1 de julio de 2025

CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
DOMICILIO:	Calle Constituyente J. Natividad Macías No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197
R.F.C.	GCM210826620.

DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
---------------------	-----------------------------

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	HORMIGUERO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,631,232.01
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 662,280.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,892,229.13

	DESTAJO	IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 565,875.86
2	ESTRUCTURA	\$ -
3	OTROS	\$ -
	SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 565,875.86

SUB TOTAL =	\$ 565,875.86
I.V.A AL 16 %	\$ 90,540.14
TOTAL =	\$ 656,416.00

ELABORO.-

JSDM
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U.Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA:		GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA				
DOMICILIO:		Calle Constituyente J. Natividad Macias				R.F.C.		GCM210826620.				
		No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197										
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN												
LOCALIDAD: HORMIGUERO												
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA												
HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA												
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,631,232.01		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$662,280.20		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:				
								\$1,892,229.13				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
			CANT	P.U.	TOTAL							
1	PRELIMINARES											
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJOS LA SUB-MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	1,076.93	\$	15.58	\$	16,778.57	1,076.93	0.0	1,076.93	\$	16,778.57
GP02	RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO	M3	467.76	\$	133.09	\$	62,254.18	467.8	0.0	467.76	\$	62,254.18
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	1,056.93	\$	37.61	\$	39,751.14	1,056.9	0.0	1,056.93	\$	39,751.14
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	1,056.93	\$	170.35	\$	180,048.03	1,056.9	0.0	1,056.93	\$	180,048.03
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	1,056.93	\$	212.07	\$	224,143.15	1,056.9	0.0	1,056.93	\$	224,143.15
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,056.93	\$	40.59	\$	42,900.79	1,056.9	0.0	1,056.93	\$	42,900.79
2	ESTRUCTURA											
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO	ML	266.06	\$	831.01	\$	221,098.52	0.0	0.0	0.00	\$	-
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=	ML	78.20	\$	705.69	\$	55,184.96	0.0	0.0	0.00	\$	-
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON	M2	864.97	\$	839.01	\$	725,718.48	0.0	0.0	0.00	\$	-
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA JUNTA DE PVC	ML	440.85	\$	32.67	\$	14,402.57	0.0	0.0	0.00	\$	-
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON	ML	432.37	\$	33.75	\$	14,592.49	0.0	0.0	0.00	\$	-
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE	ML	24.89	\$	77.12	\$	1,919.52	0.0	0.0	0.00	\$	-

ELABORO

JSDM

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGALING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

REVISADO

AUTORIZADO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.



CONTRATISTA:		GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA		01/07/2025	
DOMICILIO:		Calle Constituyente J. Natividad Macias No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197				R.F.C.		GCM210826620.			
<p align="center">DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN</p>											
				LOCALIDAD:		HORMIGUERO		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA									
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,631,232.01		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$662,280.20		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,892,229.13	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE		
			CANT	P.U.						TOTAL	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA	ML	266.06	\$	81.89	\$	21,787.65	0.0	0.0	\$	-
3	OTROS										
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA,	M2	1,138.03	\$	9.36	\$	10,651.96	0.0	0.0	\$	-
									SUB-TOTAL		\$ 565,875.86
									IVA		\$ 90,540.14
									MONTO TOTAL		\$ 656,416.00

with

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.

									
CONTRATISTA:					FECHA: martes, 1 de julio de 2025				
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.					DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.				
CONTRATISTA:		GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.							
R.F.C.		GCM210826620.							
OBRA:		CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA							
ESTIMACION		01 NORMAL							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2							
CADENAMIENTO									
	0+000.00	0+010.00			10.0000	6.08		60.80	
	0+010.00	0+020.00			10.0000	6.00		60.00	
	0+020.00	0+030.00			10.0000	6.56		65.60	
	0+030.00	0+040.00			10.0000	6.25		62.50	
	0+040.00	0+050.00			10.0000	5.97		59.70	
	0+050.00	0+060.00			10.0000	5.99		59.90	
	0+060.00	0+070.00			10.0000	6.04		60.40	
	0+070.00	0+080.00			10.0000	6.02		60.20	
	0+080.00	0+084.23			4.2300	5.01		21.19	
	0+084.23	0+130.16			0.0000	5.36		-	
	0+130.16	0+140.00			9.8400	7.27		71.54	
	0+140.00	0+150.00			10.0000	5.98		59.80	
	0+150.00	0+160.00			10.0000	5.83		58.30	
	0+160.00	0+170.00			10.0000	5.69		56.90	
	0+170.00	0+180.00			10.0000	5.94		59.40	
	0+180.00	0+190.00			10.0000	5.86		58.60	
	0+190.00	0+200.00			10.0000	7.07		70.70	
	0+200.00	0+210.00			10.0000	7.05		70.50	
	0+210.00	0+220.00			10.0000	6.09		60.90	
	0+220.00	0+230.00			10.0000	6.11		61.10	
	0+230.00	0+236.60			6.6000	6.16		40.66	
							TOTAL EJECUTADO	1178.89	
							TOTAL CONTRATADO	1076.93	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE	M3							
CADENAMIENTO									
	0+000.00	0+010.00			10.0000	6.08	0.55	33.44	
	0+010.00	0+020.00			10.0000	6.00	0.55	33.00	
	0+020.00	0+030.00			10.0000	6.56	0.55	36.08	
	0+030.00	0+040.00			10.0000	6.25	0.55	34.38	
	0+040.00	0+050.00			10.0000	5.97	0.55	32.84	
	0+050.00	0+060.00			10.0000	5.99	0.55	32.95	
	0+060.00	0+070.00			10.0000	6.04	0.55	33.22	
	0+070.00	0+080.00			10.0000	6.02	0.55	33.11	
	0+080.00	0+084.23			4.2300	5.01	0.55	11.66	
	0+084.23	0+130.16			0.0000	5.36	0.55	-	
	0+130.16	0+140.00			9.8400	7.27	0.55	39.35	
	0+140.00	0+150.00			10.0000	5.98	0.55	32.89	
	0+150.00	0+160.00			10.0000	5.83	0.55	32.07	
	0+160.00	0+170.00			10.0000	5.69	0.55	31.30	
	0+170.00	0+180.00			10.0000	5.94	0.55	32.67	
	0+180.00	0+190.00			10.0000	5.86	0.55	32.23	
	0+190.00	0+200.00			10.0000	6.07	0.55	33.39	
	0+200.00	0+210.00			10.0000	6.05	0.55	33.28	
	0+210.00	0+220.00			10.0000	6.09	0.55	33.50	
	0+220.00	0+230.00			10.0000	6.11	0.55	33.61	
	0+230.00	0+236.60			6.6000	6.16	0.55	22.36	
							TOTAL EJECUTADO	637.33	
							TOTAL CONTRATADO	467.76	

ELABORO:

JSDM

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

Bred

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.

		FECHA: martes, 1 de julio de 2025	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.		R.F.C.: GCM210826620.	
OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA		ESTIMACION: 01 NORMAL	
GENERADORES DE ESTIMACION			
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	
		CADENAMIENTO	LONG ANCHO
		0+000.00 0+010.00	10.0000 6.08 60.80
		0+010.00 0+020.00	10.0000 6.00 60.00
		0+020.00 0+030.00	10.0000 6.56 65.60
		0+030.00 0+040.00	10.0000 6.25 62.50
		0+040.00 0+050.00	10.0000 5.97 59.70
		0+050.00 0+060.00	10.0000 5.99 59.90
		0+060.00 0+070.00	10.0000 6.04 60.40
		0+070.00 0+080.00	10.0000 6.02 60.20
		0+080.00 0+084.23	4.2300 5.01 21.19
		0+084.23 0+130.16	0.0000 5.36 -
		0+130.16 0+140.00	9.8400 7.27 71.54
		0+140.00 0+150.00	10.0000 5.98 59.80
		0+150.00 0+160.00	10.0000 5.83 58.30
		0+160.00 0+170.00	10.0000 5.69 56.90
		0+170.00 0+180.00	10.0000 5.94 59.40
		0+180.00 0+190.00	10.0000 5.86 58.60
		0+190.00 0+200.00	10.0000 6.07 60.70
		0+200.00 0+210.00	10.0000 6.05 60.50
		0+210.00 0+220.00	10.0000 6.09 60.90
		0+220.00 0+230.00	10.0000 6.11 61.10
		0+230.00 0+236.60	6.6000 6.16 40.66
			TOTAL EJECUTADO 1158.69
			TOTAL CONTRATADO 1056.93
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE	M2	
		CADENAMIENTO	LONG ANCHO
		0+000.00 0+010.00	10.0000 6.08 60.80
		0+010.00 0+020.00	10.0000 6.00 60.00
		0+020.00 0+030.00	10.0000 6.56 65.60
		0+030.00 0+040.00	10.0000 6.25 62.50
		0+040.00 0+050.00	10.0000 5.97 59.70
		0+050.00 0+060.00	10.0000 5.99 59.90
		0+060.00 0+070.00	10.0000 6.04 60.40
		0+070.00 0+080.00	10.0000 6.02 60.20
		0+080.00 0+084.23	4.2300 5.01 21.19
		0+084.23 0+130.16	0.0000 5.36 -
		0+130.16 0+140.00	9.8400 7.27 71.54
		0+140.00 0+150.00	10.0000 5.98 59.80
		0+150.00 0+160.00	10.0000 5.83 58.30
		0+160.00 0+170.00	10.0000 5.69 56.90
		0+170.00 0+180.00	10.0000 5.94 59.40
		0+180.00 0+190.00	10.0000 5.86 58.60
		0+190.00 0+200.00	10.0000 6.07 60.70
		0+200.00 0+210.00	10.0000 6.05 60.50
		0+210.00 0+220.00	10.0000 6.09 60.90
		0+220.00 0+230.00	10.0000 6.11 61.10
		0+230.00 0+236.60	6.6000 6.16 40.66
			TOTAL EJECUTADO 1,158.69
			TOTAL CONTRATADO 1,056.93


ELABORO: JSDm
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: Bisd
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO: ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.



ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y E:



OBRA:

CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA



ESTIMACION:

01 NORMAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

PRELIMINARES

1	
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
GP05	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACION, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP06	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A RAZON DE 1.50 A 1.8 L7/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

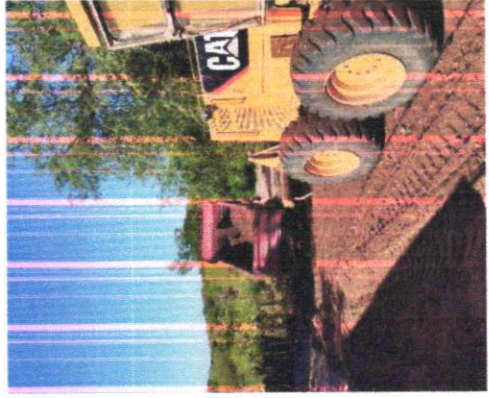

ELABORO.-

JSDM

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Briceida

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

Rubiel Rincon Ramos

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA: martes, 1 de julio de 2025
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.		DEPENDENCIA:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.		
DOMICILIO:	Calle Constituyente J. Natividad Macías	
R.F.C.:	No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197	
OBRA:	GCM210826620. CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA	

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORÓ: **JSDM**
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: **Bxsa**
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO: **[Signature]**
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.



Fecha y hora de consulta15/07/2025 1:55:21 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

--	--	--	--	--	--

Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	Poder:	100%
----------	--------	--------	------

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco	
Descripción: EST 01 NOR AD 001	Importe de la operación: 409,694.12 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836	Cuenta de depósito: 0121670859
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO	Titular de la cuenta: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA SA DE C V
Fecha de creación: 15/07/2025	Fecha de aplicación: 15/07/2025
Hora: 13:55:19	
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382	Motivo de pago: EST 01 NOR AD 001

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:	0086522091	Folio único:	I323202507151355190086522098
-----------------	------------	--------------	------------------------------

Estado operación

Porcentaje firmado:	100%	Estado:	Operado
---------------------	------	---------	---------

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	15/07/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/07/2025
