

OFICIO No. OPDUyE/414/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION
02 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 17 de Julio de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-001/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,892,229.13 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 13/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$771,317.85 (SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA, S.A. DE C.V.
- R.F.C. GCM210826620
- DOMICILIO FISCAL: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS No. 3039, COLONIA ESTELA ORTIZ DE TOLEDO, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80197
- No. DE FACTURA: # 236, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
C.C.P. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.


ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



Recibi
Marlen P
Tesorero
17-juli
2025
01848

**TESORERÍA
MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**



GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

Emisor

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

RFC: GCM210826620

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: México

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato, Culiacán Rosales Sinaloa México 80500

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 236

Fecha: 16/Jul/2025 13:09:29

Lugar de expedición (C.P.): 80197

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Culiacán Rosales

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGP-AD-FAISMUN-001/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$1,892,229.13 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$1,065,356.15 MAS I.V.A 16 % \$170,456.98 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$1,235,813.13 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%\$372,874.66 MAS I.V.A.:\$59,659.95 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:\$432,534.60 Importe TOTAL A FACTURAR \$692,481.49 MAS I.V.A \$110,797.04 MONTO NETO A FACTURAR \$803,278.53 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : \$31,960.68 TOTAL DEDUCCIONES: \$464,495.28 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$771,317.85	\$692,481.49	IVA, - Importe: 110797.04	\$692,481.49

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
ochocientos tres mil doscientos setenta y ocho Pesos 53/100 M.N.

Subtotal: \$692,481.49

I.V.A.: \$110,797.04

Total: \$803,278.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509847998
Folio Fiscal: C47C5BDF-4F0D-42E3-9CD5-9EF1E0076FD9
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-07-17T14:04:36

Sello del SAT

MoeQuKJdGQq74Vgh36h4JtN+mEatwz+FGWXX344ifpWsdgy2z4y6LA1vVdVsMvAwf2NMWMI9wWjuSxd7jzYG0LM62dogaVOSKGVpVIV04CX7O9kYMYX6zBILKJ6bbhhSKSMQU7io
xk+PrfacHowK7cy8MjSm+AnOkXFE9IWqEzyFb9/b64W+A57TUIhJmgYRuFwhSyxPQ8aAxxSF0YbvP5T0m8dsVAFmRYwa7/432K6m1vTw/V3oJBCu+S5e5x+NROhG7uWSZPAC1Uf
Y4KXU9Sm8p73xYwiaPbD1+0YBi2HsZb0pJP4NXINyNnU6IS6fNHTIQ5L9Q2LAUAQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1]C47C5BDF-4F0D-42E3-9CD5-9EF1E0076FD9[2025-07-17T14:04:36]MAS0810247C0JCVEKQ43r+Dxs2OKFYvZ7FShDDrhZc7KUGMZ1OzLB3NPWPemXaWw/5x6oC5cF0W
b0g7nHDR1vXUzhqle0TBbWR8V89Mb+cQOaUsCi9aBfsWFWj0ZgE/Imfy1DBpbGuQIB9FPQgzsOIGFN1uGK7uIlYm1m55LcO+nHlyB2lOm+B4ypRd2LkZ4KwYpCRKUPTE/XPñhPwPlyq0
E8IDNFaBvPRiu+KwX/RywAwXn2KD6Qt60vhs7xZbEJB5Yc5jHWW1ZM28Napgl7Nw8USVjncIG1kf8OHlzMvlepDvVICJm1FJNRdEh8roW3AEpvlilqH0oHdQlaCeNimdr9GCAU5ng={00
001000000709182898}

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIICSjCCBDKGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk4NDc5OTgwOQY3KoZihvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPuk1EQUUgQ0QVSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2025-07-16T13:09:29" Folio="236" FormaPago="03" LugarExpedicion="80197" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509847998"
Sello="CvEkQ43r+fXs20KFYvZ7FShDdrhZc7KUGMZ10zLB3NPWPeaxXaMwf5x6oC5cjFcWbtg7nHdR1vXUzhqfe0TbBwR8V89Mb+cQaUsCi9aBfsWFWj6ZgE/llmfy1DBpbGuQIB9FPQgzS0IGFN1u
SubTotal="692481.49" TipoDeComprobante="I" Total="803278.53" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA" RegimenFiscal="601" Rfc="GCM210826620"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL
HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGP-AD-FAISMUN-001/2025 MONTO DEL
CONTRATO: $1,892,229.13 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $1,065,356.15 MAS I.V.A 16 % $170,456.98 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA
$1,235,813.13 AMORTIZACION ANTICIPO 35%$372,874.66 MAS I.V.A.:$59,659.95 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO:$432,534.60 Importe TOTAL A FACTURAR
$692,481.49 MAS I.V.A $110,797.04 MONTO NETO A FACTURAR $803,278.53 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $31,960.68 TOTAL DEDUCCIONES: $464,495.28 MONTO
LIQUIDO A RECIBIR: $771,317.85" Importe="692481.49" NoIdentificacion="SER08" ObjetoImp="02" ValorUnitario="692481.49">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="692481.49" Importe="110797.04" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="110797.04">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="692481.49" Importe="110797.04" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="C47C5BDF-4F8D-42E3-9CD5-9EF1E0076FD9"
FechaTimbrado="2025-07-17T14:04:36" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="CvEkQ43r+fXs20KFYvZ7FShDdrhZc7KUGMZ10zLB3NPWPeaxXaMwf5x6oC5cjFcWbtg7nHdR1vXUzhqfe0TbBwR8V89Mb+cQaUsCi9aBfsWFWj6ZgE/llmfy1DBpbGuQIB9FPQgzS
NoCertificadoSAT="00001000000709182896"
SelloSAT="MceQuK7dGqQ74Vgh36h4JtN+mEatwz+FGWXX3441fpMsdy2z4y6LA1vVdVsMvAwf2NMWmf9WjuSxd7jzYg0LM82dcgaVOSKQWpViv04CX709kVMYX6zBILKJ6b1xhhrSKSHQU7ioX
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCM210826620	GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C47C5BDF-4F0D-42E3-9CD5-9EF1E0076FD9	2025-07-16T13:09:29	2025-07-17T14:04:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$803,278.53	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Fecha: 16 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V		ESTIMACIÓN No:	02 NORMAL FINIQUITO
DOMICILIO:	Calle Constituyente J. Natividad Macías No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	28-jun-25
66 71 27 04 63	66 71 27 04 63		AL	14-jul-25
R.F.C.				
GCM210826620.			FECHA DE CONTRATO:	
DEPENDENCIA:-				10-jun-25
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.				
	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
	HORMIGUERO	BADIRAGUATO	INICIO:	12-jun-25
			TERMINACIÓN:	16-jul-25
DESCRIPCIÓN:				
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA				
CONTRATO No:				
MBGP-AD-FAISMUN-001/2025				
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$1,631,232.01	\$1,892,229.13	\$662,280.20	\$1,892,229.13	
			BUENO POR:	\$ 771,317.85
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:				
\$ 771,317.85	(SON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 NORMAL FINIQUITO				
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 372,874.66	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	1,065,356.15
MAS I.V.A.:	\$ 59,659.95	MAS I.V.A 16 %	\$	170,456.98
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 432,534.60	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$	1,235,813.13
3 % SVIFYC:	\$ 31,960.68	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$	464,495.28
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 464,495.28			
		SALDO A PAGAR: \$ 771,317.85		

ELABORO.-

JSDM

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMO
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y



GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V

CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE			Fecha:	Estimacion:
			16 de julio de 2025	02 NORMAL FINQUITO
Periodo de la estimacion:	12/06/2025	14/07/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecucion:	12/06/2025	16/07/2025	HORMIGUERO	MBGP-AD-FAISMUN-001/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,892,229.13	\$ 1,631,232.01	\$ 662,280.20	\$ 570,931.21	65%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 1,065,356.15	ESTA ESTIMACION
\$ 432,534.60	16 % I.V.A (+) \$ 170,456.98	\$ 1,235,813.13
	Sub- Total A (=) \$ 1,235,813.13	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 372,874.66	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 59,659.95	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 229,745.60	Total (=) \$ 432,534.60	\$ 656,416.00
	Importe TOTAL \$ 692,481.49	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 110,797.04	TOTAL ACUMULADO.
\$ 662,280.20	Total (=) \$ 803,278.53	\$ 1,892,229.13
	3 % SVFYC: \$ 31,960.68	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 464,495.28	CONTRATADO
\$ 662,280.20	Importe T O T A L \$ 771,317.85	\$ 1,892,229.13
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 771,317.85	SALDO
\$ -	Son:	\$ -
	(SON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 M.N.)	

ELABORO.-

JSDM

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE D. O. P. D. U. Y E.

FECHA: 16 de julio de 2025

ESTADO DE CUENTA

[illegible]

REVISOR



ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA

FECHA 16 de julio de 2025

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

Calle Constituyente J. Natividad Macías.
No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo,
Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197

R.F.C.

GCM210826620.

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	HORMIGUERO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,631,232.01
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 662,280.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,892,229.13

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 1,054,704.19
3	OTROS	\$ 10,651.96
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 1,065,356.15

SUB TOTAL=	\$ 1,065,356.15
I.V.A AL 16 %	\$ 170,456.98
TOTAL =	\$ 1,235,813.13

ELABORO.-

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR.

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS


AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.



DESGLASE

CONTRATISTA:		GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA:		16/07/2025	
DOMICILIO:		Calle Constituyente J. Natividad Macías No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197				R.F.C.		GCM210826620.			
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION											
				LOCALIDAD:		HORMIGUERO		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL FINQUITO	
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA											
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,631,232.01		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$662,280.20		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,892,229.13	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE		
			CANT	P.U.	TOTAL						
1	PRELIMINARES										
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO	M2	1,076.93	\$	15.58	\$	16,778.57	1,076.93	0.0	0.00	\$
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-	M3	467.76	\$	133.09	\$	62,254.18	467.76	0.0	0.00	\$
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE	M2	1,056.93	\$	37.61	\$	39,751.14	1,056.93	0.0	0.00	\$
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE	M2	1,056.93	\$	170.35	\$	180,048.03	1,056.93	0.0	0.00	\$
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO	M2	1,056.93	\$	212.07	\$	224,143.15	1,056.93	0.0	0.00	\$
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA	M2	1,056.93	\$	40.59	\$	42,900.79	1,056.93	0.0	0.00	\$
2	ESTRUCTURA										
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	ML	266.06	\$	831.01	\$	221,098.52	266.06	0.0	266.06	\$
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y	ML	78.20	\$	705.69	\$	55,184.96	78.20	0.0	78.20	\$
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	864.97	\$	839.01	\$	725,718.48	864.97	0.0	864.97	\$
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	440.85	\$	32.67	\$	14,402.57	440.85	0.0	440.85	\$
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA	ML	432.37	\$	33.75	\$	14,592.49	432.37	0.0	432.37	\$
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	24.89	\$	77.12	\$	1,919.52	24.89	0.0	24.89	\$
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA	ML	266.06	\$	81.89	\$	21,787.65	266.06	0.0	266.06	\$
3	OTROS										



DESGLOSE

CALL FOR COUNSEL AT 1-800-441-4642

CONTRATISTA:		GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA:		16/07/2025		
DOMICILIO:		Calle Constituyente J. Natividad Macías No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197				R.F.C.		GCM210826620.				
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN												
				LOCALIDAD:		HORMIGUERO		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL FINIQUITO		
CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA												
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,631,232.01		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$662,280.20		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,892,229.13		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
			CANT	P.U.							TOTAL	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,138.03	\$	9.36	\$	10,651.96	1,138.03	0.0	1,138.03	\$	10,651.96
								SUB-TOTAL		\$ 1,065,356.15		
								IVA		\$ 170,456.98		
								MONTO TOTAL		\$ 1,235,813.13		

MSD

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

~~AUTO~~

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.



REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E:

REVISO.-

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E:



CONTRATISTA:		GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V		DEPENDENCIA:		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AYUNTAMIENTO DE BADRAGUATO.					
R.F.C.	GCM210826820.										
OBRA:	CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA										
ESTIMACION	02 NORMAL FINIQUITO										
GENERADORES DE ESTIMACION											
3	OTROS										
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2									
		CADENAMENTO			LONG	ANCHO					
		0+000.00 0+010.00			10.0000	6.08				60.80	
		0+010.00 0+020.00			10.0000	6.00				60.00	
		0+020.00 0+030.00			10.0000	6.56				65.60	
		0+030.00 0+040.00			10.0000	6.25				62.50	
		0+040.00 0+050.00			10.0000	5.97				59.70	
		0+050.00 0+060.00			10.0000	5.99				59.90	
		0+060.00 0+070.00			10.0000	6.04				60.40	
		0+070.00 0+080.00			10.0000	6.02				60.20	
		0+080.00 0+084.23			4.2300	5.01				21.19	
		0+084.23 0+130.16			0.0000	5.36				0.00	
		0+130.16 0+140.00			9.8400	7.27				71.54	
		0+140.00 0+150.00			10.0000	5.98				59.80	
		0+150.00 0+160.00			10.0000	5.83				58.30	
		0+160.00 0+170.00			10.0000	5.69				56.90	
		0+170.00 0+180.00			10.0000	5.94				59.40	
		0+180.00 0+190.00			10.0000	5.86				58.60	
		0+190.00 0+200.00			10.0000	7.07				70.70	
		0+200.00 0+210.00			10.0000	7.05				70.50	
		0+210.00 0+220.00			10.0000	6.09				60.90	
		0+220.00 0+230.00			10.0000	6.11				61.10	
		0+230.00 0+236.60			6.6000	6.16				40.66	
									TOTAL EJECUTADO	1178.69	
									TOTAL CONTRATADO	1138.03	

ELABORO -

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

~~AUTORIZO.-~~

ING. RUBTEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E:



GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.

OBRA:	CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
ESTIMACION:	02 NORMAL FINIQUITO

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION	
ESTRUCTURA	
2	
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM" , INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.



ELABORO.-

JSDM

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Brda

ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

[Signature]

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



OBRA:		CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
ESTIMACION:		02 NORMAL FINIQUITO
REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION		
3		OTROS
GP101		LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO.-

J S D M

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A DE C.V
RESPONSABLE LEGAL

REVISO.-

Brad

ARQ.BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO.

DOMICILIO:

Calle Constituyente J. Natividad Macías
No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197

R.F.C.


GCM210620620.

OBRA:

CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA
HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

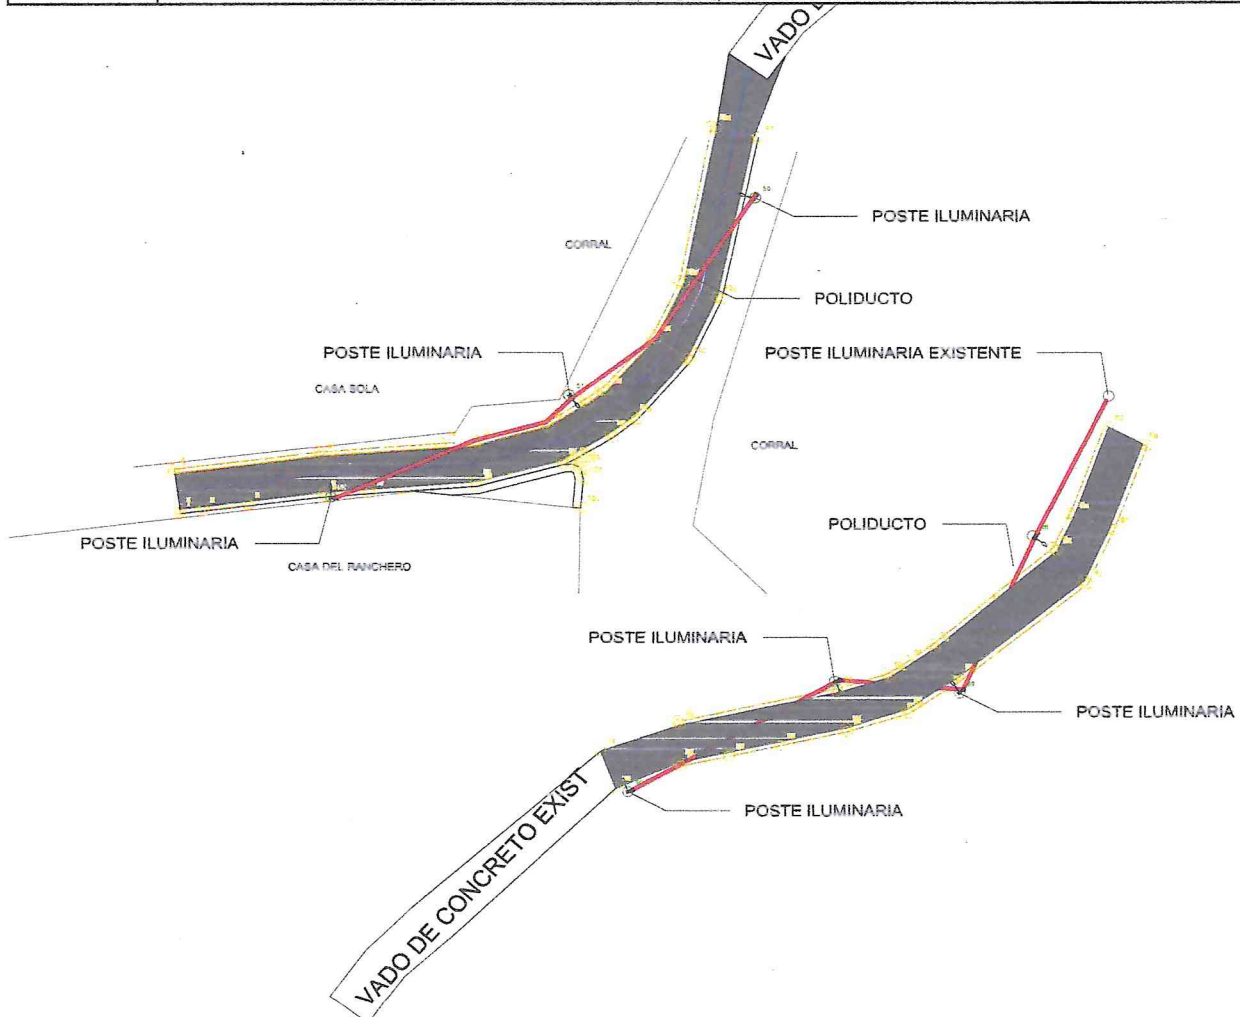

ELABORO.-

JSDM

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.



GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
AYUNTAMIENTO DE BADRAGUATO.

DOMICILIO:

Calle Constituyente J. Natividad Macías
No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80197

R.F.C.

GCM210820620.

OBRA:

CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA
HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, DEL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA


CROQUIS ESTIMACION:

3

OTROS

GP101

LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

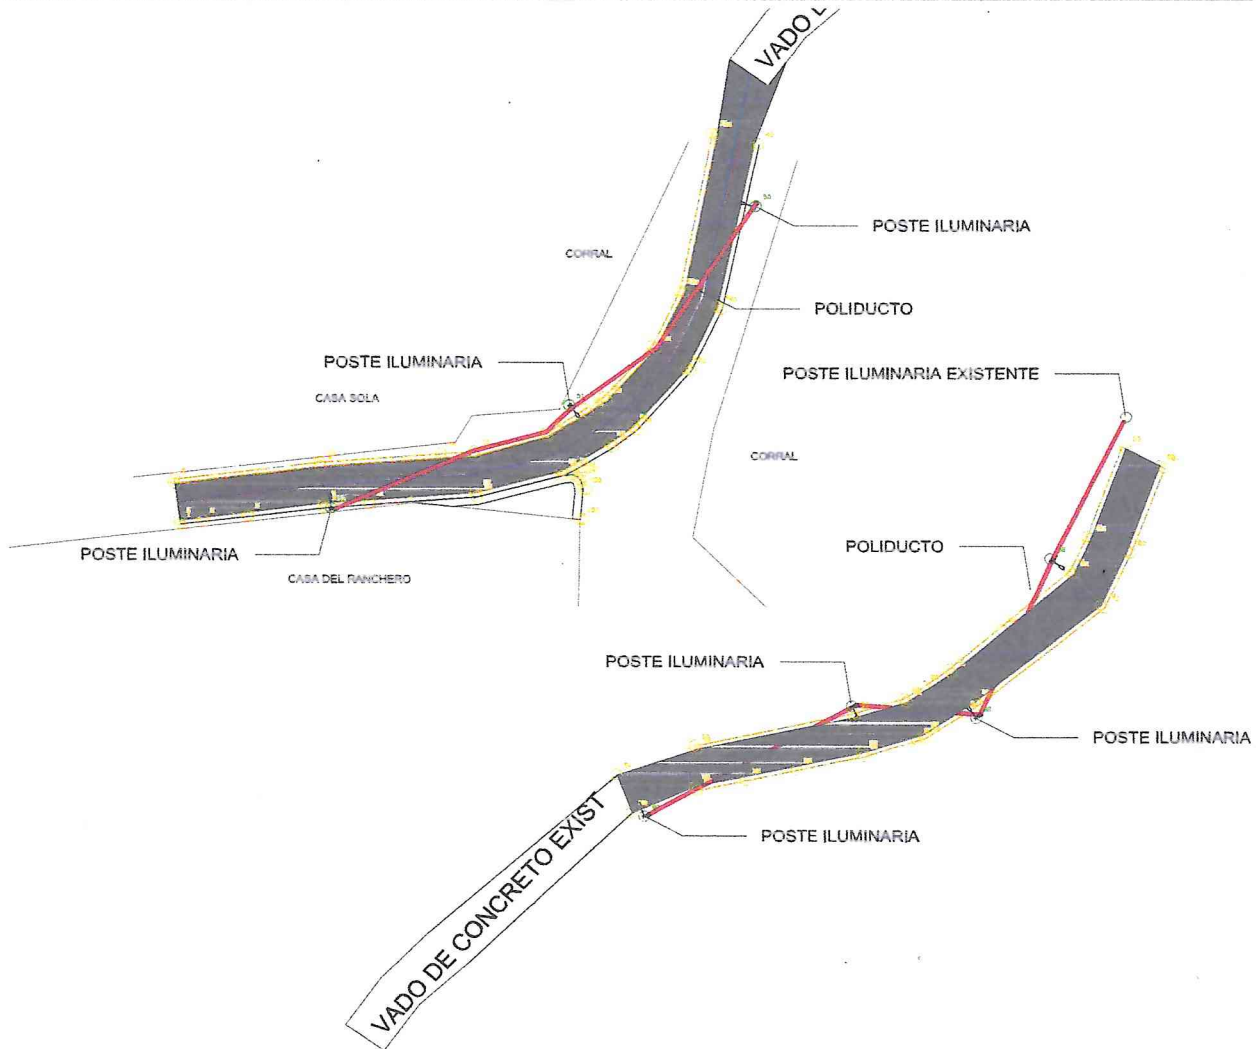

ELABORO.-

JSDM
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

Brscd
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO.-

ING. ROSAL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y E.



Fecha y hora de consulta

19/07/2025 5:42:29 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EST 2 NOR FIN AD001

Importe de la operación: 771,317.85 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 0121670859

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA SA DE C V

Fecha de creación: 19/07/2025

Fecha de aplicación: 19/07/2025

Hora: 17:42:17

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Motivo de pago: EST 02 NOR FIN AD001

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0081424228

Folio único: I323202507191742170081424235

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/07/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/07/2025
