

JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

I.M.S.S.  
L5111574103



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 3



### CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: **ESC-FAISMUN-2025-038** ESTIMACION: **01 (Finiquito)**  
PERIODO: **09-dic-25** AL **31-dic-25** LOCALIDAD: **PALMITO DEL VERDE** MUNICIPIO: **ESCUINAPA**  
DESCRIPCION: **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.**  
IMPORTE DE OBRA: **\$175,125.35**  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: **\$0.00**  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: **\$175,125.35**

| CLAVE                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | SEGUN PROYECTO |             |             | HASTA<br>ESTA<br>ESTIMACION | HASTA<br>ESTIMACION<br>ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA<br>ESTIMACION | IMPORTE   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | VOL            | PU          | \$          |                             |                                 |           |                       |           |
| CUARTOS DORMITORIOS    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |             |             |                             |                                 |           |                       |           |
| 1                      | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                |             |             |                             |                                 |           |                       |           |
| TEMP*0                 | TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE: EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.                                                                                                   | M2     | 16.00          | \$ 13.20    | \$ 211.20   | 16.00                       | 0.00                            | 0.00      | 16.00                 | 211.20    |
| TOTAL DE PRELIMINARES: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |             |             |                             |                                 |           | \$                    | 211.20    |
| 2                      | CIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |             |             |                             |                                 |           |                       |           |
| AP3                    | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIDO EN ZANJA EN SECO. | M3     | 5.89           | \$ 232.98   | \$ 1,372.25 | 12.10                       | 0.00                            | 6.21      | 12.10                 | 2,819.06  |
| 2.1.1                  | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                                                                                                        | M2     | 8.96           | \$ 284.82   | \$ 2,551.99 | 11.53                       | 0.00                            | 2.57      | 11.53                 | 3,283.97  |
| 17.1                   | ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS CON CONCRETO F'C= 200 KG /CM2. INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO. ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                                                                                  | PZA    | 4.00           | \$ 1,607.61 | \$ 6,430.44 | 4.00                        | 0.00                            | 0.00      | 4.00                  | 6,430.44  |
| 2.2.1                  | CONSTRUCCION DE MURO DE CIMENTACION BLOCK DE 9 X14 X 28 CMS. ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCION DE 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE: MORTERO PREPARADO EN OBRA, MATERIALES, NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                     | M2     | 12.80          | \$ 314.06   | \$ 4,019.97 | 11.84                       | 0.00                            | 0.00      | 11.84                 | 3,718.47  |
| 2.1                    | DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA.                                | ML     | 16.00          | \$ 398.31   | \$ 6,372.96 | 15.40                       | 0.00                            | 0.00      | 15.40                 | 6,133.97  |
| 2.07                   | FIRME DE CONCRETO. F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                                                                | ML     | 16.00          | \$ 553.87   | \$ 8,861.92 | 13.69                       | 0.00                            | 0.00      | 13.69                 | 7,582.48  |
| TOTAL DE CIMENTACION:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |             |             |                             |                                 |           | \$                    | 29,968.39 |

ELABORÓ

*Juan Ramon Reyes Pastrano*  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

REVISÓ

*Arq. Silvia Zaydee Padilla Crespo*  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

*Arq. Graciela Elizalde Santos*  
M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS  
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA



JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

I.M.S.S.  
L5111574103



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 3



### CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-038  
PERIODO: 09-dic-25 AL 31-dic-25 LOCALIDAD: PALMITO DEL VERDE ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.  
IMPORTE DE OBRA: \$175,125.35  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$175,125.35

| CLAVE                              | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | SEGUN PROYECTO |             |              | HASTA<br>ESTA<br>ESTIMACION | HASTA<br>ESTIMACION<br>ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA<br>ESTIMACION | IMPORTE   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | VOL            | PU          | \$           |                             |                                 |           |                       |           |
| 3                                  | DALAS, MUROS Y CASTILLOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |             |              |                             |                                 |           |                       |           |
| 2.2                                | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 9 X 14 X 28 CMS. ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:4, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: PLOMADA, MORTERO ECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                 | M2     | 39.90          | \$ 595.45   | \$ 23,758.46 | 32.69                       | 0.00                            | 0.00      | 32.69                 | 19,465.26 |
| 2.3                                | CASTILLO DE 15 X 15 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2,T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA ARMEX 15X20-4. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | ML     | 24.00          | \$ 300.91   | \$ 7,221.84  | 18.36                       | 0.00                            | 0.00      | 18.36                 | 5,524.71  |
| 2.4                                | DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA.                 | ML     | 16.00          | \$ 485.53   | \$ 7,768.48  | 15.40                       | 0.00                            | 0.00      | 15.40                 | 7,477.16  |
| TOTAL DE DALAS, MUROS Y CASTILLOS: |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |             |              |                             |                                 |           | \$                    | 32,467.13 |
| 4                                  | LOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                |             |              |                             |                                 |           |                       |           |
| 3.1                                | LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                 | M2     | 16.00          | \$ 1,573.75 | \$ 25,180.00 | 20.68                       | 0.00                            | 4.68      | 20.68                 | 32,545.15 |
| 4.2                                | CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE BLOCK DE 9 X 14 X 28 CMS, ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:4, EN PERIMETRO DE LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                                     | ML     | 16.00          | \$ 186.68   | \$ 2,986.88  | 17.60                       | 0.00                            | 1.60      | 17.60                 | 3,285.57  |
| 4.3                                | CONSTRUCCIÓN DE CHAFLÁN EN LOSA DE 5 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.                                                                                                                         | ML     | 16.00          | \$ 167.10   | \$ 2,673.60  | 16.40                       | 0.00                            | 0.40      | 16.40                 | 2,740.44  |
| TOTAL DE LOSA:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |             |              |                             |                                 |           | \$                    | 38,571.16 |

ELABORÓ

Juan Ramon Reyes Pastrano  
C. JOSE RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS  
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA



JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

I.M.S.S.  
L5111574103



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 3



### CONCEPTOS DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-038  
PERIODO: 09-dic-25 AL 31-dic-25 LOCALIDAD: PALMITO DEL VERDE ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$175,125.35  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$175,125.35

| CLAVE                   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | SEGUN PROYECTO |             |              | HASTA<br>ESTA<br>ESTIMACION | HASTA<br>ESTIMACION<br>ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA<br>ESTIMACION | IMPORTE    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |        | VOL            | PV          | \$           |                             |                                 |           |                       |            |
| 5                       | INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |             |              |                             |                                 |           |                       |            |
| 5.1.1                   | SALIDA ELECTRICA EN CONTACTOS Y/O APAGADORES INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO ( CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.                                                                                                | SAL    | 3.00           | \$ 1,708.98 | \$ 5,126.94  | 3.00                        | 0.00                            | 0.00      | 3.00                  | 5,126.94   |
| TOTAL DE INSTALACIONES: |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |             |              |                             |                                 |           | \$                    | 5,126.94   |
| 6                       | ACABADOS                                                                                                                                                                                                                                          |        |                |             |              |                             |                                 |           |                       |            |
| 060105                  | APLANADO FLOTEADO EN MURO Y PLAFON CON MORTERO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                               | M2     | 93.55          | \$ 339.75   | \$ 31,783.61 | 83.30                       | 0.00                            | 0.00      | 83.30                 | 28,301.18  |
| 6.1.1                   | CONSTRUCCION DE BOQUILLAS EN AREA DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | ML     | 9.60           | \$ 256.32   | \$ 2,460.67  | 27.70                       | 0.00                            | 18.10     | 27.70                 | 7,100.06   |
| TEMP*1                  | INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR ESTANDAR 0.90X2.10 MTS. INCLUYE: PUERTA CON CHAPA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                          | PZA    | 1.00           | \$ 5,648.50 | \$ 5,648.50  | 1.00                        | 0.00                            | 0.00      | 1.00                  | 5,648.50   |
| TEMP*2                  | VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINO DE 1.00X1.20MTS. INCLUYE: VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                      | PZA    | 1.00           | \$ 6,337.38 | \$ 6,337.38  | 1.00                        | 0.00                            | 0.00      | 1.00                  | 6,337.38   |
| TOTAL DE ACABADOS:      |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |             |              |                             |                                 |           | \$                    | 47,387.12  |
| 7                       | LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                          |        |                |             |              |                             |                                 |           |                       |            |
| 6.1                     | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                                                           | M2     | 16.00          | \$ 12.69    | \$ 203.04    | 16.00                       | 0.00                            | 0.00      | 16.00                 | 203.04     |
| TOTAL DE LIMPIEZA:      |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |             |              |                             |                                 |           | \$                    | 203.04     |
| TOTAL DE ESTIMACION:    |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |             |              |                             |                                 |           | \$                    | 153,934.98 |

ELABORÓ

Juan Ramon Reyes Pastrano  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS  
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA



JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5



IM.S.S.  
L5111574103

MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA



## RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO: ESC-FAISMUN-2025-038 LOCALIDAD: PALMITO DEL VERDE ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
PERIODO: 09-dic-25 AL 31-dic-25 MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$175,125.35 CONVENIO ADICIONAL:  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$175,125.35 DEL AL

### CUARTOS DORMITORIOS

| OBRA       |                          | IMPORTE       |
|------------|--------------------------|---------------|
| 1          | PRELIMINARES             | \$ 211.20     |
| 2          | CIMENTACION              | \$ 29,968.39  |
| 3          | DALAS, MUROS Y CASTILLOS | \$ 32,467.13  |
| 4          | LOSA                     | \$ 38,571.16  |
| 5          | INSTALACIONES            | \$ 5,126.94   |
| 6          | ACABADOS                 | \$ 47,387.12  |
| 7          | LIMPIEZA                 | \$ 203.04     |
| SUB TOTAL= |                          | \$ 153,934.98 |
| I.V.A      |                          | \$ 24,629.60  |
| TOTAL =    |                          | \$ 178,564.58 |

Nota.- Por cierre de ejercicio se cobrara esta cantidad.  
\$ 150,970.13  
\$ 24,155.22  
\$ 175,125.35

Elaboró

*Juan Ramon Reyes Pastrano*  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

Revisó

*Arq. Silvia Zaydee Padilla Crespo*  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó

*M. en Arq. Graciela Elizalde Santos*  
M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS  
DIRECTORA DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA



REP~J850831-1Y5

## FECHA CONTRATO: 09-dic-25

AL

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

**AUTORIZÓ**

**L.C.P. JOSE TRINIDAD IBARRA MARTINEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

# CARATULA DE RECIBO

Hoja: 1 de 1

## RECIBO MUNICIPAL No. 01 (Finiquito)

JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA

TELEFONO: CEL: 669-993-3384

R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

UBICACION:  
MAZATLAN, SIN.  
I.M.S.S.  
L5111574103

FECHA : 26-dic-25  
ESTIMACION No: 01 (Finiquito)  
PERIODO:  
DEL 09-dic-25  
AL 26-dic-25

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA DE CONTRATO: 09-dic-25  
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
INICIO: 09-dic-25  
TERMINACION: 31-dic-25  
PRORROGA:  
DEL  
AL

CONTRATO NO:  
ESC-FAISMUN-2025-038

|                 |                 |              |                            |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA | 35% ANTICIPO | IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: |
| \$150,970.13    | \$175,125.35    | \$0.00       | \$175,125.35               |

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, LA CANTIDAD DE:

\$170,596.25 SON: (CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

EN PAGO DE ESTIMACION 01 (Finiquito)

| DEDUCCIONES:                                                 |    | CALCULO DE ESTIMACION |                                      |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------------------------------|
| AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)                                | \$ | -                     | IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA |
| MAS I.V.A.                                                   | \$ | -                     | DEDUCCION ANTICIPO (35%):            |
| TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO                               | \$ | -                     | SUMA:                                |
|                                                              |    |                       | MAS I.V.A 16 %                       |
|                                                              |    |                       | TOTAL:                               |
|                                                              |    |                       | DEDUCCION SVIFC (3%):                |
|                                                              |    |                       | LIQUIDO A PAGAR:                     |
| 3% ORGANO INTERNO DE CONTROL MPAL Y CONGRESO DEL ESTADO: (*) | \$ | 4,529.10              |                                      |
| TOTAL DE DEDUCCIONES:                                        | \$ | 4,529.10              |                                      |

(\*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

SALDO A PAGAR: \$ 170,596.25

REALIZÓ

*Juan Ramon Reyes Pastrano*  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

*Graciela Elizalde Santos*  
M. en ARQ. GRACIELA ELIZALDE SANTOS  
DIRECTORA DE OBRAS, SERVIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

AUTORIZÓ

L.C.P. JOSE TRINIDAD BARRA MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

# R | P

REYES      PASTRANO

Escuinapa, Sinaloa a 26 de diciembre de 2025

Recibo No. **1 (Uno)**  
Bueno por: **\$170,596.25**

RECIBI DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: -----  
**\$170,596.25** (CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.).

POR CONCEPTO DE:  
PAGO CORRESPONDIENTE A LA **ESTIMACION No.1 (FINIQUITO)** DEL CONTRATO No.  
**ESC-FAISMUN-2025-038** DE LA OBRA DE DESIGNACION:

**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.**

|                             |              |                                                                       |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Monto total Contratado =    | \$175,125.35 | (Son Ciento Setenta y Cinco Mil Ciento Veinticinco Pesos 35/100 M.N.) |
| IMPORTE DE ESTIMACION:      |              | \$150,970.13                                                          |
| SUBTOTAL:                   |              | <b>\$150,970.13</b>                                                   |
| 16% IVA:                    |              | <b>\$24,155.22</b>                                                    |
| TOTAL:                      |              | <b>\$175,125.35</b>                                                   |
| DEDUCCIONES:                |              |                                                                       |
| AMORTIZACION ANTICIPO 35%:  |              | <b>\$0.00</b>                                                         |
| CONGRESO DEL ESTADO 3%:     |              | <b>\$4,529.10</b>                                                     |
| <b>TOTAL NETO A COBRAR:</b> |              | <b>\$170,596.25</b>                                                   |

**A T E N T A M E N T E**

*Juan Ramon Reyes Pastrano*  
**JUAN RAMON REYES PASTRANO**  
Contratista

JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

I.M.S.S.  
L5111574103



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 3



### NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: PALMITO DEL VERDE ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | LOCALIZACION |       |       | LARGO | ANCHO | ALTO | RESULTADO | OBSERVACIONES        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | EJE          | TRAMO | PZAS  |       |       |      |           |                      |
| <b>1</b> | <b>CUARTOS DORMITORIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |       |       |       |       |      |           |                      |
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |       |       |       |       |      |           |                      |
| TEMP0    | TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE: EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.                                                                                                    | M2     |              |       | 1.00  | 4.00  | 4.00  |      | 16.00     |                      |
| <b>2</b> | <b>CIMENTACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |       |       |       |       |      |           |                      |
| AP3      | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIDO EN ZANJA EN SECO. | M3     |              |       | 2.00  | 4.00  | 0.80  | 1.05 | 8.72      | Cimentacion Lateral  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | 2.00  | 3.20  | 0.80  | 1.05 | 5.38      | Cimentacion Fachadas |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       |       |       |       |      | 12.10     |                      |
| 2.1.1    | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                                                                                                         | M2     |              |       | 2.00  | 4.00  | 0.80  |      | 6.40      | Cimentacion Lateral  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | 2.00  | 3.20  | 0.80  |      | 5.12      | Cimentacion Fachadas |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       |       |       |       |      | 11.53     |                      |
| 17.1     | ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS CON CONCRETO F'C= 200 KG /CM2. INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO Y VIBRADO. ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                                                                                   | PZA    |              |       | 4.00  |       |       |      | 4.00      |                      |
| 2.2.1    | CONSTRUCCION DE MURO DE CIMENTACION BLOCK DE 9 X14 X 28 CMS. ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCION DE 1:4. ACABADO COMUN. INCLUYE: MORTERO PREPARADO EN OBRA, MATERIALES, NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                      | M2     |              |       | 4.00  | 3.70  | 0.80  |      | 11.84     |                      |
| 2.1      | DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2.T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA.                                  | ML     |              |       | 2.00  | 4.00  |       |      | 8.00      |                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | 2.00  | 3.70  |       |      | 7.40      |                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       |       |       |       |      | 15.40     |                      |
| 2.07     | FIRME DE CONCRETO. F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/8 10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                                                                 | ML     |              |       | 1.00  | 3.70  | 3.70  |      | 13.69     |                      |
| <b>3</b> | <b>DALAS, MUROS Y CASTILLOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       |       |       |       |      |           |                      |
| 2.2      | MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 9 X 14 X 28 CMS. ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCION DE 1:4. ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: PLOMADA. MORTERO ECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                | M2     |              |       | 1.00  | 3.70  | 2.30  |      | 8.51      | Muro Trasero         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | 2.00  | 3.70  | 2.42  |      | 17.91     | Muros Laterales      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | 1.00  | 3.70  | 2.53  |      | 9.36      | Muro Frontal         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | -1.00 |       | 0.90  | 2.10 | -1.89     | menos Puerta         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | -1.00 |       | 1.00  | 1.20 | -1.20     | menos Ventana        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       |       |       |       |      | 32.69     |                      |
| 2.3      | CASTILLO DE 15 X 15 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2.T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA ARMEX 15x20-4. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                | ML     |              |       | 2.00  |       | 2.30  |      | 4.60      | Muro Trasero         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | 2.00  |       | 2.53  |      | 5.06      | Muro Frontal         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | 4.00  |       | 0.60  |      | 2.40      | Zapata               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       | 3.00  |       | 2.10  |      | 6.30      | Muro Frontal         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |       |       |       |       |      | 18.36     |                      |

ELABORÓ

Juan Ramon Reyes Pastrano  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESCO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

I.M.S.S.  
L5111574103



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 2 de 3



### NUMEROS GENERADORES

ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
LOCALIDAD: PALMITO DEL VERDE  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD | LOCALIZACION |       |       | LARGO | ANCHO | ALTO | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | EJE          | TRAMO | PZAS  |       |       |      |           |               |
| 2.4    | ALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2.T.M.A. 3/4". ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA.  | ML     |              |       | 2.00  | 4.00  |       |      | 8.00      |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 3.70  |       |      | 7.40      |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       |       |       |       |      | 15.40     |               |
| 4      | LOSA                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |       |       |       |       |      |           |               |
| 3.1    | LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION. | M2     |              |       | 1.00  | 4.70  | 4.40  |      | 20.68     |               |
| 4.2    | CONSTRUCCION DE CERCO DE BLOCK DE 9 X 14 X 28 CMS. ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCION DE 1:4, EN PERIMETRO DE LOSA DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                     | ML     |              |       | 2.00  | 4.70  |       |      | 9.40      |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 4.10  |       |      | 8.20      |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       |       |       |       |      | 17.60     |               |
| 4.3    | CONSTRUCCION DE CHAFLAN EN LOSA DE 5 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE . F'C= 150 KG/CM2 DE 10, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.                                                                                                       | ML     |              |       | 2.00  | 4.40  |       |      | 8.80      |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 3.80  |       |      | 7.60      |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       |       |       |       |      | 16.40     |               |
| 5      | INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |       |       |       |       |      |           |               |
| 5.1.1  | SALIDA ELECTRICA EN CONTACTOS Y/O APAGADORES INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO ( CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.                                                                                                                           | SAL    |              |       | 3.00  |       |       |      | 3.00      |               |
| 6      | ACABADOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |       |       |       |       |      |           |               |
| 060105 | APLANADO FLOTEADO EN MURO Y PLAFON CON MORTERO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                                                          | M2     |              |       | 1.00  | 4.00  |       | 2.50 | 10.00     | Muro Trasero  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 1.00  | 3.70  |       | 2.50 | 9.25      | Muro Trasero  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 4.00  |       | 2.62 | 20.96     | Muro Lateral  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 3.70  |       | 2.62 | 19.39     | Muro Lateral  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 1.00  | 4.00  |       | 2.73 | 10.92     | Muro Frontal  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 1.00  | 3.70  |       | 2.73 | 10.10     | Muro Frontal  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 4.70  |       | 0.30 | 2.82      | Cerco Lateral |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 4.40  |       | 0.20 | 1.76      | Cerco Lateral |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 4.40  |       | 0.30 | 2.64      | Cerco Frontal |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 4.10  |       | 0.20 | 1.64      | Cerco Frontal |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | -2.00 | 0.90  |       | 2.10 | -3.78     | menos Puerta  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | -2.00 |       | 1.00  | 1.20 | -2.40     | menos Ventana |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       |       |       |       |      | 83.30     |               |
| 6.1.1  | CONSTRUCCION DE BOQUILLAS EN AREA DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6 ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.                            | ML     |              |       | 2.00  |       |       | 2.10 | 4.20      | Puerta        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 1.00  |       | 0.90  |      | 0.90      | Puerta        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  |       |       | 1.20 | 2.40      | Ventana       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  |       | 1.00  |      | 2.00      | Ventana       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  | 4.70  |       |      | 9.40      | Pretil        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       | 2.00  |       | 4.40  |      | 8.80      | Pretil        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |       |       |       |       |      | 27.70     |               |
| TEMP*1 | INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR ESTANDAR 0.90X2.10 MTS. INCLUYE: PUERTA CON CHAPA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                     | PZA    |              |       | 1.00  |       |       |      | 1.00      |               |

ELABORÓ

Juan Ramon Reyes Pastrano  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

I.M.S.S.  
L5111574103



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 3



### NUMEROS GENERADORES

LOCALIDAD: PALMITO DEL VERDE ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

| CLAVE  | CONCEPTO                                                                                                                                                     | UNIDAD | LOCALIZACION |       |      | LARGO | ANCHO | ALTO | RESULTADO | OBSERVACIONES |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------|-------|-------|------|-----------|---------------|
|        |                                                                                                                                                              |        | EJE          | TRAMO | PZAS |       |       |      |           |               |
| TEMP*2 | VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINO DE 1.00X1.20MTS. INCLUYE: VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA    |              |       | 1.00 |       |       |      | 1.00      |               |
| 7      | LIMPIEZA                                                                                                                                                     |        |              |       |      |       |       |      |           |               |
| 6.1    | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y BARRIDO DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.      | M2     |              |       | 1.00 | 4.00  | 4.00  |      | 16.00     |               |

ELABORÓ

*Juan Ramon Reyes Pastrano*  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

AUTORIZO

*Arq. Silvia Zaydee Padilla Crespo*  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

I.M.S.S.  
L5111574103



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 1 de 3



## CROQUIS


ESTIMACION: 01 (Finiquito)

LOCALIDAD: PALMITO DEL VERDE

MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

### ALZADOS CUARTO DORMITORIO

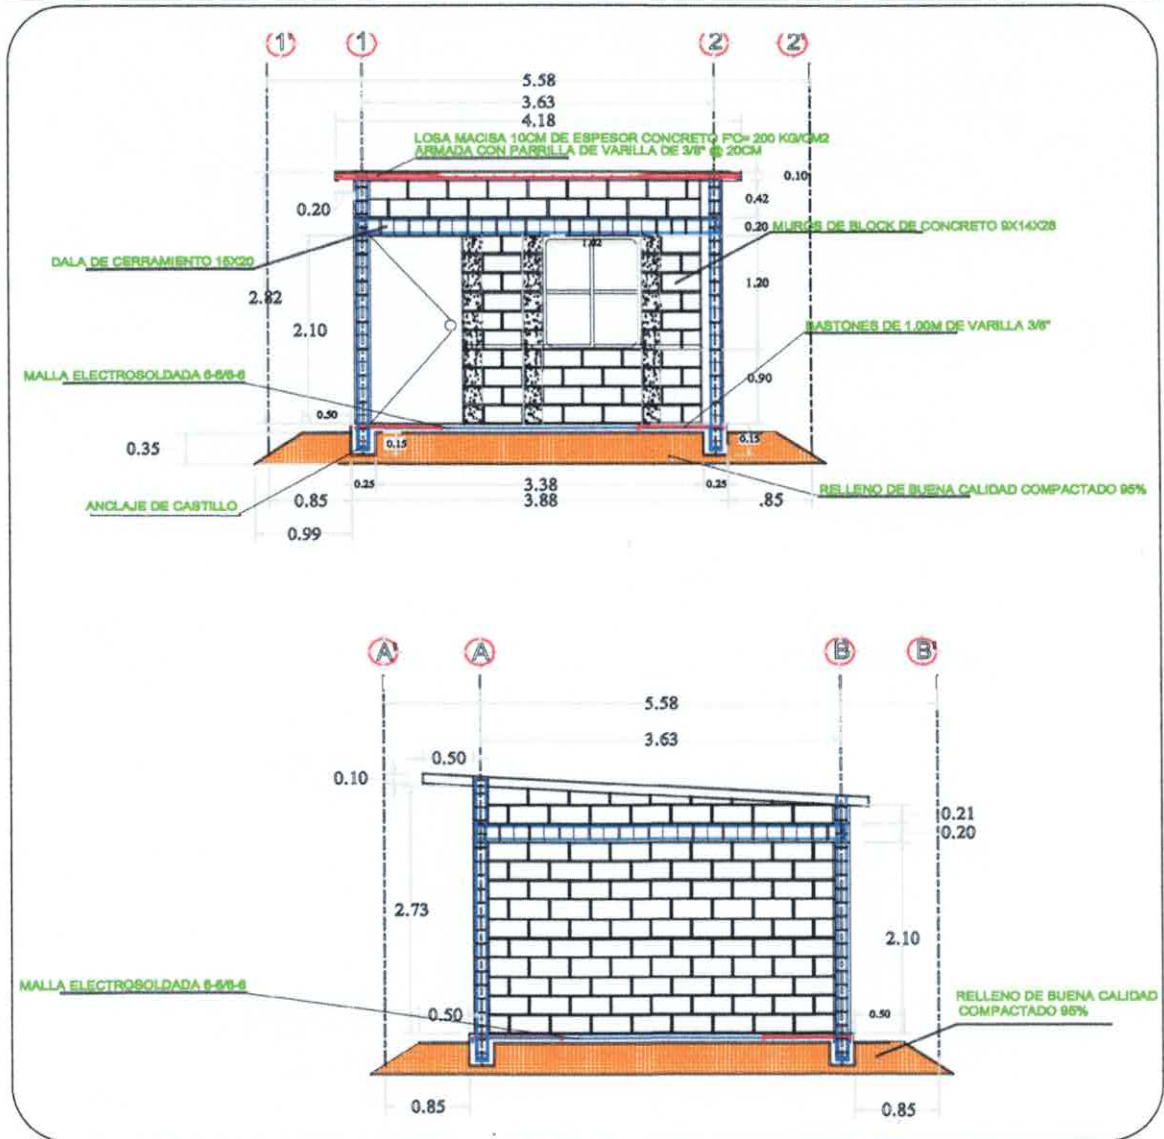

ELABORÓ

*Juan Ramon Reyes Pastrano*  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

AUTORIZO

*Arq. Silvia Zaydee Padilla Crespo*  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESCO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

I.M.S.S.  
L5111574103



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA


HOJA: 2 de 3



### CROQUIS

LOCALIDAD: PALMITO DEL VERDE  
ESTIMACION: 01 (Finiquito)  
MUNICIPIO: ESCUINAPA  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

### DETALLES DE CIMENTACION

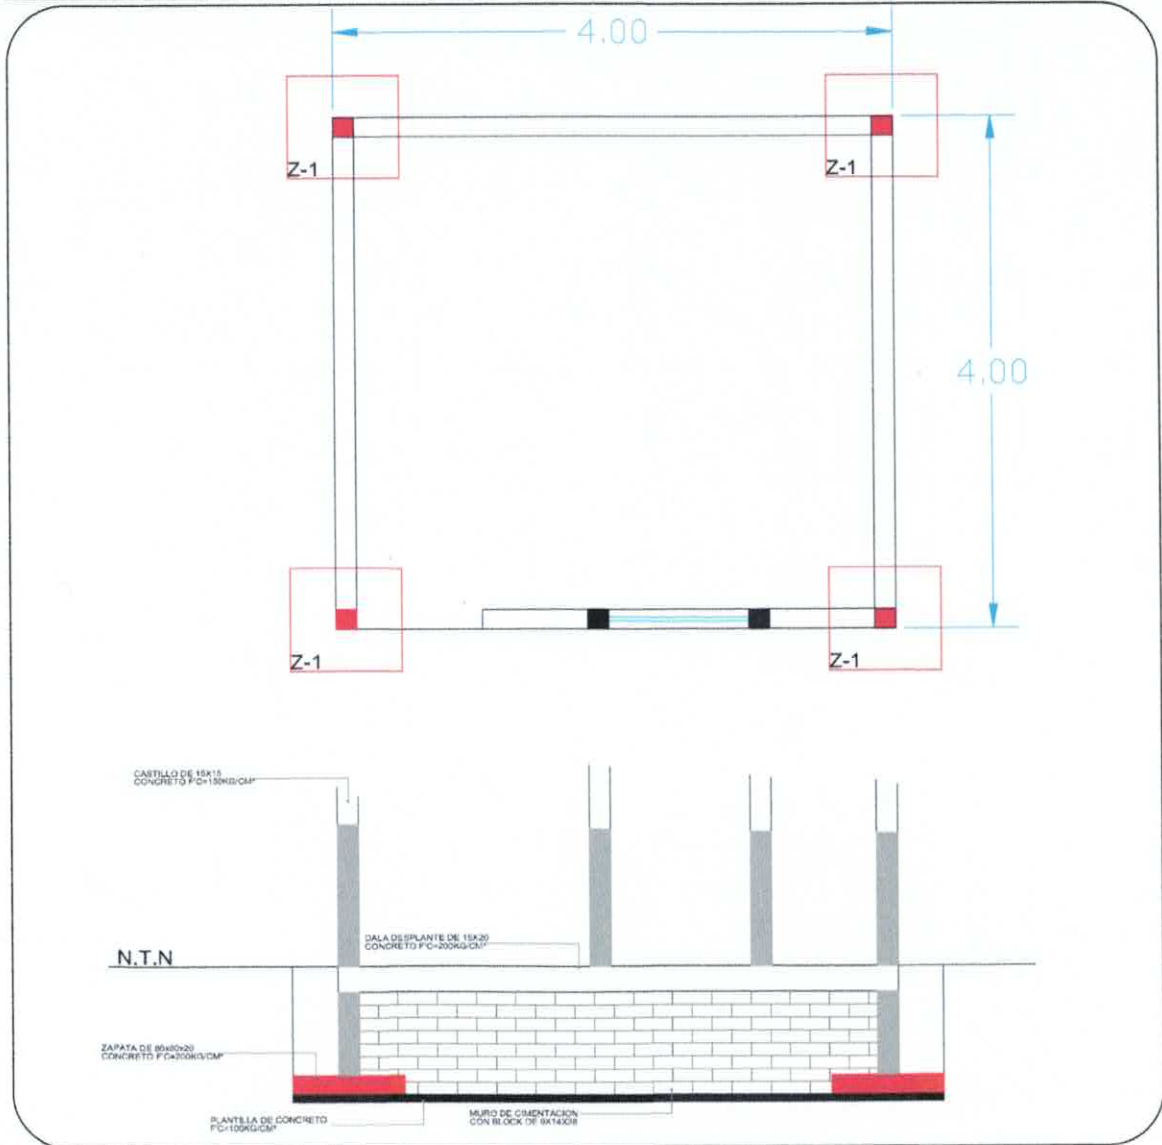

ELABORÓ

*Juan Ramon Reyes Pastrano*  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

AUTORIZO

*Arq. Silvia Zaydee Padilla Crespo*  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN RAMON REYES PASTRANO  
COLINA DE LA ESTRELLA, FRACC. COLINAS DE CONCORDIA  
CONCORDIA, SINALOA  
R.F.C.  
REP-J850831-1Y5

I.M.S.S.  
L5111574103



MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  
Y ECOLOGIA  
ESCUINAPA, SINALOA

HOJA: 3 de 3



### CROQUIS

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4x4 M2, EN LA COMUNIDAD PALMITO DEL VERDE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

LOCALIDAD: PALMITO DEL VERDE

ESTIMACION: 01 (Finiquito)


MUNICIPIO: ESCUINAPA

CLAVE


(Descripcion del Concepto)

### DETALLE DE ESTRUCTURAS

#### SECCION Z-1

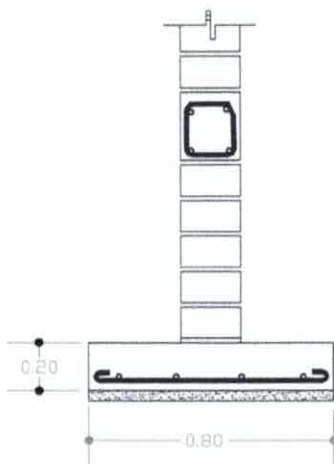


#### DALA



VARS. 3/8" Ⓢ ESQ. Y  
ESTR. 1/4" Ⓢ 0.20

#### CASTILLO



VARS. 3/8" Ⓢ ESQ. Y  
ESTR. 1/4" Ⓢ 0.20

ELABORÓ

*Juan Ramon Reyes Pastrano*  
C. JUAN RAMON REYES PASTRANO  
CONTRATISTA

AUTORIZO

*Silvia Zaydee Padilla Crespo*  
ARQ. SILVIA ZAYDEE PADILLA CRESPO  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
