



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
7533

FECHA DE EXPEDICION
28/07/2026

CTA. CARGO: 000000 - ACOSTA RUESTRA ROTHXANA YANETH

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026 / (002AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RAUL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CTA. CARGO

2113/1/000911/009337/000000/00
0000


CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
0	1.00		(002AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RAUL ROMANILLO, LOCALIDAD	335,175.44	335,175.44

2026-9-0911-222-10-10-21-56-614964-123540000090009110 Faismun-progr.urbanizacion, (red Alumbrado Publico)- FONDOS FEDERALES- APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Proyecto: 56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

COG: 614964 Faismun-progr.urbanizacion, (red Alumbrado Publico)

ACUSE



FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026
ESTIMACION 1 UNICA

Cargo: (002AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RAUL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SUB- TOTAL: 288,944.34

DESCUENTO:

I VA: 46,231.10

RETENCIONES: 13,558.41

TOTAL: 321,617.03

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

Ricardo Cota

RICARDO COTA TORRES



SECRETARIA
DE
BIENESTAR

JOAQUIN PAEZ ROIZ



Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/DOP/1143-26

Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 16 de julio del 2026.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 1 (única)**: factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento a contraloría, oficio de transferencia para verificar fecha, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, acta de entrega de recepción, invitación a contraloría, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones contractuales, de la siguiente obra:

Importe contratado: \$ 540,236.77
Importe contratado de la obra: \$ 540,236.77
Importe total estimado: \$ 524,258.31
Importe total a pagar: \$ 321,617.03


No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026	(002AH26CP) Rehabilitación de red de alumbrado público en la colonia Raúl Romanillo, localidad Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa.	ROTXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"AHOME, LA CASA DE TODOS"


ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
JETC/MYRG

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**





ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

AORR790910815
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
VARSOVIA, 2130/B, LOMAS DEL SOL, 80016, CULIACAN, Sinaloa, México
Tel. 6671530861

CLIENTE

MUNICIPIO DE AHOME
MAH1701013C0
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 81280
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 255

FOLIO FISCAL (UUID)
7485218F-72BB-40B8-89C9-A4E5BB4A2DC2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000720820568
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2026-07-15T15:45:20
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2026-07-15T14:35:12
LUGAR DE EXPEDICIÓN
80016

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 (UNICA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026	\$ 288,944.34	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 288,944.34

POR LA REALIZACION DE OBRA CONSISTENTE EN:
(002AH26CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RAUL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

IMPORTE ESTIMACION NETO: \$ 524,258.31
AMORTIZACION DE ANTICIPO 35%: \$ 189,082.87
RET VERIF INSPECCION, FISC. CONTROL 2% A.S.E. \$ 9,038.94
RET VERIF INSPECCION, FISC. CONTROL 1% O.I.C. \$ 4,519.47
TOTAL DE DEDUCCIONES: \$ 202,641.28
IMPORTE A PAGAR: \$ 321,617.03

Clave Prod. Serv. - 72151500 Servicios de sistemas eléctricos
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 288944.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 46,231.10

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS, 44/100 MXN

SUBTOTAL \$ 288,944.34
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 46,231.10
TOTAL \$ 335,175.44

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

1 - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

K3gSBwUUI77ewt+PIVe40w11NUERuWJ13EOeexqNYdr7vzLEN3mje3VHmR2PVRlafZfzHxwGX+E5y2JA1sOFaDPeMwssctKxgRGjBDWW552DAKoQ2SR2EWaZbwyDGIE2hhno7feCrZNRKkyAZUQ2xmTtkcKNYNtAwL+GQzbGdejd9yueY9B2G9+SPGBz0D7AO1qfllO78priddNbtjQb1g1FsbFKwo/DmuDygtPbzhcJCsFumDS8KSr8xNH9oKAlrNHX3teyF8YkO/Ph/Uxg/conLGS6Z2QUK3btLD8D2ZODwBrqAigmhCj6R8Fhp+sHDAI52elxlkxkNQ==


SELLO DIGITAL DEL SAT

flDhcN5icjhdNAvrsnezmdjb51Ta24znDVBQ07YGTQVCkSeCgU+/lpNXWIR4xeXCIVWJ9HskoEkBdpEqUWfVzV21Uevqzy00BVC3k1dFWzWtH5cj9nxAYdrHlaQLI5pyeQWeHrQkAFA06TGVnUTxpkW4A9K4T2IVardrpK6WnyrRwUOKsySaJ6e1FIN5EJKx5cnlHBnVmVhwl3wWHLmFjG1A2undKDQJd1rJeY2f2gpl6Cigbt1i6kzqqKeicnVCYgN8g6K2cJnc1A/Tkcp5y0234NWUm457d0FYb+vOLrVSVZ9G1lodRDRJGJycGODYTwB8whnzpKfW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7485218F-72BB-40B8-89C9-A4E5BB4A2DC2|2026-07-15T15:45:20|STA0903206B9|K3gSBwUUI77ewt+PIVe40w11NUERuWJ13EOeexqNYdr7vzLEN3mje3VHmR2PVRlafZfzHxwGX+E5y2JA1sOFaDPeMwssctKxgRGjBDWW552DAKoQ2SR2EWaZbwyDGIE2hhno7feCrZNRKkyAZUQ2xmTtkcKNYNtAwL+GQzbGdejd9yueY9B2G9+SPGBz0D7AO1qfllO78priddNbtjQb1g1FsbFKwo/DmuDygtPbzhcJCsFumDS8KSr8xNH9oKAlrNHX3teyF8YkO/Ph/Uxg/conLGS6Z2QUK3btLD8D2ZODwBrqAigmhCj6R8Fhp+sHDAI52elxlkxkNQ==|00001000000711762511||

Rothxana Y. Acosta R



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




Versión 4.5.1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AORR790910815	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7485218F-72BB- 40B8-89C9- A4E5BB4A2DC2	2026-07- 15T14:35:12	2026-07- 15T15:45:20	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$335,175.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ROTHXANA Y. ACOSTA



MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		ESTADO DE CUENTA						
		ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)						
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			<div style="text-align: center;"> ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficio con número FAISMUN-002/2026 de fecha 23 de mayo de 2026. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluida en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2026 con número O-099. Y aprobada para su ejecución mediante oficio con número AHO/PRES/106/2026 de fecha 23 de mayo de 2026. </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> FECHA ACTUAL 10 DE JULIO DE 2026. </div>				
IMPORTE DE CONTRATO	\$540,236.77	ANTICIPO DE CONTRATO	\$189,082.87	CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026 PERIODO DEL CONTRATO: DEL 29 DE JUNIO DE 2026. AL 28 DE JULIO DE 2026.				
				DIAS: 30 DIAS NATURALES.				
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
DEL:	29 DE JUNIO DE 2026.	\$524,258.31	\$189,082.87		A.S.E. 2%	O.I.C 1%	\$202,641.28	\$321,617.03
AL:	10 DE JULIO DE 2026.			\$9,038.94	\$4,519.47			
1 (UNICA) (002AH26CP)								
TOTALES:			\$524,258.31	\$189,082.87	\$9,038.94	\$4,519.47	\$202,641.28	\$321,617.03
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:			\$15,978.46	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$0.00		
CONFORME		REVISAR		AUTORIZO				
 C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA CONTRATISTA		 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS				



Los Mochis, Sinaloa., a 23 de mayo de 2026

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"(002AH26CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RAUL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$540,673.49 (Son: Quinientos Cuarenta Mil Seiscientos Setenta y Tres pesos 49/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
FAISMUN-002/2026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2026	56	614964	1235/4/9/911/9295

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
DE AHOME

C.c.p. . LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
1 (UNICA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL
CONTRATISTA

RAZON
SOCIAL

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

DOMICILIO

Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016,

Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.

CIUDAD: CULIACAN

ESTADO: SINALOA.

TELEFONO: (667) 258 3826

DATOS DEL
CONTRATO

No. de Contrato:

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

FECHA DE
CONTRATO

01 DE JUNIO DE 2026

IMPORTE DEL CONTRATO

\$540,236.77

TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN

(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL

IMPORTE DE LA OBRA

\$540,236.77

ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

AÑO 2026.

BUENO POR: \$321,617.03

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE: \$321,617.03

(Son: Trescientos Veintiuno Mil Seiscientos Diecisiete Pesos con 03/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 29 DE JUNIO DE 2026.

AL

10 DE JULIO DE 2026.

DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$288,944.34		\$451,946.82
I.V.A. 16%:	\$46,231.10		\$72,311.49
SUMA:	\$335,175.44		\$524,258.31

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35%:

\$189,082.87

RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.

\$9,038.94

RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.

\$4,519.47

TOTAL DE DEDUCCIONES:

\$202,641.28

IMPORTE A PAGAR:

\$321,617.03

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 10 DE JULIO DE 2026.


RECIBI

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR: \$335,175.44

IMPORTE A PAGAR: \$321,617.03

[illegible]

MUNICIPIO DE AHOME						ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA 1			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE 3			
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
						CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
PERIODO DEL :				29 DE JUNIO DE 2026.	AL	10 DE JULIO DE 2026.	FECHA: 10 DE JULIO DE 2026.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RED DE ALUMBRADO								
01	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES PZA MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
			1 DE 4	35	35	0	35	\$7,676.29	\$268,670.15

CONFORME

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

REVISADO

[Firma]

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONTRAN
REPRESENTANTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]

ING. JESUS ERNESTO TARRASCA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME						ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA 2			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE 3			
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
						CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
PERIODO DEL : 29 DE JUNIO DE 2026. AL 10 DE JULIO DE 2026.						FECHA:	10 DE JULIO DE 2026.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA							
			3 DE 4	31	31	0	31	\$5,199.52	\$161,185.12

CONFORME

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

REVISÁ

[Firma]

ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ COMANIT
PRESIDENTE DE OBRA

[Firma]

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME										ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA 3	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE 3	
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
								CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
PERIODO DEL : 29 DE JUNIO DE 2026. AL 10 DE JULIO DE 2026.										FECHA: 10 DE JULIO DE 2026.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
003	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	4 DE 4	515	314	0	314	\$68.53	\$21,518.42		
004	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y PZA HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4 DE 4	1	1	0	1	\$573.13	\$573.13		
SUBTOTAL DE LUMINARIAS									\$451,946.82		
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO									\$451,946.82		
IVA									\$72,311.49		
TOTAL									\$524,258.31		

CONFORME

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

REVISA

[Firma]

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CORRALES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

[Firma]

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA	1		
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS												DE	4		
												ESTIMACION No. #	1 (UNICA)		
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.											CONTRATO:		FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026	
												CONTRATISTA:		ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra	
												FECHA:	10 DE JULIO DE 2026.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES			
1	RED DE ALUMBRADO														
01	LUMINARIAS														
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA									35.00	35.00			
						1					1				
						2					1				
						3					1				
						4					1				
						31					1				
						32					1				
						33					1				
						34					1				
						36					1				
						37					1				
						38					1				
						39					1				

Rothxana Y. Acosta R.

C. ROTHXANA YANET ACOSTA Riestra

CONTRATISTA

Arg. Cesar Manuel Huizar

Vob.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS												 GENERADORES	
												HOJA	2
												DE	4
												ESTIMACION No. #	1 (UNICA)
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:			FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
								CONTRATISTA:			ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA		
												FECHA:	10 DE JULIO DE 2026.
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES	
					40				1				
					41				1				
					45				1				
					46				1				
					47				1				
					48				1				
					49				1				
					50				1				
					51				1				
					52				1				
					53				1				
					54				1				
					55				1				
					56				1				
					57				1				
					58				1				
					59				1				
					60				1				
					61				1				
					62				1				
					63				1				
					64				1				
					65				1				
									TOTAL	35			

Rothxana Y. Acosta R.
 C. ROTHXANA YANET ACOSTA RUESTA
 CONTRATISTA

Cesar Manuel Horzár
 Arq. Cesar Manuel Horzár
 Vo.B.


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS**

Alejandro Gonzalez Connant
 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA 3			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												DE 4			
												ESTIMACION No. # 1 (UNICA)			
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.											CONTRATO:		FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026	
												CONTRATISTA:		ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	
												FECHA:		10 DE JULIO DE 2026.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES			
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA									31.00	31.00			
						5				1					
						6				1					
						7				1					
						8				1					
						9				1					
						10				1					
						11				1					
						12				1					
						13				1					
						14				1					
						15				1					
						16				1					
						17				1					
						18				1					
						19				1					
						20				1					

Rothxana Y. Acosta R.
 C. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTA
 CONTRATISTA

Arg. Cesar Manuel Horzar
 V.B.



Ing. Alejandro Gonzalez Connant
 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
 RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES			
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA	4		
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS												DE	4		
												ESTIMACION No. #	Y (UNICA)		
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.											CONTRATO:		FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026	
												CONTRATISTA:		ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	
												FECHA:	10 DE JULIO DE 2026.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES			
					21				1						
					22				1						
					23				1						
					24				1						
					25				1						
					26				1						
					27				1						
					28				1						
					29				1						
					30				1						
					35				1						
					42				1						
					43				1						
					44				1						
					66				1						
								TOTAL	31						
003	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML									314.00	314.00			
				6_7					40						
				7_8					80						
				8_P. EX 1					38						
				28_9					40						
				9_10					36						
				10_11					40						
				12_13					40						
									314						
004	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA							1	1.00	1.00				



Arg. Cesar Manuel Horzar
Voz.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

Rothxana Y. Acosta R.
C. ROTHXANA YANET ACOSTA RIESTA
CONTRATISTA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO,		
	LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)

001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO	
								HOJA	1
								DE	2
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
						CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA		
PERIODO DEL : 29 DE JUNIO DE 2026. AL 10 DE JULIO DE 2026. FECHA: 10 DE JULIO DE 2026.									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	RED DE ALUMBRADO								
01	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	35	35.00	0	35.00	0.00	\$7,676.29	\$0.00
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	31	31.00	0	31.00	0.00	\$5,199.52	\$0.00

CONFORME

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

REVISÁ

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA 2		
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE 2		
OBRA:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026	
							CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	
PERIODO DEL :			29 DE JUNIO DE 2026.	AL	10 DE JULIO DE 2026.		FECHA:	10 DE JULIO DE 2026.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
003	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	515	314.00	0	314.00	201.00	\$68.53	\$13,774.53
004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$573.13	\$0.00
SUBTOTAL DE LUMINARIAS									\$13,774.53
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO									\$13,774.53
SUBTOTAL:									\$13,774.53
IVA:									\$2,203.93
TOTAL									\$15,978.46
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$540,236.77
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$524,258.31
SALDO NO EJERCIDO:									\$15,978.46

CONFORME

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

REVISAR

[Firma]

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZAR

[Firma]

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		




Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)

001

SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



Rothxana Y. Acosta R

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



61



62



63



64




65

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA






AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



Rothxana Y Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		




Rothxana Y. Acosta R

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS






AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
003	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

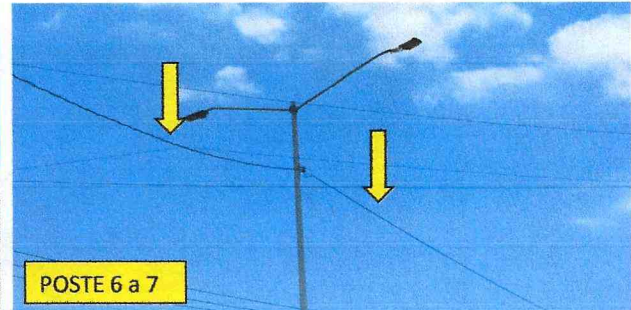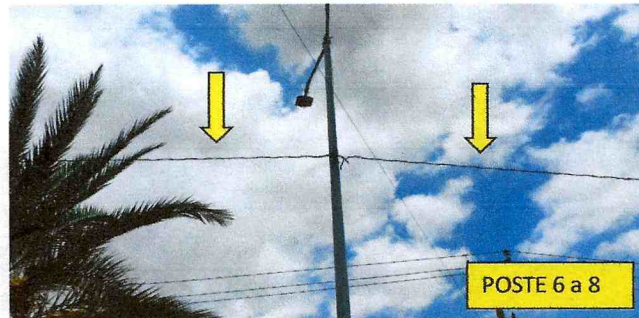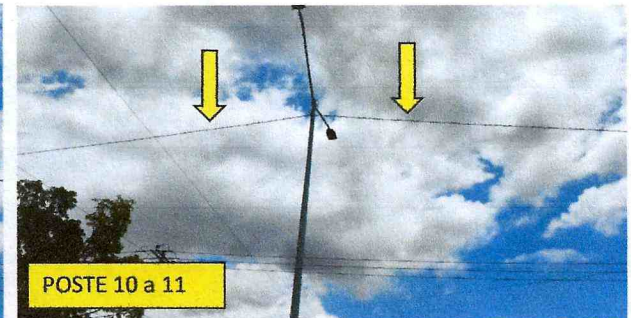


Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

[Signature]

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA






SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA			HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.			
UBICACIÓN:	ZONA URBANA COLONIA RAUL ROMANILLO			
No. CONTRATO:	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 540,236.77	IMPORTE TOTAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficio con número FAISMUN-002/2026 de fecha 23 de mayo de 2026. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluida en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2026 con número O-099. Y aprobada para su ejecución mediante oficio con número AHO/PRES/106/2026 de fecha 23 de mayo de 2026.	
MONTO DE LA OBRA:	\$ 540,236.77		SUBPROGRAMA	
FECHA DE INICIO:	02 DE JUNIO DE 2026.		REAL:	29 DE JUNIO DE 2026.
FECHA DE TERMINO:	01 DE JULIO DE 2026.		REAL:	10 DE JULIO DE 2026.
DATOS DEL CONTRATISTA:				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
DOMICILIO:	Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.			
TELÉFONOS:	(667) 258 3826			
TIPO DE TRABAJO:	LUMINARIAS			
REPRESENTANTE:	C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:				
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ		
1.-  C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA CONTRATISTA		 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		
2.- _____		 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		
3.- _____				
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:				

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

1

UBICACIÓN:

ZONA URBANA COLONIA RAUL
ROMANILLO

CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

29/06/2026

Inicio

INICIO


CON ESTA FECHA SE DECLARA ABIERTA
ESTA BITACORA DE LA OBRA:

(002AH26CP) REHABILITACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA,
RAUL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026.

Fraire Villegas Jesus



Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

2

UBICACIÓN:

ZONA URBANA COLONIA RAUL
ROMANILLO

CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
1	30/06/2026 VISITA.	SE VISITO EL SITIO PARA VERIFICAR POSTES QUE NECESITARAN ACOMETIDAS. AL CONTRATISTA.
2	TRABAJO 02/02/2026	SE EMPEZO A INSTALACION CON GRUA DE LUMINARIAS PROMETEC 80 W, 4K, 12,800 LUMENS, 100-277V, SUPRESOR 10KV, IP66, IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA NOM-031, NOM-058, ISO 9001 CON BRAZO METALICO DE 1.80 (35 P2A) SUMINISTRO Y COLOCACION CON GRUA DE LUMINARIAS PROMETEC 80W, 4K, 12,800 LUMENS, 100-277V, SUPRESOR 10K IP66, IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA NOM-031 NOM-058, ISO 9001 SIN BRAZO (31 P2A)

Fraire Villagas Jesus M.

Rothxana Y. Acosta R

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

SECRETARÍA DE OBRAS
RESIDENTE DE OBRA
URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

3

UBICACIÓN:

ZONA URBANA COLONIA RAUL
ROMANILLO

CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS																																													
1	05/07/2023 TRABAJO	<p>TENDIDO DE ACOMETIDAS 2+1 CAL #6</p> <table><tr><td>DE POSTE</td><td>6</td><td>A</td><td>7</td><td>MTS</td></tr><tr><td>DE POSTE</td><td>7</td><td>A</td><td>8</td><td>40</td></tr><tr><td>DE POSTE</td><td>8</td><td>A</td><td>POSTE EXISTENTE</td><td>80</td></tr><tr><td>DE POSTE</td><td>28</td><td>A</td><td>9</td><td>38</td></tr><tr><td>DE POSTE</td><td>9</td><td>A</td><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>DE POSTE</td><td>10</td><td>A</td><td>11</td><td>36</td></tr><tr><td>DE POSTE</td><td>12</td><td>A</td><td>13</td><td>40</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>40</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>314m</td></tr></table>	DE POSTE	6	A	7	MTS	DE POSTE	7	A	8	40	DE POSTE	8	A	POSTE EXISTENTE	80	DE POSTE	28	A	9	38	DE POSTE	9	A	10	40	DE POSTE	10	A	11	36	DE POSTE	12	A	13	40					40					314m
DE POSTE	6	A	7	MTS																																											
DE POSTE	7	A	8	40																																											
DE POSTE	8	A	POSTE EXISTENTE	80																																											
DE POSTE	28	A	9	38																																											
DE POSTE	9	A	10	40																																											
DE POSTE	10	A	11	36																																											
DE POSTE	12	A	13	40																																											
				40																																											
				314m																																											



Fraime Villagras Jesus

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Fraire Villegas Jesus M.

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
RESIDENTE DE OBRA PÚBLICAS

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

4

UBICACIÓN:

ZONA URBANA COLONIA RAUL
ROMANILLO

CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

10/02/2026

ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE PRESENTA ESTA
ESTIMACION PARA SU REVISION Y
TRAMITE DE PAGO, CON UNA CANTIDAD
DE:

\$ 524,258.31

CIERRE

CON ESTA FECHA SE DECLARA CERRADA
ESTA BITACORA DE LA OBRA (002AH26CP)
COL. RAUL ROMANILLO

CONTRATO

FAISMUN - ALP-002CP-2026

Fraire Villegas Jesus A.

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra

ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME


MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026		
FECHA	10 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)

UBICACIÓN	COORDENADAS
ZONA URBANA COLONIA RAUL ROMANILLO	25.770101°, -108.987319°

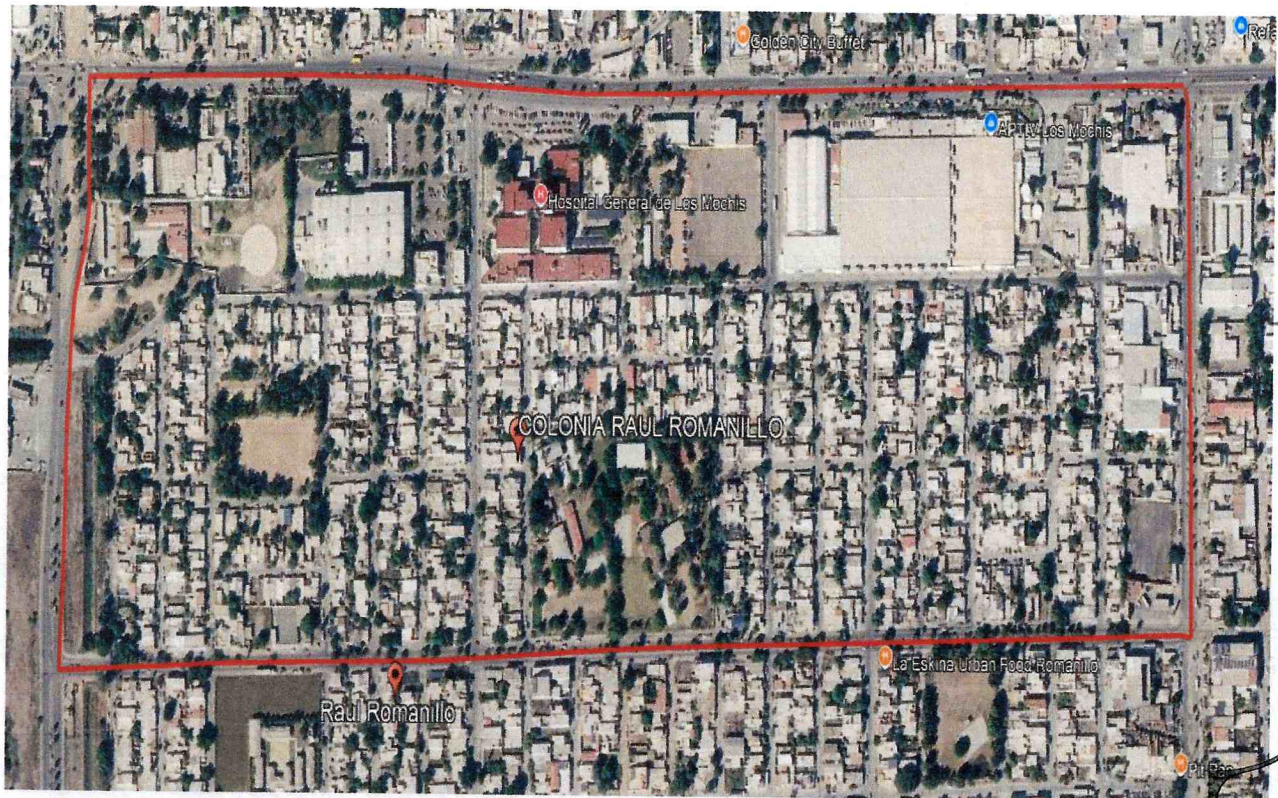

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





SERSO CONSTRUCCIONES
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

DATOS DEL PROYECTO

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE AHOME
UBICACIÓN:
LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

NOTAS GENERALES

- COTAS EN METROS.
- NIVELES EN METROS.
- NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO.
- LAS COTAS INDICADAS SON A PIANO DE ALBANILERA.
- TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN VERIFICARSE EN OBRA POR EL
CONTRATISTA.
- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DEL
PROYECTO ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE EL PROPIO CONTRATISTA DE
AL DISEÑO.

MODIFICACIONES

NUM.	COMENTARIO	FECHA

FIRMAS Y SELLOS


ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RECIDENTE DE OBRAS PUBLICAS
REVISÓ.

NOMBRE DEL PROYECTO

(002AH26CP)-REHABILITACIÓN
DE RED DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL
ROMANILLO, LOCALIDAD LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

CONTENIDO DEL PLANO

- PLANO DE OBRA TERMINADA

FECHA:
JULIO 2026

01



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDAD: LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRA: (002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026)-1

CONTRATISTA: ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra

IMPORTE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$540,236.77 (I.V.A. INCLUIDO)



II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2026, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y LA CIUDADANA ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra, CELEBRARON "EL CONTRATO PRINCIPAL" IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2026, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO, "EL CONTRATISTA" INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 29 DE JUNIO DE 2026.

III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NUMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 26 DE JUNIO DE 2026


ELABORÓ Y REVISÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA**

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA


**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte la ciudadana **ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 01 de junio de 2026, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad la obra: **(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, el cual dice de la siguiente manera:

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 (TREINTA) días naturales, iniciando los trabajos el día 02 de junio de 2026 y a terminarlos a más tardar el día 01 de julio de 2026, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL:	\$465,721.35	(SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS 35/100 M.N.)
I.V.A. (16%):	\$74,515.42	(SON: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N.)
TOTAL:	\$540,236.77	(SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)

I.6.- Se otorgo el anticipo a "EL CONTRATISTA" al que por Ley tiene derecho, con fecha 26 de junio de 2026.

I.7.- Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Diferimiento, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de los trabajos.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de la obra que se encuentra en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de los trabajos, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de los trabajos.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de la obra contratada, quedando de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
02 de junio de 2026	01 de julio de 2026	29 de junio de 2026	28 de julio de 2026

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente Convenio de Diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026)-1

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este Convenio de Diferimiento, continuaran vigentes todas las estipulaciones de "EL CONTRATO PRINCIPAL".

QUINTA. - El presente Convenio de Diferimiento comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por "LAS PARTES" que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día 26 de junio de 2026.

Por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"



C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JOAQUÍN PAEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

Por "EL CONTRATISTA"

Rothxana Y. Acosta R.
C. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

TESTIGOS:

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. MARÍA LUISA GÓMEZ LIZÁRRAGA
SÍNDICA PROCURADORA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte la ciudadana ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA, celebrado con fecha 26 de junio de 2026.

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

LOS MOCHIS, SINALOA A 28 DE JUNIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO A USTED Y MANDARLE UN CORDIAL SALUDO REFERENTE A EL CONTRATO:

Nº. FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

CON EL NOMBRE DE:

(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ESTOY SOLICITANDO UN DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 02 DE JUNIO DE 2026.

FECHA DE TERMINO: 01 DE JULIO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES.

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRAZO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2026.

FECHA DE TERMINO: 28 DE JULIO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
DIRECTOR GENERAL



Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1033-26

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 02 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obra que fue contratada, según contrato número: FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026., misma que se detalla a continuación: (002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Cuya obra le fue adjudicada al contratista de nombre: ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra.

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo con fecha del: 26 de junio del 2026, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

<u>(002AH26CP)</u>	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	02/06/2026	29/06/2026
Fecha de termino:	01/07/2026	28/07/2026
Plazo de ejecución:	30 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

A T E N T A M E N T E

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra/Contratista
C.C.P. Archivo
JETC/AARF

Rothxana Y. Acosta R.
03/07/2026



SERSO CONSTRUCCIONES

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

LOS MOCHIS, SINALOA, A 26 DE JUNIO DE 2026.

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE SE RECIBIO EL 35% DE ANTICIPO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME FUE EN LA FECHA DEL 26 DE JUNIO DE 2026, DE LAS OBRAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO No. FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026.

Detalle de movimiento

Spei recibido banorte
26 junio 2026, 10:59 h

\$189,082.87

Mostrar movimientos Completar

Motivo de pago	Pago ant. 35 por ap 6155 fact 248
Importe	\$ 189,082.87
Nombre del beneficiario	Municipio De Ahome
Banco origen	BANORTE
Cuenta origen	072731013467356908
Nombre del beneficiario	Acosta Riestra Rothxana Yaneth
Referencia numerica	260626
Código de rastreo	8846APR120260626 5464240122



SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA SALUDARLO.

ATENTAMENTE:

Rothxana Y. Acosta R.
LIC. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
REPRESENTANTE LEGAL

VARSOVIA No. 2130 – B COL. LOMAS DEL SOL C.P. 80016

CULIACÁN, SINALOA. TELÉFONO: 667-243-9676

EMAIL: rothxana.yaneth79@gmail.com



SERSO CONSTRUCCIONES
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

VARSOVIA No. 2130 - B COL. LOMAS DEL SOL C.P. 80016
CULIACAN, SINALOA TELÉFONO: 667 - 387 - 06 - 12.
EMAIL: rothxana.acosta79@gmail.com

FECHA DE PRESENTACION: 29 DE JUNIO DE 2026

OBRA:
(002AH26CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RAUL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINO: 28 DE JULIO DE 2026
DURACION: 30 DIAS NATURALES

Reprogramacion de Obra de Montos

NO. DE ACTIVIDADES	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA DE INICIO	Duración	FECHA DE TERMINO	Año 2026	
							01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	- (002AH26CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RAUL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$ 38,762.50	\$ 426,958.85
1	- RED DE ALUMBRADO			29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$ 38,762.50	\$ 426,958.85
01	- LUMINARIAS			29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$ 38,762.50	\$ 426,958.85
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	85.00	PZA	29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$ 22,389.25	\$ 246,280.90
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M,	31.00	PZA	29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$ 13,432.17	\$ 147,752.95

Rothxana Y. Acosta R.
C. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
REPRESENTANTE LEGAL





SERSO CONSTRUCCIONES
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

VARSOVIA No. 2130 - B COL. LOMAS DEL SOL C.P. 80016
CULIACAN, SINALOA TELÉFONO: 667 - 387 - 06 - 12.
EMAIL: rothxana.acosta79@gmail.com

FECHA DE PRESENTACION: 29 DE JUNIO DE 2026

OBRA:

(002AH26CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RAUL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINO: 28 DE JULIO DE 2026
DURACION: 30 DIAS NATURALES

Reprogramacion de Obra de Montos

NO. DE ACTIVIDADES	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA DE INICIO	Duración	FECHA DE TERMINO	Año 2026 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
003	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	515.00	ML	29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$ 2,941.08	\$ 32,351.87
004	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1.00	PZA	22/Jul/2026	7c	28/Jul/2026		\$ 573.13
TOTAL PARCIAL:							\$ 38,762.50	\$ 426,958.85
TOTAL ACUMULADO:							\$ 38,762.50	\$ 465,721.35



Rothxana Y. Acosta R.
C. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
REPRESENTANTE LEGAL



ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

LOS MOCHIS, SINALOA A

01 DE JUNIO DE 2026

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE ES EL ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA:
(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

N° DE CONSTRATO: FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA.

CEDULA PROFESIONAL:
No. 6768269

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Rothxana Y. Acosta R.


C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
DIRECTOR GENERAL



Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.



ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

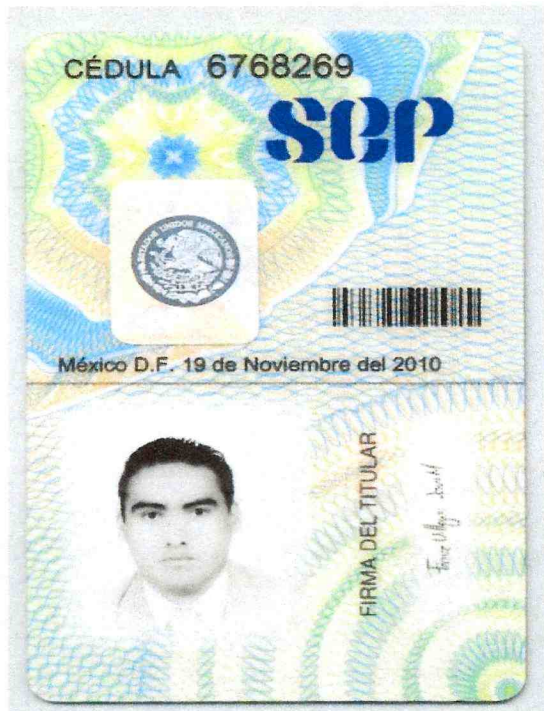

Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 29 de mayo del 2026.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
P R E S E N T E.


Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de la siguiente: **(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Número de contrato: **FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026.**

Fecha: **01 de junio de 2026.**

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.



C.c.p.- ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA/Contratista
C.c.p.- Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF

Rothxana Y Acosta R.
29/05/2029

29/mayo/2026
[Signature]



ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

LOS MOCHIS, SINALOA A

29 DE JUNIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

OFICIO DE INICIO DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL INICIO DE LA OBRA EMPEIZA REALIZARSE EN LA FECHA DEL 29 DE JUNIO DE 2026.

EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:


(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE



C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
DIRECTOR GENERAL



Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1032-26.

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 02 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obra que fue contratada, según contrato numero: FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026., consistentes específicamente en: (002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; cuya obra le fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA, con un importe total de hasta: \$ 540,236.77, identificándose como origen del recurso el correspondiente a: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026).


Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a la obra antes señalada, quedaron establecidos como a continuación se indica:

(002AH26CP)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
29/06/2026	28/07/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CAYO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga /Síndica Procuradora
c.c.p. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA/Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/AARF

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx

Rothxana Y. Acosta R.
03/07/2026



ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

LOS MOCHIS, SINALOA A

10 DE JULIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

FINAL DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL **FINAL** DE LA OBRA EMPEZ'A REALIZARSE EN LA FECHA DEL **10 DE JULIO DE 2026**.
EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:


(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:
FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	POSITIVO

RFC	Folio
AORR790910815	26NF9531300

Fecha y hora de emisión
15 de julio de 2026 a las 12:18 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.



Cadena Original

||AORR790910815|26NF9531300|15-07-2026|P||0000108888800000031||

Sello Digital

eJcMI5VwVXFPIGwkB4mNwljkEkB/xht58iWAN3SixyQGHk2ew+zW/3SsxcoFT63Bb3gX6trH9usxwRQStIL1VOx4J
x4UR7lufMQ+nVkrzehKMKVkfUaVBFOz3Ens6BWCiZhws+RQwvKV6/ksB8FJ5Dsxw+fAm84FzFijV67qMUUgvt0Fh2
gRY0yO7XK81E5atn1H0o5XYAtbWg3TkSmHSE6sOa0ZOQY42iYPp6lkWL564T7NzDOv1/UoNEOwq6CeSx6ytH/j5qk
SutQ0cluYrIjxkDnvxZYZlfsxaWk6Vrd6RFj1a01Gu1zjFePSdICP+hAUWDBHMn0pBKYbwDg==



Gobierno de México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2026-0057

Los Mochis, Sinaloa, 8 de junio de

C. ACOSTA RUESTRA ROTHXANA YANETH, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.

Obligación	Detalles	Al cumplir
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RAMON VILLA HURTADO
DIRECTOR DE INGRESOS



Cadena de Seguridad
XH+RMkmykG4axYFTbXFwsIVQFHw=





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/042-26

Asunto: El que se indica

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 16 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FELIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: **(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Que tiene el número de contrato: **FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026.**

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 10 de julio de 2026, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día lunes 20 de julio de 2026 a las **11:00 a.m.** horas.

Se anexa croquis de localización.


A T E N T A M E N T E

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.C.P.- Archivo
C.C.P.- María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora
C.C.P.- Rothxana Yaneth Acosta Riestra/Contratista
C.C.P.- Ing. Alejandro Gonzalez Connant/Residente De Obra
JETC/AARF

UBICACIÓN: COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

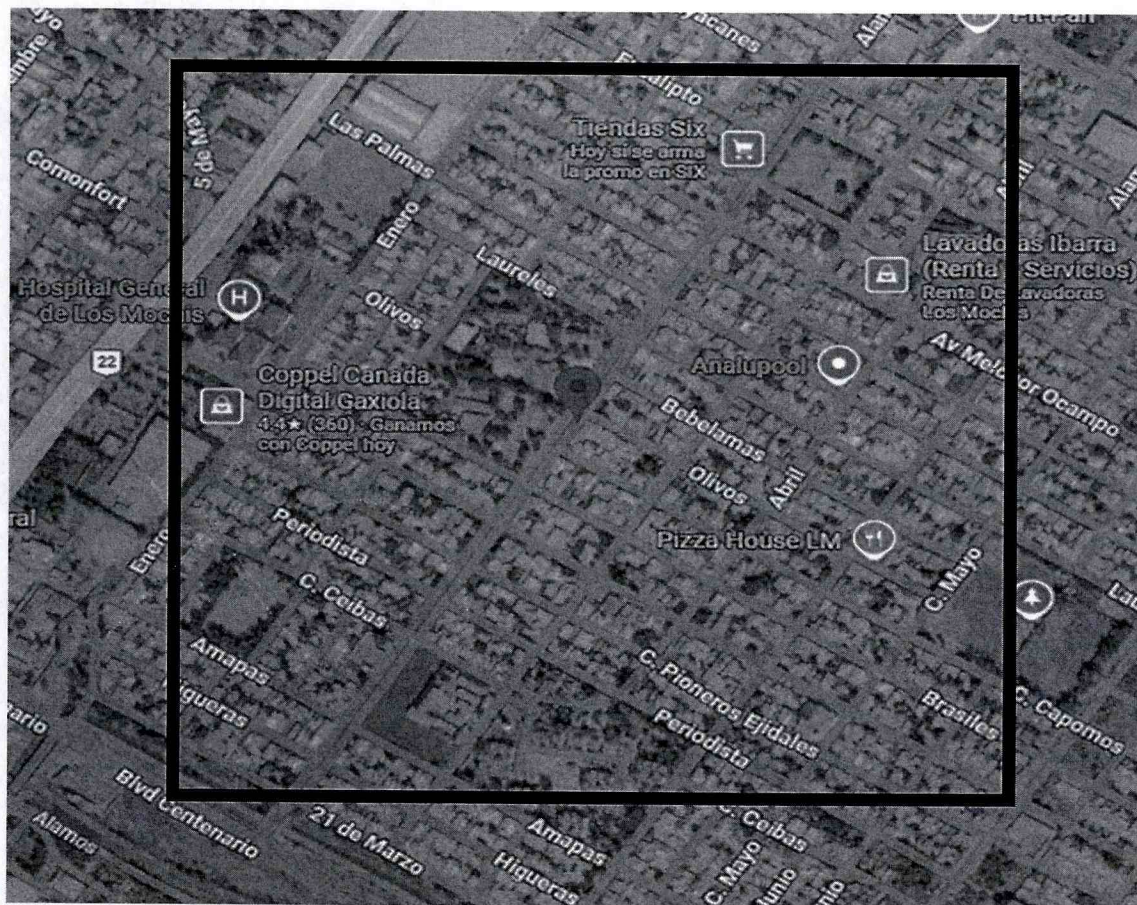

FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026.

(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

COORDENADAS: 25°46'12.6"N, 108°59'08.0"W.





MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra :	(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
Localidad	COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
Municipio	AHOME		
Num. De contrato	FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026.		
Contratista	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA.		
Importe de la obra	\$540,236.77		
Anticipo entregado	\$189,082.87		
Fianza de anticipo	2741134-0000, LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.		
Fianza de cumplimiento	2741135-0000, LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.		
Inicio de los trabajos	29 DE JUNIO DE 2026		
Termino de los trabajos	10 DE JULIO DE 2026		
Plazo de días de ejecución de la obra	12 DIAS		

En Los Mochis Sinaloa siendo las: 11:00 horas del día 20 de JULIO del 2026

Se reunieron para la entrega-recepción de la obra antes mencionada las siguientes personas:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

Residente de Obra

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA.

Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)	29/06/2026	10/07/2026	\$524,258.31	\$524,258.31	\$321,617.03	\$321,617.03
Saldo a cancelar			\$15,978.46			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leída la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ENTREGO EL CONTRATISTA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
Residente de Obra



ROTHXANA Y. ACOSTA R.
CONTRATISTA



Municipio de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Datos generales de la Obra:

Obra:

(002AH26CP) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. de contrato: **FAISMUN-ALP-002CP-AH-2026.**
Fecha de contrato: **01 de junio de 2026**
Inversión contratada: **\$ 540,236.77**
Inversión ejercida: **\$ 524,258.31**
Fecha de inicio: **29 de junio de 2026**
Fecha de término: **10 de julio de 2026**

Siendo las **12:00** hrs. del día **20 de julio** del año **2026** se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, ubicadas en Palacio Municipal, cita en Degollado y Cuauhtémoc, Los Mochis, Sinaloa; las siguientes personas:

Nombre

Cargo

Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro

Director de Obras Públicas

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra

Contratista

Rothxana Y. Acosta R.

Declaraciones

I.-El H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que encomendó a Rothxana Yaneth Acosta Riestra, "El Contratista" la realización de la obra: **(002AH26CP)**

REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA RAÚL ROMANILLO, LOCALIDAD LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Observando para ello todo lo establecido en el contrato, proyecto, especificaciones técnicas, presupuesto y programa de obra respectivos.



Municipio de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

II.-El H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que "El Contratista" cumplió con dicha encomienda acatando para ello, lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el contrato, de acuerdo al presupuesto, proyecto, especificaciones técnicas y programa de ejecución respectivo. Se ha levantado el acta correspondiente a la entrega-recepción de la obra con fecha 20 de julio de 2026, y se elaboró el finiquito con fecha 10 de julio de 2026.

III.-Ambas partes, EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME y "El Contratista" declaran que a la fecha no existen adeudos por lo que se dan por terminadas las obligaciones establecidas en el contrato respectivo, sin derecho a posterior reclamación, reservándose EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME el derecho de hacer reclamaciones a "El Contratista" en lo que resulte por daños derivados de vicios ocultos, en los términos señalados en el contrato y fianza respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 12:15 horas del día 20 del mismo mes y año arriba señalado.

Por "El Contratante"

Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro
Director de Obras Públicas

Por "El Contratista"

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra

