



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
4685

FECHA DE EXPEDICION
14/05/2026

CTA. CARGO

2113/1/000910/009847/000000/00
0000

CTA. CARGO: 000000 - CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN SA DE CV

CONT-SOPUE-DOP-003-26-3 / INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELECTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
1	1.00	1	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO)	116,056.92	116,056.92

NUMERO DE OBRA DEL CONTRATO: 3

2026-8-0910-221-10-10-21-61-614910-123540009100004270 Obra Publica Directa- CONSTRUCCIONES- OBRA PUBLICA DIRECTA

Proyecto: 61 OBRA PUBLICA DIRECTA - OBRA PUBLICA DIRECTA
COG: 614910 Obra Publica Directa



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: CONT-SOPUE-DOP-003-26
PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO)

Cargo: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SUB- TOTAL: 100,049.07

DESCUENTO:

I VA: 16,007.85

RETENCIONES: 4,617.65

TOTAL: 111,439.27



REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISIÓN Y PAGO

Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

JUAN IVAN CASTRO SOBERANES

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

AUTORIZO

JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO



Ahome
La Casa de Todos

Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/723-26

Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 14 de mayo del 2026.

C. ROBERTO MORALES LEYVA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

AT'N: ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ
DIRECTOR DE EGRESOS

Anexo al presente envío para su revisión y pago de **estimación no. 1 (uno)**: autorización presupuestal, factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, planos de obra terminada, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento, oficio de transferencia del anticipo, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, invitación a contraloría, acta de entrega de recepción, de la siguiente obra la cual cumple con lo establecido en el *artículo 11 fracc. I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa*:

Importe contratado :\$ 887,765.98
Importe contratado de la obra: \$ 178,549.11
Importe total estimado: \$ 178,549.11
Importe total a pagar: \$ 111,439.27

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
CONT-SOPUE-DOP-003-26	Instalaciones eléctricas para cuatro cargadores para autos eléctricos en el Palacio Municipal, ubicado en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa.	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"AHOME, LA CASA DE TODOS"

ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
C.c.p. Anselmo Acosta Bojórquez. -Director de Egresos
JIIA/MYRG



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN

CCE220215159

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

MUNICIPIO DE AHOME

MAH1701013C0

Domicilio fiscal: 81280 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

243f8e8f-8a28-433c-b1ab-ade2a2e35940

Número de serie del CSD

00001000000700944622

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 80050

12/05/2026 14:23:45 PM

Serie y folio snube

A - 151

Exportación

01

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de Impuesto
-----------	--------	----------	------------	--------	-------------	-----------------	---------	------------------

72151500	72151500	1	E48	E48	EST 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CONT- SOPUE-DOP-003-26, POR LA REALIZACION DE LA OBRA: -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, IMPORTE ESTIMACION NETA: \$ 178,549.11 AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$ 62,492.19 RET. VERIF. INSPECCION FISC. CONTROL 2% A.S.E: \$ 3,078.43 RET. VERIF. INSPECCION FISC. CONTROL 1% O.I.C.: \$ 1,539.22 TOTAL DEDUCCIONES: \$67,109.84 IMPORTE A PAGAR: \$ 111,439.27	\$100,049.07	\$100,049.07	02
----------	----------	---	-----	-----	--	--------------	--------------	----

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$100,049.07	\$16,007.85

Importe con letra:

CIENTO DIECISEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.

CONTADO | 99 - Por definir | PPD - Pago en parcialidades o diferido

Subtotal	\$100,049.07
Descuento	\$0.00
IVA 16.0%	\$16,007.85
TOTAL	\$116,056.92

Sello digital del CFDI:

pxAY+m9HS89EEwr6qLslbw9W9e21rfF8aarV5E474y/ZdWaL8lsN5DDxqt/shf9vHxIJZAgJOjCYm7VjBLJeR+va5Olvejaj76
9lrilzXQr2M5SK6Mc08Be+AxOjvYoBhlOu9eXbgzpEbeESZhpP8B3pXyzQwPhMCyv9xUL2Be9mSe13C4vPisQu/3vvTwfTC50BF
5mO8ug3hQxRwKpqu9UgOsjoVvUDrBxbSaUJmjYJ5ba94eJkrHHXv1XuMrC4QivYrV3V0j9WHznDC2VwKDDJRKmR23iMvBrSsz24br
ZCkBGTAc4N0gg05GU3PqBWNZvYA5hzRbN/cUjsrIA==

Sello del SAT:

a3M3mu4UbAAC0Z4rf/EBN67plgBqmrGvCTsDxDCwM+/nZXh07NM/6NEbTY6itqhTnmq7VeSSRTMKXuG0glEgywfyUQqJuZQT2OT
2diMs8pqrUuYxYezwY7N2ssRuJl3sPjxl5mlf/W0nTjYkt0rivSzsO9qh7oCVrv+ZaTd31/Kq4BJVK1HTs1Vg/K6JHEwFEq0IU+
EZ2jLwgMSYGK25qmV+nn0MV8F7IruAZoQJ2InGE3iXc6gxRJQXWZG+VGvQZw+n7r48QzFpivXxJQN8ENelz6Z/aXJTYCGvb1rq
cWnwNAEmzKyaXomccnyawMqt+oV7m1GDzpc+J2O40w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]243f8e8f-8a28-433c-b1ab-ade2a2e35940|2026-05-12T15:24:46|LSO1306189R5|pxAY+m9HS89EEwr6qLslbw9W
9e21rfF8aarV5E474y/ZdWaL8lsN5DDxqt/shf9vHxIJZAgJOjCYm7VjBLJeR+va5Olvejaj769lrilzXQr2M5SK6Mc08Be+Ax
OjvYoBhlOu9eXbgzpEbeESZhpP8B3pXyzQwPhMCyv9xUL2Be9mSe13C4vPisQu/3vvTwfTC50BF5mO8ug3hQxRwKpqu9UgOsjoV
VuDrBxbSaUJmjYJ5ba94eJkrHHXv1XuMrC4QivYrV3V0j9WHznDC2VwKDDJRKmR23iMvBrSsz24brZCkBGTAc4N0gg05GU3PqBWNZ
vYA5hzRbN/cUjsrIA==|00001000000719545303]]




Daniela Acosta L.

No de Serie de Certificado del SAT:
00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:
12/05/2026 15:24:46 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCE220215159	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
243FBE8F-8A28-433E-B1AB-ADE2A2E35940	2026-05-12T14:23:45	2026-05-12T15:24:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$116,056.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2028,	
autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con	
número: 022-A/2026 y 023-A/2026 ambos de fecha 05 de	
marzo de 2026; y 026-A/2026 y 027-A/2026 ambos de fecha	
19 de marzo de 2026. Obras que fueron aprobadas	
mediante oficios con número: 022/2026 y 023/2026 ambos	
de fecha 05 de marzo de 2026; y 026/2026 y 027/2026	
ambos de fecha 19 de marzo de 2026. Obras incluidas en el	
Programa Anual de Inversión en Obra Pública (POA) con	
números: O-072, O-073, O-074 y O-075	

28 DE ABRIL DE 2026.

\$887,765.98

\$310,718.10

CONT-SOPUE-DOP-003-26

DEL 20 DE ABRIL DE 2026 AL 03 DE JUNIO DE 2026

DIAS: 45 DIAS NATURALES.

AMORT. DE ANTICIPO

A.S.E. 2%	
-----------	--

LIQUIDO A PAGAR

\$178,549.11

\$62,492.19

\$3,078.43

\$1,539.22

\$67,109.84

\$111,439.27

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:

\$709,216.87

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

\$248,225.91

CONFORME


REVISAR

AUTORIZO

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



H. Ayuntamiento de Ahome
Tesorería Municipal
Despacho del Tesorero

Los Mochis, Sinaloa., a 19 de marzo del 2026

LIC. ANTONIO MENENDEZ DE LLANO BERMUDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME

P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELECTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por **\$179,362.36 (Son: Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 36/100 M.N.)** con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
026-A/2026	GASTO DIRECTO	61	614910	1235-4-910-427

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal



C.c.p. ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO. - Secretario de Obras, Urbanismo y Ecología.
C.c.p. Archivo
RML/RSL*





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
1 (UNO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
	DOMICILIO	Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.		
	CIUDAD:	CULIACAN	ESTADO:	SINALOA
		TELÉFONO:		(667) 243 96 76

DATOS DEL CONTRATO	No. de Contrato:	FECHA DE CONTRATO	30 DE MARZO DE 2026.	IMPORTE DEL CONTRATO
	CONT-SOPUE-DOP-003-26			\$887,765.98
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN			IMPORTE DE LA OBRA
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			\$178,549.11 AÑO 2026.

BUENO POR: \$111,439.27

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE: \$111,439.27

(Son: Ciento Once Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos con 27/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO
DEL 20 DE ABRIL DE 2026 AL 28 DE ABRIL DE 2026.
DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

IMPORTE A FACTURAR		LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$100,049.07		\$153,921.65
I.V.A. 16%:	\$16,007.85		\$24,627.46
SUMA:	\$116,056.92		\$178,549.11
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35%:			\$62,492.19
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.			\$3,078.43
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.			\$1,539.22
TOTAL DE DEDUCCIONES:			\$67,109.84
IMPORTE A PAGAR:			\$111,439.27
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 28 DE ABRIL DE 2026.			


RECIBI

Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A.
DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO

Arq. Jesús Ernesto Tarría Castro
ARQ. JESÚS ERNESTO TARRÍA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



IMPORTE A FACTURAR:	\$116,056.92
IMPORTE A PAGAR:	\$111,439.27

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE
ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)

OBRA:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
					CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL :		20 DE ABRIL DE 2026		AL	28 DE ABRIL DE 2026.		FECHA:	28 DE ABRIL DE 2026.
NO.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES		DE ESTA ESTIMACIÓN		OBSERVACIONES		
1 (UNO) 03-SOPUE-003-2026	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				\$153,921.65			
ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA		CLAVE						
MONTO DE LA OBRA		03-SOPUE-003-2026	\$178,549.11					
MONTO ESTIMADO		03-SOPUE-003-2026	\$178,549.11					
MONTO POR CANCELAR		03-SOPUE-003-2026	\$0.00					
MONTO DEL ANTICIPO		03-SOPUE-003-2026	\$62,492.19					
MONTO AMORTIZADO		03-SOPUE-003-2026	\$62,492.19					
MONTO POR AMORTIZAR		03-SOPUE-003-2026	\$0.00					
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		03-SOPUE-003-2026	\$310,718.10					
			SUBTOTAL		\$0.00		\$153,921.65	
			I.V.A.		\$0.00		\$24,627.46	
ESTIMACION		1 (UNO) 03-SOPUE-003-2026	\$62,492.19		TOTAL		\$0.00 \$178,549.11	
TOTAL AMORTIZADO DE ANTICIPO:			\$62,492.19					
					GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA \$67,109.84			
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:		\$178,549.11 Son: Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos con 11/100 M.N.)						
ESTADO CONTABLE		CONTRATO		ANTICIPO		CONTRATO		
IMPORTE DEL CONTRATO		\$887,765.98		ANTICIPO OTORGADO		\$310,718.10		
ESTIMADO A LA FECHA		\$178,549.11		AMORTIZADO A LA FECHA		\$62,492.19		
SALDO POR ESTIMAR:		\$709,216.87		SALDO A AMORTIZAR		\$248,225.91		
CONFORME		REVISÁ		AUTORIZO				
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.		ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT		ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO				
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		RESIDENTE DE OBRA		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
CONTRATISTA								



ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
HOJA	1
DE	1

OBRA:		INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-003-26			
							CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN S.A. DE C.V.			
		PERIODO DEL :		20 DE ABRIL DE 2026		AL	28 DE ABRIL DE 2026.		FECHA:	28 DE ABRIL DE 2026.	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL										
01	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES.										
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1 1/2", CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/2", COPLE GALVANIZADO DE 1 1/2", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMPS., CONDULET LB 1 1/2, CONDULET C DE 2", GABINETE TIPO NEMA 3R 30X40X20 CMS, CONDULET C DE 1 1/2" , CODO GALVANIZADO S/R DE 1 1/2", MONITOR Y CONTRA DE 1 1/2", TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", RIEL UNICANAL GALV. DE 4 X4" LISO, ABRAZADERA UNICANAL DE 1-1/2", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X40 AMPS., GABINETE NEMA 3R 60X 50 X20 CMS, CABLE THW CAL. 1/0, REDUCCION DE 2" A 1 1/2", COPLE GALV. C/R DE 2", VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", COPLE GALVANIZADO S/R 1", CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE									
			1 DE 1	1	1	0	1	\$153,921.65	\$153,921.65		
						CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL			\$153,921.65		
									\$24,627.46		
									\$178,549.11		

CONFORME

Daniel Aosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2026.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL.											
01	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES.											
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1 1/2", CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/2", COPLE GALVANIZADO DE 1 1/2", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMPS., CONDULET LB 1 1/2, CONDULET C DE 2", GABINETE TIPO NEMA 3R 30X40X20 CMS, CONDULET C DE 1 1/2" , CODO GALVANIZADO S/R DE 1 1/2", MONITOR Y CONTRA DE 1 1/2", TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", RIEL UNICANAL GALV. DE 4 X4" LISO, ABRAZADERA UNICANAL DE 1-1/2", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X40 AMPS., GABINETE NEMA 3R 60X 50 X20 CMS, CABLE THW CAL. 1/0, REDUCCION DE 2" A 1 1/2", COPLE GALV. C/R DE 2", VARILLA PARA TIERRA 5/8"1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", COPLE GALVANIZADO S/R 1", CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE										

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

[Signature]
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

CROQUIS DE GENERADORES


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-003-26
FECHA:	28 DE ABRIL DE 2026.
ESTIMACION NO.:	1 (UNO)

CONCEPTO

001

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1 1/2", CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/2", COPLE GALVANIZADO DE 1 1/2", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMPS., CONDULET LB 1 1/2, CONDULET C DE 2", GABINETE TIPO NEMA 3R 30X40X20 CMS, CONDULET C DE 1 1/2" , CODO GALVANIZADO S/R DE 1 1/2", MONITOR Y CONTRA DE 1 1/2", TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", RIEL UNICANAL GALV. DE 4 X4" LISO, ABRAZADERA UNICANAL DE 1-1/2", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40 AMPS., GABINETE NEMA 3R 60X 50 X20 CMS, CABLE THW CAL. 1/0, REDUCCION DE 2" A 1 1/2", COPLE GALV. C/R DE 2", VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", COPLE GALVANIZADO S/R 1", CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DIAGRAMA UNIFILAR

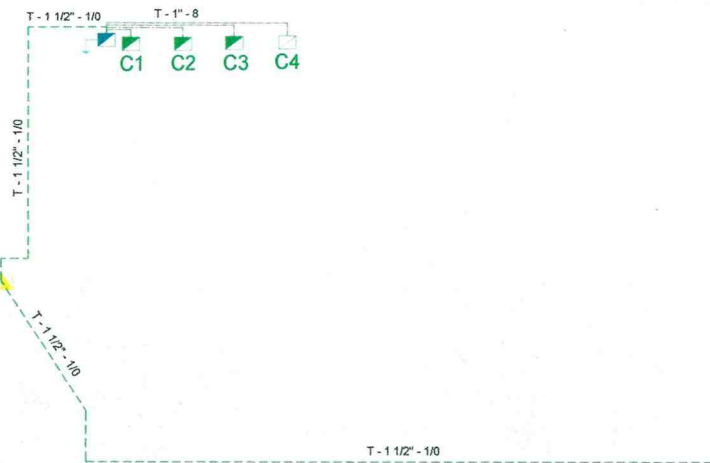

SIMBOLOGIA

	GABINETE NEMA 3R 60x50x20 CM METALICO (CARGADOR N° 1)
	GABINETE NEMA 3R 60x50x20 CM METALICO (CARGADOR N° 2)
	GABINETE NEMA 3R 60x50x20 CM METALICO (CARGADOR N° 3)
	GABINETE NEMA 3R 60x50x20 CM METALICO (CARGADOR N° 4)
	GABINETE NEMA 3R 30x40x20 CM METALICO.
	CENTRO DE CARGA 8 CIRCUITOS QO-8 CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40 AMP.
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30x50 AMP. INSTALADO EN GABINETE EXISTENTE.
	TUBERIA GALVANIZADA S/ROSCA 1 1/2" CON CABLE THW CAL. 1/0 AWG.
	TUBERIA GALVANIZADA S/ROSCA 1" CON CABLE THW CAL. 8 AWG.
	TIERRA FISICA.

**SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA**
**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**


Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

CROQUIS DE GENERADORES

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-003-26
FECHA:	28 DE ABRIL DE 2026.
ESTIMACION NO. :	1 (UNO)

CONCEPTO

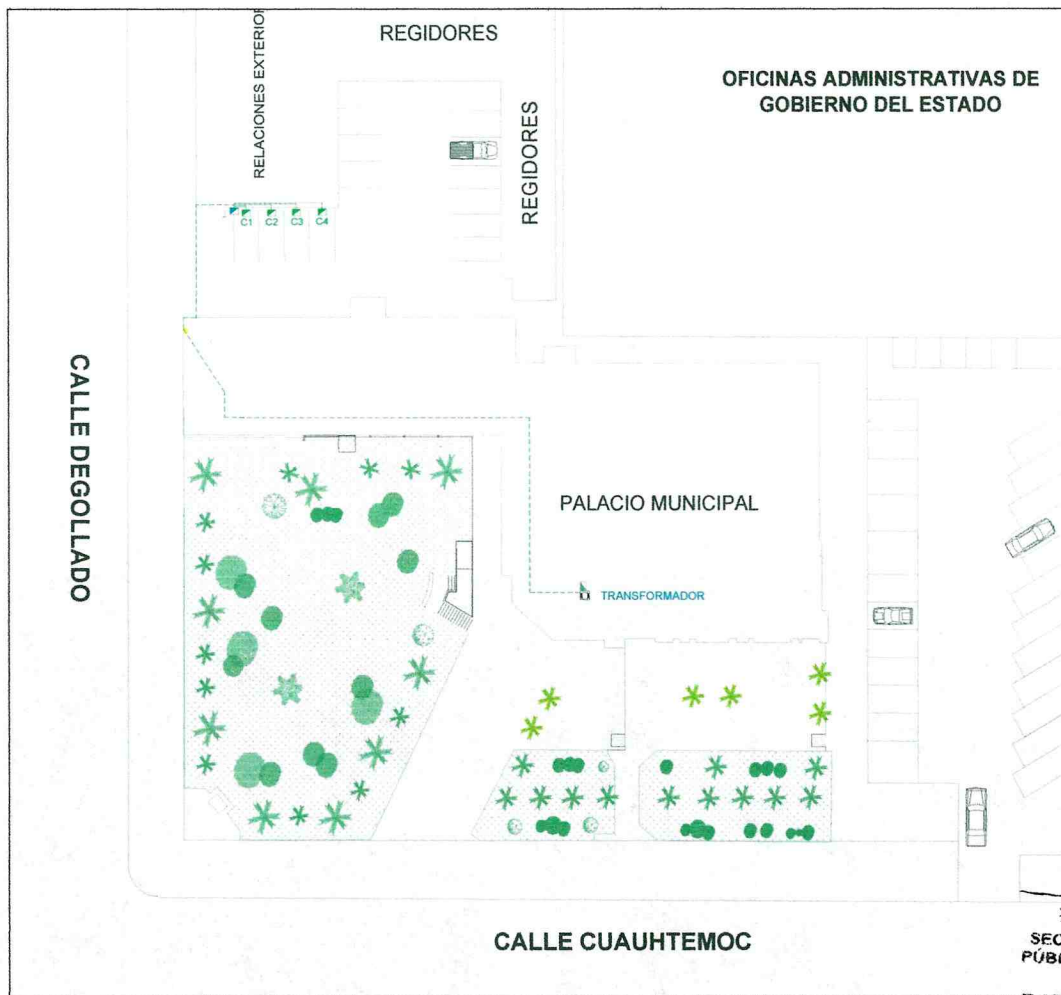

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Daniela Acosta
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	1	
OBRA:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-003-26	
							CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 20 DE ABRIL DE 2026 AL 28 DE ABRIL DE 2026. FECHA: 28 DE ABRIL DE 2026.									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL.								
01	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES.								
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1 1/2", CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/2", COPLER GALVANIZADO DE 1 1/2", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMPS., CONDULET LB 1 1/2, CONDULET C DE 2", GABINETE TIPO NEMA 3R 30X40X20 CMS, CONDULET C DE 1 1/2", CODO GALVANIZADO S/R DE 1 1/2", MONITOR Y CONTRA DE 1 1/2", TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", RIEL UNICANAL GALV. DE 4 X4" LISO, ABRAZADERA UNICANAL DE 1-1/2", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X40 AMPS., GABINETE NEMA 3R 60X 50 X20 CMS, CABLE THW CAL. 1/0, REDUCCION DE 2" A 1 1/2", COPLER GALV. C/R DE 2", VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", COPLER GALVANIZADO S/R 1", CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1	1.00	0	1.00	0.00	\$153,921.65	\$0.00
SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES.									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$178,549.11
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$178,549.11
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00

CONFORME

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO


CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

REVISÁ

[Firma]
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	28 DE ABRIL DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1 1/2", CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/2", COPLE GALVANIZADO DE 1 1/2", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMPS., CONDULET LB 1 1/2, CONDULET C DE 2", GABINETE TIPO NEMA 3R 30X40X20 CMS, CONDULET C DE 1 1/2" , CODO GALVANIZADO S/R DE 1 1/2", MONITOR Y CONTRA DE 1 1/2", TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", RIEL UNICANAL GALV. DE 4 X4" LISO, ABRAZADERA UNICANAL DE 1-1/2", CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X40 AMPS., GABINETE NEMA 3R 60X 50 X20 CMS, CABLE THW CAL. 1/0, REDUCCION DE 2" A 1 1/2", COPLE GALV. C/R DE 2", VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", COPLE GALVANIZADO S/R 1", CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	28 DE ABRIL DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)



TUBO GALVANIZADO DE 1"




COPE GALVANIZADO DE 1"



CONECTOR GALVANIZADO DE 1"



PUESTA A TIERRA, VARILLA
5/8" X 1.5 MTS

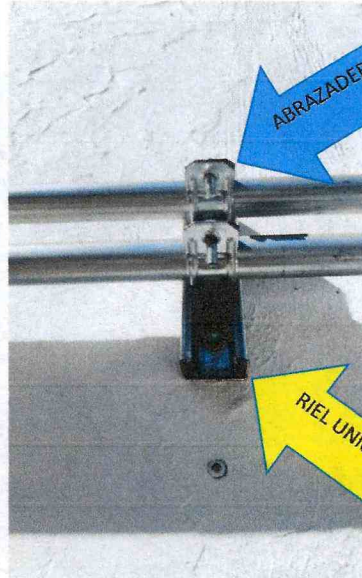

ABRAZADERA

RIEL UNICANAL 4



CODO DE 90° 1"

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA







AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	28 DE ABRIL DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)

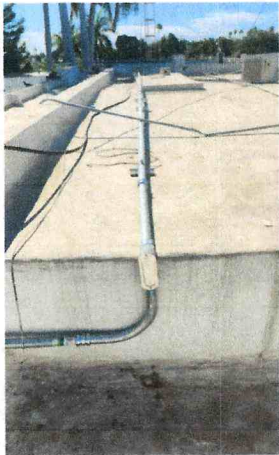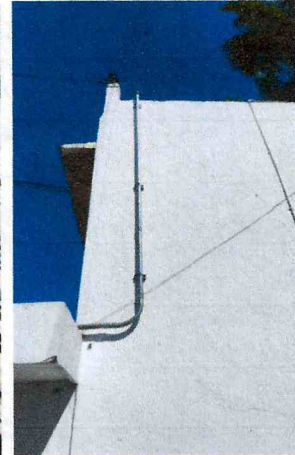

TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2"



CONDULET DE 1 1/2"



INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3
X 150 AMP"

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A.
DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	28 DE ABRIL DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)

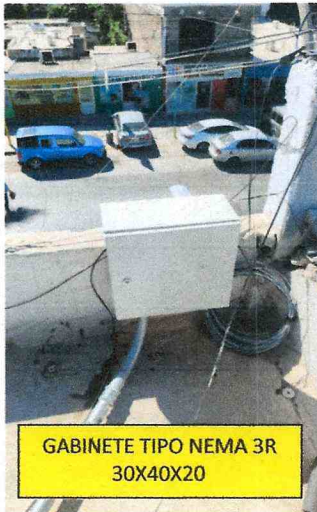


GABINETE TIPO NEMA 3R
30X40X20

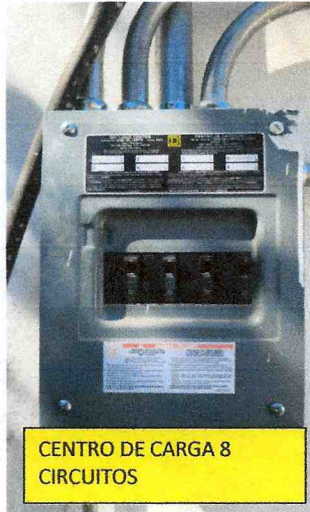

CENTRO DE CARGA 8
CIRCUITOS



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2
X 40 AMP

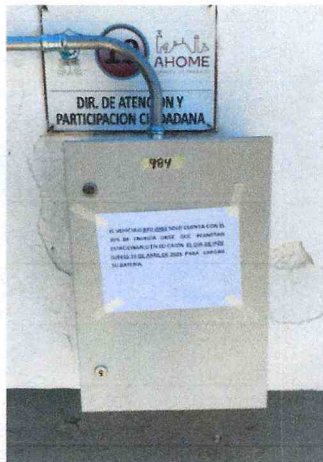

GABINETE NEMA 3R 60X50X20

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE:	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
UBICACIÓN:	PALACIO MUNICIPAL		
No. CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-003-26	PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 887,765.98	IMPORTE TOTAL	RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2026, autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con número: 022-A/2026 y 023-A/2026 ambos de fecha 05 de marzo de 2026; y 026-A/2026 y 027-A/2026 ambos de fecha 19 de marzo de 2026. Obras que fueron aprobadas mediante oficios con número: 022/2026 y 023/2026 ambos de fecha 05 de marzo de 2026; y 026/2026 y 027/2026 ambos de fecha 19 de marzo de 2026. Obras incluidas en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública (POA) con números: O-072, O-073, O-074 y O-075.
MONTO DE LA OBRA:	\$ 178,549.11	SUBPROGRAMA	
FECHA DE INICIO:	06 DE ABRIL DE 2026.	REAL:	20 DE ABRIL DE 2026.
FECHA DE TERMINO:	20 DE MAYO DE 2026.	REAL:	28 DE ABRIL DE 2026.
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A.	
DOMICILIO:	Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.		
TELÉFONOS:	(667) 243 96 76		
TIPO DE TRABAJO:	4 CARGADORES PARA CARROS ELECTRICOS		
REPRESENTANTE:	C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.		
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1.- <u>Daniela Acosta L.</u> C. DANIELA ACOSTA LAZCANO. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V. CONTRATISTA		<u>Alejandro Gonzalez Connant</u> ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA	
2.- _____			
3.- _____			
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS
ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

1

UBICACIÓN:

PALACIO MUNICIPAL

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

20/ABRIL/26

Inicio

CON ESTA FECHA SE DECLARA ABIERTA
ESTA BITACORA DE LA OBRA:


INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO
CARGADORES PARA AUTOS ELECTRICOS
EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO
EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME
SINALOA.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Ing. Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS
ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

2

UBICACIÓN:

PALACIO MUNICIPAL


CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
1	21/04/2026 TRABAJO	COLOCACION DE ZIEL UNICANAL, PER- RADO, TRAVETEARO, COLOCACION DE ABRASADERAS UNICANAL 1 1/2" COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1" y 1 1/2"
2	TRABAJO	COLOCACION DE GABINETES TIPO NEMA 3R DE 30x40x20 (1 PZA) GABINETE TIPO NEMA 3R DE 60x60x20 (4 PZA) Y CENTRO DE CARGA 8 CIRCUITOS (1 PZA)
3	TRABAJO	COLOCACION DE COPLES Y COLECTORES
4	TRABAJO	COLOCACION DE VARILLA A TIERRA.


C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA




ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

3

UBICACIÓN:

PALACIO MUNICIPAL

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.


CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	24/04/2026	
1	TRABAJO	TEJIDO DE CABLE THW CAL. 10, CABLE THW CALIBRE 8 NEGRO, CABLE THW CALIBRE 12 VERDE
2	TRABAJO	COLOCACION DE TERMICOS 2 x 40 AMP (4P2A)
3	TRABAJO	COLOCACION DE TERMICO 3 x 150 AMP (1P2A) EN TRANSFORMADOR EXISTENTE
4	TRABAJO	CONEXIONES ELECTRICAS EN GABINETES, TERMICOS, Y CARGADORES PARA AUTOS.

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA




ING. ALEJANDRO GONZALEZ CO

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS
ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

4

UBICACIÓN:

PALACIO MUNICIPAL

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

CONT-SOPUE-DOP-003-26

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

28/04/2026

ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE PRESENTA ESTA
ESTIMACION PARA SU REVISION Y
TRAMITE DE PAGO, CON UNA
CANTIDAD DE:

\$178,549.11


CIERRE

CON ESTA FECHA SE DECLARA
CERRADA ESTA BITACORA DE LA
OBRA:

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
CUATRO CARGADORES PARA AUTOS
ELECTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL
UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA.

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ


MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
	CONT-SOPUE-DOP-003-26		
FECHA	28 DE ABRIL DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)

UBICACIÓN	COORDENADAS
PALACIO MUNICIPAL	25.783172°, -108.993623°

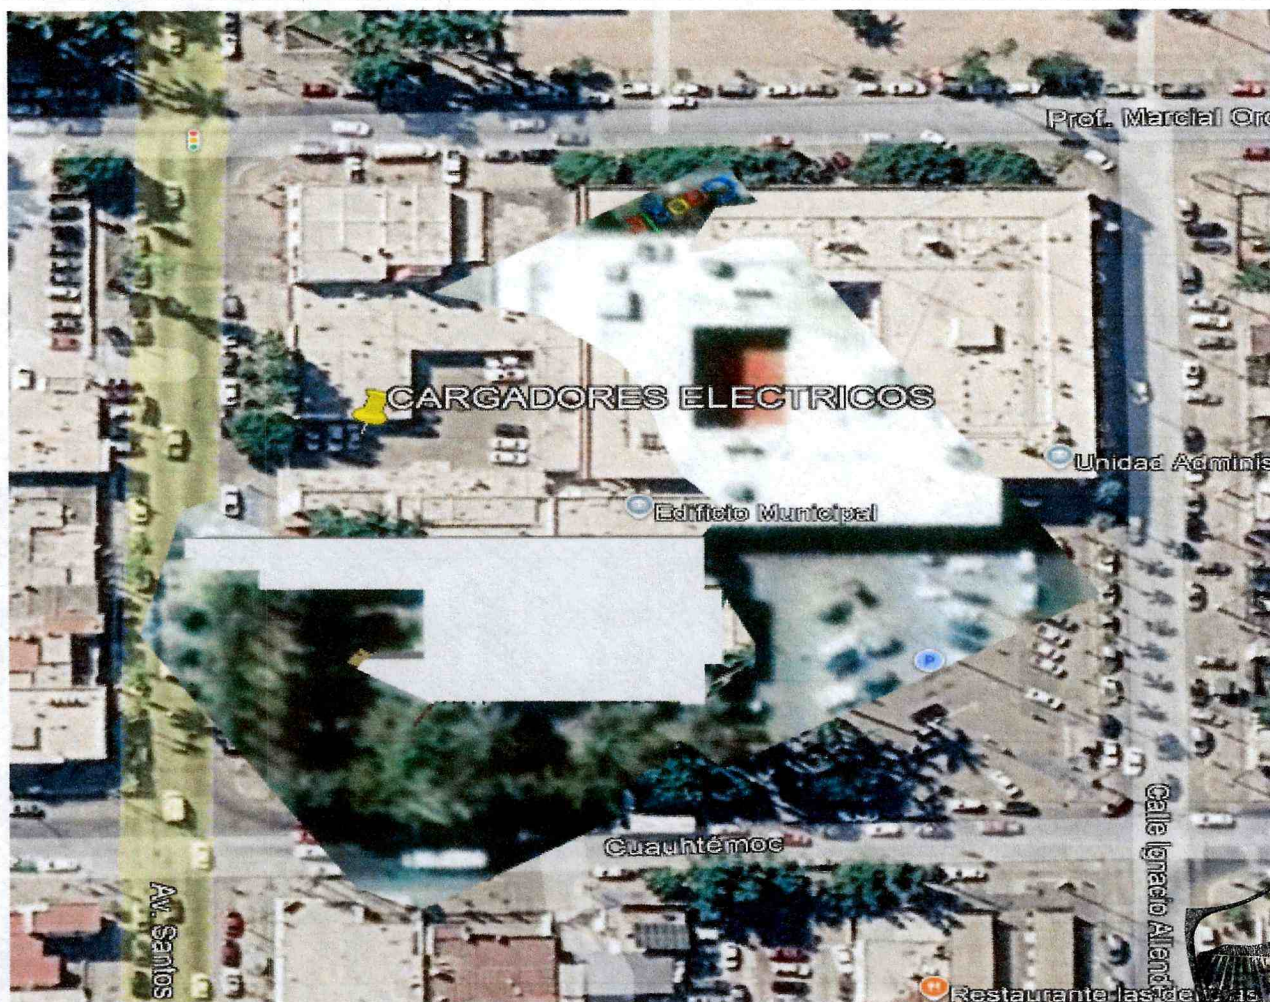


Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDAD: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRAS: 1)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; 2)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; 3)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; e 4)-INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-003-26

No. DE CONVENIO: (CONT-SOPUE-DOP-003-26)-1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A DE C.V.

IMPORTE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$887,765.98 (I.V.A. INCLUIDO)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 30 DE MARZO DE 2026, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. CELEBRARON "EL CONTRATO PRINCIPAL" IDENTIFICADO CON EL NUMERO SOPUE-DOP-003-26, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2026, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO, "EL CONTRATISTA" INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2026.

Daniela Acosta L.

[Signature]



III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SENALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NÚMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 17 DE ABRIL DE 2026




SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

ELABORÓ Y REVISÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGÍA



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte la moral denominada **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.**, representada por la ciudadana **DANIELA ACOSTA LAZCANO**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 30 de marzo de 2026, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **CONT-SOPUE-DOP-003-26**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad las obras: 1)- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; 2)- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; 3)- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; e 4)- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios, los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, cuyo tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista.

I.4. - Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, el cual dice de la siguiente manera:

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 45 (CUARENTA Y CINCO) días naturales, iniciando los trabajos el día 06 de abril de 2026 y a

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (CONT-SOPUE-DOP-003-26)-1

terminarlos a más tardar el día **20 de mayo de 2026**, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL: \$765,315.50 (SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 50/100 M.N.)
I.V.A. (16%): \$122,450.48 (SON: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.)
TOTAL: \$887,765.98 (SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)

I.6.- Se otorgo el anticipo a "EL CONTRATISTA" al que por Ley tiene derecho, con fecha **17 de abril de 2026**.

I.7.- Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Diferimiento, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de los trabajos.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de la obra que se encuentra en "EL CONTRATO PRINCIPAL", y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de los trabajos, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de los trabajos.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de la obra contratada, quedando de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(45 DÍAS NATURALES)		(45 DÍAS NATURALES)	
		06 de abril de 2026	20 de mayo de 2026	20 de abril de 2026	03 de junio de 2026
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(45 DÍAS NATURALES)		(45 DÍAS NATURALES)	
		06 de abril de 2026	20 de mayo de 2026	20 de abril de 2026	03 de junio de 2026
3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(45 DÍAS NATURALES)		(45 DÍAS NATURALES)	
		06 de abril de 2026	20 de mayo de 2026	20 de abril de 2026	03 de junio de 2026
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(45 DÍAS NATURALES)		(45 DÍAS NATURALES)	
		06 de abril de 2026	20 de mayo de 2026	20 de abril de 2026	03 de junio de 2026

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (CONT-SOPUE-DOP-003-26)-1

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente Convenio de Diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este Convenio de Diferimiento, continuaran vigentes todas las estipulaciones de "EL CONTRATO PRINCIPAL".

QUINTA. - El presente Convenio de Diferimiento comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por "LAS PARTES" que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de tres testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día 17 de abril de 2026.

Por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"

C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL

Por "EL CONTRATISTA"


Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MORAL
DENOMINADA CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

TESTIGOS:

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. MARÍA LUISA GÓMEZ LIZÁRRAGA
SÍNDICA PROCURADORA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte la moral denominada CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V., representada por la ciudadana DANIELA ACOSTA LAZCANO, celebrado con fecha 17 de abril de 2026.

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

20 DE ABRIL DE 2026

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO A USTED Y MANDARLE UN CORDIAL SALUDO REFERENTE A EL CONTRATO:

N°. CONT-SOPUE-DOP-003-26

CON EL NOMBRE DE:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ESTOY SOLICITANDO UN DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 06 DE ABRIL DE 2026.

FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES.

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRAZO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO: 20 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TERMINO: 03 DE JUNIO DE 2026

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/583-26

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento por pago de anticipo..

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 22 de abril de 2026.

C. JUAN CARLOS VILLAREAL CASTRO
ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato número: **CONT-SOPUE-DOP-003-26**, mismas que se detallan a continuación: 1) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 3) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 4) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Cuyas obras le fueron adjudicadas al contratista de nombre: **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.**

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo con fecha del **17 de abril del 2026**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

CONT-SOPUE-DOP-003-26	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	06/04/2026	20/04/2026
Fecha de termino:	20/05/2026	03/06/2026
Plazo de ejecución:	45 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

A T E N T A M E N T O

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. Archivo
JETC/AARF



23/ABRIL/2026

Diana Acosta L

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA, A 17 DE ABRIL DE 2026.

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE SE RECIBIO EL 35% DE ANTICIPO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME FUE EN LA FECHA DEL 17 DE ABRIL DE 2026, DE LAS OBRAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-003-26

Hola, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN:

Se recibió una transferencia interbancaria SPEI del Banco BANORTE, de la cuenta *****4150, a la cuenta CLABE *****2856.

Clave de Rastreo:	8846APR1202604175203063256
Hora y Fecha:	15:14:30 17 ABR 2026
Numero de Referencia:	170426
Banco Origen:	BANORTE
Ordenante:	MUNICIPIO DE AHOME
Concepto del Pago:	PAGO OBRA PUBLICA DIRECTA
Nombre del Beneficiario:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN
Banco Destino:	BANCO VE POR MAS, SA
Importe:	310718.10

Si tienes alguna duda, llama a Línea Bx+ al 01800-8376-7627, en donde uno de nuestros ejecutivos con gusto te atenderá

SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA SALUDARLO.

ATENTAMENTE:

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL

Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 17/ABRIL/2026.
DURACION: 45 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 20/ABRIL/2026.
FECHA DE TERMINACION: 03/JUNIO/2026.

OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELECTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramacion de Obra de Montos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	2026 Abr	May	Jun
	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELECTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOSCHIS, SINALOA.									
	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELECTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL									
	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES									
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1 1/2", CONECTOR GALVANIZADO DE 1 1/2", COPLE GALVANIZADO DE 1 1/2", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X150 AMPS., CONDULET LB 1 1/2, CONDULET C DE 2", GABINETE TIPO NEMA 3R 30X40X20 CMS, CONDULET C DE 1 1/2", CODO GALVANIZADO S/R DE 1 1/2", MONITOR Y CONTRA DE 1 1/2", TAQUETE PLASTICO 3/8", PIJA CABEZA HEXAGONAL 1/4X 1 1/2", RIEL UNICANAL GALV. DE 4 X4" LISO, ABRAZADERA UNICANAL DE 1-1/2",	LOTE	1.00	20/Abr/2026	45c	03/Jun/2026	\$153,921.65	\$40,621.77	\$100,473.43	\$12,826.45

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL

BLVD. CONQUISTADORES #2213 FRACC. CONQUISTA DEL REY, C.P. 80058 CULIACAN, SINALOA.
RFC: CCE220215159, TEL 667 243 9676 COREO: contructycomercerk@gmail.com



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 17/ABRIL/2026.

DURACION: 45 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 20/ABRIL/2026.

FECHA DE TERMINACION: 03/JUNIO/2026.

OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELECTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramacion de Obra de Montos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	2026 Abr	May	Jun
	CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X40 AMPS., GABINETE NEMA 3R 60X 50 X20 CMS, CABLE THW CAL. 1/0, REDUCCION DE 2" A 1 1/2", COPLER GALV. C/R DE 2", VARILLA PARA TIERRA 5/8*1.5 MTS. PROTOCOLIZADA, CONECTOR PARA VARILLA TIERRA, TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1", CODO GALVANIZADO S/R 1", CONECTOR GALVANIZADO DE 1", COPLER GALVANIZADO S/R 1", CABLE DE COBRE THW CAL. 8 NEGRO, CABLE DE COBRE THW CAL. 12 VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									
TOTAL PARCIAL:							\$153,921.65	\$40,621.77	\$100,473.43	\$12,826.45
TOTAL ACUMULADO:								\$40,621.77	\$141,095.20	\$153,921.65
% PARCIAL:								26.39%	65.28%	8.33%
% ACUMULADO:								26.39%	91.67%	100.00%

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL

BLVD. CONQUISTADORES #2213 FRACC. CONQUISTA DEL REY, C.P. 80058 CULIACAN, SINALOA.
RFC: CCE220215159, TEL 667 243 9676 COREO: constructycomercerkan@gmail.com



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A 30 DE MARZO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE ES EL ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

N° DE CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-003-26

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA.

CEDULA PROFESIONAL:
No. 6768269

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.



ATENTAMENTE

Jesús Manuel Fraire Villegas

ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS
SUPERINTENDENTE

ATENTAMENTE

Daniela Acosta Lazcano



C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL

Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

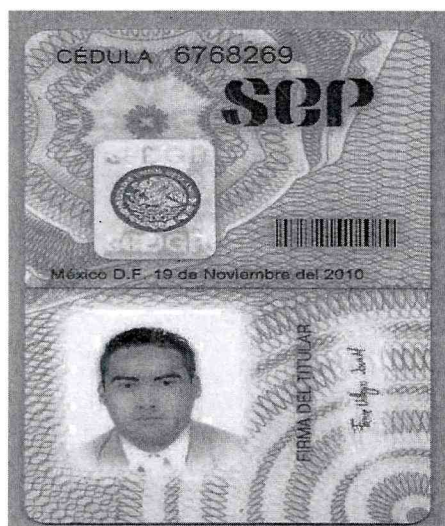

Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 30 de marzo del 2026.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
PRESENTE.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de las siguientes:

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Número de contrato: CONT-SOPUE-DOP-003-26.

Fecha: 30 de marzo de 2026.

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO JARÍA CASTRO
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

30/03/2026
Daniela Acosta L.

30/MAR/2026

C.c.p.- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V./Contratista
C.c.p.- Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

20 DE ABRIL DE 2026

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

OFICIO DE INICIO DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL INICIO DE LA OBRA EMPEIZA REALIZARSE EN LA FECHA DEL 20 DE ABRIL DE 2026
EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:
CONT-SOPUE-DOP-003-26

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**


·Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058,
localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/582-26
Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 22 de abril de 2026.



C. JUAN CARLOS VILLAREAL CASTRO
ENCARGADO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL


Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato número: CONT-SOPUE-DOP-003-26., consistentes específicamente en: 1) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE SUBESTACIÓN 300 KVA 13200/220-127 V PARA PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., 2) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA (DGSPM) DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "A" Y ALA "B", ALUMBRADO Y CONTACTOS, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 3) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. 4) -INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSITO MUNICIPAL AREA DE RECAUDACIÓN, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA., cuyas obras le fueron adjudicadas a "EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V., con un importe total de hasta: \$ 887,765.98.

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en el plazo de ejecución de los trabajos relativos a las obras antes señaladas, quedaron establecidos como a continuación se indica:

CONT-SOPUE-DOP-003-26	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
20/04/2026	03/06/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.



ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TARRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p.- María Luisa Gómez Lizárraga/ Síndica Procuradora
c.c.p.- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V./Contratista
c.c.p.- Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
c.c.p. Archivo
JETC/AARF

22/ABRIL/2026

Daniel Acosta L

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

28 DE ABRIL DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

FINAL DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL FINAL DE LA OBRA EMPEZ'A REALIZARSE EN LA FECHA DEL 28 DE ABRIL DE 2026.

EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:
CONT-SOPUE-DOP-003-26

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Ubicado en: boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058,
localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

22ND8223947

Clave de R.F.C.

CCE220215159

Nombre, Denominación o Razón social

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN SA DE CV


Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 11 de mayo de 2026, a las 12:24 horas

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Notas

- 1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
- 2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026.

Cadena Original

||CCE220215159|22ND8223947|11-05-2026|P||00001088888800000031||

Sello Digital

vjBKSBJYMcgwnhLLrEKnSR9nkvVgkBHIVNmwdHZwmUXfNSCEXUYH4FiJ3hi5lehgaiPvATiaKYfTJ5K5PKI+6c64T5
bKBxgWtNf3xYykZwhTzpwTS1lqgP3gA8rfzJu4D4E1cSfJp3HvVLDzVlWcnlHIPTGqEu/Kk4HKygiQ=**GOBIERNO DE
MÉXICO****HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026.

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.



Cadena Original

||CCE220215159|22ND8223947|11-05-2026|P||00001088888800000031||

Sello Digital

vjBKSBJYMcgwnhLLrEKnSR9nkvVgkBHIVNmwdHZwmUXfNSCExUYH4FiJ3hi5lehgaiPvATlaKYfTJ5K5PKI+6c64T5
bKBxgWtNf3xYykZwhtTzpwTS1lqgP3gA8rfzJu4D4E1cSfJp3HvvLDrZvLwcnlHiPTThGqEu/Kk4HKygiQ=



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2026-003667

Los Mochis, Sinaloa, 8 de abril de 2026

C. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, SA DE CV , de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.


Obligacion	Detalles	Al corriente
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RAMON VILLA HURTADO
DIRECTOR DE INGRESOS



Cadena de Seguridad
c94f4Zut/pLuVDfsp2irLNQPqs0=



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/709-26

Asunto: El que se indica

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 13 de mayo de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FELIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: **INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Que tiene el número de contrato: **CONT-SOPUE-DOP-003-26**

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 28 de abril de 2026, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día jueves 14 de mayo de 2026 a las **10:00 a.m.** horas.


- Nombre de la Comunidad: Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.
- Beneficiarios: Habitantes de la ciudad de Los Mochis.
- Montos ejecutados de la obra: \$ 178,549.11
- Residente de la obra: Ing. Alejandro González Connant
- Número de celular de residente: 6681525451

Se anexa croquis de localización.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TARRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P.- Archivo
C.C.P.- María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora
C.C.P.- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V./Contratista
C.C.P.- ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT/Residente De Obra
JETC/DEVA



**SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA**
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra : **INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA CUATRO CARGADORES PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Localidad	LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA.
Municipio	AHOME
Num. De contrato	CONT-SOPUE-DOP-003-26
Contratista	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
Importe de la obra	\$178,549.11
Anticipo entregado	\$62,492.19
Fianza de anticipo	26A14213, DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Fianza de cumplimiento	26A14231, DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Inicio de los trabajos	20 DE ABRIL DE 2026
Termino de los trabajos	28 DE ABRIL DE 2026
Plazo de dias de ejecución de la obra	09 DIAS

En Los Mochis Sinaloa siendo las: **10:00** horas del día **14** de **MAYO** del 2026
Se reunieron para la entrega-recepción de la obra antes mencionada las siguientes personas:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

Residente de Obra

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) 03-SOPUE-003-2026	20/04/2026	28/04/2026	\$178,549.11	\$178,549.11	\$111,439.27	\$111,439.27
Saldo a cancelar			\$0.00			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leída la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ENTREGO EL CONTRATISTA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

Daniela Acosta L.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DANIELA ACOSTA LAZCANO

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
Residente de Obra

