



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/594/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

ESTIMACIÓN 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 29 de Octubre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$554,206.96 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 96/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR \$158,976.34 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
- R.F.C. BOAI461105TB6
- DOMICILIO FISCAL: CALLE AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
- No. DE FACTURA: # 2, DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

29 OCT 2025

03:02 PM

RECIBIDO



Emisor:
JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
BOAI461105TB6
TURMALINA 3 1489 STASE, CP: 80020, CULIACAN,
SINALOA, México
Lugar de Expedición: 80020 SINALOA
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Tel: 6673722952
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
MBA850101214
Código postal: 80500
Uso del CFDI: I01 - Construcciones
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal: d4d5acf9-4eb9-4917-9ab7-5955b6691c31
Fecha / Hora de Emisión: 29/10/2025 - 12:37:19
No. de Certificado Digital: 00001000000709570684
Exportacion: 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
72101500	1	E48 - Unidad de servicio	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No. MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025 CONTRATADO IMPORTE: \$447,764.62 IVA: \$76,442.34 TOTAL: \$554,206.96 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: \$140,687.03 MAS IVA 16% : \$22,509.92 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : \$163,196.95 DEDUCCIONES AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$0.00 MAS IVA 16%: \$0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: \$0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: \$140,687.03 IVA A FACTURAR (16%): \$22,509.92 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: \$163,196.95 RETENCION 3%(S.V.I.F.Y.C.) : \$4,220.61 TOTAL DE DEDUCCIONES: \$4,220.61 MONTO LIQUIDO A RECIBIR : \$158,976.34 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$140,687.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$22,509.92	\$140,687.03	\$140,687.03
				Subtotal:	\$140,687.03
				IVA 16%:	\$22,509.92

Moneda: MXN
- Peso
Mexicano
CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 95/100
MXN
Total: \$163,196.95
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en
parcialidades ó diferido

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha / Hora de Certificación:
29/10/2025 - 13:37:19

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1]1d4d5ef9-4eb9-4317-9ab7-5955b6691c31|2025-10-29T13:37:19|LSO13061899R5|q74LxDbXr6U+mOPxWGuiliorAQbQmIEkww3s30FwcWzOEa/Fzd8RXo4nMfd6nt12RVowCeIHUKqKQCYvEjsaO/YfPKUNBQPI9ZuAW7wkbSuE2Tqm+hOSWCNM8b5w1OuS/9pOQCDGjRLvLWjaio4Zq24gnboUfr17f8ICg5awBAKo6CIBf7CdNONF7omkwYu6BZeHAdRd2vO36wKFOdQ7TwrCvt8WjqYKbaufvtU4eRLQjvnKpt4y7I2Ss08G0jh09xkQWoddNvLwTYosYN8Pt5ThpLDebPXzdlqOXeWVv59TZdhy9VLBdKChyL6mR3QM;BIPTm4DFTg==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

q74LxDbXr6U+mOPxWGuiliorAQbQmIEkww3s30FwcWzOEa/Fzd8RXo4nMfd6nt12RVowCeIHUKqKQCYvEjsaO/YfPKUNBQPI9ZuAW7wkbSuE2Tqm+hOSWCNM8b5w1OuS/9pOQCDGjRLvLWjaio4Zq24gnboUfr17f8ICg5awBAKo6CIBf7CdNONF7omkwYu6BZeHAdRd2vO36wKFOdQ7TwrCvt8WjqYKbaufvtU4eRLQjvnKpt4y7I2Ss08G0jh09xkQWoddNvLwTYosYN8Pt5ThpLDebPXzdlqOXeWVv59TZdhy9VLBdKChyL6mR3QM;BIPTm4DFTg==

Sello Digital del SAT

IFJ3R3BMiyCwVtIcmKp9jXUPUSQC7dQjNRvmK90ymgDDFVR/SsQpFTogd6iIZ7Hv/SLPXSxRAdQjNE5/P0jgYgZKrpDWAUJalemGStD7C94Q/5IZZqqQ+kwA3rnk4NOhbXS76F3vGQs0lv3XT3qdyuEyEkaM303vLk0DkG29Fa9N5HKq+VvYWKdOYhKy4NNVLRvTxQY+gRaimV9Qzsc3N/bfRuknWwg3yS4Kw1NxlgMakBCYQqRUCP6Xub3heXhoZLvbLHFku5Zx7NeCBNC94/eCSVvj/dtxSY73+rgA/m3sk0rQbU2IGHj0ikrPRH3IEF4Pm2+qM5ACw37BoYQ==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO13061899R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Folio="2" Fecha="2025-10-29T12:37:19"
Sello="q74LcxDbXr61U+mOPxNGuiorAQbQmIEkwq3s30FwcWz0Ee/rFzd8RXo4nMfd6nt12RVowCe1HUKqKKGQYvEjsa01/YfPKUNBQP19ZuAW7wkbSuE2Tqm+h0SWCNM8b5w10u5/9pOQCdGkjrLv
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000709570684"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDk1NzA2ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQ0DCx8QyBERUwgu08VSVk1DSU8gREUGURNSU5JU1RSQUNJT04gVJFJJQIVU
SubTotal="140687.03" Moneda="MXN" Total="163196.95" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" LugarExpedicion="80020"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="BOAI461105TB6" Nombre="JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA050101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No. MBG0R-AD-FAISMUN-014/2025 CONTRATADO IMPORTE: $447,764.62 IVA: $76,442.34 TOTAL: $524,206.96
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA: $140,687.03 MAS IVA 16% : $22,509.92 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA : $163,196.95 DEDUCCIONES AMORTIZACION
ANTICIPO 35%: $0.00 MAS IVA 16%: $0.00 TOTAL AMORTIZACION ANTICIPO: $0.00 MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $140,687.03 IVA A FACTURAR
(16%): $22,509.92 TOTAL A FACTURAR DE LA ESTIMACION: $163,196.95 RETENCION 3%( S.V.I.F.Y.C.): $4,220.61 TOTAL DE DEDUCCIONES: $4,220.61 MONTO
LIQUIDO A RECIBIR : $158,976.34 " ValorUnitario="140687.03" Importe="140687.03" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="140687.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22509.92"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22509.92">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="140687.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22509.92"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="d4d5acf9-4eb9-4917-9ab7-5955b6691c31"
FechaTimbrado="2025-10-29T12:37:19" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="q74LcxDbXr61U+mOPxNGuiorAQbQmIEkwq3s30FwcWz0Ee/rFzd8RXo4nMfd6nt12RVowCe1HUKqKKGQYvEjsa01/YfPKUNBQP19ZuAW7wkbSuE2Tqm+h0SWCNM8b5w10u5/9pOQC
NoCertificadoSAT="00001000000509046663"
SelloSAT="1FJB3BM1yGwV1HcmKp9jyXUPUSQC7dQjNRvmk90ymgDDFVRASsQpFTogd6HZ7hV/5tPXsxsRAD0JNE5/P0jgYgzK+pDWAUaIemGstiJ7G94Q/SfZZqqQ+kwA3rnk4N0hbXS26FjvGQs
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 6 de octubre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL
DOMICILIO:	CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	22-sep-25
6678229976	6678229976		AL	01-oct-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
BOAI461105TB6			20-sep-25	
DEPENDENCIA.-	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO			

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO: 22-sep-25
		TERMINACIÓN: 21-oct-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$477,764.62	\$554,206.96	\$0.00	\$554,206.96

RECIBI:	BUENO POR:	\$ 158,976.34
----------------	-------------------	---------------

\$ 158,976.34 (SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
-------------------------------	-----------

DEDUCCIONES:		CÁLCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 140,687.03
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 22,509.92
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 163,196.95
3 % SVIFYC:	\$ 4,220.61	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 4,220.61
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 4,220.61	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 163,196.95

SALDO A PAGAR:	\$ 158,976.34
-----------------------	---------------

ELABORO:-

JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:

C. ING. RUBIEL RINCON RAMO
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y



JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

Dependencia :
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:		Estimacion:	
			6 de octubre de 2025		01 NORMAL	
Periodo de la estimacion:	22/09/2025	01/10/2025	Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:	22/09/2025	21/10/2025	BADIRAGUATO		MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance	
\$ 554,206.96		\$ 477,764.62	\$ -	\$ -	29%	
					% Avance Total	
					29%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 140,687.03	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 22,509.92	
\$ -	Sub- Total A (=)	\$ 163,196.95	\$ 163,196.95
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ -	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=)	\$ -	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR	\$ 140,687.03	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 22,509.92	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	Total (=)	\$ 163,196.95	\$ 163,196.95
	3 % SMFYC:	\$ 4,220.61	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 4,220.61	CONTRATADO
\$ -	Importe TOTAL	\$ 158,976.34	\$ 554,206.96
	NETO A PAGAR	\$ 158,976.34	
SALDO DEL ANTICIPO			SALDO
\$0.00	Son:		\$ 391,010.01
	(SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)		

ELABORO.-

C. JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

ELABORO.-
C/ JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ 
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:	FECHA:	6 de octubre de 2025
--------------	--------	----------------------

JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791,
COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P.

R.F.C. BOAM461105TB6

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
------------	-------------	-------------	-----------

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 477,764.62
--------------------------	---------------

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ -
------------------------------	------

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 554,206.96
----------------------------	---------------

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 140,687.03
2	ESTRUCTURA	\$ -
3	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 140,687.03

SUB TOTAL=	\$ 140,687.03
I.V.A AL 16 %	\$ 22,509.92
TOTAL =	\$ 163,196.95

ELABORO.-

C. JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA:		JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA		lunes, 6 de octubre de 2025	
DOMICILIO:		CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.		BOA1461105TB6		1 de 3			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$477,764.62		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$554,206.96	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
1	PRELIMINARES										
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	270.90	\$ 15.58	\$ 4,220.62	270.90	0.00	0.00	270.90	\$	4,220.62
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	149.00	\$ 133.09	\$ 19,830.41	149.00	0.00	0.00	149.00	\$	19,830.41
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	270.90	\$ 37.61	\$ 10,188.55	270.90	0.00	0.00	270.90	\$	10,188.55
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	270.90	\$ 157.55	\$ 42,680.30	270.90	0.00	0.00	270.90	\$	42,680.30
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	270.90	\$ 196.07	\$ 53,115.36	270.90	0.00	0.00	270.90	\$	53,115.36

ELABORÓ:-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
C. ING. RUÍSEL RINCÓN RAMOS

AUTORIZO

C. ING. RUÍSEL RINCÓN RAMOS



CONTRATISTA:		JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA:		lunes, 6 de octubre de 2025	
DOMICILIO:		CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000		R.F.C.:		BOA461105TB6		2 de 3			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$477,764.62		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$554,208.96	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	270.90	P.U. 39.32	\$ 10,651.79	270.90	270.90	0.00	270.90	\$ 10,651.79	
2	ESTRUCTURA									\$	

ELABORÓ:

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOLUMENES GENERADORES

		CONTRATISTA: JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA							CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE RADIRAGUATO, SINALOA				ESTIMACION 01 NORMAL	
RFC:		BOA40611051B6												
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES				
		EJE	TRAMO								EN METROS			
GP01	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2										
	CADENAMIENTO													
	0+000.00	0+010.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+010.00	0+020.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+020.00	0+030.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+030.00	0+040.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+040.00	0+043.00			3.0000	6.30			18.90					
								TOTAL EJECUTADO	276.90					
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES EN SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.			M3										
	CADENAMIENTO				LONG	ANCHO	ESPESOR							
	0+000.00	0+010.00			10.0000	6.30	0.55		34.65					
	0+010.00	0+020.00			10.0000	6.30	0.55		34.65					
	0+020.00	0+030.00			10.0000	6.30	0.55		34.65					
	0+030.00	0+040.00			10.0000	6.30	0.55		34.65					
	0+040.00	0+043.00			3.0000	6.30	0.55		10.40					
								TOTAL EJECUTADO	149.00					
GP03	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE INCLUYE ESCURFONDO E INCLUTACION DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.			M2										
	CADENAMIENTO				LONG	ANCHO								
	0+000.00	0+010.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+010.00	0+020.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+020.00	0+030.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+030.00	0+040.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+040.00	0+043.00			3.0000	6.30			18.90					
								TOTAL EJECUTADO	276.90					
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD. PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.			M2										
	CADENAMIENTO				LONG	ANCHO								
	0+000.00	0+010.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+010.00	0+020.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+020.00	0+030.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+030.00	0+040.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+040.00	0+043.00			3.0000	6.30			18.90					
								TOTAL EJECUTADO	276.90					
GP25	BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			M2										
	CADENAMIENTO				LONG	ANCHO								
	0+000.00	0+010.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+010.00	0+020.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+020.00	0+030.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+030.00	0+040.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+040.00	0+043.00			3.0000	6.30			18.90					
								TOTAL EJECUTADO	276.90					
GP06	RIEGO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSION CATIONICA EGLES A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.			M2										
	CADENAMIENTO				LONG	ANCHO								
	0+000.00	0+010.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+010.00	0+020.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+020.00	0+030.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+030.00	0+040.00			10.0000	6.30			63.00					
	0+040.00	0+043.00			3.0000	6.30			18.90					
								TOTAL EJECUTADO	276.90					

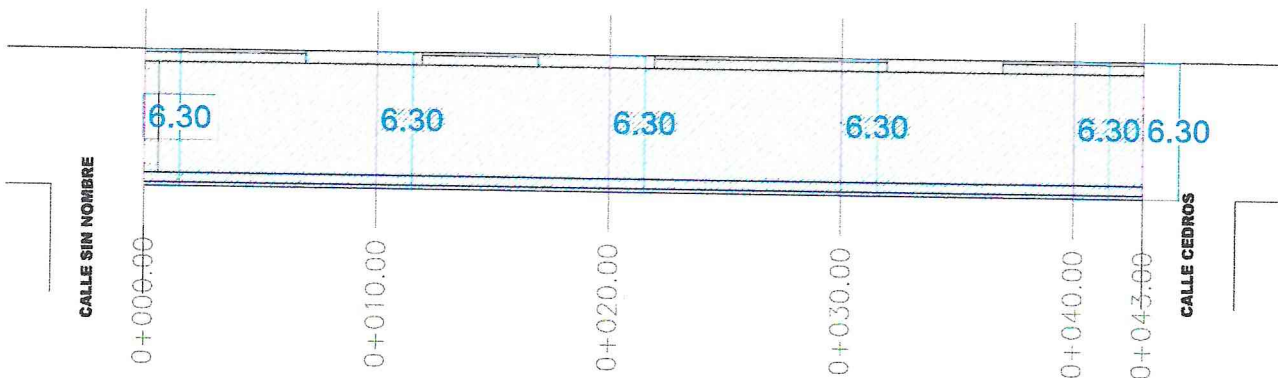

JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL


SUPERVISOR DE OBRA


ING RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.E.

	
CONTRATISTA: JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA	
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO:	CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
R.F.C.:	BOAM61105TB6
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:	
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE
GF255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO,
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN,
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,



ELABORO.-

 C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO:

CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA #791, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

R.F.C.

BOAI461105TB6

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

PRELIMINARES

1

GP01

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GP02

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO

GP05

COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE

GP25

SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL

GP25

MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE

GP06

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,



ELABORO.-

C. JOSÉ IGNACIO BROWN ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

C. SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Fecha y hora de consulta

18/11/2025 7:59:12 PM

Contrato

00798320

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NOR AD 014

Importe de la operación: 158,976.34 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 030730900033057253

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: JOSE IGNACIO BROWN
ACOSTA

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha valor: 19/11/2025

Fecha de creación: 18/11/2025

Fecha de aplicación: 18/11/2025

Concepto de pago: EST 01 NOR AD 014

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 19:59:10

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000501863

Clave de rastreo: 002601002511190000501863

Folio de firma: 0004006128

Folio único: I401202511181959100004006134

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	18/11/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/11/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
