

CP



OFICIO No. OPDUyE/608/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 02 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 07 de Noviembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: DENISSE MACHADO OROZCO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$864,259.65 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$121,515.21 (CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 21/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: DENISSE MACHACO OROZCO
- R.F.C. MAOD870924MZ9
- DOMICILIO FISCAL: CALLE CONST. HERIBERTO JARA N. 1961, COLONIA: LOC. LIBERTAD, C.P. 80180, CULIACÁN, SINALOA
- No. DE FACTURA: # 64C8, DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE
C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
C.C.P. ARCHIVO
BADIRAGUATO, SINALOA.

MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA
05:50 PM
07 NOV 2025
Marlen R. Z.
RECIBIDO

RFC emisor:MAOD870924MZ9

Nombre emisor: DENISSE MACHADO OROZCO

RFC receptor:MBA850101214

Nombre receptor: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Código postal del receptor: 80500

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:D6BF5D0F-375F-49AC-B532-B0ED657A64C8

No. de serie del CSD: 00001000000712949676

Código postal, fecha y hora de emisión: 80180 2025-11-07 12:24:20

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
60111618		1	E48	Unidad de servicio	109,095.15	109,095.150000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACION: 02 NORMAL DE LA OBRA REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No MBGBR-AD-FAISMUN-013/20 25 MONTO DEL CONTRATO: \$864258.65 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$167836.69 MAS IVA 16% \$26854.19 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$194692.88 AMORTIZACION ANTICIPO 35% \$68743.54 MAS IVA \$9398.97 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO \$68142.51 IMPORTE TOTAL A FACTURAR \$109095.15 MAS IVA \$17455.22 MONTO NETO A FACTURAR \$126550.37 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) \$5035.16 TOTAL DEDUCCIONES \$73177.67 MONTO LIQUIDO A RECIBIR \$121515.21				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	109,095.150000	Tasa	16.00%	17,455.224000
					ISR	Retención	109,095.150000	Tasa	1.25%	1,363.689375
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

\$ 109,095.15

IVA 16.00% \$ 17,455.22

ISR \$ 1,363.69

\$ 125,186.68

Sello digital del CFDI:

AMxS4DFUuu6PB9VMs+JmPNNJg3PVNuCN5rAtB/leEy7XWdAWR57JgsNYRfUSfw77vxqkEPJ05n6PohIRe5YTQ3lobzP+9gZKKMGJf/eRHkPPIU3c5F+KLV7He5mQVfVtJEjNoTbphjN9JCYpyigdo6m6fA1S24P7S0OWFPKe9jKNzoldkYmWxCzQC4Q3rdNvjvFaG2wPAVD9dacutDlvs0z6d4WCZlfdmnLh5ptiWeIDNk6QjFqxJvpm0bBx8899ngFFvnuHqgrgaGP92gPSPymqwfHBaTij8TiuWcHNTXyeHCwF/+PgSUZQarc/qVtGbUfhpVgPPYrDaYGUA==

Sello digital del SAT:

fY40SH+Le6YCKdYPipUmqnja2VsoTLCvNqI2rUDALFVGZWwt1NS447QMR3y0xkhtVs2CiDogRapJdITU3jelpTsO1x0kwmRQ0wnNfh3pc6r17z3uGbFNZzg9cCnAGMUZEB+ENWIJYqHXeh8db4+upvyHF3ZW1wiUiup76EJU79CNx5CCfPS53kMxeeJZhda4YF9chxZ5CkbIMAXiIAYbBeKl4Nk6xuRUyjrAoFKHd944g6ZWuKuR2Qk+WFelxnMhPF2bbUmUxq5W8l4RiSfCsVOSGkjmZMfhEHfNoL+aVpL0G+LyMzkuYSUSzg/ATMFvXTSNAS32xbK50w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|D6BF5D0F-375F-49AC-B532-B0ED657A64C8|2025-11-07T12:25:04|SAT970701NN3|AMxS4DFUuu6PB9VMs+JmPNNJg3PVNuCN5rAtB/leEy7XWdAWR57JgsNYRfUSfw77vxqkEPJ05n6PohIRe5YTQ3lobzP+9gZKKMGJf/eRHkPPIU3c5F+KLV7He5mQVfVtJEjNoTbphjN9JCYpyigdo6m6fA1S24P7S0OWFPKe9jKNzoldkYmWxCzQC4Q3rdNvjvFaG2wPAVD9dacutDlvs0z6d4WCZlfdmnLh5ptiWeIDNk6QjFqxJvpm0bBx8899ngFFvnuHqgrgaGP92gPSPymqwfHBaTij8TiuWcHNTXyeHCwF/+PgSUZQarc/qVtGbUfhpVgPPYrDaYGUA==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Fecha y hora de certificación: 2025-11-07 12:25:04

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2025-11-07T12:24:20"
Sello="AMxS4DFUtu6P89VMs+JmPNNJg3PVNuCN5rAtB/leEy7XWdAWR57lgsNYRfUSfw77vxqkEPJ05n6PohIRe5YTQ3tobzP+9gZKKMGJf/eRHKPPtU3c5F+KLV7He5mQVfVtJEjNoTbphjN9JCypY
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000712949676"
Certificado="MIIGRjCCBC6GAwIBAGIUMDAwMDEwMDA3MTI5NDk2NzYwQDYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDQDDCxBQyBERUwgu0V5VhIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJQ1VU
SubTotal="109095.15" Moneda="MXN" Total="125186.68" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="80180">
  <cfdi:Emisor Rfc="MAOD870924MZ9" Nombre="DENISSE MACHADO OROZCO" RegimenFiscal="626"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80111618" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION: 02 NORMAL DE LA
    OBRA REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE
    BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO No.M8GBR-AD-FAISMUN-013/2025 MONTO DEL CONTRATO: $864259.65 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $167838.69 MAS IVA 16%
    $26854.19 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $194692.88 AMORTIZACION ANTICIPO 35% $58743.54 MAS IVA $9398.97 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $68142.51
    IMPORTE TOTAL A FACTURAR $109095.15 MAS IVA $17455.22 MONTO NETO A FACTURAR $126550.37 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) $5035.16 TOTAL DEDUCCIONES
    $73177.67 MONTO LIQUIDO A RECIBIR $121515.21" ValorUnitario="109095.15" Importe="109095.150000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="109095.150000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17455.224000"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Retenciones>
          <cfdi:Retencion Base="109095.150000" Impuesto="001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.012500" Importe="1363.689375"/>
        </cfdi:Retenciones>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17455.22" TotalImpuestosRetenidos="1363.69">
    <cfdi:Retenciones>
      <cfdi:Retencion Impuesto="001" Importe="1363.69"/>
    </cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="109095.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="17455.22"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D6BF5D0F-375F-49AC-B532-B0ED657A64C8"
    FechaTimbrado="2025-11-07T12:25:04" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="AMxS4DFUtu6P89VMs+JmPNNJg3PVNuCN5rAtB/leEy7XWdAWR57lgsNYRfUSfw77vxqkEPJ05n6PohIRe5YTQ3tobzP+9gZKKMGJf/eRHKPPtU3c5F+KLV7He5mQVfVtJEjNoTbphj
    NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
    SelloSAT="fY40SH+Le6YCKdYIPUmqnja2VsoTLCvNqt2r/UDALFVGZWwIt1NS447QMR3y0XtXhVs2ClDcgRapJc1TU3jetpTs01x0kwmRQwnNfh3pc6r17zr3uGbFNZzg9cCnAGMUZEb+ENWI
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```



**CONSTRUCCIONES
MACHADO**

Dependencia : Ayuntamiento de Badiraguato
Control de Estimaciones

DENISSE MACHADO OROZCO

REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:	Estimacion:
			3 de octubre de 2025	02 NORMAL
Periodo de la estimacion:	16/09/2025	30/09/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	01/09/2025	15/10/2024	LA SOLEDAD	MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 864,259.65	\$ 745,051.42	\$ 302,490.88	\$ 260,768.00	23%
				% Avance Total
				81%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 167,838.69	ESTA ESTIMACION
\$ 68,142.51	16 % I.V.A (+) \$ 26,854.19	\$ 194,692.88
	Sub- Total A (=) \$ 194,692.88	
	Amortizacion Anticipo \$ 58,743.54	
	16 % I.V.A (+) \$ 9,398.97	
AMORTIZACION ANTERIOR	Total (=) \$ 68,142.51	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 178,160.30		\$ 509,029.44
	Importe TOTAL \$ 109,095.15	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 17,455.22	TOTAL ACUMULADO.
\$ 246,302.81	Total (=) \$ 126,550.37	\$ 703,722.32
	3 % SVIFYC: \$ 5,035.16	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 73,177.67	CONTRATADO
\$ 302,490.88	Importe TOTAL \$ 121,515.21	\$ 864,259.65
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 121,515.21	SALDO
\$56,188.07	Son:	\$ 160,537.33
	(SON CIENTO VEINTIUNO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 21/100 M.N.)	

ELABORO:

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIR. D. O. P. D. U. Y. E.

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: DENISSE MACHADO OROZCO		ESTIMACIÓN No: 02 NORMAL	
DOMICILIO: Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	16-sep-25
6671-325077	6671633083	AL	30-sep-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
MAOD870924MZ9.		19-jun-25	
DEPENDENCIA:			
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
LA SOLEDAD		BADIRAGUATO	INICIO: 01-sep-25
			TERMINACIÓN: 15-oct-24
DESCRIPCIÓN:			
REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No:			
MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$745,051.42	\$864,259.65	\$302,490.88	\$864,259.65
			BUENO POR: \$ 121,515.21
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO:			
\$ 121,515.21	(SON CIENTO VEINTIUNO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 21/100 M.N.)		
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 NORMAL			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 58,743.54	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 167,838.69
MAS I.V.A.:	\$ 9,398.97	MAS I.V.A 16 %	\$ 26,854.19
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 68,142.51	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 194,692.88
3 % SVIFYC:	\$ 5,035.16	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 73,177.67
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 73,177.67	MONTO A FACTURAR CON IVA	\$ 126,550.37
		SALDO A PAGAR: \$ 121,515.21	

ELABORO.-

 DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

 ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCON RAMO
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y



CONSTRUCCIONES
MACHADO

FECHA 3 de octubre de 2025

CONTRATISTA:	DENISSE MACHADO OROZCO	DEPENDENCIA:	AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO:	Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán,		
R.F.C.	MAOD870924MZ9.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	LA SOLEDAD	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 745,051.42
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 302,490.88
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 864,259.65

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	CIMENTACION	\$ -
3	ESTRUCTURA	\$ -
4	ALBAÑILERIA	\$ 57,268.70
5	ACABADOS	\$ 55,175.40
6	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 55,394.59
7	TRABAJO FINALES	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 167,838.69

SUB TOTAL=	\$ 167,838.69
I.V.A AL 16 %	\$ 26,854.19
TOTAL =	\$ 194,692.88

ELABORO.-

S. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D. O. P. D. U. Y E.

CONSTRUCCIONES
MACHADO

CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:		FECHA:			
DENISSE MACHADO OROZCO		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		3 de octubre de 2022			
DOMICILIO:		Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180					
R.F.C.		MAOD870924M29.					
ESTADO DE CUENTA							
	LOCALIDAD:	LA SOLEDAD	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL			
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.						
FECHA INICIO CONTRATO:	FECHA TERMINACION CONTRATO:	15-oct-24	CONTRATO:	MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025	FECHA CONTRATO: 19-Jun-25		
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$745,051.42		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$302,490.88		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$864,259.65		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$864,259.65			
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 NORMAL	01-sep-25	\$ 509,029.44	\$ 438,818.48	\$ 13,164.55	\$ 178,160.30	\$ 191,324.85	\$ 317,704.59
02 NORMAL	16-sep-25	\$ 194,692.88	\$ 167,838.69	\$ 5,035.16	\$ 68,142.51	\$ 73,177.67	\$ 121,515.21
TOTALES:		\$ 703,722.32	\$ 606,657.17	\$ 18,199.71	\$ 246,302.81	\$ 264,502.52	\$ 439,219.80
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 160,537.33	SALDO POR AMORTIZAR:		\$ 56,188.07		

LABOR:-

REVISO.-

AUTORIZO:-

C. DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U.Y.E.



CONTRATISTA:		DENISSE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA		03/10/2025	
DOMICILIO:		Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonla: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa. Código Postal: 80180		R.F.C.		MAOD870924WZ9.		1 de 3			
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION											
DESCRIPCION:		REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		LOCALIDAD:		LA SOLEDAD		ESTIMACION:		02 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$745,051.42		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$302,490.88		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$864,259.65	
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD		CANT		SEGUN PROYECTO		P.U.	
1		PRELIMINARES						VOLUMEN TOTAL		EXCEDENTE	
2		CIMENTACION						HASTA ESTIM ANTERIOR		DE ESTA ESTIMACION	
3		ESTRUCTURA									
4		ALBAÑILERIA									
GP828		IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1"x1" DE SECCION, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.		M2		98.61		275.97 \$		27,213.40	
GP2532		CHAFALAN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCION 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		ML		36.56		195.33 \$		7,141.26	
GP830		BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		ML		11.70		302.86 \$		3,543.46	
GP223		MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		ML		11.43		1,548.85 \$		17,703.36	
GBR16		MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		PZA		1.00		1,667.22 \$		1,667.22	

ELABORO

DENISSE MACHADO OROZCO

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS

DIRECTOR DE O. P. D. U. Y. E.

CONTRATISTA:		DENISSE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA:		
DOMICILIO:		Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180		R.F.C.		MAOD870924M29.		03/10/2025		
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION										
DESCRIPCIÓN:		LOCALIDAD:		LA SOLEDAD		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL		
REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.										
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$745,051.42		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$302,490.88		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		
								\$864,259.65		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		TOTAL	VOLUMEN TOTAL	HASTA ESTIMI ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
5	ACABADOS									\$ -
GP196	APLANADO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	177.71	\$ 310.48	\$ 55,175.40	177.71	0.00	0.00	177.71	\$ 55,175.40
6	INSTALACIONES ESPECIALES									\$ -
GP232	SALIDA PARA CONTACTOS, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00	\$ 2,019.18	\$ 6,057.54	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 6,057.54
GP233	SALIDA PARA APAGADOR, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	5.00	\$ 1,651.11	\$ 8,255.55	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 8,255.55
GP230	SALIDA PARA ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	11.00	\$ 1,631.31	\$ 17,944.41	11.00	0.00	0.00	11.00	\$ 17,944.41
GP134	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO DE EMPOTRAR DE 6" DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00	\$ 580.56	\$ 6,386.16	11.00	0.00	0.00	11.00	\$ 6,386.16
GP2569	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS MARCA SQUARE D O SIMILAR INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 2,954.63	\$ 2,954.63	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,954.63
GP2568	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, INC: INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 527.32	\$ 527.32	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 527.32
GP899	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,561.25	\$ 2,561.25	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,561.25

ELABORADO
C. DENISSE MACHADO OROZCO

REVISADO
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

AUTORIZADO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.



CONTRATISTA:		DENISSE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA		03/10/2025	
DOMICILIO:		Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80180				R.F.C.		MAOD870924MIZ9.		3 de 3	
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION											
		LOCALIDAD:		LA SOLEDAD		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL			
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$745,051.42		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$302,490.88		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$864,259.65	
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD		CANT		SEGUN PROYECTO P.U.		TOTAL	
GP657		SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERÍA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.		SAL		1.00		\$ 1,427.95		\$ 1,427.95	
GP258		SALIDA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.		SAL		2.00		\$ 1,303.49		\$ 2,606.98	
GP243		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA LLENADO DE TINACO DESDE RED EXISTENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO APISONADO, TUBERÍA, CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.		ML		12.00		\$ 214.11		\$ 2,569.31	
GP246		ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERÍA DE CPVC AZUL DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERÍA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE METAL, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.		SAL		3.00		\$ 1,367.83		\$ 4,103.49	
7		TRABAJOS FINALES								\$ -	
						SUBTOTAL		\$		167,838.69	
						IVA		\$		26,854.19	
						TOTAL		\$		194,692.88	

ELABORADO
C. DENISSE MACHADO OROZCO

REVISADO
ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

AUTORIZADO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O. P. D. U. Y E.

VOLUMENES GENERADORES



CONTRATISTA:

DENISSE MACHADO OROZCO

R.F.C. MAOD870924MZ9.

REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION
02 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
4	ALBANILERIA									
GP628	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE.			M2						
			AREA DE COCINA ABIERTA		23.50			23.50		
			AREA DE COCINA		32.74			32.74		
			AREA DE COMEDOR		42.37			42.37		
								TOTAL EJECUTADO	98.61	
GP2532	GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1"X1" DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.			PZA						
			AREA DE COCINA ABIERTA		15.43			15.43		
			AREA DE COMEDOR		21.13			21.13		
								TOTAL EJECUTADO	36.56	
GP830	CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCIÓN 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			ML						
				5.85				5.85		
				5.85				5.85		
								TOTAL EJECUTADO	11.70	
GP223	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-8/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			ML						
				11.43				11.43		
								TOTAL EJECUTADO	11.43	
GBR16	BASE PARA TINACO DE 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA LAC 6-8/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
				1.00				1.00		
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
5	ACABADOS									
GP196	APLANADO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			M2						
			EN LOSAS					98.61		
			EN MUROS					61.10		
			EN COLUMNAS					18.00		
			EN FILOS							
								TOTAL EJECUTADO	177.71	

ELABORADO
DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZADO
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR D.O.P.D.U.Y.E.

VOLUMENES GENERADORES



CONTRATISTA:

DENISSE MACHADO OROZCO

R.F.C. MAOD870924MZ9.

REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION

02 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							
6	INSTALACIONES ESPECIALES									
GP232	SALIDA PARA CONTACTOS, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.			SAL						
				3.00				3.00		
								TOTAL EJECUTADO	3.00	
GP233	SALIDA PARA APAGADOR, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.			SAL						
				5.00				5.00		
								TOTAL EJECUTADO	5.00	
GP230	SALIDA PARA ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.			SAL						
				11.00				11.00		
								TOTAL EJECUTADO	11.00	
GP134	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO DE EMPOTRAR DE 6" DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA						
				11.00				11.00		
								TOTAL EJECUTADO	11.00	
GP2569	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS MARCA SQUARE D O SIMILAR INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
				1.00				1.00		
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP2568	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, INC: INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			PZA						
				1.00				1.00		
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP699	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA						
				1.00				1.00		
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP657	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERIA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.			SAL						
				1.00				1.00		
								TOTAL EJECUTADO	1.00	
GP258	SALIDA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERIA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.			SAL						
				2.00				2.00		
								TOTAL EJECUTADO	2.00	
GP243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" PARA LLENADO DE TINACO DESDE RED EXISTENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO APISONADO, TUBERÍA, CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.			ML						
				12.00				12.00		
								TOTAL EJECUTADO	12.00	
GP246	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERÍA DE CPVC AZUL DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERÍA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE METAL, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.			SAL						
				3.00				3.00		
								TOTAL EJECUTADO	3.00	


C.DENISSE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZADO
INS. RUBEN RINCON RAMOS
DIRECTOR D.O.P.D.U.Y.E.

		CONTRATISTA: DENISE MACHADO OROZCO		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO: Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961, Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80150, Culiacán, Sinaloa, Código Postal: 80150					
R.F.C.: MAOD870924MZ9.					
OBRA: REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					

CROQUIS ESTIMACION:	
CLAVE	CONCEPTO
4	ALBANTLERIA
GP01	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR
GBR39	GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1"X1" DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP830	CHAFLÁN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCIÓN 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP223	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA
GBR16	BASE PARA TINACO DE 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4",

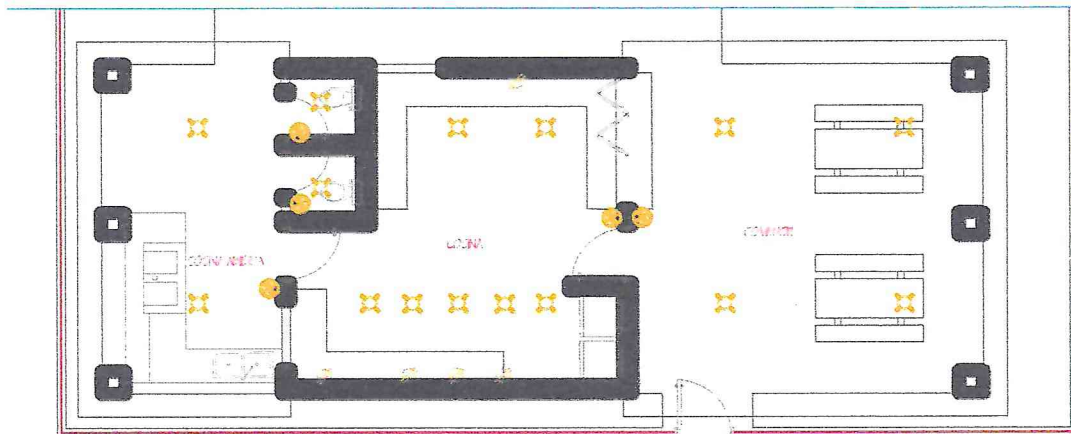

REVISÓ.-

SUPERVISOR DE OBRA

ELABORÓ.-

C. DENISE MACHADO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR O. P. D. U. Y. E.



Fecha y hora de consulta14/11/2025 1:36:46 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación:		Pago Mismo Banco	
Descripción:		EST 02 NORM AD 013	Importe de la operación: 120,151.52 MXP
Cuenta de retiro:		0124174836	Cuenta de depósito: 0488130388
Divisa de la cuenta:		MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta:		MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	Titular de la cuenta: DENISSE MACHADO OROZCO
Fecha de creación:		14/11/2025	Fecha de aplicación: 14/11/2025
Hora:		13:36:44	
Instrumento de seguridad:		ASD 6551749382	Motivo de pago: EST 02 NORM AD 013

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:0074774061

Folio único: I323202511141336440074774068

Estado operación

Porcentaje firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	14/11/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/11/2025
