

LOPEZ MATEOS No. 985 3ER PISO, COL. ANGEL FLORES, C.P. 81040, GUASAVE, SINALOA

CJE-080310-BP9



CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. DE OBRA: PR-25GU062

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO :

27 DE OCTUBRE DE 2025	INICIA
31 DE DICIEMBRE DE 2025	TERMINA

IMPORTE CONTRATADO :	\$ 1,066,524.17	CON I.V.A.
----------------------	-----------------	------------

IMPORTE DE ANTICIPO :	\$ 533,262.09	CON I. V. A.
-----------------------	---------------	--------------

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIONES	0.2% CMIC SIVA			AMORTIZACION ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	LIIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 500,103.93				\$ 250,051.97		\$ 250,051.97	\$ 250,051.96
2 (DOS)	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 381,852.42				\$ 190,926.21		\$ 190,926.21	\$ 190,926.21
3 (FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 184,567.82				\$ 92,283.91		\$ 92,283.91	\$ 92,283.91
TOTALES		\$ 1,066,524.17	-			\$ 533,262.09		\$ 533,262.09	\$ 533,262.08
SALDO DE CONTRATO		\$ -							
SALDO POR AMORTIZAR						\$ -			

ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA

~~CONFORME~~

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
AUTORIZO

ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION
REVISÓ

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

CONTRATISTA
ELABORO

ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO

COORDINADOR DE P.C.O.

Vo. Bo.



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO. 3 (FINQUITO)

PERIODO DEL : 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IMPORTE: \$92,283.91

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°. JUMAPAG/R33/62/2025

No. DE OBRA: PR-26GU062

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,624.17

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE	
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)							92,283.91
	EQUIPOS DE BOMBEO							
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO AUTOCEDANTE MARCA GORMAN-RUPP MODELO 11 1/2 AS-E2 Y 1P PARA UN GASTO DE 2.3 LPS Y 12 M.C.A. ROSCABE DE 1.5X1.5" SELLO TIPO 21. MECANICO AUTOLUBRICADO. CARA ROTATORIA EN CARBON Y ESTACIONARIA EN NI-RESIST. ELASTOMEROS EN BUNA N. JAULA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE 18-8. TEMPERATURA MAXIMA DEL LIQUIDO A BOMBLEAR 180°F (71°C). TIPO DE ACOPAMIENTO Y MOTOR ACOPADO DIRECTAMENTE DE 2 HP A 3450 RPM, ARMAZON 56, TIPO TCCV, PARA 1F, 115V/230V, 60HZ. CAPACITOR DE ARRANQUE POR INDUCCION, PROTECCION TERMICA POR SOBRECARGA 23/11.5 AMPERES A PLENA CARGA.	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 149,587.49	\$
1.1								
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA PROGRAMAR EL ARRANQUE A TENSION PLENA DE TRES BOMBAS 2 HP/220 VCA 2F 4H/60HZ. ALTERNADAS Y SIMULTANEADAS ENTRE SI, CON FUNCION LOGICA PARA EL VACIADO DE UN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE ACUERDO AL NIVEL EXISTENTE EN EL MISMO. CUENTA CON PROTECCION POR BAJO NIVEL. INCLUYE: SECCION DE CONTROL AUTOMATICO ELECTRONICO PARA REALIZAR LA FUNCION LOGICA. LAMPARA PILOTO INDICADORA DE "MOTOR OPERANDO" POR MOTOR 2. SELECTOR DE OPERACION "MANUAL-PUERA-AUTOMATICO" POR MOTOR 2. AUDIO-VISUAL POR ALTO NIVEL EN EL CARCAMO CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO "PERA". ESPECIAL PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE 10 AMP / 120 VOLTS Y 5 MTS. DECABLE SUMERGIBLE 7 BARRA PRINCIPAL DE CONEXIONES. SECCION DE POTENCIA, ARRANCADOR MAGNETICO CON PROTECCION POR SOBRECARGA POR MOTOR. GABINETE DE SOBREPONER IP65 DE TAMAÑO ADECUADO PARA INTEGRAR LOS COMPONENTES. MODELO: APLCA-3AS-5-2V	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 25,877.36	\$
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA MODELO INT. FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA. CON CAPSULA DE MERCURIO. SE SUMINISTRA CON 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO.	PZA	4.00	4.00		4.00	\$ 5,266.93	\$
	PIEZAS ESPECIALES DE ACERO							
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2" DE DIAMETRO EN MANIFUL. INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTES Y SOLDADURA.	ML	14.00	14.00		14.00	\$ 1,284.97	\$
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 2" Ø	PZA	19.00	19.00		19.00	\$ 1,113.79	\$
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA DE 3" X 2" Ø DE ACERO AL CARBON BRIDADA POR UN EXTREMO (VER DETALLE EN PLANO)	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 2,255.86	\$
	PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO							
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE 2 1/2".	PZA	4.00	4.00		4.00	\$ 838.24	\$
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 1 1/2" Ø. ROSCADO.	PZA	6.00	6.00		6.00	\$ 325.99	\$
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.15 MTS.	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 228.99	\$
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPILE SOLDABLE DE 1".	PZA	3.00	3.00		3.00	\$ 338.67	\$
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPILE SOLDABLE DE 1/2".	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 315.13	\$
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2"	PZA	2.00	2.00		2.00	\$ 144.71	\$
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2X 1 1/2".	PZA	4.00	4.00		4.00	\$ 353.68	\$
	PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO							
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO DE 90° X 2" Ø	PZA	4.00	4.00		4.00	\$ 1,931.67	\$
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO DE 4" X 2" Ø	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 1,833.04	\$
	PIEZAS DE PVC							
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" Ø	PZA	1.00	1.00		1.00	\$ 1,211.30	\$
	NOTAS:							
	CONFORME ING. CLAUDIA MARTINEZ CERVANTES LEYVA							
	GERENCIA TECNICA							

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR: ING. VIANEY DENNIS LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
Vobo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA
ELABORO C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO. 3 (FINQUITO)

PERIODO DEL : 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IMPORTE: \$82,283.91

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R3362/2025

No. DE OBRA: PR-26GU062

IMPORTE DE CONTRATO: \$1'086,524.17

FECHA:

31 DE DICIEMBRE DE 2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
2.4	CONSTRUCCION DE SARDINEL A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR POR 10 CM DE ALTURA. SECCION CIRCULAR DE 30 CM DE DIAMETRO INTERIOR PARA COLOCACION DE COLUMNA DE SUCCION. ARMADO CON ARMEC 8-6 10/10 Y CONCRETO FC= 150 KG/CM2. INCLUYE DEMOLICION DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR.	ML	2.00	2.00	2.00	0.00	\$ 410.05	\$ -
2.5	CONSTRUCCION DE MURO EN CARCAMO DE BOMBEO PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE 120 CM DE ALTURA. BASE DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE: CASTILLOS DE 15X15 CM. ARMEC DE 12X12. Y DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO SECCION 20X15 CM (VER DETALLE EN PLANO)	ML	2.80	2.80	2.80	0.00	\$ 4,071.17	\$ -
2.6	DEMOLICION RETIRO SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	8.00	8.00	8.00	0.00	\$ 358.00	\$ -
2.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA. RESANES. PRIMER MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	8.00	8.00	8.00	0.00	\$ 202.52	\$ -
2.8	RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO INCLUYE SUMINISTRO Y ACABRO DE MATERIAL. LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.	M3	1.80	1.80	1.80	0.00	\$ 410.10	\$ -
2.9	LOSA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. ARMADA CON MALLA CALIBRE 10-10. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	M2	1.80	1.80	1.80	0.00	\$ 1,108.44	\$ -
TOTAL 2. REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTENON)								
3.1	3. CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS SUMINISTRO DE MATERIALES. FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3. INCLUYE ACABRO DE MATERIALES.	M2	36.00	36.00	36.00	0.00	\$ 313.75	\$ -
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA. RESANES. PRIMER MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	18.00	18.00	18.00	0.00	\$ 202.52	\$ -
3.3	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	12.00	12.00	12.00	0.00	\$ 215.92	\$ -
3.4	IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	3.00	3.00	3.00	0.00	\$ 421.97	\$ -
TOTAL 3. CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS								
4.1	4. OBRA DE PROTECCION DESMONTE Y APILE DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.	M2	84.00	84.00	84.00	0.00	\$ 41.29	\$ -
4.2	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO. INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM.	M3	9.10	9.10	9.10	0.00	\$ 441.22	\$ -
4.3	LOSA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. ARMADA CON MALLA CALIBRE 10-10. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	M2	84.60	84.60	84.60	0.00	\$ 1,108.44	\$ -
4.4	COLOCACION DE PUERTA VEHICULAR EXISTENTE MEDIANTE JUEGO DE HERRAJES.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$ 2,016.11	\$ -
4.5	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS. COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.	HR	5.00	5.00	5.00	0.00	\$ 4,342.70	\$ -
TOTAL 4. OBRA DE PROTECCION								

NOTAS:

CONFORME ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LETYA
GERENCIA TECNICA

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR: ING. VIMNEY DENISE LETYA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
Vobo: ING. JUAN MANDEL MEDINA GERARDO

ELABORO C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO)

PERIODO DEL : 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

IMPORTE: \$92,283.91

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO NO. 1 DE AGUAS NEGRAS

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°: JUMAPAG/R3162/2025

No. DE OBRA: PR-25GU062

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,624.17

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
5. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)								
BAJA TENSION								
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3x50 AMP S.D.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 3,251.91	\$ 6,503.82
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 115.87	\$ 463.48
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	200.00	200.00	0.00	200.00	\$ 107.73	\$ 21,546.00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" Ø.	PZA	21.00	21.00	0.00	21.00	\$ 408.49	\$ 8,578.29
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1/8 DE 3/4"	PZA	12.00	12.00	0.00	12.00	\$ 101.23	\$ 1,214.76
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL DE 3/4"	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 491.19	\$ 491.19
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 3/4"	PZA	20.00	20.00	0.00	20.00	\$ 101.02	\$ 2,020.40
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4"	PZA	9.00	9.00	0.00	9.00	\$ 134.41	\$ 1,209.69
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4"	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 109.41	\$ 328.23
5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 115.87	\$ 463.48
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE C/O CALIBRE 10 AWG	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 71.62	\$ 429.72
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 3/4" Ø	ML	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 234.50	\$ 703.50
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 3/4"	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 126.16	\$ 756.96
ALUMBRADO								
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 720.62	\$ 720.62
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 240.80	\$ 240.80
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 681.13	\$ 681.13
5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 299.60	\$ 299.60
5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	ML	40.00	40.00	0.00	40.00	\$ 280.67	\$ 11,226.80
5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	100.00	100.00	0.00	100.00	\$ 107.73	\$ 10,773.00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE	ML	200.00	200.00	0.00	200.00	\$ 98.65	\$ 19,730.00
5.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA C/V	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 283.32	\$ 566.64
5.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 261.95	\$ 523.90
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 4,680.26	\$ 9,360.52
5.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 10,922.26	\$ 21,844.52
5.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 5,581.98	\$ 11,163.96
5.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTROICO	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 3,158.80	\$ 6,317.60
5.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELAANA	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 107.14	\$ 214.28
5.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 134.72	\$ 269.44
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 171.88	\$ 343.76
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GALA CHALUPA	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 152.15	\$ 304.30
5.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 109.51	\$ 109.51
5.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 85.92	\$ 85.92
5.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRO DE 4"	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 145.49	\$ 290.98
5.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2" Ø.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 144.96	\$ 289.92
5.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" Ø.	PZA	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 299.60	\$ 1,797.60
5.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 299.60	\$ 599.20
5.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 144.96	\$ 289.92
5.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2".	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 94.92	\$ 189.84
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 3/4".	PZA	20.00	20.00	0.00	20.00	\$ 55.00	\$ 1,100.00
5.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACULETE PL 3/8" C/PLA 10 X 38 MM.	PZA	30.00	30.00	0.00	30.00	\$ 69.18	\$ 2,075.40
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLIA AUTOREGOSCABLE 25 MM.	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 91.89	\$ 918.90
5.43	RETIRAR MATERIAL EXISTENTE EN ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES A C.F.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 193.94	\$ 193.94
TOTAL 5. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)							\$ 11,878.67	\$ 11,878.67
							\$	\$ 169,110.19

NOTAS:

LUGAR: GUASAVE, SINALOA
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR: ING. VIANEY DENNIS LEVYA CERNANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
VBO: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO
C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERNANTES LEVYA
GERENCIA TECNICA



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO. 3 (FINQUITO)		PERIODO DEL : 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		IMPORTE: \$92,283.91				
OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.						
UBICACION: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA		CONTRATO N°. JUMAPAG/R3362/2025		No. DE OBRA: PR-26GU062				
		IMPORTE DE CONTRATO: \$1'066,524.17		FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	CANTIDAD DE OBRA HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
					IMPORTE DE ESTIMACION	3 (FINQUITO)	SIN IVA	\$ 159,110.19
							16% DE IVA:	\$ 25,457.63
							TOTAL:	\$ 184,567.82
							DEDUCCIONES:	
					AMORTIZACION DE ANTICIPO 50 % :			\$ 92,283.91
					TOTAL:			\$ 92,283.91
TOTAL HOJA:								92,283.91
NOTAS:								
LUGAR: GUASAVE, SINALOA								
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2025								
SUPERVISOR: ING. VIANEY DENNIS LEYVA CERVANTES								
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG								
Vobo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO								
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA								
ELABORO C. JESUS FELIX GARCIA								
REPRESENTANTE LEGAL								
REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ								
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA								
CONFORME: ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA								
GERENCIA TECNICA								

NUMEROS GENERADORES



OBRA: REHABILITACIÓN DE CARGAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR3362/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 3 (FINIQUITO)
No. DE OBRA: PR-26GU062
PERIODO DE ESTIMACION:
01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE CARGAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARGAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)										
	EQUIPOS DE BOMBEO										
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO AUTOCEBANTE MARCA GORMAN-RUP MODELO 11 1/2 AS-EZ Y 1P PARA UN GASTO DE 2.5 LPS Y 12 M.C.A. ROSCABE DE 1.5X1.5". SELLO TIPO 21. MECANICO AUTOLUBRICADO. CARA ROTATORIA EN CARBON Y ESTACIONARIA EN NITRIST. ELASTOMEROS EN BUNA N. JALUA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE 18-8. TEMPERATURA MAXIMA DEL LIQUIDO A BOMBLEAR 160°F (71°C). TIPO DE ACOPLAMIENTO Y MOTOR ACOPLADO DIRECTAMENTE DE 2 HP A 3450 RPM. ARMAZON 56, TIPO TCCV. PARA 1F, 115V/230V, 60HZ. CAPACITOR DE ARRAQUE POR INDUCCION, PROTECCION TERMICA POR SOBRECARGA 2311.5 AMPERES A PLENA CARGA.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA PROGRAMAR EL ARRAQUE A TENSION PLENA DE TRES BOMBAS 2 HP/220 VCA 2F 48 60HZ. ALTERNADAS Y SIMULTANEADAS ENTRE SI CON FUNCION LOGICA PARA EL VACIO DE UN CARGAMO DE AGUAS NEGRAS DE ACUERDO AL NIVEL EXISTENTE EN EL MISMO. CUENTA CON PROTECCION POR BLOQUEO NIVEL. INCLUYE SECCION DE CONTROL, CONTROL AUTOMATICO ELECTRONICO PARA REALIZAR LA FUNCION LOGICA. LAMPARA PILOTO INDICADORA DE MOTOR OPERANDO POR MOTOR. SELECTOR DE OPERACION MANUAL-FUERZA-AUTOMATICO. PORNITOR. ALARMA AUDIO-VISUAL POR ALTO NIVEL EN EL CARGAMO. CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO "PERRA". ESPECIAL PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE 10 AMF. / 220 VOLTS 1 5 MTS. DECABLE SUMERGIBLE. BARRA PRINCIPAL DE CONEXIONES. SECCION DE POTENCIA, ARRAQUADOR MAGNETICO CON PROTECCION POR SOBRECARGA POR MOTOR. GABINETE, GABINETE DE SOBREPONER 1P65 DE TAMAÑO ADECUADO PARA INTEGRAR LOS COMPONENTES. MODELO. APLCA-3AS-5-2V	PZA							0.00		PZA
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA MODELO INT. FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA. CON CAPSULA DE MERCURIO. SE SUMINISTRA CON 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE USO RUJO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO.	PZA							0.00		PZA
	PIEZAS ESPECIALES DE ACERO										
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2" DE DIAMETRO EN MANIFUL. INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR. CORTES Y SOLDADURA.	ML							0.00		ML
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 2" ø	PZA							0.00		PZA
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA DE 3" X 2" ø DE ACERO AL CARBON BRIDADA POR UN EXTREMO (VER DETALLE EN PLANO)	PZA							0.00		PZA
	PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO										
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE 2"ø.	PZA							0.00		PZA
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 1 1/2" Ø. ROSCADO.	PZA							0.00		PZA
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.15 MTS.	PZA							0.00		PZA
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE SOLDABLE DE 1"ø.	PZA							0.00		PZA
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE SOLDABLE DE 1 1/2"ø.	PZA							0.00		PZA
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2"	PZA							0.00		PZA
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2X 1 1/2"ø.	PZA							0.00		PZA
	PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO										
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO FO DE 90° X 2" ø	PZA							0.00		PZA
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO DE 4" X 2" ø	PZA							0.00		PZA
	PIEZAS DE PVC										
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" ø	PZA							0.00		PZA
1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE DE PVC DE 4" ø	PZA							0.00		PZA
	VALVULAS										
1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 2" DIAM.	PZA							0.00		PZA

AUTORIZO:
ING. VANEEY DENISE LEIVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.
C. JESUS FELIX GARCIA
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS
UBICACION: LOCALIDAD DE BAMBOL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAG/33/62/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 3 (FINQUIRO)
No. DE OBRA: PR-26G0062
PERIODO DE ESTIMACION:
01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2" ø.	PZA							0.00		PZA
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1" ø	PZA							0.00		PZA
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1 1/2" ø	PZA							0.00		PZA
1.22	EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE MARCA A.R.I. MODELO D-221. CUERPO DE NYLON REFORZADO. PN 10 BAR. PLASTICA ROSCABLE MACHO NPT DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	PZA							0.00		PZA
1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO, MARCA SEAMETRICS, MODELO MAG4700. CERTIFICACION NSF. PROTECCION IP 68. ALIMENTACION MEDIANTE BATERIAS. ANILLOS PARA TIERRA DE ACERO INOXIDABLE 304. TOTALIZADOR COMPACTO CON SALIDA DE PULSOS. NO INCLUYE CABLE, BRIDAS ANSI CLASE 150 DE 2" DE DIAMETRO.	PZA							0.00		PZA
1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/4") ø ACERO INOXIDABLE. MEMA 4X. TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO PARA FUNCION DE AGUAS NEGRAS.	PZA							0.00		PZA
1.25	EMPAQUES Y TORNILLOS SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" ø	PZA							0.00		PZA
1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" ø	PZA							0.00		PZA
1.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA							0.00		PZA
1.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"	PZA							0.00		PZA
1.29	OBRA CIVIL SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE PC=250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 1.20 MTS. BASE SUPERIOR DE 30 CMS. INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLEIRA DE 4"x1/4" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBERIA, INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE.	PZA							0.00		PZA
2.1	2. REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMBOL (SECTOR PANTEON) REJILLA DE ALUMINIO ATRAPA SOLIDOS DE 1.30 X 0.90 M, ARMADA CON SOLEIRA DE 1 1/2" X 1/4" CON UNA SEPARACION DE 5/8" Y BASTIDOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4". INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO Y COLOCACION.	PZA							0.00		PZA
2.2	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.90 X 1.50 M, EN TRAMPA DE SOLIDOS ARMADA CON PTR DE 1 1/2" X 1/8" CON UNA SEPARACION DE 2". MARCO ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4", CON BISAGRA TUBULAR DE 5/8".	PZA							0.00		PZA
2.3	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.70 X 0.70 M, CON MARCO Y CONTRAMARCO DA ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8". LAMINA CORRUGADA.	PZA							0.00		PZA
2.4	CONSTRUCCION DE SARDINEL A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR POR 10 CM DE ALTURA, SECCION CIRCULAR DE 30 CM DE DIAMETRO INTERIOR PARA COLOCACION DE COLUMNA DE SUCCION, ARMADO CON ARMEX 56 10/10 Y CONCRETO PC= 150 KG/CM2. INCLUYE DEMOLICION DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR.	ML							0.00		ML
2.5	CONSTRUCCION DE MURO EN CARCAMO DE BOMBEO PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE 120 CM DE ALTURA, BASE DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 CM, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE: CASTILLOS DE 15X15 CM, ARMEX DE 12X12, Y DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO SECCION 20X15 CM (VER DETALLE EN PLANO)	ML							0.00		ML
2.6	DEMOLICION, RETIRO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS, CON PROPORCION 1:3. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							0.00		M2
2.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES, PRIMER, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2							0.00		M2

AUTORIZO: ELABORO: CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.
ING. VIANEY DENISSE LEIVA CERVANTES C. JESUS FELIX GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG CONTRATISTA

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS
UBICACION: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAGR33622025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO.- 3 (FINICURTO)
No. DE OBRA: PR-266U62
PERIODO DE ESTIMACION:
01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
2.8	RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO.INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.	M3								0.00	M3
2.9	LOSA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. ARMADA CON MALLAS CALIBRE 10-10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	M2								0.00	M2
3.1	3. CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLAMADO PLUIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES.	M2								0.00	M2
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES, PRIMER, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2								0.00	M2
3.3	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2								0.00	M2
3.4	IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2								0.00	M2
4.1	4. OBRA DE PROTECCION DESMONTE Y APIL DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.	M2								0.00	M2
4.2	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO.INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM.	M3								0.00	M3
4.3	LOSA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. ARMADA CON MALLAS CALIBRE 10-10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	M2								0.00	M2
4.4	COLOCACION DE PUERTA VEHICULAR EXISTENTE MEDIANTE JUEGO DE HERRALES	PZA								0.00	PZA
4.5	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.	HR								0.00	HR
5.1	5. INSTALACION ELECTRICA PARA CARGAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON) BATA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAGABINETE DE 3X50 AMP S.D.	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA						4.00	4.00	4.00	PZA
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML			200.00			1.00	200.00	200.00	ML
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" s.	PZA						21.00	21.00	21.00	PZA
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 18 DE 3/4"	PZA						12.00	12.00	12.00	PZA
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL DE 3/4"	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISSE JENYA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.
C. JESUS FELIX GARCIA
CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO No. 1 DE AGUA NEGRAS
UBICACION: LOCALIDAD DE BAMA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066 524.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAGR33/82/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO. 3 (FINQUITO)
No. DE OBRA: PR-26G082
PERIODO DE ESTIMACION:
01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 3/4"	PZA						20.00	20.00	20.00	PZA
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4"	PZA						9.00	9.00	9.00	PZA
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4	PZA						3.00	3.00	3.00	PZA
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA						4.00	4.00	4.00	PZA
5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 10 AWG	PZA						6.00	6.00	6.00	PZA
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 3/4" Ø	ML						3.00	3.00	3.00	ML
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LIQUATITE DE 3/4"	PZA						6.00	6.00	6.00	PZA
5.14	ALUMBRADO SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	ML						40.00	40.00	40.00	ML
5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML			100.00			1.00	100.00	100.00	ML
5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE	ML			200.00			1.00	200.00	200.00	ML
5.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CVI	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PRISMAL	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRO	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALA OHALUPA	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
5.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
5.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4"	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" ø.	PZA						6.00	6.00	6.00	PZA
5.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2"	PZA						2.00	2.00	2.00	PZA
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 3/4"	PZA						20.00	20.00	20.00	PZA
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAJUETE PL 3/8" CRPLA 10 X 38 MM.	PZA						30.00	30.00	30.00	PZA
5.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATA AUTROSOCABLE 25 MM.	PZA						10.00	10.00	10.00	PZA
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2"	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
5.43	RETRAPAR MATERIAL EXISTENTE EN ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES A C.F.E.	LOTE						1.00	1.00	1.00	LOTE

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISE DE VERA CERVANTES

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

REPORTE FOTOGRAFICO


OBRA: REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAG/R33/6/22/2026
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 3 (FINIQUITO)
No. DE OBRA: PR-25GU062

PERIODO DE ESTIMACION:
01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	

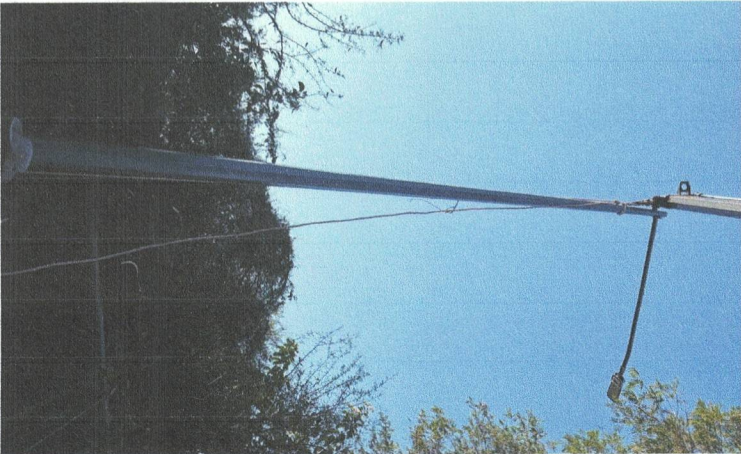

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARGAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS
 UBICACIÓN: LOCALIDAD DE BAMOÁ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1'066,524.17
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°. JUMAPAGR/33/6/2/2025
 DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 3 (FINIQUITO)
 No. DE OBRA: PR-26GU062

PERIODO DE ESTIMACION:
 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	



AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LEIVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
